



GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN, CATEGORIA II-2, 6° NIVEL DE COMPLEJIDAD NUEVO HOSPITAL DE ANDAHUAYLAS”

PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN, CATEGORIA II-2, 6° NIVEL DE COMPLEJIDAD NUEVO HOSPITAL DE ANDAHUAYLAS”



FOTOGRAFIA 01:RENDERS DE HOSPITAL DE ADAHUAYLAS

1. IDENTIFICACIÓN

1.1. CODIGO SNIP DEL PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA: **72278**

1.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA:

DEPARTAMENTO: APURIMAC

PROVINCIA: ANDAHUAYLAS

DISTRITO: ANDAHUAYLAS

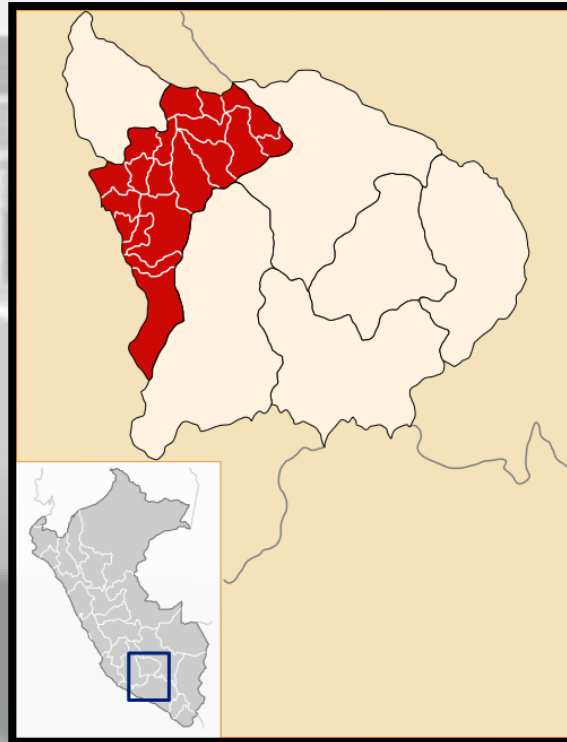


FIGURA 01: UBICACIÓN Y LOCALIZACIÓN DE PROYECTO DENTRO DE LA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS

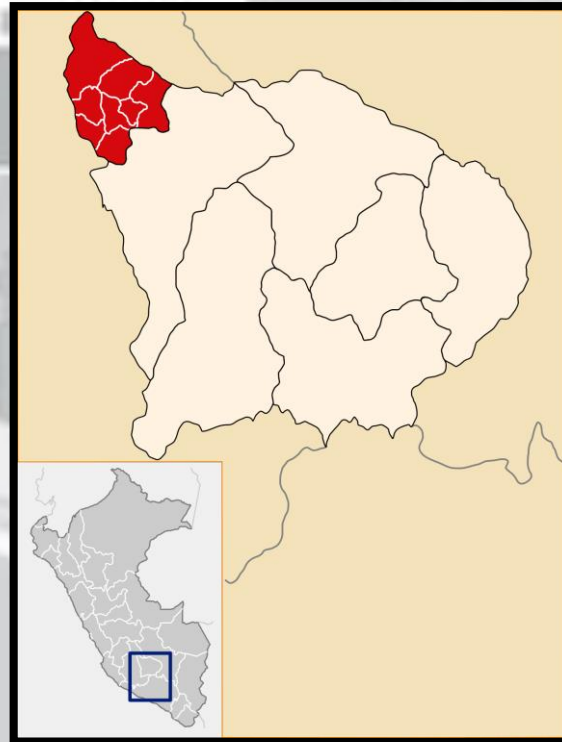


FIGURA 02: CHINCHEROS - APURIMAC

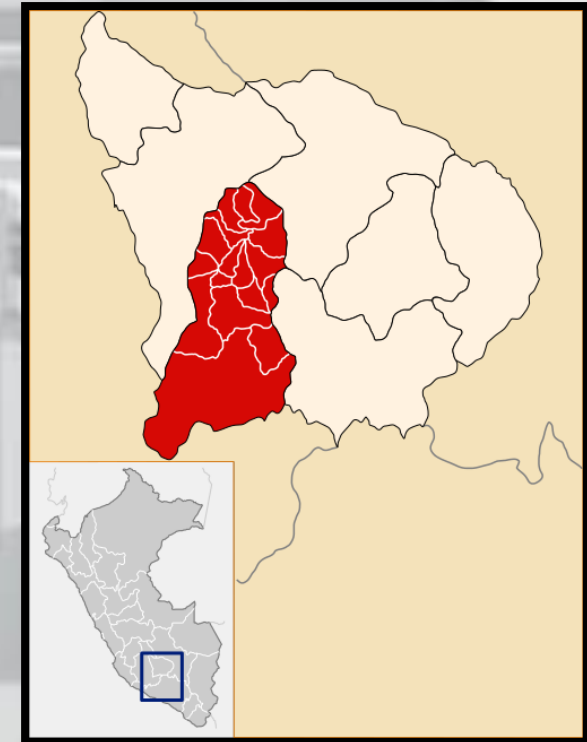


FIGURA 03: AYMARAE - APURIMAC

2. PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA, OBJETIVO, BENEFICIOS SOCIALES Y SERVICIOS

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

LIMITADA COBERTURA, CALIDAD, CAPACIDAD DIAGNÓSTICA Y RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA EL ÁMBITO DE INFLUENCIA DEL HOSPITAL DE ANDAHUAYLAS

2.3. OBJETIVO

EL OBJETIVO DEL PROYECTO CONSISTE EN CONTAR CON UNA MODERNA Y ADECUADA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE ACUERDO CON LOS SERVICIOS Y REQUERIMIENTOS DE UN ESTABLECIMIENTO DE SALUD (HOSPITAL II-2).

2.2. BENEFICIOS

EL PROYECTO BENEFICIARA DIRECTAMENTE A MÁS DE 200.000 PERSONAS, SIENDO APROXIMADAMENTE LA MITAD DE LA POBLACIÓN DE APURÍMAC, PRINCIPALMENTE SE ATENDERÁN PACIENTES DE ANDAHUAYLAS, CHINCHEROS Y AYMARAES, SIN EMBARGO TAMBIÉN RECIBIRÁ A FAMILIAS DE ZONAS CONTIGUAS, COMO LAS REGIONES DE AYACUCHO Y EL CUSCO.

2.4. SERVICIOS

MEDICOS, QUIRURGICOS, EMERGENCIA, LABORATORIO Y DIAGNOSTICO POR IMÁGENES DEBIENDO RESPONDER REQUERIMIENTOS FUNCIONALES, ADECUADA ZONIFICACIÓN, CIRCULACIÓN DESTINADOS A PACIENTES INTERNOS, PERSONAL Y SERVICIOS AL PÚBLICO EN GENERAL.

3. UNA VEZ FINALIZADO EL PROYECTO LA POBLACIÓN LOCAL CONTARÁ CON:

- **MEJOR CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA EL USUARIO.**
- **OPORTUNO DIAGNÓSTICO Y APROPIADO TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD.**
- **DISMINUCIÓN DE MORBILIDAD POR ADECUADA CAPACIDAD RESOLUTIVA.**
- **MAYOR CONFIANZA DE LA POBLACIÓN POR LA ADECUADA CAPACIDAD E IMPLEMENTACION DEL ESTABLECIMIENTO.**
- **SE PREVÉ FINALIZADO EL PROYECTO, REALIZAR MÁS DE 108.000 ATENCIONES A PACIENTES, 27.600 ATENCIONES DE EMERGENCIA Y MÁS DE 3.000 INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS QUE NO HUBIERAN SIDO POSIBLE SIN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.**

4. METAS DE PROYECTO

TABLA 01: METAS DE PROYECTO

Descripción de productos/acciones	Tipo de ítem	Unidad físicas		Descripción de productos/acciones	Tipo de ítem	Unidades físicas	
		U.M.	Meta			U.M.	Meta
OBRA NUEVA				OBRAS DE REMODELACION			
CONSULTA EXTERNA - OBRA NUEVA (INCLUYE INGRESO A PROCEDIMIENTO - OBRA NUEVA	INFRAESTRUCTURA	AMBIENTES	41	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN - REMODELACIÓN	INFRAESTRUCTURA	AMBIENTES	26
FARMACIA - OBRA NUEVA	INFRAESTRUCTURA	AMBIENTES	13	PROGRAMAS - REMODELACIÓN	INFRAESTRUCTURA	AMBIENTES	2
PATOLOGÍA CLÍNICA - OBRA NUEVA	INFRAESTRUCTURA	AMBIENTES	6	PATOLOGÍA CLÍNICA - REMODELACIÓN	INFRAESTRUCTURA	AMBIENTES	12
IMÁGENES - OBRA NUEVA	INFRAESTRUCTURA	AMBIENTES	28	BANCO DE SANGRE - REMODELACIÓN	INFRAESTRUCTURA	AMBIENTES	30
EMERGENCIA - OBRA NUEVA	INFRAESTRUCTURA	AMBIENTES	74	MEDICINA FISICA Y REHABILITACION - REMODELACION	INFRAESTRUCTURA	AMBIENTES	21
HOSPITALIZACIÓN - OBRA NUEVA	INFRAESTRUCTURA	AMBIENTES	129	ANATOMIA PATOLOGICA - REMODELACION	INFRAESTRUCTURA	AMBIENTES	8
UCI GENERAL - OBRA NUEVA	INFRAESTRUCTURA	AMBIENTES	54	DOCENCIA - REMODELACION	INFRAESTRUCTURA	AMBIENTES	8
UCI NEONATAL - OBRA NUEVA	INFRAESTRUCTURA	AMBIENTES	32	RECIDENCIA MEDICA - REMODELACION	INFRAESTRUCTURA	AMBIENTES	8
CENTRO OBSTÉTRICO - OBRA NUEVA	INFRAESTRUCTURA	AMBIENTES	33	BIBLIOTECA - REMODELACION	INFRAESTRUCTURA	AMBIENTES	1
CENTRO QUIRÚRGICO - OBRA NUEVA	INFRAESTRUCTURA	AMBIENTES	54	ESTAR MEDICO - REMODELACION	INFRAESTRUCTURA	AMBIENTES	1
CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN - OBRA NUEVA	INFRAESTRUCTURA	AMBIENTES	17	AUDITORIO Y CAFETERIA - REMODELACION	INFRAESTRUCTURA	AMBIENTES	3
ANATOMIA PATOLOGICA - OBRA NUEVA	INFRAESTRUCTURA	AMBIENTES	10	PSICOPROFILAXIS - REMODELACION	INFRAESTRUCTURA	AMBIENTES	1
DOCENCIA - OBRA NUEVA	INFRAESTRUCTURA	AMBIENTES	5	TOTAL	INFRAESTRUCTU	AMBIENTES	121
NUTRICION Y DIETA - OBRA NUEVA	INFRAESTRUCTURA	AMBIENTES	18	EQUIPAMIENTO	CAPACITACION		
LAVANDERIA Y VESTIDORES - OBRA NUEVA	INFRAESTRUCTURA	AMBIENTES	15	EQUIPOS COMPLEMENTARIOS	PROGRAMA CCC		
MANTENIMIENTO Y TALLERES/LIMPIEZA/VIGILANCIA	INFRAESTRUCTURA	AMBIENTES	26	EQUIPOS INFORMATICA Y COMUNICACIÓN	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y MEJORA DE COMPETENCIAS		
CASSETAS D ECONTROL - OBRA NUEVA	INFRAESTRUCTURA	AMBIENTES	4	EQUIPOS BIOMEDICOS	REORGANIZACIÓN DE SERVICIOS Y REINGENIERIA		
ALMACEN GENERAL - OBRA NUEVA	INFRAESTRUCTURA	AMBIENTES	10	EQUIPOS ELECTROMECHANICOS Y OTROS	SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN DE OPERACIÓN		
AREA DE EQUIPO CENTRAL DE GASES/CASA DE FUERZ	INFRAESTRUCTURA	AMBIENTES	10	INSTRUMENTAL QUIRURGICO	ACCIONES DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS		
TANQUE DE PETROLEO - OBRA NUEVA	INFRAESTRUCTURA	AMBIENTES	1	MOBILIARIO ADMINISTRATIVO			
TANQUE DE GAS LIQUIDO - OBRA NUEVA	INFRAESTRUCTURA	AMBIENTES	1	MOBILIARIO CLINICO			
TANQUE DE AGUAS RESIDUALES - OBRA NUEVA	INFRAESTRUCTURA	AMBIENTES	1				
ACOPPIO DE RESIDUOS SOLIDOS - OBRA NUEVA	INFRAESTRUCTURA	AMBIENTES	1				
TOTAL	INFRAESTRUCTU	AMBIENTES	598				

Pip Viable		PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA ECONOMICA		VARIACION	
Und	Cant	Und	Cant	Und	Cant
M2	14,244.11	M2	16,786.59	M2	2,542.48

FUENTE: GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

5. PROCESO DE SELECCIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA - OFERTA

5.1. PROCESO DE SELECCIÓN:

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° 02 — 2012 — GRAP

19 DE NOVIEMBRE DEL 2012

5.2. SISTEMA DE CONTRATACIÓN:

LLAVE EN MANO A PRECIOS UNITARIOS

5.3. VALOR REFERENCIAL:

S/ 111,627,431.09 INC. IGV (2012)

5.4. PLAZO DE EJECUCIÓN:

600 DIAS CALENDARIOS

6. POSTOR GANADOR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

6.1. CONTRATISTA:
CONSORCIO ANDAHUAYLAS



6.2. CONTRATO:
C.G.R. N° 001-2013-GR-APURIMAC/GG

11 DE ENERO DEL 2013

6.3. MONTO CONTRATADO:
EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA: S/ 64,275,161.34
EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO: S/ 58,181,337.46

VALOR CONTRACTUAL: S/ 122,456,498.80 INC. IGV

6.4. PLAZO DE EJECUCIÓN: 600 DIAS CALENDARIOS

7. EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE OBRA

7.1. INICIO DE EJECUCIÓN DE OBRA:
11 DE FEBRERO DEL 2013.

7.2. PARALIZACIÓN DE OBRA:
19 DE DICIEMBRE DEL 2014.

7.3. REINICIO DE OBRA:
11 DE DICIEMBRE DE 2017.

7.4. FIN DE OBRA:
15 DE DICIEMBRE DE 2018.

- VALORIZACIONES PENDIENTES DE PAGO AL CONSORCIO ANDAHUAYLAS POR FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
- RETIRO DEFINITIVO DE LA SUPERVISION EN LA ETAPA DE EJECUCION POR VALORIZACIONES PENDIENTES DE PAGO, POR FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (15/11/2014)
- FALTA DE APROBACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE ADICIONALES POR DEFICIENCIAS ENCONTRADAS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO

8. SUCESOS EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE OBRA

- 19/11/2012** **Licitación Publica Internacional - N° 02-2012-GRAP**
- 11/01/2013** **Contrato N° 001-2013-GR-APURIMAC** entre el Gobierno Regional de Apurímac y el Consorcio Andahuaylas, para la ejecución de la obra, bajo el sistema de contratación a Precios Unitarios y un plazo de ejecución de 600 días calendarios.
- 26/01/2013** Se realiza la entrega de terreno según consta el acta de la misma fecha.
- 10/02/2013** La sociedad de beneficencia pública de Andahuaylas ha presentado el Oficio N° 021-2013-SBPA-PA donde informa que dicha sociedad dejó el terreno libre el día 10.02.2013
- 11/02/2013** **INICIO CONTRACTUAL DE OBRA**
- 16/12/2013** **CAOV Original por 600 días calendarios** aprobado resolutivamente **RGGR- 182 – 2013 – GR – APURIMAC -GG**
- 15/05/2014** **CAOV modificado** Con resolución **Gerencial General Regional N° 088-2014-GR-APURIMAC/GG**, se aprueba el calendario de avance de obra valorizada actualizado, siendo el plazo de ejecución de obra **737 días calendarios**, con fecha de inicio de obra 11/02/2013 y fecha de término 17/02/2015.
- 15/11/2014** **RETIRO DEFINITIVO LA SUPERVISIÓN** de Obra por pendientes de pagos de valorizaciones y falta de disponibilidad presupuestal.
- 19/12/2014** Las partes Consorcio Andahuaylas y el Gobierno Regional de Apurímac, a través de la Gerencia Regional de Obra, suscriben el **ACTA DE PARALIZACION TEMPORAL DE OBRA.**

9. SUCESOS EN LA ETAPA DE PARALIZACIÓN DE OBRA

19/12/2014

Las partes Consorcio Andahuaylas y el Gobierno Regional de Apurímac, a través de la Gerencia Regional de Obra, suscriben el **ACTA DE PARALIZACION TEMPORAL DE OBRA.**

09/02/2015

RESOLUCION DE NULIDAD DE ACTA DE PARALIZACIÓN.

10/02/2015

Con carta N° 029-CA-2015 de fecha 10 de febrero del 2015, el **Consorcio Andahuaylas**, presenta su **RESOLUCIÓN DE CONTRATO.**

JULIO/2015

El gobierno Regional de Apurímac asume la obra en **Custodia** e inicia negociaciones para restituir el vinculo contractual con el contratista.

ENERO/2016

Inicia los tramites con el Ministerio de Salud para garantizar la **disponibilidad presupuestal** para la conclusión de la obra.

02/02/2016

Con carta N° 003-2016-GG/GRAP, la Gerencia General del Gobierno Regional de Apurímac, remite Carta Notarial al CONSORCIO LAS MERCEDES, responsable de la elaboración del Expediente Técnico de la referencia, para que en un plazo de 48 horas absuelva las observaciones y emitir pronunciamiento técnico al respecto.

12/05/2016

Se suscribe el **Acta de Conciliación N°003242** entre el Consorcio Andahuaylas y el Gobierno Regional de Apurímac donde se tomaron diferentes acuerdos.

- Deberá Contar Con Una Nueva Supervision
- La Entidad Se Compromete A Evaluar Y Cancelar Los Pendientes De Pagos De Las Valorizaciones (Evaluado Por La Nueva Supervision)
- La Entidad Realizara Las Gestiones Para La Adecuación De Los Expedientes Técnicos (Adicionales)
- El Gobierno Regional Deberá Acreditar Disponibilidad Presupuestal

9. SUCESOS EN LA ETAPA DE PARALIZACIÓN DE OBRA

- 25/05/2016** 25 de Mayo del 2016 se suscribe el Acta de paralización temporal entre el Consorcio Andahuaylas y Gobierno Regional de Apurímac.
- 06/07/2016** CP-SM-1-2016-GRAP-1. valor referencial 1,554,201.90 — Declarado Desierta
- 12/09/2016** AS-SM-18-2016-GRAP-1. valor referencial 2,000,000.00 — Declarado Desierta
- 13/10/2016** AS-SM-18-2016-GRAP-2. — Valor referencial 2,000,000.00 - Declarado Desierta
- 08/11/2016** AS-SM-18-2016-GRAP-3. — Valor referencial 2,466,667.00 — Buena Pro: S/ 2,220,000.30
- 27/12/2016** Con fecha 27 de diciembre de 2016 se suscribe el **Contrato N° 1041-2016-GR-APURIMAC/GG** entre el Gobierno Regional de Apurímac y el CONSORCIO SUPERVISOR ANDAHUAYLAS, para la Supervisión de la obra, bajo el sistema de contratación a Suma Alzada y un plazo de ejecución de 570 días calendarios
- 10/5/2017** El consorcio Andahuaylas manifiesta a la entidad que no es responsabilidad la elaboración de los expedientes de los adicionales (DESPUES de un año firmado el acta de conciliación manifiesta que no es su responsabilidad)

9. SUCESOS EN LA ETAPA DE PARALIZACIÓN DE OBRA

MODIFICACIONES OCASIONADOS POR DEFICIENCIAS EN LA ESPECIALIDADES EN EL EXPEDIENTE TECNICO

- DEFICIENCIA DE METRADOS
- DEFICIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES SANITARIAS
- DEFICIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DE GASES MEDICINALES
- DEFICIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES CONTRA INCENDIO
- DEFICIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DE VENTILACIÓN
- DEFICIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES DE COMUNICACIONES
- DEFICIENCIA EN LAS INSTALACIONES DE MEDIA TENSION E INSTALACIONES ELECTRICAS
- COMPATIBILIDAD DE ESPECIALIDADES CON EQUIPAMIENTO
- EXPEDIENTE DE REINICIO DE OBRA

11/12/2017

ADDENDA N° 02-2017-GR-APURIMAC/GG entre el Gobierno Regional de Apurímac y el Consorcio Andahuaylas dando reinicio de ejecución de obra el 11/12/2017, así mismo en dicha adenda se realiza la reducción de metas al contrato del Consorcio Andahuaylas que asciende al monto de S/. 117, 709,344.94, por lo que el contratista ya no ejecutara las obras de remodelación debido que dicho espacio sigue funcionando actualmente el hospital de Andahuaylas y estas partidas serán ejecutadas posteriormente.

10. SUCESOS EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE REINICIO OBRA

12/06/2017

Se suscribe El ACTA DE ENTREGA DEL TERRENO entre el Consorcio Andahuaylas y Gobierno donde se da en custodia al Consorcio Andahuaylas.

11/12/2017

ADDENDA N° 02-2017-GR-APURIMAC/GG entre el Gobierno Regional de Apurímac y el Consorcio Andahuaylas dando reinicio de ejecución de obra el 11/12/2017, así mismo en dicha adenda se realiza la reducción de metas al contrato del Consorcio Andahuaylas que asciende al monto de S/. 117, 709,344.94, por lo que el contratista ya no ejecutara las obras de remodelación debido que dicho espacio sigue funcionando actualmente el hospital de Andahuaylas y estas partidas serán ejecutadas posteriormente.

06/02/2018

Con carta N° 018-2018-ADM-CSA, de fecha 06 de febrero del 2018, CONSORSCIO SUPERVISOR ANDAHUAYLAS, remite a la entidad con asunto regularización del cronograma de avance de obra para el reinicio de la ejecución de obra.

11. POSTOR GANADOR DE LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA

19.1. CONTRATISTA:

CONSORCIO SUPERVISOR ANDAHUAYLAS (SUPERVISIÓN DEL SALDO)

19.2. CONTRATO:

C.G.R. N° 1041 2016-GR-APURIMAC/GG — DE FECHA 27 DE DICIEMBRE 2016

19.3. MONTO CONTRATADO

S/ 2,220,000.30

19.4. PLAZO DEL SERVICIO SUPERVISIÓN

570 DIAS CALENDARIO

19.5. INICIO DE SERVICIO DE SUPERVISIÓN

28 DE DICIEMBRE DEL 2016

19.5. FIN DE SERVICIO DE SUPERVISIÓN

20 DE JULIO DEL 2018



GRACIAS

