

RE CONSTRUCCIÓN

CON CAMBIOS

ESQUEMA DE INTERVENCIONE S

DU 016-2023
Noviembre 2023



AVANCE EN CONTRATACIONES POR DEPARTAMENTO – EJECUCIÓN

NÚMERO DE PAQUETE	CUENCA /SECTOR	N° DE PUNTO CRÍTICO	ESTADO	FECHA DE INICIO DE CONTRATO	FECHA DE INICIO DE LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN
1	Río Tumbes	31 al 39	10/11/2023 - EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA EN TRABAJOS DE LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN Y CONFORMACIÓN DE DIQUE EN LOS PUNTOS CRÍTICOS 33, 34, 35 Y 39.	4/08/2023	15/10/2023
2	Río Tumbes	40 al 55	10/11/2023 - EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA EN TRABAJOS DE LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN Y CONFORMACIÓN DE DIQUE EN EL PUNTO CRÍTICO 55	4/08/2023	30/10/2023
3	Río Tumbes	56 al 60	10/11/2023 - EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA EN TRABAJOS DE LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN EN EL PUNTO CRÍTICO 57.	4/08/2023	25/10/2023
4	Chutuque / Virrilá	1	10/11/2023 - EL CONTRATISTA VIENE EJECUTANDO LAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DESCOLMATACIÓN Y CONFORMACIÓN DE DIQUE EN LOS SECTORES DE CHUTÚQUE Y VIRRILÁ, TIENE UN AVANCE ACUMULADO DEL 30.31%. EN EL SECTOR VIRRILÁ, SE ESTÁ DESARROLLANDO LA CONFORMACIÓN DE DIQUE CON LA INSTALACIÓN DE GEOCONTENDORES.	14/07/2023	15/08/2023
5	La Leche	2	10/11/2023 - SE APROBÓ LA FICHA TÉCNICA DEFINITIVA AL 100%, EL CONTRATISTA PODRÁ CONTINUAR CON LOS TRABAJOS PROGRAMADOS.	26/08/2023	8/10/2023

AVANCE EN CONTRATACIONES POR DEPARTAMENTO – EJECUCIÓN

NÚMERO DE PAQUETE	CUENCA /SECTOR	N° DE PUNTO CRÍTICO	ESTADO	FECHA DE INICIO DE CONTRATO	FECHA DE INICIO DE LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN
6	La Leche	3	10/11/2023 - EL CONTRATISTA PERSISTE EN EL INCUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LA FTD AL 20%.	1/09/2023	22/11/2023
7	Quebrada Oso - Chicama	8	10/11/2023 - DSI APROBÓ LA FICHA TÉCNICA DEFINITIVA AL 100% 10.11.2023, EL CONTRATISTA INICIARÁ LOS TRABAJOS 13.11.2023, LA MAQUINARÍA SE ENCUENTRA EN CAMPO.	26/08/2023	13/11/2023
8	Qda Santanero - Contumaza	9	10/11/2023 - EL CONTRATISTA CULMINÓ LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EL DÍA 01.11.2023	26/08/2023	7/10/2023
9	Chicama	10 al 12	10/11/2023 - LA UNIDAD LOGÍSTICA DE DSI EMITIRÁ INFORME PARA LA RESOLUCIÓN DE CONTRATO POR INCLUMIENTO DE FUNCIONES.	26/08/2023	22/11/2023
10	Virú	13	10/11/2023 - EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN Y CONFORMACIÓN DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO O DE PRÉSTAMO, SE TIENE UN AVANCE FÍSICO DE 75.4% DEL TOTAL DE LA ACTIVIDAD.	26/08/2023	7/10/2023
11	Badén y Chanchajalla	14	10/11/2023 - EL CONTRATISTA VIENE REALIZANDO INFORMES PARA EL CIERRE DE LA ACTIVIDAD.	30/08/2023	17/09/2023



AVANCE EN CONTRATACIONES POR DEPARTAMENTO – EJECUCIÓN

NÚMERO DE PAQUETE	CUENCA /SECTOR	N° DE PUNTO CRÍTICO	ESTADO	FECHA DE INICIO DE CONTRATO	FECHA DE INICIO DE LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN
12	Lacramarca	15 al 21	10/11/2023 - EL CONTRATISTA CULMINÓ CON LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD EL DÍA 03.11.2023.	11/08/2023	16/09/2023
13	Lacramarca	22 al 28	10/11/2023 - EL CONTRATISTA CULMINÓ CON LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD EL DÍA 08.11.2023.	11/08/2023	16/09/2023
14	Lacramarca	29 al 30	10/11/2023 - EL CONTRATISTA ESTÁ REALIZANDO TRABAJOS DE LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN EN EL SECTOR ZONA INDUSTRIAL - PUNTO CRÍTICO 28	28/08/2023	7/10/2023
15	Río Rímac	61, 62, 63, 64, 65, 77, 78 y 79	10/11/2023 - EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA EN LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD (PUNTO CRÍTICO 79), SE TIENE UN AVANCE FÍSICO ACUMULADO DE 1200 METROS.	15/08/2023	5/10/2023
16	Río Rímac	68,69,70,71,96,72, 97,99,75,76,98,66, 67,73,74	10/11/2023 - EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA EN TRABAJOS DE CORTE, ACARREO Y CONFORMACIÓN DE DIQUE (EN EL PUNTO CRÍTICO 70, 71 y 72).	15/08/2023	27/09/2023
17	Río Rímac	85, 86, 87, 88, 89, 90 y 91	10/11/2023 - EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA EN TRABAJOS DE LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN EN EL PUNTO CRÍTICO 91 y 86	10/08/2023	7/09/2023

AVANCE EN CONTRATACIONES POR DEPARTAMENTO – EJECUCIÓN

NÚMERO DE PAQUETE	CUENCA /SECTOR	N° DE PUNTO CRÍTICO	ESTADO	FECHA DE INICIO DE CONTRATO	FECHA DE INICIO DE LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN
18	Río Rímac	81, 94, 95	10/11/2023 - EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA EN TRABAJOS DE LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN EN EL PUNTO CRÍTICO 81	15/08/2023	21/09/2023
19	Quebradas Carosio, Corrales, Libertad, California, Chacrasana 1 Y 3	80, 82, 83, 84, 92, 93	10/11/2023 - CON FECHA 02/11/2023 SE APROBÓ LA FTD AL 20%, EL CONTRATISTA DEBIÓ INICIAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES, A LA FECHA NO SE PRESENTA Y POR PARTE DEL DU SE LE ESTÁ INICIANDO EL PROCESO DE APERCIBIENDO.	26/08/2023	3/11/2023
20	Qbra. Huaycoloro	100 y 101	10/11/2023 - EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA EN TRABAJOS DE LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN Y CONFORMACIÓN DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO O DE PRÉSTAMO EN EL PUNTO CRÍTICO 101.	26/08/2023	19/09/2023
21	Chancay-Lambayeque	4 al 5	10/11/2023 - EL CONTRATISTA AÚN NO PRESENTA LA FTD DEL 100%, PERSISTE EN EL INCUMPLIMIENTO.	11/08/2023	11/09/2023
22	Reque	6 al 7	10/11/2023 - EL CONTRATISTA AÚN NO PRESENTA LA FTD DEL 100%, PERSISTE EN EL INCUMPLIMIENTO.	14/08/2023	11/09/2023

ESQUEMA DE INTERVENCIÓN

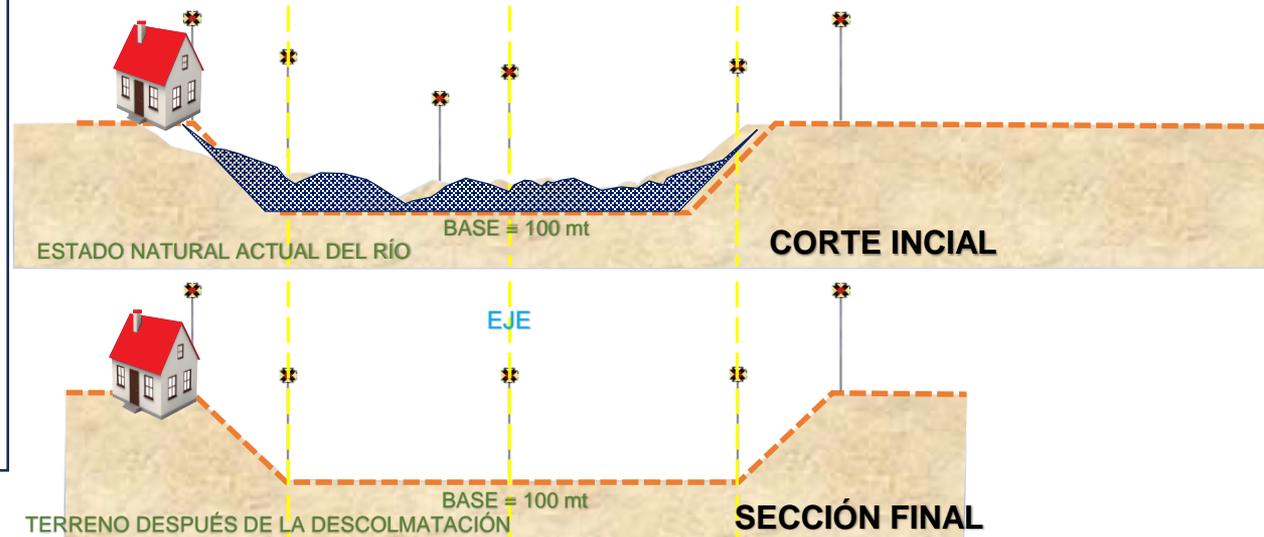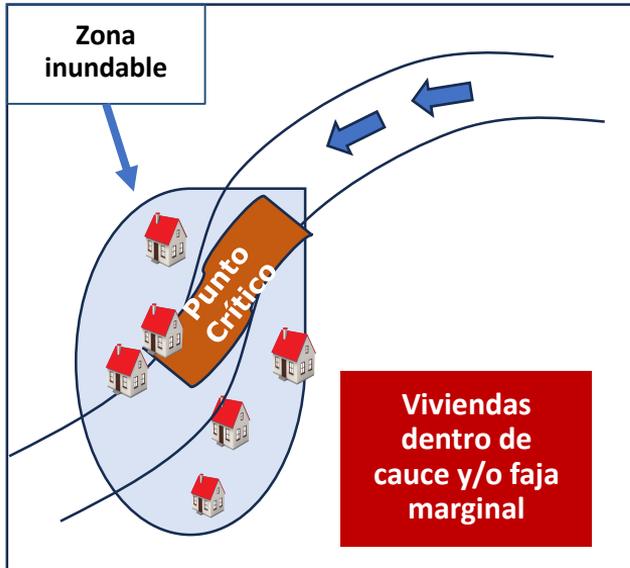

TUMBES

El paquete 01, comprende 9 puntos críticos (31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 y 39) con una meta de 12.86 km.



Sector El Sauce- Santa Clotilde - El Chivato



Sector La Y - El Palmar



Sector Tuna Romero



PAQUETE Nº 01

Monto DU: S/ 7,677,939.00

Monto adjudicado: S/ 6,195,281.37

PROG. FÍSICA	MES 1 23%	MES 2 52%	MES 3 25%
PC 33	57 %	43%	
PC 34	27 %		
PC 36	60%	40%	
PC 39		89%	

Al 10/11/2023, el contratista se encuentra en trabajos de limpieza, descolmatación y conformación de dique en los puntos críticos 33, 34, 35 y 39.

Avance semana del 28 de octubre al 03 de noviembre

Avance semana del 04 al 10 de noviembre

TUMBES

El paquete 02, comprende 16 puntos críticos (40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 y 55) con una meta de 12.51 km.



Sector El Peligro



Sector Punte Francos



Sector San Juan de la Virgen



Avance semana del 28 de octubre al 03 de noviembre

Avance semana del 04 al 10 de noviembre

PAQUETE N° 02

Monto DU: S/ 10,869,911.00


Monto adjudicado: S/ 8,936,271.30

PROG. FÍSICA	MES 1 23%	MES 2 46%	MES 3 31%
PC 55	22%		

Al 10/11/2023, el contratista se encuentra en trabajos de limpieza, descolmatación y conformación de dique en el punto crítico 55.

TUMBES

El paquete 03, comprende 5 puntos críticos (56, 57, 58, 59 y 60) con una meta de 6.00 km.

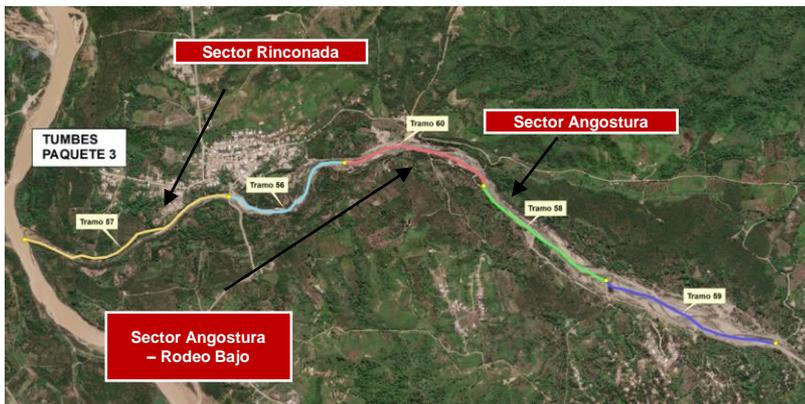

Sector Angostura – Rodeo Bajo



Sector Rinconada



Sector Angostura



Avance semana del 28 de octubre al 03 de noviembre

Avance semana del 04 al 10 de noviembre

PAQUETE N° 03

Monto DU: S/ 5,956,450.00

Monto adjudicado: S/ 5,540,726.24

PROG. FÍSICA	MES 1 16%	MES 2 67%	MES 3 17%
PC 57	3%	37%	


Al 10/11/2023, el contratista se encuentra trabajos de limpieza y descolmatación en el punto crítico 57.

TUMBES

El paquete 04 comprende 02 sectores:

- Canal Chutuque: 8.32 km
- Protección Virrilá: 12.84 km

Total 21.16 km de intervención aproximadamente.

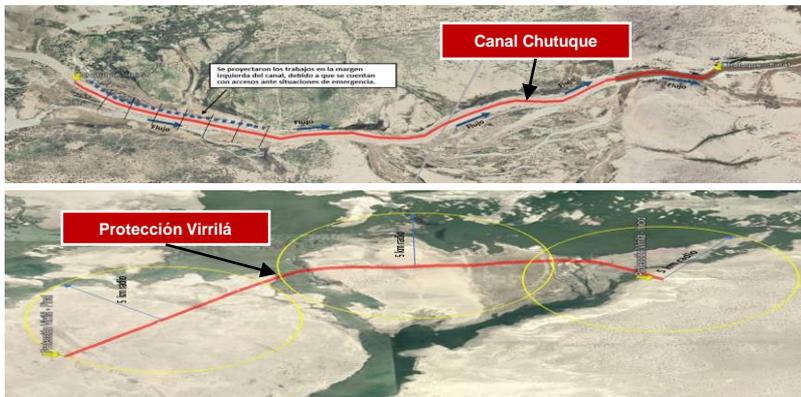

Sector Chutuque



Sector Virrilá



Avance semana del 28 de octubre al 03 de noviembre

Avance semana del 04 al 10 de noviembre

PAQUETE Nº 04

Monto DU: S/ 102, 800,000.00

Monto adjudicado: S/ 82,841,292.05

PROG. FÍSICA	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5
	2.47%	12.18%	25.54%	45.10%	14.7%
PC 01	2.72%	12.12%	11.66%	3.81%	

Al 10/11/2023, el contratista vienen ejecutando las actividades de limpieza descolmatación y conformación de dique en los sectores de Chutuque y Virrilá, tiene un avance acumulado del 30.31%.

En el sector Virrilá, se está desarrollando la conformación de dique con la instalación de geocontenedores.

LAMBAYEQUE

El paquete 05, comprende 01 punto Crítico (02) con una meta de 500 metros.



Sector Bosque de Pomac



Avance semana del 28 de octubre al 03 de noviembre



Avance semana del 04 al 10 de noviembre

PAQUETE N° 05

Monto DU: S/ 491,087.21

Monto adjudicado: S/ 446,825.48

PROG. FÍSICA	MES 1 100%
PC 02	40 %


El día 10.11.2023 se le aprobó la ficha técnica definitiva al 100%, el contratista podrá continuar con los trabajos programados.

LAMBAYEQUE

El paquete 06, comprende 01 punto crítico (03) con una meta de 500 metros.



Sector Santa Clara

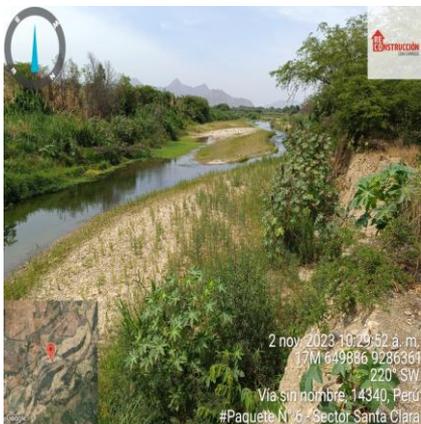

Avance semana del 28 de octubre al 03 de noviembre



Avance semana del 04 al 10 de noviembre

PAQUETE N° 06

Monto DU: S/ 243,747.15

Monto adjudicado: S/ 316,643.18

PROG. FÍSICA	MES 1 80%	MES 2 20%

Al 10/11/2023, el contratista persiste en el incumplimiento de la presentación de la FTD al 20%.

LAMBAYEQUE

El paquete 21, comprende dos puntos críticos (04 y 05) con una meta de 3.5 km.



Sector Puntilla Aguas Arriba



Avance semana del 28 de octubre al 03 de noviembre



Avance semana del 04 al 10 de noviembre

PAQUETE N° 21

Monto DU: S/ 1,204,472.03


Monto adjudicado: S/ 1,164,384.75

PROG. FÍSICA	MES 1 23%	MES 2 77%
PC 04	55 %	
PC 05	20 %	

Al 10/11/2023, el contratista aún no presenta la FTD del 100%, persiste en el incumplimiento.

LAMBAYEQUE

El paquete 22, comprende dos puntos críticos (06 y 07) con una meta de 1.2 km.

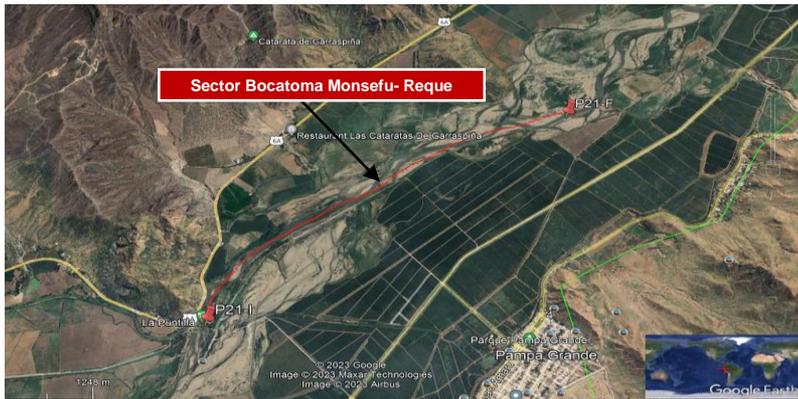

Sector Bocatoma Monsefu-Reque



Avance semana del 28 de octubre al 03 de noviembre



Avance semana del 04 al 10 de noviembre

PAQUETE Nº 22

Monto DU: S/ 559,727.99

Monto adjudicado: S/ 546,328.96

PROG. FÍSICA	MES 1 20%	MES 2 80%
PC 06	34 %	57%

Al 10/11/2023, el contratista aún no presenta la FTD del 100%, persiste en el incumplimiento.



LA LIBERTAD

El paquete 07, comprende un punto crítico (08) con una meta de 2.70 km.



Sector Pascona



Avance semana del 28 de octubre al 03 de noviembre



Avance semana del 04 al 10 de noviembre

PAQUETE N° 07

Monto DU: S/ 2,500,000.00

Monto adjudicado: S/ 2,407,005.58

PROG. FÍSICA	MES 1 80%	MES 2 20%

Al 10/11/2023, DSI aprobó la ficha técnica definitiva al 100%. El día 10.11.2023, el contratista iniciará los trabajos. El día 13.11.2023, la maquinaria se encuentra en campo.



LA LIBERTAD

El paquete 08, comprende un punto crítico (09) con una meta de 1.30 km.



Sector Jaguey



Avance semana del 28 de octubre al 03 de noviembre



Avance semana del 04 al 10 de noviembre

PAQUETE N° 08

Monto DU: S/ 750,000.00

Monto adjudicado: S/ 705,082.13

PROG. FÍSICA	MES 1 100%
PC 09	100 %

Al 10/11/2023, el contratista culminó la ejecución de las actividades el día 01.11.2023.



LA LIBERTAD

El paquete 09, comprende 03 puntos críticos (10, 11 y 12) con una meta de 3.60 km.



Sector Sausal



Avance semana del 28 de octubre al 03 de noviembre



Avance semana del 04 al 10 de noviembre

PAQUETE N° 09

Monto DU: S/ 4,450,000.00

Monto adjudicado: S/ 4,143,404.81

PROG. FÍSICA	MES 1 42%	MES 2 43%	MES 3 15%
--------------	--------------	--------------	--------------

Al 10/11/2023, la unidad logística de DSI emitirá informe para la resolución de contrato por incumplimiento de funciones.



LA LIBERTAD

El paquete 10, comprende un punto crítico (13) con una meta de 1.30 km.



Sector Huancaquito



Avance semana del 28 de octubre al 03 de noviembre



Avance semana del 04 al 10 de noviembre

PAQUETE N° 10

Monto DU: S/ 1,800,000.00


Monto adjudicado: S/ 1,726,236.36

PROG. FÍSICA	MES 1 100%	
PC 13	50 %	25.4%

Al 10/11/2023, el contratista se encuentra en ejecución de las actividades de limpieza, descolmatación y conformación de dique con material propio o de préstamo, se tiene un avance físico de 75.4% del total de la actividad.



El paquete 11, comprende dos puntos críticos (29 y 30) con una meta de 4.88 km.

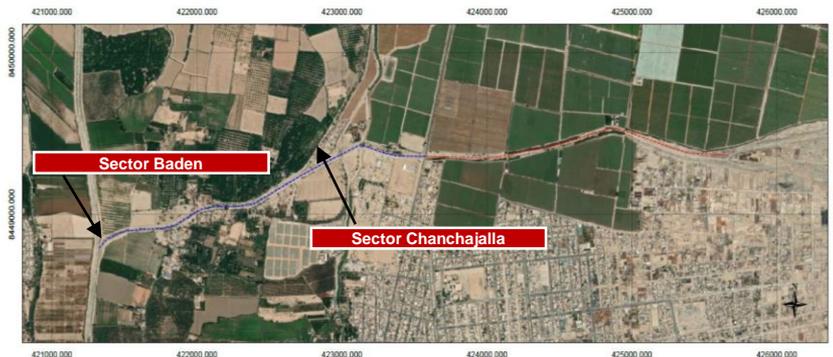

Sector Baden



Sector Chanchajalla



Avance semana del 28 de octubre al 03 de noviembre



Avance semana del 04 al 10 de noviembre

PAQUETE Nº 11

Monto DU: S/ 4, 694,819.07

Monto adjudicado: S/ 3,263,262.83

PROG. FÍSICA	MES 1 14%	MES 2 64%	MES 3 22%
PC 29	54 %	46%	
PC 30		100%	

Al 10/11/2023, el contratista viene realizando informes para el cierre de la actividad.

ÁNCASH

El paquete 12, comprende un punto crítico (14) con una meta de 1.74 km.



Avance semana del 28 de octubre al 03 de noviembre



Avance semana del 04 al 10 de noviembre

PAQUETE N° 12

Monto DU: S/ 2, 507, 308.00

Monto adjudicado: S/ 2,496,867.13

PROG. FÍSICA	MES 1 34%	MES 2 50%	MES 3 16%
PC 14	34 %	59%	3%

Al 10/11/2023, el contratista culminó con la ejecución de la actividad el día 03.11.2023.

ÁNCASH

El paquete 13, comprende siete puntos críticos (15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21) con una meta de 6.27 km.



PAQUETE N°13

Monto DU: S/ 5, 235, 284.00

Monto adjudicado: S/ 4,920,317.37

Sector Tangay – Tangay 2



Avance semana del 28 de octubre al 03 de noviembre




Avance semana del 04 al 10 de noviembre

PROG. FÍSICA	MES 1 11%	MES 2 33%	MES 3 56%
PC 15	100%		
PC 16		100%	
PC 17		100%	
PC 18		100%	
PC 19		100%	
PC 20		100%	
PC 21		100%	

Al 10/11/2023, el contratista culminó con la ejecución de la actividad el día 08.11.2023.

ÁNCASH

El paquete 14, comprende siete puntos críticos (22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28) con una meta de 1.90 km.

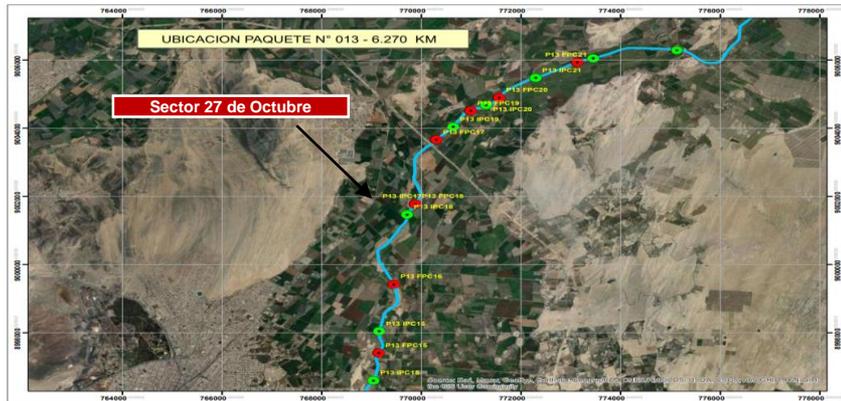

Avance semana del 28 de octubre al 03 de noviembre



Avance semana del 04 al 10 de noviembre

PAQUETE N° 14

Monto DU: S/ 1,677,408.00

Monto adjudicado: S/ 1,341,926.40

PROG. FÍSICA	MES 1 32%	MES 2 68%
PC 28	33%	

Al 10/11/2023, el contratista está realizando trabajos de limpieza y descolmatación en el sector zona industrial - punto crítico 28.

LIMA

El paquete 15, comprende ocho puntos críticos (61, 62, 63, 64, 65, 77, 78 y 79) con una meta de 12.44 km.



Avance semana del 28 de octubre al 03 de noviembre



Avance semana del 04 al 10 de noviembre

PAQUETE N° 15

Monto DU: S/ 9,437,980.68

Monto adjudicado: S/ 9,091,767.96

PROG. FÍSICA	MES 1 100%		
PC 79	14 %	19.43%	

Al 10/11/2023, el contratista se encuentra en la ejecución de la actividad (punto crítico 79), se tiene un avance físico acumulado de 1200 metros.

LIMA

El paquete 16, comprende quince puntos críticos (68,69,70,71,96,72,97,99,75,76,98,66,67,73,y 74) con una meta de 4.87 km.



Sector Corrales y Carosio



Avance semana del 28 de octubre al 03 de noviembre



Avance semana del 04 al 10 de noviembre

PAQUETE Nº 16


Monto DU: S/ 8,660,087.56
 Monto adjudicado: S/ 8,274,292.57

PROG. FÍSICA	MES 1 2.51%	MES 2 67.72%	MES 3 29.77%
PC 68	31%	69%	
PC 69		100%	
PC 70		10%	90%
PC 71			9%
PC 72			3%

Al 10/11/2023, el contratista se encuentra en trabajos de corte, acarreo y conformación de dique (en el punto crítico 70, 71 y 72).

LIMA

El paquete 17, comprende siete puntos críticos (85, 86, 87, 88, 89, 90 y 91) con una meta de 11.1 km.

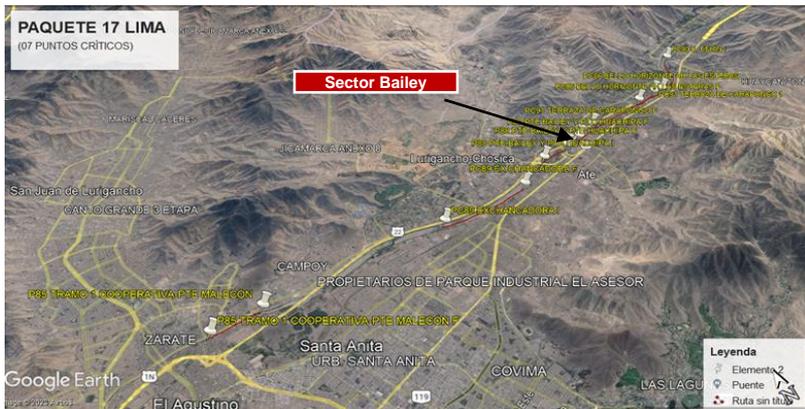

Sector Bailey



Avance semana del 28 de octubre al 03 de noviembre



Avance semana del 04 al 10 de noviembre

PAQUETE N° 17

Monto DU: S/ 23,646,274.12

Monto adjudicado: S/ 21,786,017.94

PROG. FÍSICA	MES 1 16%	MES 2 84%
PC 86		47%
PC 87	100 %	
PC 88	100 %	
PC 90		100%
PC 91		41%

Al 10/11/2023, el contratista se encuentra en trabajos de limpieza y descolmatación en el punto crítico 91 y 86.

LIMA

El paquete 18, comprende tres puntos críticos (81, 94, 95) con una meta de 2.36 km.



Sector La Ronda



Avance semana del 28 de octubre al 03 de noviembre



Avance semana del 04 al 10 de noviembre

PAQUETE Nº 18

Monto DU: S/ 2,418,637.73


Monto adjudicado: S/ 2,315,050.20

PROG. FÍSICA	MES 1 40%	MES 2 40%	MES 3 20%
PC 94	80 %	20%	
PC 95		11%	

Al 10/11/2023, el contratista se encuentra en trabajos de limpieza y descolmatación en el punto crítico 81.

LIMA

El paquete 19, comprende seis puntos críticos (80, 82, 83, 84, 92, 93) con una meta de 1.61 km.

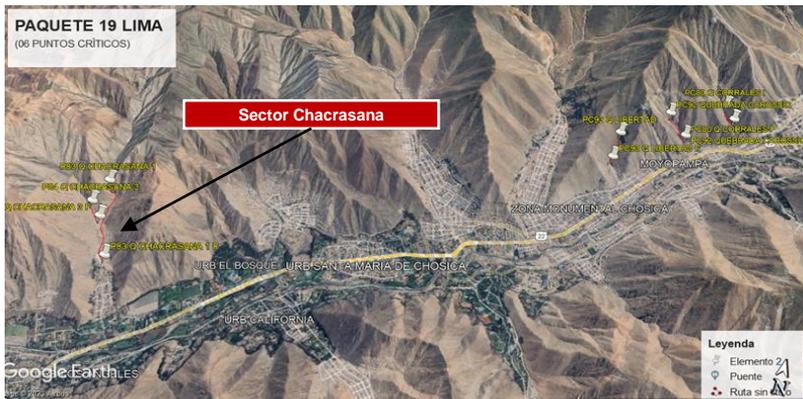

Avance semana del 28 de octubre al 03 de noviembre



PAQUETE Nº 19

Monto DU: S/ 3,503,692.66

Monto adjudicado: S/ 2,802,953.60

PROG. FÍSICA

MES 1
79%

MES 2
21%

Al 10/11/2023, con fecha 02/11/2023 se aprobó la FTD al 20%, el contratista debió iniciar la ejecución de las actividades, a la fecha no se presenta y por parte del du se se está iniciando el proceso de apercibiendo.

LIMA

El paquete 20, comprende dos puntos críticos (100 y 101) con una meta de 8.31 km.



Sector Huaycoloro



Avance semana del 28 de octubre al 03 de noviembre



Avance semana del 04 al 10 de noviembre

PAQUETE N° 20

Monto DU: S/ 18,744,083.10

Monto adjudicado: S/ 9,815,868.80

PROG. FÍSICA	MES 1 5%	MES 2 33%	MES 3 43%	MES 4 19%
PC 100	13 %	87%		
PC 101		11 %	71%	

Al 10/11/2023, el contratista se encuentra en trabajos de limpieza y descolmatación y conformación de dique con material propio o de préstamo en el punto crítico 101.

RE CONSTRUCCIÓN

CON CAMBIOS

ESQUEMA DE INTERVENCIONE S

DU 016-2023
Noviembre 2023

