

Séptima Sesión Descentralizada de la Comisión Especial Multipartidaria de Seguimiento al Proceso de Reconstrucción en las Zonas Afectadas por el Fenómeno de El Niño Costero – CEMRCFC

Intervenciones de la Contraloría General de la República


Ejecución del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios (PIRCC) – Región Cajamarca

- 1. Principales hallazgos identificados por la Contraloría General de la República (CGR) en las intervenciones del PIRCC en la región Cajamarca.**
- 2. Propuestas o alternativas para mejorar la eficiencia y eficacia en las intervenciones de RCC.**

RESUMEN:



- 72 Entidades (gobierno regional y local).
- 144 IRI en 13 provincias.
- 477 informes de servicio de control simultáneo (SCC, AS, SSV, SOO).
- 17 informes de auditoría.
- Período: 2017-2022.

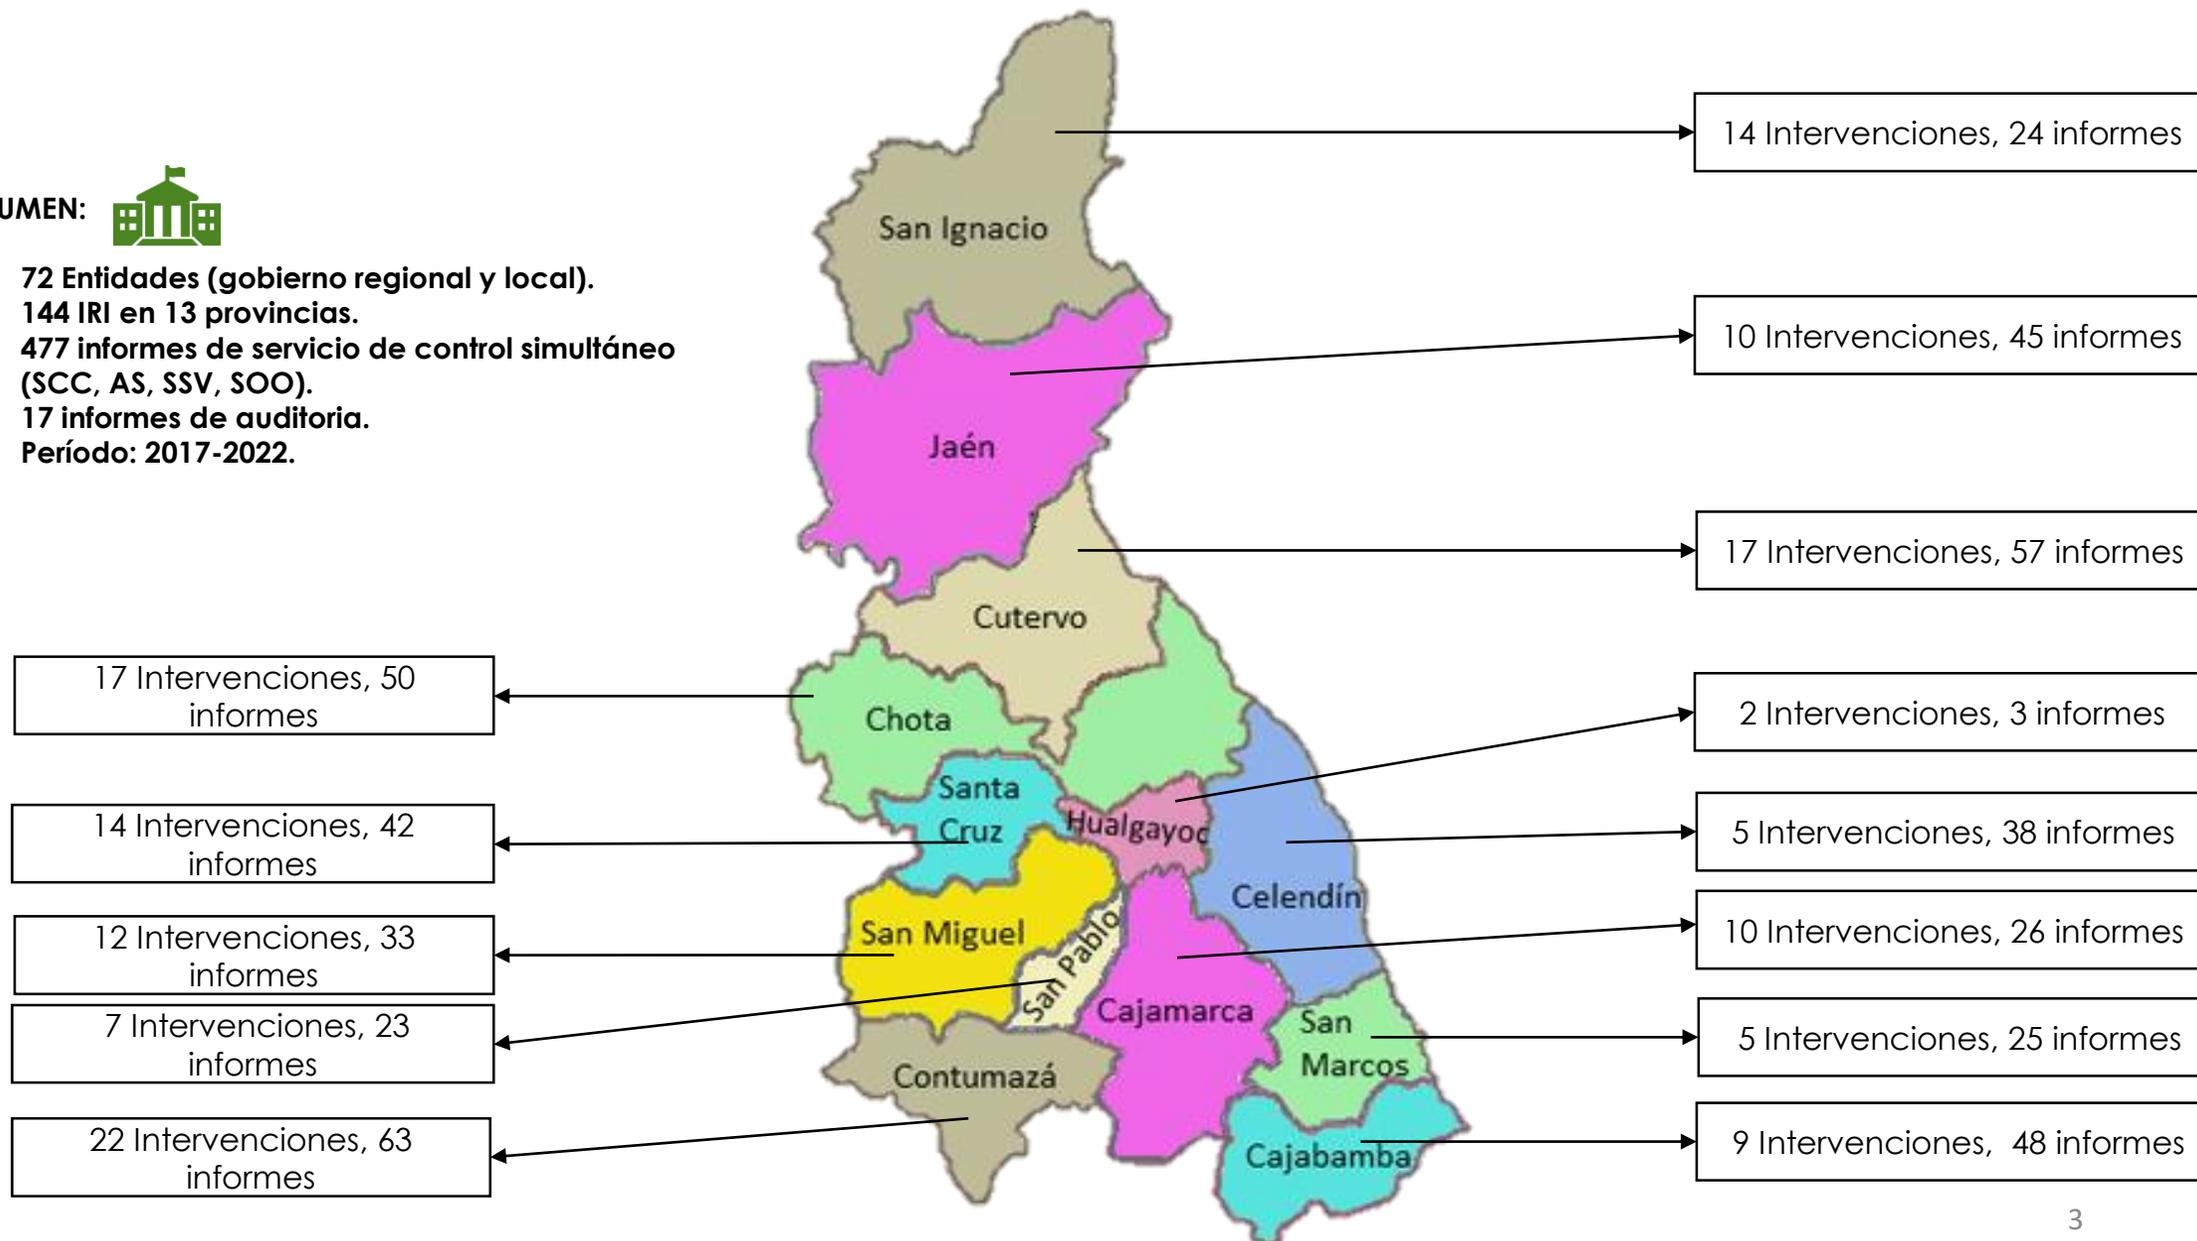

Situaciones adversas recurrentes – Servicio de Control Simultáneo



Expediente Técnico

- Inconsistencias e incompatibilidades en los componentes del expediente técnico.
- Falta de disponibilidad del terreno.
- Estimación de presupuesto de obra no se encuentran debidamente sustentados.




Procedimiento de selección

- Bases elaboradas al margen de lo establecido en los TDR y normativa de contrataciones.
- Incumplimiento de publicación de la documentación pertinente en el SEACE.
- Exigencias requeridas en las bases incompatibles con el expediente técnico.



Ejecución y supervisión de obra

- Inicio de ejecución de obra sin cumplir requisitos establecidos en la normativa.
- Falta de disponibilidad del terreno.
- Ejecución de obra sin presencia de personal clave del ejecutor y supervisión.
- Ejecución de trabajos sin cumplir lo establecido en las especificaciones técnicas del expediente técnico.
- Ejecución de trabajos que comprenden adicionales de obra sin previa autorización y/o aprobación de la supervisión y/o entidad.
- Aprobación y pago de valorizaciones incluyendo trabajos no ejecutados o no se ajustan a las especificaciones técnicas o al avance real.
- Deficientes controles de calidad.
- Demora en la aprobación de prestaciones de adicionales de obra.
- Atraso en la ejecución de la obra.
- Ejecución de trabajos durante suspensión o paralización de obra.
- Demora en la aprobación de ampliaciones de plazo.
- Trabajos con materiales no contemplados en el expediente técnico.



1. Principales hallazgos identificados por la CGR en las intervenciones del PIRCC - Cajamarca.

01

Intervención CGR Ejecución del PIRCC – Provincia de Cajabamba

Servicio de Control Simultáneo



OBRA: RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL Y PRIMARIA N° 82334 (CODIGO DE LOCAL 099794) DEL C.P. DE PURUPAMBA, CAJABAMBA – CAJABAMBA. (S/ 4 125 037,66)

Tipo de servicio: Control Concurrente.

Entidad sujeta a control: MP Cajabamba



Informes: 5 Hitos de Control



- Partidas ejecutadas al margen de lo establecido en el expediente técnico.
- Supervisión y ejecución no cuentan con el equipamiento mínimo ofertado.
- Ejecución de trabajos durante suspensión de obra.
- Entidad no resolvió solicitud de ampliación en el plazo.
- Ejecución de partidas antes de aprobarse el expediente de adicional de Obra.



Servicio de Control Posterior



OBRA: MEJ. DEL SERV. DE TRANS. VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JR. EL PORVENIR, AV.16 DE JULIO, AV. CAJAMARCA, JR. RAMÓN CASTILLA, EN LA LOCALIDAD DE CAUDAY – CONDEBAMBA - CAJABAMBA. (S/1 651 247,66)

Tipo de servicio: Servicio de Control Específico a Hechos con Presunta Irregularidad.

Entidad sujeta a control: MD Condebamba



Informe: 052-2020-2-0369 de 7/11/2020

Hecho: Obra por administración directa intervenida bajo reconstrucción con cambios fue ejecutada sin contar con las condiciones establecidas para ello, realizándose gastos y compra de materiales que no fueron contemplados en el expediente técnico; además, de duplicar pagos por contratación paralela de personal, situaciones que ocasionaron un perjuicio económico a la entidad de S/ 135 856,10.

Perjuicio: S/ 135 856,10.

Tipo de Responsabilidad: Penal, Administrativa Entidad.

02

**Intervención CGR
Ejecución del PIRCC – Provincia de Cajamarca**

Servicio de Control Simultáneo



OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL URBANA DEL DISTRITO DE ASUNCIÓN, PROVINCIA DE CAJAMARCA – CAJAMARCA. (S/ 2 065 776,13).

Tipo de servicio: Control Concurrente

Entidad sujeta a control: MD Asunción



Informes: 3 Hitos de Control



- Ausencia de personal del Contratista y la Supervisión en Obra.
- Proceso constructivo al margen de las especificaciones técnicas.
- Trabajos no ejecutados según expediente técnico.
- Presencia de fisuras en el pavimento rígido construido.
- Incumplimiento de plazos para pronunciarse sobre la liquidación, que contiene errores de cálculo, trabajos deficientes, inaplicación de penalidades, y pago de valorización de mayores metrados sin autorización.



Servicio de Control Posterior

Tipo de servicio: Servicio de Control Específico a Hechos con Presunta Irregularidad

Entidad sujeta a control: MD Asunción



Informe: 3913-2022-CG/GRCA-SCE de 1/07/2022

Hecho: No aplicación de penalidad identificada durante proceso de recepción de obra pese a no haberse subsanado observaciones formuladas por comité de recepción y aprobación de liquidación sin considerar aplicación de máxima penalidad por mora, ocasionó perjuicio económico de S/ 205 568,14.

Perjuicio: S/ 205 568,14

Tipo de Responsabilidad: Penal, Administrativa Entidad.

03

**Intervención CGR
Ejecución del PIRCC – Provincia de Celendín**

Servicio de Control Simultáneo



OBRA / SERVICIO: RECONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS DE LOS JR. BOLOGNESI, JR. GRAU, JR. PARDO, JR. UNION, JR. SAN MARTIN, JR. AYACUCHO, JR. DOS DE MAYO, JR. CACERES, JR. JOSE GÁLVEZ, DISTRITO DE CELENDIN - CELENDIN. (\$/ 9 127 751,61)

Tipo de servicio: Control Concurrente


Entidad sujeta a control: MP Celendín



Informes: 3 Orientaciones de Oficio, 17 Hitos de Control



- Procedimiento convocado sin disponibilidad presupuestal.
- Incongruencias en las bases integradas.
- Otorgamiento de buena pro sin corresponder.
- Carta de referencia bancaria carece de validez legal.
- Incumplimiento de condiciones para el inicio de la obra.
- Ausencia de profesionales en obra.
- Aprobación de partidas que incumple las especificaciones.
- Uso de material con dimensiones distintas a las establecidas en las especificaciones.
- Trabajos de adicional de obra inconclusos.
- No entrega de garantía por adicional-deductivo vinculante.
- Ejecución de trabajos durante suspensión de plazo.
- Aprobación de ampliación de plazo, pese a que el área encargada lo declaró improcedente.

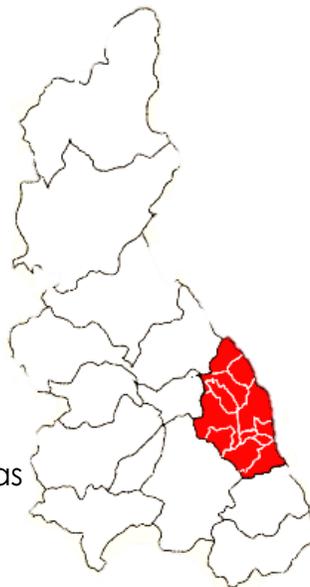

Servicio de Control Posterior

Tipo de servicio: Servicio de Control Específico a Hechos con Presunta Irregularidad

Entidad sujeta a control: MP Celendín



Informe: 058-2020-2-0370 de 08/09/2020

Hecho: Procedimiento de selección con actos preparatorios al margen de la normativa, incongruencias en los actos públicos y con otorgamiento de la buena pro a postor que no alcanzó el puntaje técnico mínimo; además suscripción de contrato pese a que no se acreditó la experiencia de los profesionales, ocasionaron que la entidad no cuente con la oportunidad de obtener mejores ofertas en precio y que no se garantice la correcta ejecución de la obra ni su finalidad pública.

Tipo de Responsabilidad: Penal, Administrativa Entidad.

04

**Intervención CGR
Ejecución del PIRCC – Provincia de Chota**

Servicio de Control Simultáneo



OBRA: MEJ. DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN LOS JIRONES EL PORVENIR 1-3; ERNESTINA RODRÍGUEZ 1-2,4-6; GRAU 2-3; MARIO VÁSQUEZ 1; MIRAFLORES 1-3; Y OSCAR CAMPOS 1-3, DISTRITO DE CONCHAN - CHOTA – CAJAMARCA. (S/ 3 030 418,00)

Tipo de servicio: Control Concurrente


Entidad sujeta a control: MD Conchán



Informes: 3 Hitos de Control.



- Ausencia de profesionales en obra.
- Presencia de "cangrejeras" en los paños del pavimento.
- Aprobación de expediente de adicional y deductivo con deficiencias técnicas.
- Ejecución de partidas fuera del plazo contractual genera una penalidad por S/ 300 155,69, y pendiente de inclusión en la liquidación de obra.
- Recepción de obra sin presentación de planos de replanteo.
- Liquidación del contrato de obra sin considerar penalidades.

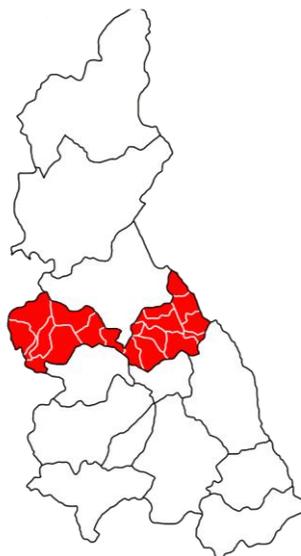

Servicio de Control Posterior

Tipo de servicio: Servicio de Control Específico a Hechos con Presunta Irregularidad

Entidad sujeta a control: MD Conchán



Informe: 17497-2021-CG/GRCA-SCE de 8/09/2021

Hecho: Entidad aprobó y pagó en su totalidad el adicional y deductivo n.º 1 a pesar que contenía partidas cuya ejecución estuvieron contemplados en los planos del expediente técnico contractual; así como, no efectuaron el cobro de penalidades por retraso injustificado, conllevando a un perjuicio económico equivalente a S/ 454 327,41.

Perjuicio: S/ 454 327,41.

Tipo de Responsabilidad: Penal, Administrativa Entidad.

05

**Intervención CGR
Ejecución del PIRCC – Provincia de Cutervo**

Servicio de Control Simultáneo



OBRA: REHABILITACIÓN DE LOS CAMINOS VECINALES DEL TRAMO 1: SAN JUAN - SANTA CRUZ DE LA SUCCHA, TRAMO 2: AMACHONGA - LA CONGA, TRAMO 3: SAN JUAN - EL PARAÍSO. DISTRITO DE SAN JUAN DE CUTERVO, PROVINCIA DE CUTERVO-CAJAMARCA. (S/ 8 275 915,00)

Tipo de servicio: Control Concurrente

Entidad sujeta a control: MD San Juan de Cutervo



Informes: 4 Hitos de Control



- Garantía emitida por entidad no autorizada.
- Partidas no consistentes con la realidad de la zona.
- Valorizaciones con trabajos no ejecutados.
- Ausencia de personal clave en obra.
- No cobro de penalidades.
- Aprobación de valorizaciones incluyendo trabajos no ejecutados.
- Ejecución de partidas que incumplen cantidades establecidas en el expediente.



Servicio de Control Posterior

Tipo de servicio: Servicio de Control Específico a Hechos con Presunta Irregularidad

Entidad sujeta a control: MD San Juan de Cutervo



Informe: 046-2020-2-0372 de 1/11/2020

Hecho: Suscripción de contratos, ejecución de obra y servicio de supervisión, al margen de la normativa aplicable, afectaron el principio de integridad que rige los actos en las contrataciones del estado, ocasionando un perjuicio económico de S/1 096 118,08.

Perjuicio: S/ 1 096 118,08

Tipo de Responsabilidad: Penal, Administrativa Entidad.

06

**Intervenci3n CGR
Ejecuci3n del PIRCC – Provincia de Ja3n**

Servicio de Control Simultáneo



OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE PEÑA BLANCA, LA UNIÓN Y PAMPAS DEL INCA – DISTRITO DE SAN JOSÉ DEL ALTO - JAÉN. (S/ 7 650 595,00)

Tipo de servicio: Control Concurrente.


Entidad sujeta a control: MD San José Del Alto



Informes: 5 Hitos de Control



- Valorizaciones incluyendo trabajos deficientes.
- Ejecución de obra con atrasos recurrentes.
- Suspensión de plazo no justificado.
- Valorización incluyendo partidas no ejecutadas.

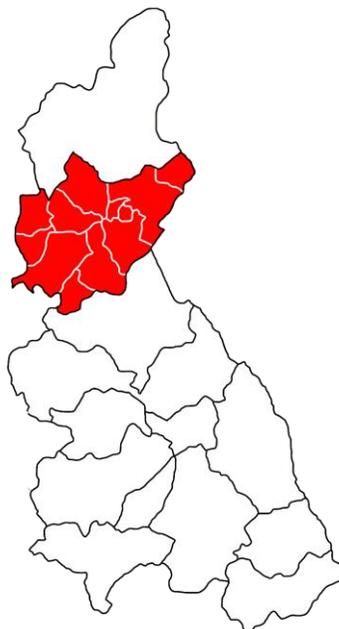

Servicio de Control Posterior



OBRA: RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL EN LOS LINDEROS - PAMPA COLORADA - C.P EL PAPAYO - SAULACA, DISTRITO DE SALLIQUE - JAÉN - CAJAMARCA. (S/ 3 670 420,86)

Entidad sujeta a control: MD Sallique

Tipo de servicio: Control Concurrente.



Informes: 6 Hitos de Control



- Pago de partidas y metrados no ejecutados y sobrevaluados.
- Deficiencias en el expediente de adicional.
- Ensayos no acorde a las especificaciones técnicas.
- Ejecución de trabajos durante paralización de obra.
- Incumplimiento de plazo para recepción de obra.
- Recepción de obra con deficiencias en su ejecución.

Tipo de servicio: Auditoría de Cumplimiento



Informe: 034-2021-2-0375-AC

Hecho: La Administración Municipal en la ejecución de la obra, otorgó conformidad y pagó por metrados de transporte no ejecutados, ocasionando perjuicio económico a la Entidad por S/ 984 376,38.

Perjuicio: S/ 984 376,38.

Tipo de Responsabilidad: Penal, Administrativa Entidad.

07

**Intervención CGR
Ejecución del PIRCC – Provincia de San Ignacio**

Servicio de Control Simultáneo



OBRA: RENOVACION DE PUENTE DE CARRETERA: EN LA RECONSTRUCCION DEL TRAMO 2-1203 DEL PUENTE SAN MIGUEL, DISTRITO DE HUARANGO, PROVINCIA SAN IGNACIO - CAJAMARCA. (S/ 2 190 661,11)

Tipo de servicio: Control Concurrente.

Entidad sujeta a control: MD Huarango.



Informes: 5 Hitos de Control



- Expediente técnico con deficiencias.
- Aprobación de valorizaciones incluyendo partidas no ejecutadas.
- Ausencia de profesionales en obra.
- Ejecución de trabajos durante suspensión de obra.
- Aprobación de liquidación con cartas fianzas vencidas.



Servicio de Control Posterior

Tipo de servicio: Servicio de Control Específico a Hechos con Presunta Irregularidad.

Entidad sujeta a control: MD Huarango.



Informe: 017-2021-2-0376 de 19/11/2021

Hecho: Funcionarios de la Entidad avalaron la irregular contratación de consultor externo para elaboración del adicional de obra, y conjuntamente con la supervisión aprobaron la valorización de la partida falso puente como adicional de obra, pese a que al haberse ejecutado sin estar autorizado, debió de pagarse de acuerdo al precio del mercado; además consintieron la inaplicación de penalidad por ausencia de residente en la obra; ocasionando un perjuicio económico ascendente a un monto de S/ 195 142,65.

Perjuicio: S/ 195 142,00

Tipo de Responsabilidad: Penal, Administrativa Entidad.

08

**Intervención CGR
Ejecución del PIRCC – Provincia de San Marcos**

Servicio de Control Simultáneo



OBRA: RECUPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LAS LOCALIDADES DE PAMPA LA TUNA - CAUTIVAS - LA HIGUERA, DISTRITO DE CHANCAY - SAN MARCOS. (\$/ 23 288 723,85).

Tipo de servicio: Control Concurrente.

Entidad sujeta a control: MD Chancay



Informes: 6 SCC



- Expediente con deficiencias técnicas.
- Insumo con características distintas a las especificaciones técnicas.
- Incumplimiento de obligaciones contractuales de la supervisión.
- Valorización con metrados no ejecutados y sin sustento.
- Valorizaciones con duplicidad de recursos.
- Ejecución de adicional sin aprobación previa y sin certificación presupuestal.
- Valorizaciones con trabajos deficientes.



OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA LOCALIDAD DE ICHOCÁN, DISTRITO DE ICHOCÁN - SAN MARCOS – CAJAMARCA. (\$/ 9 515 588,00)

Tipo de servicio: Servicio de Control Específico a Hechos con Presunta Irregularidad.

Entidad sujeta a control: MD Ichocán




Informe: 025-2020-2-2682 de 28/12/2020

Hecho: Elaboración, evaluación y aprobación del expediente técnico del proyecto mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal de la Localidad de Ichocán, sin sustento técnico y legal, conlleva a determinar un mayor plazo de ejecución de obra, incrementando los gastos generales variables y gastos de supervisión variables, ocasionando un perjuicio económico a la Entidad de S/ 182 176,52 en su ejecución.

Perjuicio: S/ 182 176,52

Tipo de Responsabilidad: Civil, Administrativa Entidad.

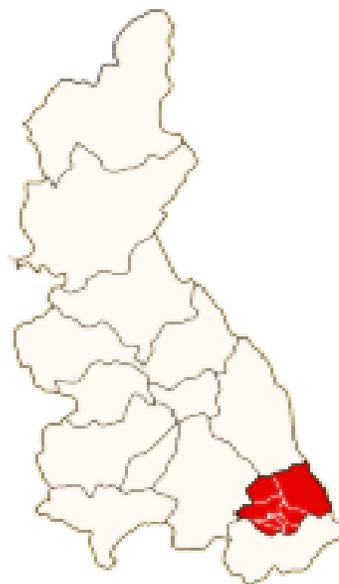

09

**Intervención CGR
Ejecución del PIRCC – Provincia de San Miguel**

Servicio de Control Simultáneo



OBRA: RECUPERACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR 821547 CON CÓDIGO LOCAL 577105, CASERÍO LA AVENTURANZA BAJA, DISTRITO DE NANCHOC, SAN MIGUEL, CAJAMARCA“ (S/ 4 091 474,00)

Tipo de servicio: Control Concurrente.

Entidad sujeta a control: MD Nanchoc



Informes: 5 Hitos de Control



- Partidas con metrados sobredimensionados.
- Incumplimiento de requisitos para perfeccionar contrato.
- Pago de adelanto con montos superiores a lo establecido.
- Inicio de obra con incorrecta entrega de terreno.
- Ausencia de profesionales en obra.
- Desintegración prematura de juntas de losa multideportiva.



Servicio de Control Posterior

Tipo de servicio: Servicio de Control Específico a Hechos con Presunta Irregularidad.

Entidad sujeta a control: MD Nanchoc



Informe: 4126-2022-CG/GRCA-SCE de 26/07/2022

Hecho: Aprobación y pago de adelanto de materiales o insumos al Contratista sin sujetarse al cronograma de adquisición de materiales y estando la obra suspendida; así mismo, aprobación de la ampliación de plazo pese a que no se encontraba técnica y legalmente justificada; lo que generó que se beneficie al Contratista con una liquidez financiera por S/ 773 461,77, afectando la correcta ejecución, administración y control de los recursos financieros de la Entidad y un perjuicio económico a la Entidad por la inaplicación de penalidad por mora ascendente a S/ 270 799,44

Perjuicio: S/ 270 799,44

Tipo de Responsabilidad: Penal, Administrativo Entidad

10

Intervención CGR

Ejecución del PIRCC – Provincia de Santa Cruz

Servicio de Control Simultáneo



OBRA: MEJ. DEL SERVICIO DE TRANS. VEHICULAR Y PEATONAL DE LOS JIRONES DOMINGO NEGRÓN, CUTERVO, SANTA ROSA, SAN ROQUE, ATAHUALPA, HUÁSCAR, LOS SAUCO, DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ, DISTRITO DE SANTA CRUZ. (S/ 3 937 203,00)

Tipo de servicio: Control Concurrente

Entidad sujeta a control: MP Santa Cruz



Informes: 6 SCC



- Suscripción de contrato sin haberse presentado la totalidad de requisitos.
- Incumplimiento en la presentación de ensayos de calidad.
- Ausencia de profesionales.
- Deficiencias en losas de concreto.
- Suspensión sin sustento legal.
- Incumplimiento de plazos en la recepción de la obra.
- Deterioro prematuro de las losas de concreto del pavimento rígido.



Servicio de Control Posterior

Tipo de servicio: Auditoría de Cumplimiento

Entidad sujeta a control: MP Santa Cruz



Informe: 028-2021-2-0378 de 21/12/2021

Hecho: Funcionarios de la Entidad permitieron que la obra se ejecute sin la presencia del supervisor de modo permanente y directo; asimismo, inobservaron las especificaciones establecidas en el expediente técnico; ocasionando que la obra se deteriore prematuramente y generando perjuicio económico por el importe de S/ 617 305,59.

Perjuicio: S/ 617 305,59

Tipo de Responsabilidad: Penal, Administrativa Entidad.

11

Intervención CGR Ejecución del PIRCC – Provincia de Contumazá

Servicio de Control Simultáneo



SERVICIO: CONSULTORÍA PARA FORMULACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PLAN INTEGRAL PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES Y MOVIMIENTOS DE MASA DE LA CUENCA DEL RIO ZAÑA PARA RCC. (S/ 11 000 000,00)

Tipo de servicio: Control Concurrente

Entidad sujeta a control: Pro. Esp. Jequetepeque Zaña - PEJEZA



Informes: 5 Hitos de Control



- Inadecuada admisión de ofertas.
- Entidad no cautela cumplimiento de entregables.
- Entregables no socializados con los actores involucrados.
- Entregables no cumple con TDR.
- Entregables presentados fuera de plazo.



12

Intervención CGR Ejecución del PIRCC – Provincia de San Pablo

Servicio de Control Simultáneo



OBRA: REHABILITACIÓN DE TRAMO 2-104-AVENIDA JULIÁN CRUZADO DESDE ALT. ARCO EL TRIUNFO HASTA INSTITUTO 13 DE JULIO, TRAMO 2-4-AVENIDA 13 DE JULIO (ALT. CUCHOS) DESDE ALT. CUADRA 4 HASTA ALTURA CUADRA 6, DISTRITO DE SAN PABLO, SAN PABLO-CAJAMARCA. (S/ 1 688 500,48)

Tipo de servicio: Control Concurrente


Entidad sujeta a control:



Informes: 7 Hitos de Control



- Ejecución de partidas durante suspensión autorizada.
- Ausencia de profesionales en obra.
- Materiales utilizados no cumplen con especificaciones técnicas.
- Ejecución de trabajos no contemplados en el expediente técnico.
- Valorización y pago de partidas no ejecutadas.
- Inaplicaciones de penalidades por retraso injustificado.

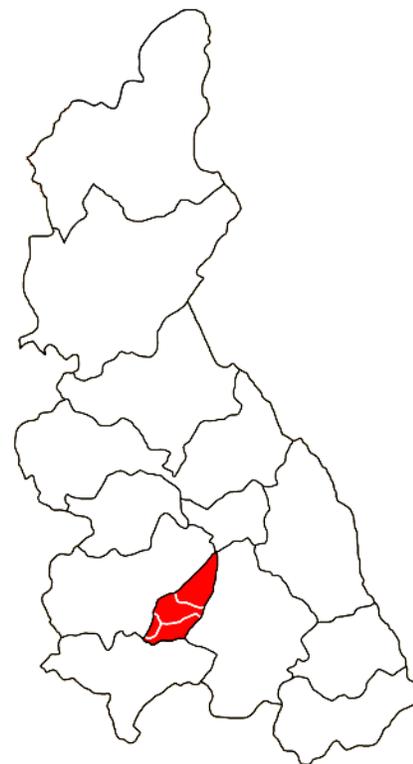

13

**Intervención CGR
Ejecución del PIRCC – Provincia de Hualgayoc**

Servicio de Control Simultáneo



OBRA: REPARACIÓN DE PISTAS EN EL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL, TRAMOS 2-874 Y 2-919 DEL DISTRITO DE HUALGAYOC, PROVINCIA DE HUALGAYOC-CAJAMARCA. (S/ 1 832 319,64)

Tipo de servicio: Control Concurrente

Entidad sujeta a control:



Informes: 2 Hitos de Control



- Existencia de fisuras en las veredas y losas de pavimento.
- Suscripción de contrato sin incluir cláusulas obligatorias.
- Ejecución de la partida no concordante con el expediente técnico.
- Inejecución de partidas.



Recomendaciones



Expediente Técnico

- Formular los expedientes técnicos de acuerdo a la normatividad aplicable, debidamente sustentado, y acorde a las características de los terrenos.
- Cautelar que se cuente con la disponibilidad de la totalidad del terreno a intervenir al momento de la aprobación del expediente técnico.




Procedimiento de selección

- Convocar los procedimientos de selección acordes a la normatividad de contrataciones del Estado.
- Formular bases de acuerdo al requerimiento del área usuaria, compatible con el expediente técnico, y de acuerdo a la normatividad.
- Cumplir el principio de transparencia con la publicación oportuna y completa de la información de los procesos de contratación.



Ejecución y supervisión de obra

- Ejecución de obra con presencia permanente de residente, supervisor y personal clave contractualmente.
- Realizar controles de calidad suficientes.
- Aprobar prestaciones adicionales de obra en plazos previstos, sin que afecte la ejecución de la obra.
- Resolver de manera celeridad las consultas formuladas por el contratista.
- Aprobar valorizaciones justificadas y sustentadas que reflejen lo realmente ejecutado.



2. Propuestas o alternativas para mejorar la eficiencia y eficacia en las intervenciones RCC.

2. Propuestas o alternativas para mejorar la eficiencia y eficacia en las intervenciones RCC.



1. Asignar recursos humanos y logísticos a los OCI y Gerencia, necesarios para la realización de servicios de control de manera oportuna y con la calidad requerida.
2. Garantizar que la formulación de los proyectos de RCC se realicen cumpliendo con los parámetros técnicos y presupuestales cautelando que la inversión sea aprobada con la calidad requerida, evitando modificaciones posteriores que impliquen reprocesos y sobrecostos durante su contratación y ejecución.
3. Motivar a los funcionarios y servidores de las entidades, a cargo de la ejecución de intervenciones RCC, para que efectúen un control administrativo, técnico, físico y financiero, enmarcados en el cumplimiento de los objetivos de la contratación especial, a fin de contribuir al logro de la finalidad pública.
4. Propiciar eventos de capacitación a los funcionarios y/o servidores de las entidades a cargo de la implementación de las situaciones adversas comunicadas, a fin que adopten las medidas y acciones preventivas y correctivas, comunicando oportunamente a los responsables del seguimiento.

Gracias.
