

Informe sobre todas las acciones de control realizadas en relación con los Proyectos de Inversión con CUI 2446345, 2503297 y 2539202, tanto en su etapa preparatoria como de ejecución, así como sobre los principales hechos adversos o recomendaciones realizados por los órganos de control y el estado de su implementación, con la finalidad de velar por el uso adecuado de los recursos públicos.



ÍNDICE:

1. PROYECTO: QUEBRADA SAN IDELFONSO - CUI 2446345

- ✓ Datos y avances del Proyecto
- ✓ Servicios de control
- ✓ Auditoria programada

2. PROYECTO: QUEBRADA SAN CARLOS - CUI N° 2503297

- ✓ Datos y avances del proyecto
- ✓ Servicios de control
- ✓ Auditoria programada

3. PROYECTO: DRENAJE PLUVIAL EN TRUJILLO - CUI N° 2539202

- ✓ Datos y avances del Proyecto
- ✓ Servicios de control
- ✓ Auditoria programada

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

QUEBRADA SAN IDELFONSO

1. DATOS DEL PROYECTO

Denominación:		"Creación del servicio de protección contra inundaciones en la quebrada de San Idelfonso, en los Distritos de El Porvenir, Trujillo y Víctor Larco Herrera de la provincia de Trujillo - departamento de La Libertad – CUI 2446345"				
Sistema de Contratación:		Contrato NEC3 ECC (Contrato de Ingeniería y Construcción) opción F (Contrato de Gestión)				
Contrato para la Ejecución: DEFENSAS RIBEREÑAS DE LA QUEBRADA SAN IDELFONSO	Monto del Contrato:	S/ 179 330 981,52 (Incluye IGV)	Fecha de Suscripción:	08.04.2021		
	Monto actualizado según Línea Base Vigente:	S/ 299 455 126,08 (Incluye IGV)	Fecha de aceptación de Línea Base:	19.02.2025		
	Monto actualizado según SSI-MEF	S/ 644,383,174.77 (Incluye IGV)	Fecha de Consulta:	04/04/2025		
	Plazo del Contrato:	967 d.c.				
	Culminación física de obra:	Contractual (Contrato)	Contractual Actualizada (Línea Base)	Prevista (Cronograma Marzo-2025)	Prevista (Portal SSI-MEF)	
		1.12.2023	25/07/2025	20/11/2025	29/09/2025	
	Contratista:	CONSORCIO BESALCO – STRACON (conformado por las empresas BESALCO PERÚ S.A.C. y STRACON S.A.) con RUC N° 20607671061.				

(+) El Presupuesto de Inversión Actualizado publicado en el Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI – MEF) obedece a costos de construcción, diseño (expediente técnico), supervisión, gastos de Gestión del Proyecto y control concurrente.

2. AVANCE DEL PROYECTO

Avance Financiero (Portal SSI MEF al 4.04.2025)			
Monto Viable	Monto actualizado	Monto devengado	Avance Financiero
S/ 222,112,612.00	S/ 644,383,174.77	S/ 600,007,472	93.10%



Control Concurrente (Portal SSI MEF al 4.04.2025)		
Total	Monto Transferido a CGR	Saldo
S/. 3,245,217.00	S/. 2,214,893.00	S/ 1,030,324.00

Avance de la Ejecución Física		
Descripción	Según reporte semanal al 23.03.25	Portal SSI-MEF
Ejecución de las defensas riverañas de la Quebrada San Idelfonso	61,54%	65.48%

3. ALCANCE DEL PROYECTO

Características del Paquete	Principales Acciones del Paquete
Paquete 2: “Diques Transversales de Retención Quebrada San Idelfonso”	<u>Diseño del paquete:</u> - 4.08.2022, el diseño (RIBA 4) fue aceptado por el Gerente de Proyecto (GP). <u>Ejecución del Paquete:</u> - 15.04.2024, se culminó construcción.
Paquete 4A: “Conducción Quebrada San Idelfonso”	<u>Diseño del paquete:</u> - 20.09.2022, el diseño (RIBA 4) fue aceptado por el GP. <u>Ejecución del Paquete:</u> - Se estima culminar el 19.11.2025.
Paquete 5 – II y III: “Estructura de Protección del Río Moche”	<u>Diseño del paquete:</u> - 3.01.2023, el diseño (RIBA 4) fue aceptado por el GP. <u>Ejecución del Paquete:</u> Se estima culminar el 20.11.2025.
Paquete 6: “Túnel”	<u>Diseño del paquete:</u> - 15.02.2023, el diseño (RIBA 4) fue aceptado por el GP. <u>Ejecución del Paquete:</u> - Se estima culminar el 13.04.2025.
Paquete 9: “Estructura de Captación y Derivación, Conducto cubierto, Canal en Túnel y Empalme a Tránsito”	<u>Diseño del paquete:</u> - 15.02.2023, el diseño (RIBA 4) fue aceptado por el GP. <u>Ejecución del Paquete:</u> - Se estima culminar la ejecución el 14.11.2025.
Paquete 10: “Estructura de cruce sobre Carretera Longitudinal de la Sierra, en Conducción San Idelfonso – Puente Concesionado Laredo”	<u>Diseño del paquete:</u> - 2.11.2022, el diseño (RIBA 4) fue aceptado por el GP. <u>Ejecución del Paquete:</u> - Se estima culminar la ejecución el 20.11.2025.

Quebrada San Idelfonso – Región La Libertad – Cartera Soluciones Integrales

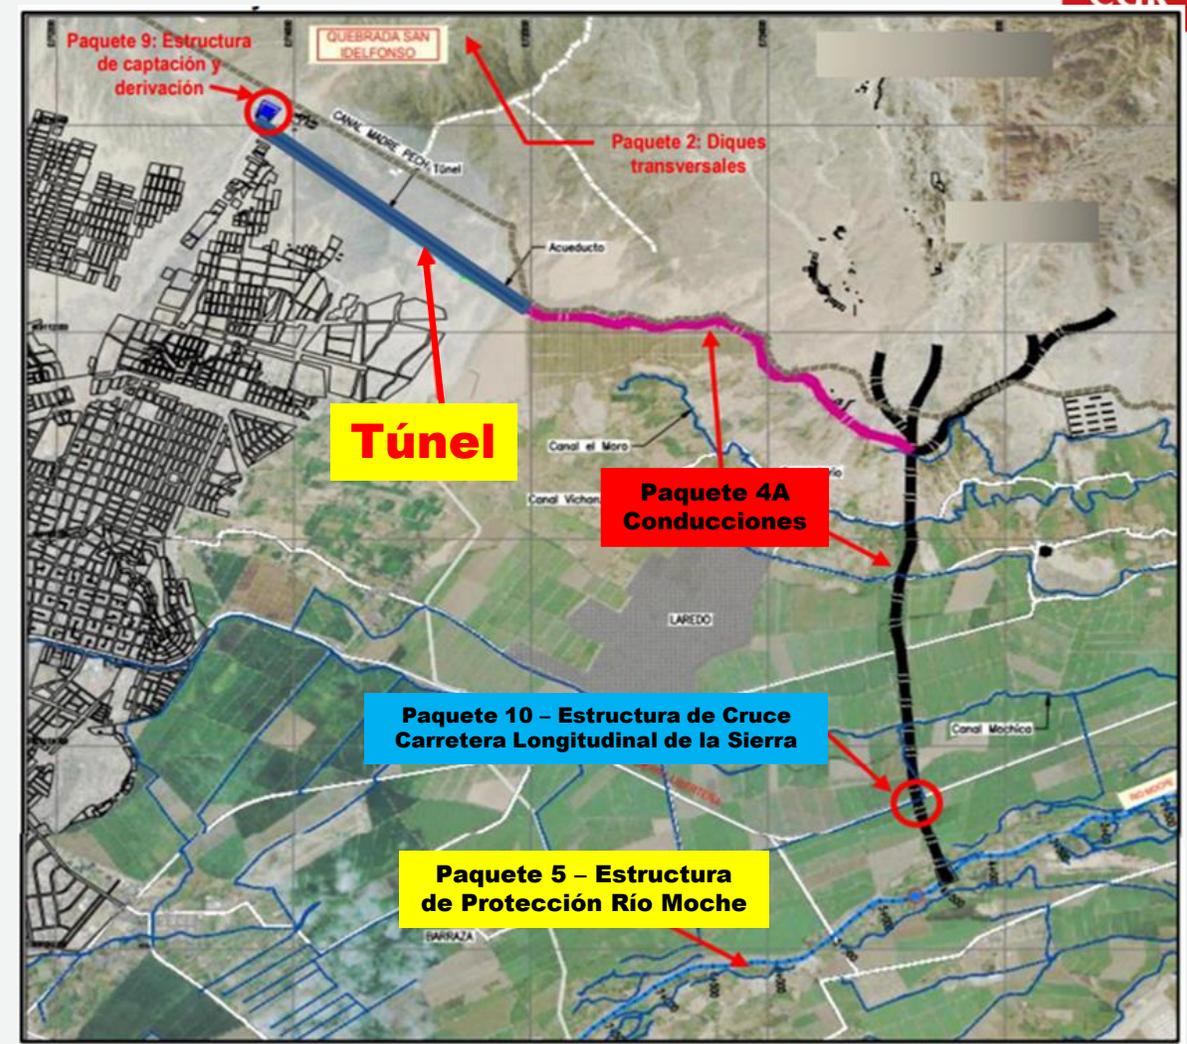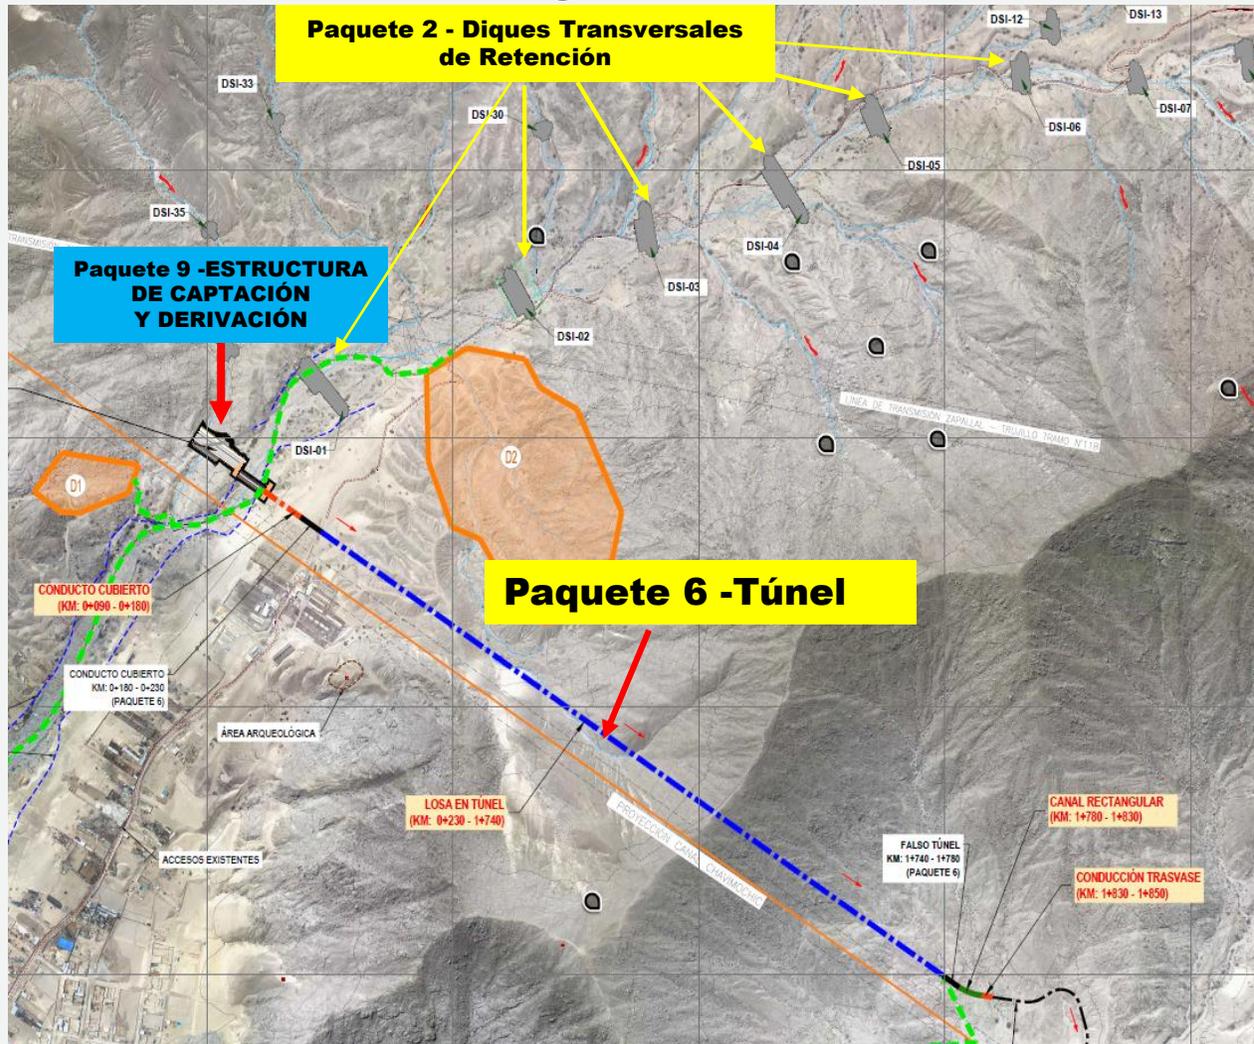

 Pendiente de Ejecutar

 En ejecución con atraso.

CUI 2446345 - SAN IDELFONSO

30347-2022-CG/MPROY-SCC 16/12/2022

Hito de Control N° 42

Avance en la ejecución de las intervenciones de la cartera soluciones integrales, al mes de noviembre de 2022

11430-2023-CG/MPROY-SCC 09/06/2023

Hito de Control N° 1 "Avance en la ejecución, al mes de mayo de 2023

23538-2023-CG/MPROY-SCC 31/10/2023

Hito de Control N° 2 "Avance en la ejecución, al mes de setiembre de 2023

4177-2024-CG/MPROY-SCC 07/03/2024

Hito de Control N° 3 "Avance en la ejecución, al mes de febrero de 2024

12965-2024-CG/MPROY-SCC 23/05/2024

Hito de Control N° 4 "Avance en la ejecución, al mes de abril de 2024

24558-2024-CG/MPROY-SCC 15/10/2024

Hito de Control N° 5 "Avance en la ejecución, al mes de setiembre de 2024

28275-2024-CG/MPROY-SCC 02/12/2024

Hito de Control N° 6 "Avance en la ejecución, al mes de noviembre de 2024

4. Principales situaciones adversas sin acciones y no corregidas a la fecha



PUNTO DE ATENCIÓN	Informe de Hito de Control	Fecha
<p>En la documentación revisada no se advierte un Plan de Contingencia ante la posibilidad que, en la ejecución de obra, que comprende elementos complementarios para que el sistema de protección a la población funcione, permita mitigar el riesgo de inundación ante la eventualidad de presentarse la activación de la quebrada.</p>	-	-
<p>Aceptación de la cotización de la instrucción N° 07, por parte del gerente de proyecto, desplazando la fecha clave de aceptación del diseño final (162 días calendario Nueva Fecha Aceptación de diseño final 15.02.2023, lo que implicó que no se le aplique penalidad de esos 162 días equivalente a S/ 1 911 600,00), incumpliendo el procedimiento para la evaluación de las cotizaciones establecido en el contrato NEC3 suscrito; genera incertidumbre en la determinación de dicha fecha clave y en la consecuente cuantificación de aplicación de la penalidad por su; lo cual podría afectar el adecuado uso y resguardo de los recursos públicos.</p>	4177-2024-CG/MPROY-SCC	7.03.2024
<p>El Gerente de Proyecto de la ANIN aceptó el evento compensable N° 52, el cual fue comunicado por el contratista fuera del plazo establecido en el Contrato NEC3; generando impacto en el costo del proyecto Defensas Ribereñas de la quebrada San Idelfonso, con un costo S/ 10 307 157,74 incluido la tarifa y el IGV, para el proyecto.</p>	24558-2024-CG/MPROY-SCC	15.10.2024
<p>La contratista no está ejecutando el monitoreo ambiental en todas las Estaciones establecidas en el instrumento de gestión ambiental (IGAPRO) y Sus modificatorias; incumpliendo las disposiciones contractuales y las Medidas de seguimiento y prevención establecidas en la certificación Ambiental del proyecto; situación que podría generar afectación al medio Ambiente, así como la posible aplicación de sanciones y multas por parte de La autoridad competente, con un costo de 15 UIT = 59 400,00.</p>	24558-2024-CG/MPROY-SCC	15.10.2024
<p>Elaboración del informe Geológico – geotécnico deficiente e incompleto, incumpliendo el contrato NEC3 y la normativa técnica aplicable para estudios de túneles, genera incertidumbre en las características geotécnicas de los materiales y la sectorización del túnel por tipo de roca para la construcción del paquete 6; situación que impactaría en el costo y plazo del proyecto, según evaluaciones de los efectos que se determinen.</p>	12965-2024-CG/MPROY-SCC	23.05.2024

PROPUESTA DE SERVICIO DE CONTROL 1

Auditoría de Cumplimiento al proyecto “Creación del servicio de protección contra inundaciones en la quebrada de San Idelfonso, en los Distritos de El Porvenir, Trujillo y Víctor Larco Herrera de la provincia de Trujillo - departamento de La Libertad – CUI 2446345”.



QUEBRADA SAN CARLOS

Quebrada San Carlos – Región La Libertad – Cartera Soluciones Integrales



1. DATOS DEL PROYECTO

Denominación:		"Creación de los Servicios de Protección contra inundaciones mediante captación, control y derivación hacia el mar de las aguas de las avenidas de la quebrada de San Carlos de la cuenca del Cerro Centinela, distrito de Laredo - provincia de Trujillo - departamento de La Libertad – CUI N° 2503297"				
Sistema de Contratación:		Contrato NEC3 ECC (Contrato de Ingeniería y Construcción) opción F (Contrato de Gestión)				
Contrato para la Ejecución: DEFENSAS RIBEREÑAS DE LA QUEBRADA SAN CARLOS	Monto del Contrato:	S/ 184 360 799,45 (Incl. IGV)	Fecha de Suscripción:	08.04.2021		
	Monto Actualizado según Línea Base Vigente :	S/ 196 207 407, 57 (Incl. IGV)	Fecha de aceptación de Línea Base:	21.01.2025		
	Monto Actualizado según SSI –MEF:	S/ 345 014 544, 35 (Incl. IGV) (+)	Fecha de Consulta:	4.04.2025		
	Plazo de Contrato:	967 d.c.				
	Culminación Física de Obra:	Contractual (Contrato)	Contractual Actualizada (Línea Base)	Prevista (Cronograma Mar-2025)	Prevista (Portal SSI-MEF)	
		7.10.2023	12.12.2025	12.12.2025	11.11.2025	
	Contratista:	CONSORCIO BESALCO – STRACON (conformado por las empresas BESALCO PERÚ S.A.C. y STRACON S.A.) con RUC N° 20607671061.				

(+) El Presupuesto de Inversión Actualizado publicado en el Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI – MEF) obedece a costos de construcción, diseño (expediente técnico), supervisión, gastos de Gestión del Proyecto y costo de control concurrente.


2. AVANCE DEL PROYECTO

Avance Financiero (Portal SSI MEF al 4.04.2025)			
Monto Viable	Monto actualizado	Monto devengado	Avance Financiero
S/ 221 138 204,29	S/ 345 014 544,35	S/ 316 180 122,00	91.64%

Control Concurrente (Portal SSI MEF al 4.04.2025)		
Total	Monto Transferido a CGR	Saldo
S/ 3,807,871.00	S/ 3,202,218.00	S/. 605,653.00

Avance del Ejecución Física		
Descripción	Según reporte semanal al 23.03.25	Portal SSI-MEF
Ejecución Quebrada San Carlos	90.96%	90.96%

3. ALCANCE DEL PROYECTO

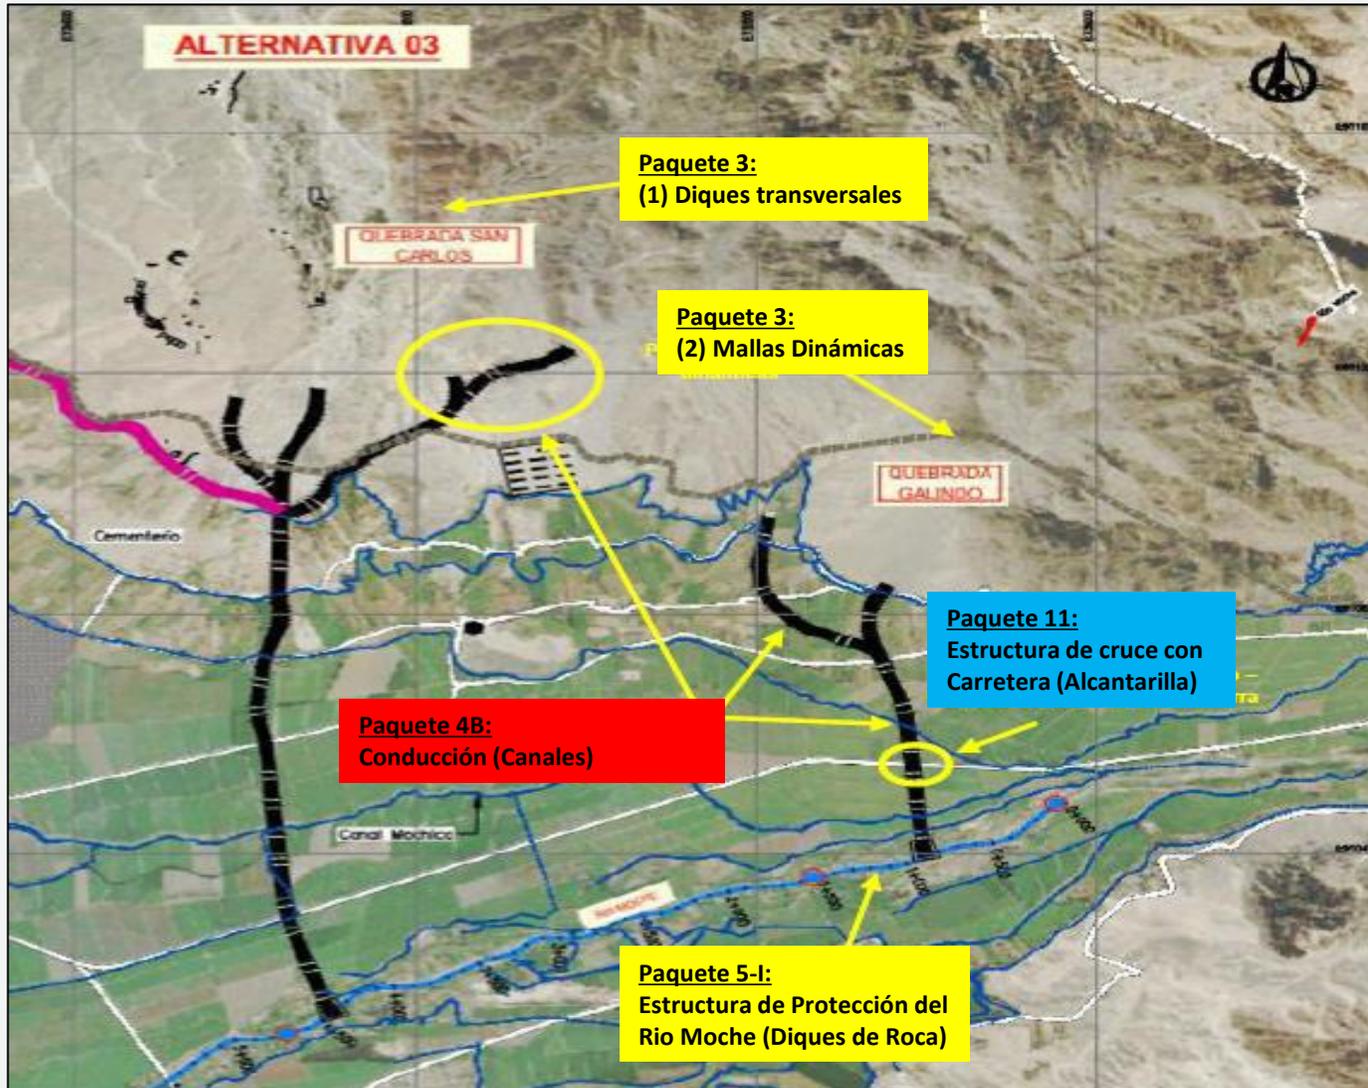

Características del Paquete	Principales Acciones del Paquete
Paquete 3: “Diques Transversales” y “Mallas Dinámicas”	<p><u>Diseño del paquete:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 30.09.2022, el diseño (RIBA 4) fue aceptado por el Gerente de Proyecto (GP). <p><u>Ejecución del Paquete:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 21.12.2024 culminó la construcción.
Paquete 4B: “Conducción Quebrada San Carlos”	<p><u>Diseño del paquete:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 11.11.2022, el diseño (RIBA 4) fue aceptado por el GP. <p><u>Ejecución del Paquete:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Se estima culminar el 4.12.2025.
Paquete 5 - I: “Estructura de Protección del Río Moche”	<p><u>Diseño del paquete:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 8.12.2022, el diseño (RIBA 4) fue aceptado por el GP. <p><u>Ejecución del Paquete:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Se estima culminar el 31.03.2025.
Paquete 11: “Estructura de cruce sobre Carretera Longitudinal de la Sierra, en Conducción San Carlos”.	<p><u>Avance en el diseño del paquete:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 8.12.2022, el diseño (RIBA 4) fue aceptado por el GP. <p><u>Ejecución del Paquete:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Se estima culminar el 4.12.2025.

■ En ejecución con atraso.

■ Pendiente de Ejecutar

CUI 2503297 - SAN CARLOS

30335-2022-CG/MPROY-SCC 15/12/2022

Hito de Control N° 41

Avance en la ejecución de las intervenciones de la cartera soluciones integrales, al mes de noviembre de 2022

11430-2023-CG/MPROY-SCC 09/06/2023

Hito de Control N° 1 “Avance en la ejecución, al mes de mayo de 2023

23538-2023-CG/MPROY-SCC 31/10/2023

Hito de Control N° 2 “Avance en la ejecución, al mes de setiembre de 2023

4141-2024-CG/MPROY-SCC 06/03/2024

Hito de Control N° 1 “Avance de la Ejecución, al mes de febrero de 2024

12887-2024-CG/MPROY-SCC 24/05/2024

Hito de Control N° 2 “Avance de la Ejecución, al mes de abril de 2024”

24667-2024-CG/MPROY-SCC 23/10/2024

Hito de Control N° 3: “Avance de la ejecución, al mes de setiembre de 2024”

28451-2024-CG/MPROY-SCC 11/12/2024

Hito de Control N° 4: “Avance de la ejecución, al mes de noviembre de 2024”

4. Principales situaciones adversas sin acciones y no corregidas a la fecha

PUNTO DE ATENCIÓN	Informe de Hito de Control	Fecha
Respecto a las demoras en la liberación de interferencias del Paquete 4B, que corresponden a infraestructuras existentes de propiedad de la empresa Agroindustrial Laredo S.A.A. que afectan el cumplimiento del cronograma de obra y postergan la entrega de las obras a la población usuaria.	4141-2024-CG/MPROY-SCC	6.03.2024
Aceptación de la cotización de la instrucción N° 07, por parte del gerente de proyecto, desplazando la fecha clave de aceptación del diseño final (245 días calendario Nueva Fecha Aceptación de diseño final 8.12.2022, lo que implicó que no se le aplique penalidad de esos 245 días equivalente a S/ 2 956 059,75), incumpliendo el procedimiento para la evaluación de las cotizaciones establecido en el contrato NEC3 suscrito; genera incertidumbre en la determinación de dicha fecha clave y en la consecuente cuantificación de aplicación de la penalidad por su; lo cual podría afectar el adecuado uso y resguardo de los recursos públicos.	4141-2024-CG/MPROY-SCC	7.03.2024
La falta de realización del proyecto de evaluación arqueológica en la zona arqueológica monumental galindo por parte del contratista, incumple el contrato NEC3, ocasionando que se retrase la construcción del paquete 4B, lo que postergaría la culminación del proyecto defensas ribereñas de la quebrada San Carlos, afectando a la población y unidades productoras del distrito de laredo, provincia de Trujillo, departamento de la Libertad.	12887-2024-CG/MPROY-SCC	21.05.2024
Incumplimiento de la Fecha de Culminación de las Obras y el continuo desplazamiento de la fecha pronóstico de culminación en los Cronogramas mensuales de junio a setiembre de 2024, sin que se evidencien acciones o estrategias del Contratista para mitigar los retrasos; en contravención a lo establecido en el Contrato NEC3; genera incertidumbre respecto a la fecha real de culminación de las obras para la puesta en servicio de las defensas ribereñas en la quebrada San Carlos, afectando los objetivos del proyecto	24667-2024-CG/MPROY-SCC	23.10.2024
Demora en la disposición al contratista para la modificación del expediente técnico del canal conducción Galindo (Paquete 4B), generaría el riesgo de incumplir la fecha de culminación establecida en el cronograma, así como el incremento del costo y plazo del proyecto.	28451-2024-CG/MPROY-SCC	11.12.2024
Falta de actualización del presupuesto estimado del proyecto quebrada San Carlos, en concordancia con lo establecido en el contrato NEC3 suscrito, no permite determinar el monto real que deberá reconocer el contratista a favor de la entidad, ante eventual pérdida o daños a los bienes, y defectos en el diseño; ni contar con el monto que garantice el fiel cumplimiento de las obligaciones del contratista, respecto al costo actual del proyecto, entre otras implicancias en torno a la actualización del presupuesto, según evaluaciones de los efectos que se determinen.	4141-2024-CG/MPROY-SCC	7.03.2024

PROPUESTA DE SERVICIO DE CONTROL 2

Auditoría de Cumplimiento al proyecto “Creación de los Servicios de Protección contra inundaciones mediante captación, control y derivación hacia el mar de las aguas de las avenidas de la quebrada de San Carlos de la cuenca del Cerro Centinela, distrito de Laredo - provincia de Trujillo - departamento de La Libertad – CUI N° 2503297”



PROYECTO DE DRENAJE PLUVIAL EN TRUJILLO

1. DATOS DEL PROYECTO

Datos generales del contrato suscrito

Paquete	Proyecto	Componente	Datos Del Contrato			
			Contratista	Fecha Suscripción	Plazo (dc)	Monto Estimado
D-04	Diseño Integral del Proyecto de Drenaje Pluvial de la ciudad de Trujillo	A	LOMBARDI S.A. INGENIEROS CONSULTORES – SUCURSAL DEL PERÚ	11.01.2023	18	S/ 34 670 914,62

Fuente: Contrato NEC3 PSC Opción A Consultoría para la entrega del diseño integral del “Proyecto de Drenaje Pluvial de la ciudad de Trujillo”.

2. AVANCE DEL PROYECTO

Avance Financiero (Portal SSI MEF al 4.04.2025)			
Monto Viable	Monto actualizado	Monto devengado	Avance Financiero
S/420,648,934.50	S/450'181,176.85	S/ 46,860,381	10.40%

Control Concurrente (Portal SSI MEF al 4.04.2025)		
Total	Monto Transferido a CGR	Saldo
S/6'774,815.00	S/449,143.00	S/. 6'325,672.00

Avance del Ejecución Fisica	
Descripción	Portal SSI-MEF
Diseño integral de Proyecto de Drenaje Pluvial de la ciudad de Trujillo	76.6%

CUI 2539202 - 5 DISTRITOS

24425-2024-CG/MPROY-SCC 04/10/2024

Hito de Control N° 1

Avance de la ejecución al mes de agosto de 2024

28321-2024-CG/MPROY-SCC 03/12/2024

Hito de Control N° 2

Avance de la ejecución al mes de noviembre de 2024



Diseño integral de Proyecto de Drenaje Pluvial de la ciudad de Trujillo

4. Principales situaciones adversas sin acciones y no corregidas a la fecha

PUNTO DE ATENCIÓN	Informe de Hito de Control	Fecha
<p>1. ESTIMACIÓN DE MAYORES ÁREAS DE VIVIENDAS EN LA DETERMINACIÓN DE SU VALOR UNITARIO, SIN CONSIDERAR LAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO NACIONAL DE TASACIONES; OCASIONARÍA LA SOBRESTIMACIÓN DE LOS BENEFICIOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL ANÁLISIS DEL COSTO BENEFICIO SOCIAL, LO CUAL PERMITIRÍA SUSTENTAR EL INCREMENTO DEL COSTO TOTAL DE INVERSIÓN, PONIENDO EN RIESGO LA CONSISTENCIA DEL PROYECTO.</p>	<p>24425-2024-CG/MPROY-SCC</p>	<p>04/10/2024</p>
<p>2. LA FALTA DE CRONOGRAMA Y NARRATIVA DEL CRONOGRAMA ACTUALIZADOS PARA LA ELABORACION DEL DISEÑO DEL ¿PROYECTO DE DRENAJE PLUVIAL DE LA CIUDAD DE TRUJILLO¿ INCUMPLIENDO EL CONTRATO NEC3, NO PERMITE REALIZAR UN ADECUADO SEGUIMIENTO Y CONTROL EFICAZ DEL AVANCE DEL PROYECTO SITUACIÓN QUE GENERA INCERTIDUMBRE RESPECTO AL PLAZO DE CULMINACIÓN DEL DISEÑO; Y PODRÍA AFECTAR LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO.</p>		
<p>1. LOS TRATOS DIRECTOS NO SE VIENEN SOLUCIONANDO EN EL PLAZO MÁXIMO DE DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, INCUMPLIENDO LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA ¿OPCIÓN ÚNICA ZW¿ DEL CONTRATO NEC3; SITUACIÓN QUE GENERA INCERTIDUMBRE EN EL COSTO Y PLAZO DE LA ELABORACIÓN DEL DISEÑO DEL ¿PROYECTO DE DRENAJE PLUVIAL DE LA CIUDAD DE TRUJILLO¿.</p>	<p>28321-2024-CG/MPROY-SCC</p>	<p>03/12/2024</p>
<p>2. LAS ESTRATEGIAS Y PLANES DE ACCIÓN PROPUESTOS POR EL CONSULTOR PARA MITIGAR EL RETRASO EN LA ELABORACIÓN DEL DISEÑO DEL PROYECTO NO HAN LOGRADO CUMPLIR SU OBJETIVO; SITUACIÓN QUE GENERA INCERTIDUMBRE RESPECTO A LA FECHA REAL DE CULMINACIÓN, Y, A SU VEZ, AFECTA LA CONTINUIDAD DE LA FASE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO Y LA PUESTA EN SERVICIO DE UN ADECUADO SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE TRUJILLO.</p>		

Auditoría de Cumplimiento al proyecto ““CREACIÓN DEL SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL EN EL ÁMBITO URBANO DE 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD CON CUI N° 2539202”



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

RESPECTO DE LOS PROYECTOS

- ✓ La conceptualización del proyecto no ha considerado las interferencias con los terrenos de cultivo en Laredo, conllevando a retrasos en el diseño y construcción, y con ello afectando a la población con las inundaciones cuando se han activado las quebradas.
 - ✓ Es necesario que se considere planes de contingencia durante la construcción del proyecto orientados a proteger a la población de inundaciones frente a la ocurrencia de activación de quebradas.
 - ✓ La gestión de los eventos compensables ha conllevado a retrasos en el diseño y ejecución del proyecto, generando mayores costos del proyecto y mayores plazos para la culminación del proyecto.
- 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

DE SERVICIOS DE CONTROL

- ✓ Desde el periodo 2022 hasta la fecha se han emitido 16 informes de servicios de control concurrente y 24 situaciones adversas, de las cuales 13 se encuentran sin acciones y no corregidas, mientras que solo 11 han sido corregidas.
- ✓ Existe un saldo de **S/ 7'691,649.00 soles** pendiente de transferencia por parte de la entidad en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 31358 – Ley que establece medidas para la expansión del Control Concurrente.
- ✓ La CGR a través de la Subgerencia de Control de Megaproyectos tiene previsto llevar a cabo 02 auditorias de cumplimiento a los Proyectos Quebrada San Idelfonso y Quebrada San Carlos entre los meses abril – julio 2025.

Gracias
