



DÉCIMO CUARTA SESIÓN ORDINARIA DESCENTRALIZADA
SEGUIMIENTO Y AVANCE DEL
PROYECTO

“Mejoramiento y Ampliación del Servicio Aeroportuario en la Región Cusco mediante el Nuevo
Aeropuerto Internacional de Chinchero – Cusco (AICC)”

AVANCE DEL PROYECTO

El Contratista y MTC suscribieron la adenda N°3 el 30 de Octubre del 2024.

El avance del proyecto es de **31.22%**, a continuación, se detalla por fases: diseño, procura y construcción y por paquetes.



Descripción	%Avance al 20.abr.2025
PROYECTO	31.22%
DISEÑO	94.27%
PROCURA	4.38%
CONSTRUCCIÓN	29.59%
Paquete 00	70.43%
Paquete 02	46.14%
Paquete 06	17.53%

AVANCE DEL PAQUETE 06 – EDIFICIO TERMINAL DE PASAJEROS

El avance de construcción del paquete 06 a la suscripción de la adenda N°3 es de 14.50%, y a la fecha del 20/04/2025 se tiene un avance de 17.53%.

Descripción	%Avance al 30.oct.2024	%Avance al 20.abr.2025	DESVIACIÓN
Paquete 06	14.50%	17.53%	3.03%

-Como se denota en la tabla anterior, se tiene un avance notable de 3.03% desde la suscripción de la adenda



AVANCE DEL PAQUETE 06 – EDIFICIO TERMINAL DE PASAJEROS

A continuación, se presenta el avance previsto versus el avance real:

Descripción	% Avance al 20.abr.2025	% Valor planificado	Desviación	SPI
Paquete 06	17.53%	15.90%	1.63%	▲ 1.10


Como se detalla, el avance de la obra supera lo previsto, ya que actualmente se están ejecutando: el **montaje de las estructuras metálicas**, las losas de piso, y la construcción de los muros interiores. Asimismo, se está culminando todo el casco estructural y las instalaciones enterradas del Edificio Terminal."



AVANCE DEL MONTAJE LAS ESTRUCTURAS METÁLICAS

Actualmente se están ejecutando los trabajos de izaje y alineamiento de las estructuras metálicas del Edificio Terminal de Pasajeros. La estructura metálica total del terminal tiene un peso de 1,606 toneladas, de las cuales, hasta la fecha, se han izado 284.1 toneladas.

Se ha alcanzado un avance físico por frente de:

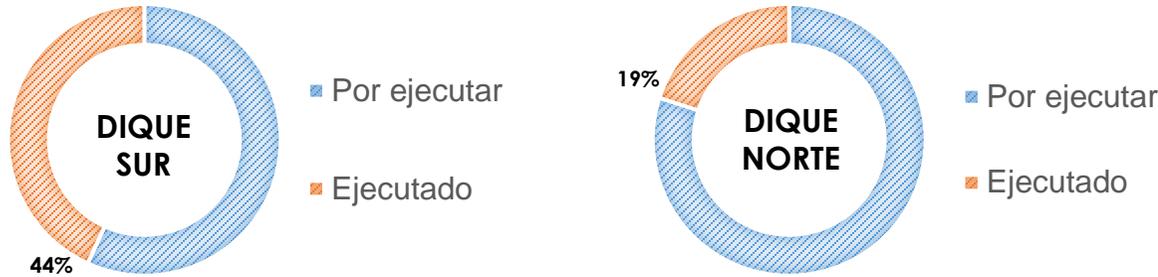


Con respecto al Procesador se tiene previsto el inicio del montaje en las actividades en julio el 2025



AVANCE DE PAQUETE 2: CERCO PERIMÉTRICO



Se continúa con la ejecución del cerco de bloques de concreto.

A pesar de las interferencias identificadas, se vienen implementando propuestas de mejora en la ingeniería, lo que permite continuar con las actividades programadas. A la fecha se tiene un avance de 46.14% en la totalidad del cerco perimétrico, y netamente en el cerco perimétrico de bloques de concreto de 52.25%

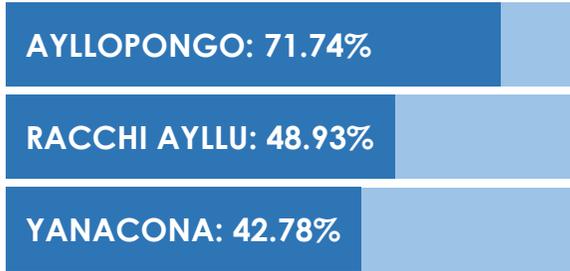

CRONOGRAMA DEL PROYECTO

- El Cronograma detallado (línea base) de la adenda 3 fue aprobado el 25/01/25.

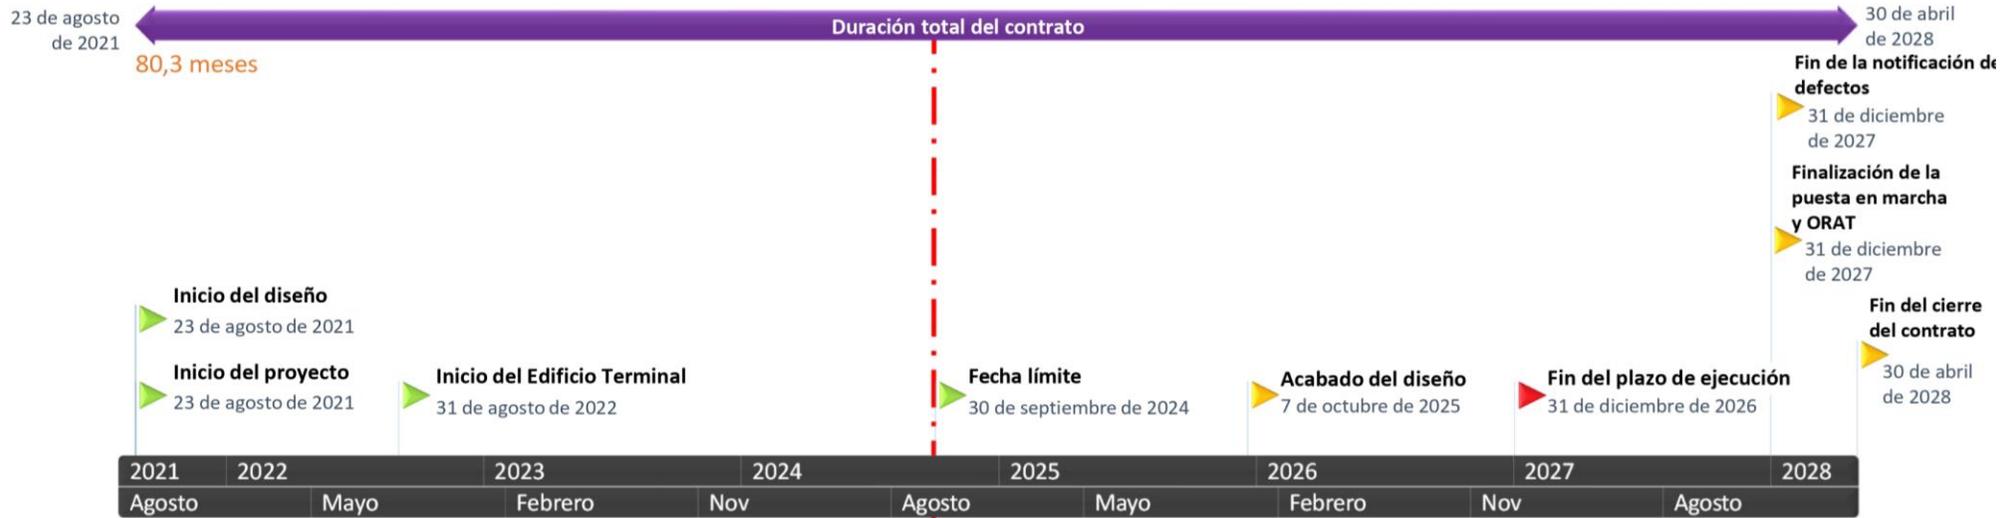

Obras	Plazo (meses)
Periodo de Diseño	No Fijado
Periodo de Ejecución (*)	64
Periodo de Notificación de Defectos	12
Periodo para el cierre del contrato	4
Plazo total del contrato	80


(*) **Periodo de ejecución:** Inicio 21 de Agosto de 2021 hasta la terminación de las obras el 31 de diciembre de 2026. El Periodo de Puesta en marcha y ORAT tendrá una duración de 12 meses, cuyo inicio será determinado en función del avance del total de las obras requeridas para culminar el proyecto del AICC. El Contratista participará en este proceso.



ACTIVIDADES POR REALIZAR EN LOS PRÓXIMOS 06 MESES

PLANIFICACIÓN DEL CONTRATISTA

ACTIVIDADES EN EL AICC A REALIZARSE EN LOS PRÓXIMOS SEIS MESES

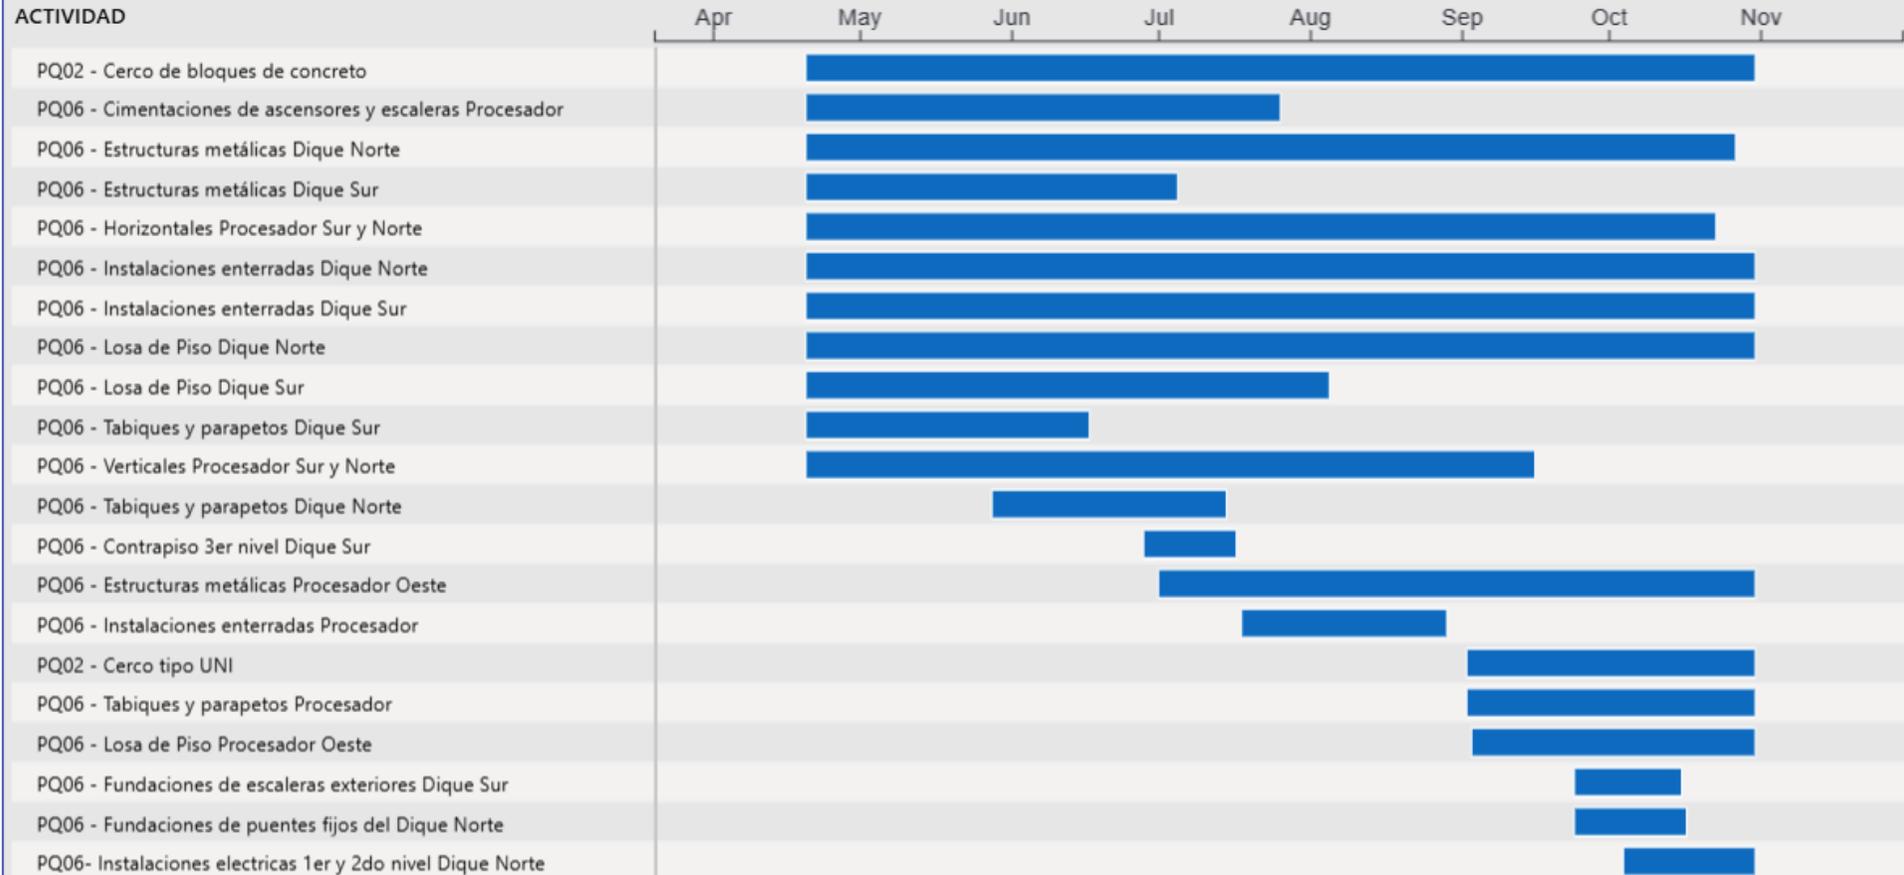

PAQUETES EXCLUIDOS DEL ALCANCE DEL CONTRATISTA

De acuerdo con la adenda firmada el 30 de octubre del 2024, el CONTRATISTA tiene excluido de su alcance:

- Paquete 1: Zona de maniobras
- Paquete 2: Cerco operativo, Vía perimetral y drenaje, Drenaje, Sistemas CCTV, PIDs e Iluminación
- Paquete 3: Plataformas
- Paquete 4: Parqueadores y vías de acceso
- Paquete 5: Sistema eléctrico
- Paquete 7: Torre de Control
- Paquete 8: Otros edificios



Estos paquetes se encuentran en proceso de licitación, para lo cual el INGENIERO tiene las siguientes funciones:

- Apoyo en el proceso de licitación del nuevo CONTRATISTA
- Revisión, supervisión y/o aprobación del diseño del nuevo CONTRATISTA
- Gestión y supervisión de la construcción del nuevo CONTRATISTA

GRACIAS / THANKS

CHINCHERO-CUSCO
