

Huancavelica, 05 de mayo del 2022

OFICIO N° 103 **-2022/GOB.REG.-HVCA/GGR-ORSyL**

Señor (a):
WILSON SOTO PALACIOS
Congresista de la Republica

CIUDAD.-

Asunto: Remito Información Solicitada

Ref. : a) OFICIO N° 788-2022-WSP-CR

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente, a nombre de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación y el mío propio, y a la vez remitir información solicitada, para el cual adjunto documento en 09 folios.

Sin otro particular reitero a usted las muestras de mi consideración y estima personal.

Atentamente,




**GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA**
Oficina Regional de Supervisión y Liquidación
Arq. Arturo Jesús Mattos Gilvonto
Oficina Regional de Supervisión y Liquidación
DIRECTOR

C.c. Archivo
AJMG/tris

N° DOC.	
N° EXP.	1648162

Huancavelica, 05 de mayo de 2022

INFORME N°073-2022/GOB.REG-HVCA/GGR-ORSyL/gpm-monitor



A : ARQ. ARTURO MATTOS GILVONIO
 Director Regional de Supervisión y Liquidación

Asunto : REMITO ESTADO SITUACIONAL DE OBRA

Referencia : a) OFICIO N°788-2022-WSP-CR
 b) MEMORANDUM MULT. N° 130-2022/GOB.REG-HVCA/GGR-GRPPyAT
 c) OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD CASTROVIRREYNA DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA, DEPARTAMENTO DE HUANCABELICA".

Por medio del presente es grato dirigirme a usted, para saludarlo y a la vez remitir a su despacho el estado situacional de la obra, que detallo a continuación:

1. RESUMEN EJECUTIVO

1.1. DATOS DE LA OBRA:

OBRA : "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA, DEPARTAMENTO DE HUANCABELICA"

Código Único de Inversión : 2331865

Localidad : Castrovirreyna

Distrito : Castrovirreyna

Provincia : Castrovirreyna

Departamento : Huancavelica

Unidad Formuladora : Gobierno Regional de Huancavelica

Unidad Ejecutora : Gobierno Regional de Huancavelica

Convocatoria : LP-SM-2-2021-GOB.REG.HVCACSO-1

Contrato N° : 146-2021/ORA

Fecha de firma de contrato : 06/10/2021

Sistema de contratación : A Suma Alzada

Presupuesto base : S/. 52,041,282.55 soles

Presupuesto contratado : S/. 50,900,000.00 soles

Representante Común : Sr. Jaime Rolando Lino Moya

Residente de Obra : Arq. Bruno Jorge Battifora Carrera

Plazo de ejecución : 300 días calendarios

3112 GOB.REG. GGR.ORSyL

Sr. Secretaria

Para: proyección presupuesto

Hvca. 05 de Mayo de 2022

Oficina Regional de Supervisión y Liquidación

1.2. DATOS DEL INSPECTOR/SUPERVISOR

Inspector de Obra : Arq. Arturo Jesús Mattos Gilvonio

Resolución de designación : RGGR N°652-2021/GOB.REG-HVCA/GGR

Fecha de efectividad : 21/10/2021 – 16/02/2022

Supervisor de Obra : Arq. Dino Max Navarro Daviran

Contrato N° : 009-2022/ORA

Fecha de efectividad : 17/02/2022 en adelante

2. ANTECEDENTES

- ✓ De fecha 06/10/2021 se suscribe el **CONTRATO N°146-2021/ORA** entre el Gobierno Regional de Huancavelica y el Consorcio Ejecutor de Salud Castrovirreyna, para la ejecución de la obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD CASTROVIRREYNA DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA", por la suma de S/. 50'900,000.00, con un plazo de 300 días calendarios.
- ✓ Con fecha 20.10.2021 se realiza la entrega del terreno.
- ✓ De fecha 27 de octubre de 2021 se da inicio a la ejecución de la obra "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD CASTROVIRREYNA DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA."
- ✓ Mediante RGGR N°652-2021/GOB.REG-HVCA/GGR de fecha 21.10.2021, la entidad se designa como jefe de Inspector de Obra al Arq. Arturo Jesús Mattos Gilvonio.
- ✓ De fecha 16/02/2022 se suscribe el **CONTRATO N°009-2022/ORA** de fecha 16/02/2022, se firma contrato entre el Gobierno Regional de Huancavelica y el Consorcio Supervisor Salud, para la consultoría de supervisión de obra por la suma de S/. 2'586,625.87, por el plazo de 360 días calendarios, asumiendo el supervisor de obra a partir del 17/02/2022.
- ✓ Mediante MEMORANDUM MULT. N°130-2022/GOB.REG-HVCA/GGR-GRPPyAT, de fecha 29/04/2022 la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial solicita el estado situacional de obra.
- ✓ Mediante OFICIO N°788-2022-WSP-CR de fecha 28/04/2022 el congresista de la republica Sr. Wilson Soto Palacios solicita el estado situacional de la obra de la referencia.
- ✓ Mediante PROVEIDO 3000 GOB.REG.HVCA/GGR.ORSyL de fecha 04/05/2022 la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación me remite el documento b) de la referencia para la atención respectiva.
- ✓ Mediante PROVEIDO 3005 GOB.REG.HVCA/GGR.ORSyL de fecha 04/05/2022 la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación me remite el documento a) de la referencia para la atención respectiva.

3. ESTADO SITUACIONAL DE OBRA:

Datos del Contratista:

Con fecha 06 de octubre del 2021 se suscribe el CONTRATO N° 146-2021/ORA, entre el Gobierno Regional de Huancavelica y el **CONSORCIO EJECUTOR DE SALUD CASTROVIRREYNA**, cuyo representante Común es el Sr. Jaime Rolando Lino Moya; para la ejecución de la obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD CASTROVIRREYNA DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA.", por un monto contractual de S/. **50'900,000.00** (cincuenta millones novecientos mil con 00/100 Soles), con un plazo de ejecución de trescientos (300) días calendarios.

La obra inicio el día 27 de octubre de 2021 y la culminación estaba programada para el día 22 de agosto de 2022.

Respecto al plazo de ejecución:

La obra tiene un plazo de ejecución de 300 días calendario, iniciando el día 27 de octubre de 2021 cuya culminación estaba programada para el día 22 de agosto de 2022.

Se tiene una Suspensión del Plazo de ejecución N°01 por espacio de 13 días calendarios desde el 13 de enero al 27 de enero de 2022, debido a que el residente de obra contrajo el COVID-19 debiendo permanecer en aislamiento. Por lo cual la nueva fecha de culminación de obra es el día 04 de setiembre de 2022.

Se tiene una Suspensión del Plazo de ejecución N°02 por espacio de 59 días calendarios desde el 05 de marzo al 02 de mayo de 2022, debido las constantes y fuertes precipitaciones pluviales que no permitían la normal ejecución de obra, modificando la ruta crítica. Por lo cual la nueva fecha de culminación de obra es el día 02 de noviembre de 2022.

Respecto a la ejecución de obra (avances programados):

Mediante Carta Múltiple N°589-2021/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL, de fecha 22.11.2021 la entidad comunica al contratista e inspector de obra la aprobación del calendario de avance de obra adecuado al inicio del plazo contractual, siendo el avance de obra el siguiente:

CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO ADECUADO AL INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL (AL MONTO DEL CONTRATO)					
N° VAL	PERIODO	PROGRAMADO (MONTO OFERTADO TOTAL)		EJECUTADO (MONTO OFERTADO TOTAL)	
		Monto S/. (C/IGV)	% Avance	Monto S/. (C/IGV)	% Avance
		Parcial	Parcial	Parcial	Parcial
01	DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE 2021	S/22,556.60	0.04%	S/21,770.27	0.04%
02	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021	S/754,866.80	1.48%	S/605,446.35	1.19%
03	DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2021	S/721,081.94	1.42%	S/145,057.72	0.28%
05	DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2022	S/1,793,258.56	3.52%		
06	DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022	S/3,477,521.55	6.83%		
07	DEL 01 AL 31 DE MARZO 2022	S/3,869,027.54	7.60%		
08	DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2022	S/4,781,383.67	9.39%		
09	DEL 01 AL 31 DE MAYO 2022	S/7,453,230.54	14.64%		
10	DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2022	S/9,222,150.71	18.12%		
11	DEL 01 AL 31 DE JULIO 2022	S/9,845,608.57	19.34%		
12	DEL 01 AL 22 DE AGOSTO 2022	S/8,959,313.52	17.62%		
MONTO ACUMULADO C/IGV		S/50,900,000.00	100.00%	S/772,274.34	1.51%

Como se aprecia en cuadro anterior, la obra presenta un avance muy lento, habiendo caído en un primer atraso el mes de diciembre de 2021, debido a que el monto programado acumulado era de S/1,498,505.34 soles (dato obtenido de la valorización N°03 y 04 correspondiente al mes de diciembre) y solo se llegó a una ejecución de S/. 772,274.34 equivalente al 52% del monto programado acumulado, es decir menor al 80% de lo programado, en razón a ello el Inspector de obra solicita al contratista la presentación del calendario acelerado de obra.

Mediante Carta Múltiple N°025-2022/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL, de fecha 03.02.2022 la entidad comunica al contratista e inspector de obra la aprobación del calendario acelerado de obra; sin embargo, el contratista mantiene el atraso permanente en la ejecución de la obra, siendo el avance ejecutado el que se detalla a continuación:

CALENDARIO ACELERADO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO ADECUADO AL PLAZO CONTRACTUAL (AL MONTO DEL CONTRATO)					
N° VAL.	PERIODO	PROGRAMADO (MONTO OFERTADO TOTAL)		EJECUTADO (MONTO OFERTADO TOTAL)	
		Monto S/. (C/IGV)	% Avance	Monto S/. (C/IGV)	% Avance
		Parcial	Parcial	Parcial	Parcial
01	DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE 2021	S/21,770.27	0.04%	S/21,770.27	0.04%
02	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021	S/605,446.35	1.19%	S/605,446.35	1.19%
03	DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2021	S/145,057.72	0.28%	S/145,057.72	0.28%
05	DEL 01 AL 14 Y DEL 28 AL 31 DE ENERO DE 2022	S/176,236.62	0.35%	S/125,069.25	0.25%
06	DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022	S/907,010.24	1.78%	S/591,411.53	1.16%
	DEL 01 AL 04 DE MARZO 2022	S/251,836.63	0.49%	S/202,552.24	0.40%
07	DEL 05 AL 31 DE MARZO 2022	S/1,699,897.28	3.34%		
08	DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2022	S/8,348,718.43	16.40%		
09	DEL 01 AL 31 DE MAYO 2022	S/11,327,835.87	22.26%		
10	DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2022	S/11,392,826.72	22.38%		
11	DEL 01 AL 31 DE JULIO 2022	S/9,163,932.50	18.00%		
12	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2022	S/6,827,229.76	13.41%		
13	DEL 01 AL 04 DE SETIEMBRE 2022	S/32,201.61	0.08%		
MONTO ACUMULADO C/IGV		S/50,900,000.00	100.00%	S/1,691,307.36	3.32%

Del cuadro anterior se observa que la obra se encuentra permanentemente atrasada. Teniendo un avance ejecutado acumulado de 3.32% desde el inicio (27.10.2021) hasta el 04 de marzo de 2022 (debido que desde el 05.03.2022 la obra se encontraba suspendida), con un plazo de ejecución de 116 días, quedando una ejecución física pendiente de 96.68% y un saldo de plazo contractual de 184 días calendarios.

Es preciso señalar que la obra tiene un avance muy lento, apenas logrando superar el 80% del monto total programado a fin de no caer en su segundo atraso, lo cual conllevaría a la resolución de contrato o intervención económica.

Respecto a los adelantos otorgados y las amortizaciones:

La entidad otorgo al contratista el adelanto directo por un monto de S/.5'090,000.00 soles y por concepto de adelanto para materiales un monto de S/. 10'180,000.00 soles.

Las amortizaciones de los adelantos otorgados se resumen en el siguiente cuadro:

AD. DIRECTO OTORGADO	S/ 5,090,000.00	
AD. MATERIALES OTORGADO	S/ 10,180,000.00	
DESCRIPCION	AMORT. AD. DIRECTO	AMOR. AD. MATERIALES
VAL N°01 (27 AL 31 DE OCTUBRE 2021)	S/2,177.03	S/0.00
VAL N°02 (01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021)	S/60,544.63	S/0.00
VAL N°03 (01 AL 27 DE DICIEMBRE 2021)	S/8,146.72	S/0.00
VAL N°04 (28 AL 31 DE DICIEMBRE 2021)	S/6,359.06	S/0.00
VAL N°05 (1 AL 14 Y DEL 28 AL 31 DE ENERO DE 2022)	S/12,506.93	S/8,798.86
VAL N°06 (DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2022)	S/59,141.15	S/269,493.79
MONTO TOTAL AMORTIZADO C/IGV	S/148,875.51	S/278,292.65
SALDO POR AMORTIZAR C/IGV	S/4,941,124.49	S/9,901,707.35

Como se observa en el cuadro el saldo por amortizar por concepto de adelanto directo es S/.4'941,124.49 soles y por concepto de adelanto para materiales es de S/. 9'901,707.35 soles, (incluye valorización N°06 de febrero 2022); lo cual evidencia que no se viene cumpliendo el cronograma de adquisición de materiales presentado por el contratista en la solicitud de adelanto de materiales.

Es todo cuanto informo para su conocimiento y demás fines del caso;

Atentamente,



GISELLA PAREJAS MORA
ARQUITECTA CAP 10009
MONITOR DE OBRA

04

Lima, 21 de abril de 2022.

OFICIO N° 788 - 2022-WSP-CR

Señor:
MACISTE ALEJANDRO DIAZ ABAD
 Gobernador Regional
 Torre Tagle 336, Huancavelica
 Presente. –



Asunto: Pedido de información


De mi consideración:

Sirva el presente para saludarlo y en aplicación del artículo 96 de la Constitución Política del Estado, concordante con el artículo 22, inciso b) del Reglamento del Congreso de la República, solicito que nos remita al Despacho, información detallada y documentada sobre el **estado situacional** de la obra "Mejoramiento de los Servicios de Salud del Establecimiento de Salud Castrovirreyna del Distrito y Provincia de Castrovirreyna, Departamento De Huancavelica", con código único inversión N° 2331865, vínculo generado con el Proceso de selección LP-SM-2-2021-GOB.REG.HVCACSO-1, Contratista: Consorcio Ejecutor de Salud Castrovirreyna y Supervisado: Consorcio Salud Castrovirreyna.

Nuestro requerimiento tiene sustento legal conforme se citó las normas glosadas en líneas arriba, y así como nuestras atribuciones de fiscalización según reconoce la Carta Maga y el Reglamento del Congreso de la República.

Agradeciendo su atención al presente, aprovecho la oportunidad para expresarle mi especial consideración y estima personal.

Atentamente

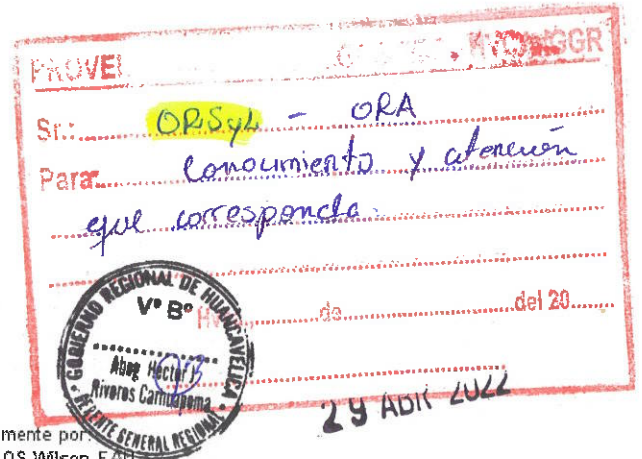

Firmado digitalmente por:
 SOTO PALACIOS Wilson FAD
 20181749128 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 22/04/2022 15:12:04-0500

RECEIVED 3005 GOB. REG. A.GGR.ORS
 Sr. Arq. Gisella Parejas
 Para: su atención

Hvca. 29 de Abril de 2022

WILSON SOTO PALACIOS
 Congresista de la República

Oficina Regional de Supervisión y Liquidación

Doc: 2210853
 Exp: 1648162

MEMORANDUM MULT. N° 130-2022/GOB.REG-HVCA/GGR-GRPPyAT

Al : GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
GERENTE SUB REGIONAL DE ACOBAMBA
GERENTE SUB REGIONAL DE HUAYTARÁ
DIRECTOR REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
DIRECTOR REGIONAL DE YAKU TARPUY
DIRECTOR REGIONAL DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN

Asunto : REMITIR INFORMACION DETALLADA Y DOCUMENTADA DEL ESTADO SITUACIONAL DE LA LISTA DE INVERSIONES.

REF. : OFICIO N°770-2022-WSP-CR

Fecha : Huancavelica, 29 de abril del 2022

Mediante el presente me dirijo a Ustedes para comunicarles que en merito al documento de la referencia se solicita remitir el estado situacional de los proyectos que fueron incluidos en la Ley de Presupuesto del Sector Publico para el año fiscal 2022-Ley N°31365, según la relación que se adjunta en el anexo del documento.

En este sentido, se insta a las Unidades Ejecutoras de Inversiones remitir con carácter de Urgente la información solicitada de manera detalla y documentada en un plazo máximo de 48 horas; a fin de dar respuesta al documento de la referencia.



Atentamente;

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
DIRECCION REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO
Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
[Signature]
Lcon. Edgar Ancasti Jurado
GERENTE REGIONAL


C.c.
EAJ/
Reg. Documento: 2217517
Reg. Expediente: 1648223

BOVEDOR 3000 GOB. REG. HVCA/GGR/LORSYL
Dr. Sig. Gisella Parejón / Ing. Esterini Sanchez
para Ing. Maribel Mejia
su ptencion
Hvca. 29 de Abril de 2022
Esterini Sanchez
Ing. Esterini Sanchez

Lima, 20 de abril de 2022.

OFICIO N° 770 - 2022-WSP-CR

Señor:
MACISTE ALEJANDRO DIAZ ABAD
Gobernador Regional
Torre Tagle 336, Huancavelica
Presente.



Asunto: Pedido de información

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con la finalidad de saludarlo muy cordialmente y, en aplicación del artículo 96 de la Constitución Política del Estado, concordante con el artículo 22, inciso b) del Reglamento del Congreso de la República, solicitamos de manera URGENTE nos remita al Despacho, información detallada y documentada sobre el estado situacional de los proyectos que fueron incluidos en la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022- Ley N° 31365, según la relación que se adjunta en el anexo.

Nuestra solicitud, es al amparo de las normas glosadas en líneas arriba y que además responde a mis facultades del control político; la misma que será insumo para atender a los reclamos de las autoridades locales, quienes son los beneficiarios finales que esperan la ejecución y culminación de los referidos proyectos de inversión pública.


Sin otro particular, es propicia la oportunidad para reiterar los sentimientos de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,

PROVEIDO N°.....1605.REG.-HVCA/GRPPyAT.
Sr.: *S.G.P.M.1*
Para: *Análisis y pres. prev. y eval.*
la información
28 ABR 2022
Hvca, de del 20.....
Gerencia Regional de Planeamiento Presupuestario y Acondicionamiento Territorial



Firmado digitalmente por:
SOTO PALACIOS Wilson FAU
20181749128 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 22/04/2022 15:06:27-0500



2210940
1648222

NDLL/WSP

.....
WILSON SOTO PALACIOS
Congresista de la República

Anexo

N°	CUI	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO INVERSIÓN
01	2285758	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ESTRATÉGICO HOSPITAL DE PAMPAS; DISTRITO DE PAMPAS, TAYACAJA - HUANCVELICA <i>GR</i>	S/178,855,514.95
02	2467444	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO PIEDRA HERMOSA EN EL DISTRITO DE HUAYTARA - PROVINCIA DE HUAYTARA - DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA <i>Huaylara</i>	S/44,459,007.50
03	2331865	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD CASTROVIRREYNA DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA, DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	S/61,571,004.87 <i>Superación bise</i>
04	2193411	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCVELICA - YAULI - PUCAPAMPA (RUTA HV - 112)	S/196,891,504.07 <i>Superación RO</i>
05	2192219	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCAPAMPA-CCASAPATA-CHUÑUNAPAMPA-TINQUERCASA-PADRE RUMI-PAUCARA	S/192,227,192.14 <i>Estafeta</i>
06	2495408	CREACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DIGITAL DE LAS LOCALIDADES DE INTERÉS SOCIAL EN LAS 7 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA <i>Transparencia</i>	S/28,925,070.27
07	2326592	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO TULLPACANCHA, EN LOS DISTRITOS DE CHURCAMP, LA MERCED Y SAN MIGUEL DE MAYOCC DE LA PROVINCIA DE CHURCAMP - DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA <i>Yaku torpu</i>	S/145,753,776.10
08	2414831	CREACION DEL SERVICIO DE RIEGO EN LOS DISTRITOS DE ACOBAMBA, POMACOCCHA Y CAJA DE LA PROVINCIA DE ACOBAMBA - DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA <i>Yaku torpu</i>	S/289,408,389.21
09	2339213	CREACION DEL SERVICIO DE RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE ROSARIO Y VILLA MANTARO, DISTRITO DE ROSARIO - ACOBAMBA - HUANCVELICA <i>Acobamba</i>	S/10,203,821.37
10	2464651	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES JATUS, ALLPAMACHAY, PAMPAPUQUIO, HORGON HUERTA Y VISTA ALEGRE, DE LA COMUNIDAD DE PAMPAPUQUIO DEL DISTRITO DE SAN ANTONIO DE CUSICANCHA - PROVINCIA DE HUAYTARA - DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA <i>Huaylara</i>	S/18,729,349.98
11	2414870	CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LOS SECTORES DE NUEVA ESPERANZA DE POCYACC, SANTA ROSA, BAJA Y CHACHASPATA, TOCAS - DISTRITO DE COLCABAMBA - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA <i>GR</i>	S/3,077,709.12
12	2321810	CREACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO HUARMICOCHA EN LAS LOCALIDADES DE PUEBLO LIBRE, SACHACOTO, SURCUBAMBA, SOCCOS Y SANTA MARÍA, EN LOS DISTRITOS DE SURCUBAMBA Y HUACHOCOLPA DE LA PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA <i>Yaku torpu</i>	S/29,605,162.22
13	2326592	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO TULLPACANCHA, EN LOS DISTRITOS DE CHURCAMP, LA MERCED Y SAN MIGUEL DE MAYOCC DE LA PROVINCIA DE CHURCAMP - DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	S/145,753,776.10
