



PERÚ

Ministerio de Salud

SETIEMBRE 2019

SITUACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION EN SALUD 2019

UCAYALI

Ministerio de Salud


EL PERÚ PRIMERO



UCAYALI

Inversiones

PADRE ABAD	
1 PROYECTO DE INVERSION	
S/ 15.78	Millones

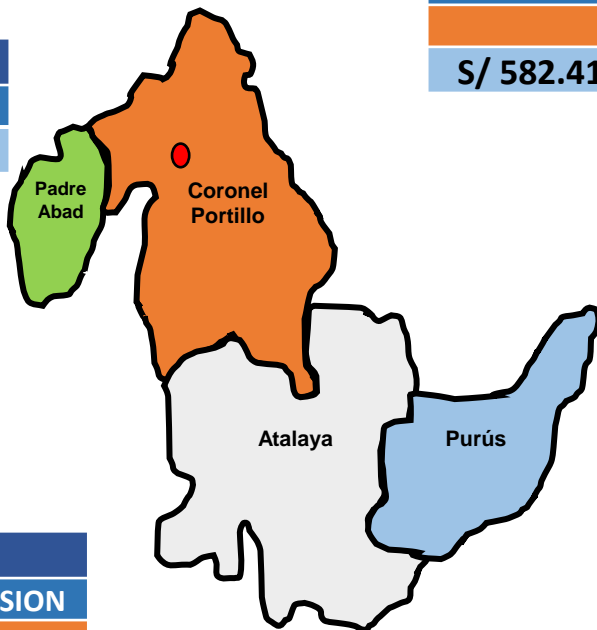

CORONEL PORTILLO	
4 PROYECTO DE INVERSION	
1 IOARR	
S/ 582.41	Millones

ATALAYA	
4 PROYECTO DE INVERSION	
1 IOARR	
S/ 170.40	Millones

PURUS	
1 PROYECTO DE INVERSION	
S/ 36.70	Millones



S/ 806.74
Millones
MONTO DE INVERSIÓN




610,435 Mil
POBLACION BENEFICIARIA

13

10 Proyectos de Inversión	S/. 805.22 Millones
3 IOARR	S/. 1.52 Millones

10 Proyectos de Inversión

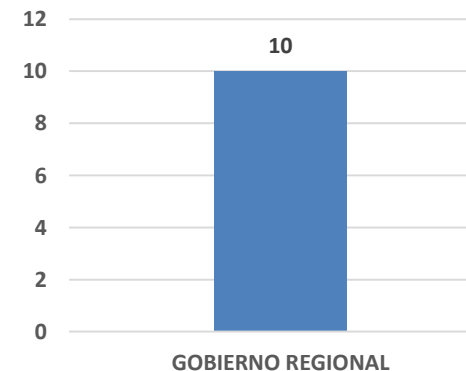

UCAYALI

N° PI	FASE	HOSPITALES REGIONALES	HOSPITALES PROVINCIALES	CENTROS Y PUESTO DE SALUD	MONTO DE INVERSION	
0	RECEPCION E INAUGURACION	0	0	0	S/ 0.0	Millones
7	EJECUCION	1	1	5	S/ 681.58	Millones
0	EXPEDIENTE TECNICO	0	0	0	S/ 0.0	Millones
2	PERFIL VIABLE	0	0	2	S/ 45.43	Millones
1	PREINVERSION	0	1	0	S/ 78.21	Millones



EE.SS EN FASE DE EJECUCION

N°	PROVINCIA	ESTABLECIMIENTO DE SALUD	CATEGORIA PROYECTADA	BENEFICIARIOS	UNIDAD EJECUTORA	MONTO DE INVERSION (MILLONES)	AVANCE FISICO	ESTADO SITUACIONAL
1	PUCALLPA	HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA	III-1	417615	GORE UCAYALI	S/ 447.60	72%	OBRA PRESENTA UN AVANCE FÍSICO AL MES DE AGOSTO DE 72.06%, HABIÉNDOSE PROGRAMADO 59.79%, REPRESENTANDO UN ADELANTO DE 12.08%
2	ATALAYA	HOSPITAL ATALAYA	II-E	49328	GORE UCAYALI	S/ 90.87	67%	LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA DESDE EL 30.01.2019, POR PROBLEMAS CLIMATOLÓGICOS Y DEFICIENCIAS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA. SE EJECUTO EL PLAN DE RIESGO Y SE ESTA PROGRAMANDO EL REINICIO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA EL 28.09.2019.
3	PURÚS	CENTRO DE SALUD PURÚS	I-4	4405	GORE UCAYALI	S/ 36.70	24%	EL AVANCE DE FÍSICO DE LA OBRA AL MES DE AGOSTO ES DE 23.91%, HABIÉNDOSE PROGRAMADO 25.00%.
4	ATALAYA	CENTRO DE SALUD BOLOGNESI	I-4	8020	GORE UCAYALI	S/ 22.65	8%	EL AVANCE DE FÍSICO DE LA OBRA AL MES DE AGOSTO ES DE 8.33%, HABIÉNDOSE PROGRAMADO 8.04%.
5	ATALAYA	PUESTO DE SALUD BREU	I-3	2587	GORE UCAYALI	S/ 27.19	6.6%	EL AVANCE DE FÍSICO DE LA OBRA AL MES DE AGOSTO ES DE 6.55%, HABIÉNDOSE PROGRAMADO 7.26%.
6	CORONEL PORTILLO	CENTRO DE SALUD NUEVA REQUENA	I-4	5538	GORE UCAYALI	S/ 20.57	0%	EL ACTA DE ENTREGA DE TERRENO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA SE FIRMÓ EL 03/09/2019. LA EJECUCIÓN DE LA OBRA SE INICIO EL 04/09/2019.
7	CORONEL PORTILLO	C.S. CAMPO VERDE	I-4	15743	GORE UCAYALI	S/ 36.0	0%	EL ACTA DE ENTREGA DE TERRENO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA SE FIRMÓ EL 01/09/2019. LA EJECUCIÓN DE LA OBRA SE INICIO EL 02/09/2019.

2

**EE.SS EN FASE DE
PERFIL VIABLE**

N°	PROVINCIA	ESTABLECIMIENTO DE SALUD	CATEGORIA PROYECTADA	BENEFICIARIOS	UNIDAD EJECUTORA	MONTO DE INVERSION (MILLONES)	AVANCE FISICO	ESTADO SITUACIONAL
1	ATALAYA	C.S SEPAHUA	I-4	6108	GORE UCAYALI	S/ 29.65	0	NO CUENTA CON FINANCIAMIENTO PARA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. SE ENCUENTRA INCLUIDO EN EL PMI 2020-2022 DEL SECTOR GR
2	PADRE ABAD	C.S. SAN ALEJANDRO	I-3	1647	GORE UCAYALI	S/ 15.78	0	NO CUENTA CON RECURSOS PARA INICIO DE ELABORACION DE EXP. TÉCNICO. SE ENCUENTRA INCLUIDO EN EL PMI 2020-2022 DEL SECTOR GR

1

**EE.SS EN FASE DE
PREINVERSION**

N°	PROVINCIA	ESTABLECIMIENTO DE SALUD	CATEGORIA PROYECTADA	BENEFICIARIOS	UNIDAD EJECUTORA	MONTO DE INVERSION (MILLONES)	AVANCE FISICO	ESTADO SITUACIONAL
1	CORONEL PORTILLO	HOSPITAL AMAZONICO - YARINACOCHA	II-2	99444	GORE UCAYALI	S/ 78.21	0	PREINVERSION EL ESTADO DE LA INVERSIÓN ES DESHABILITADO TEMPORALMENTE. NO CUENTA CON RECURSOS PARA CONTINUAR CON EL ESTUDIO EN FORMULACIÓN

IOARR - UCAYALI

PLIEGOS / UNIDADES EJECUTORAS / INVERSIONES	IOARR	OTROS GASTOS DE CAPITAL	SEGUIMIENTO EJECUCIÓN DE IOARR AÑO 2019				
			PIM	CERTIF.	COMPROM.	DEVENG.	AVANCE %
001-942: REGION UCAYALI-SEDE CENTRAL	1,518,000	428,700	1,518,000	76000	0	0	0.00%
CONGELADORES HORIZONTALES	28,000		28,000	28000	0	0	0.00%
CONGELADORES HORIZONTALES Y ESTERILIZADOR	48,000		48,000	48000	0	0	0.00%
EQUIPO ECOCARDIOGRAFO, DENSITÓMETRO ÓSEO, BOMBA DE INFUSIÓN, MEZCLADOR DE GAS Y VENTILADORES PARA CUIDADOS INTENSIVOS DE ADULTOS O PEDIÁTRICOS	1,442000		1,442,000	0	0	0	0.00%
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI	S/ 1,518,000.00	S/ 428,700.00	S/ 1,518,000.00	S/ 76,000.00	S/ 0.00	S/ 0.00	0.0%

TRANSFERIDO D.S. N° 106-2019-EF:

* IOARR	: S/ 1,518,000.00
* OTROS GASTOS DE CAPITAL	: S/ 428,700.00
TOTAL	S/ 1,946,700.00

SEGUIMIENTO IOARR:

PIM	S/ 1,518,000.00	
CERTIFICADO	S/ 60,000.00	3.95%
COMPROMETIDO	S/ 0.00	
EJECUTADO	S/ 0.00	
