



PERÚ

Ministerio  
de Salud

Viceministerio de Prestaciones y  
Aseguramiento en Salud

Programa Nacional de  
Inversiones en Salud



# ESTADO ACTUAL DE PROYECTOS PIRCC

Décimo Segunda Sesión  
Ordinaria de la CEMRCFC  
05.MAY.2023

MINISTERIO DE SALUD  
SALUD. DERECHO DE TODOS



BICENTENARIO  
DEL PERÚ  
2021 - 2024



**MINSA - PRONIS  
32 EE.SS.**

PIRCC: S/ 130,054,416

1	ANCASH	2	S/	460,000
2	PIURA	10	S/	26,370,000
3	LAMBAYEQUE	10	S/	27,430,416
4	LA LIBERTAD	4	S/	11,556,000
5	LIMA	4	S/	6,082,000
6	CAJAMARCA	1	S/	156,000
7	ICA	1	S/	31,000,000

PIM 2023: S/ 35,380,928

**CAMBIO DE ENTIDAD EJECUTORA****8 IRI****Con desistimiento de Cambio de Unidad Ejecutora**

Región	N° de EE.SS.	PIM 2023
LAMBAYEQUE	1	0
LA LIBERTAD	1	0
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>0</b>

**Con Opinión Favorable a solicitud de Cambio de Unidad Ejecutora**

Región	N° de EE.SS.	PIM 2019
LAMBAYEQUE	2	0
LA LIBERTAD	2	0
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>0</b>

**A la espera de ingreso de solicitud de Cambio de Unidad Ejecutora**


Región	N° de EE.SS.	PIM 2019
LAMBAYEQUE	3	0
LA LIBERTAD	4	0
LIMA	1	57,261
<b>Total</b>	<b>8</b>	<b>57,261</b>

**MINSA – PRONIS (\*)  
24 EE.SS.**

PIM: S/ 35,380,928

1	ANCASH	2	S/	109,694
2	PIURA	10	S/	15,987,801
3	LAMBAYEQUE	7	S/	15,188,412
4	LIMA	3	S/	574,704
5	CAJAMARCA	1	S/	109,694
6	ICA	1	S/	3,324,889

(\*) Después de aprobado el cambio de Entidad Ejecutora

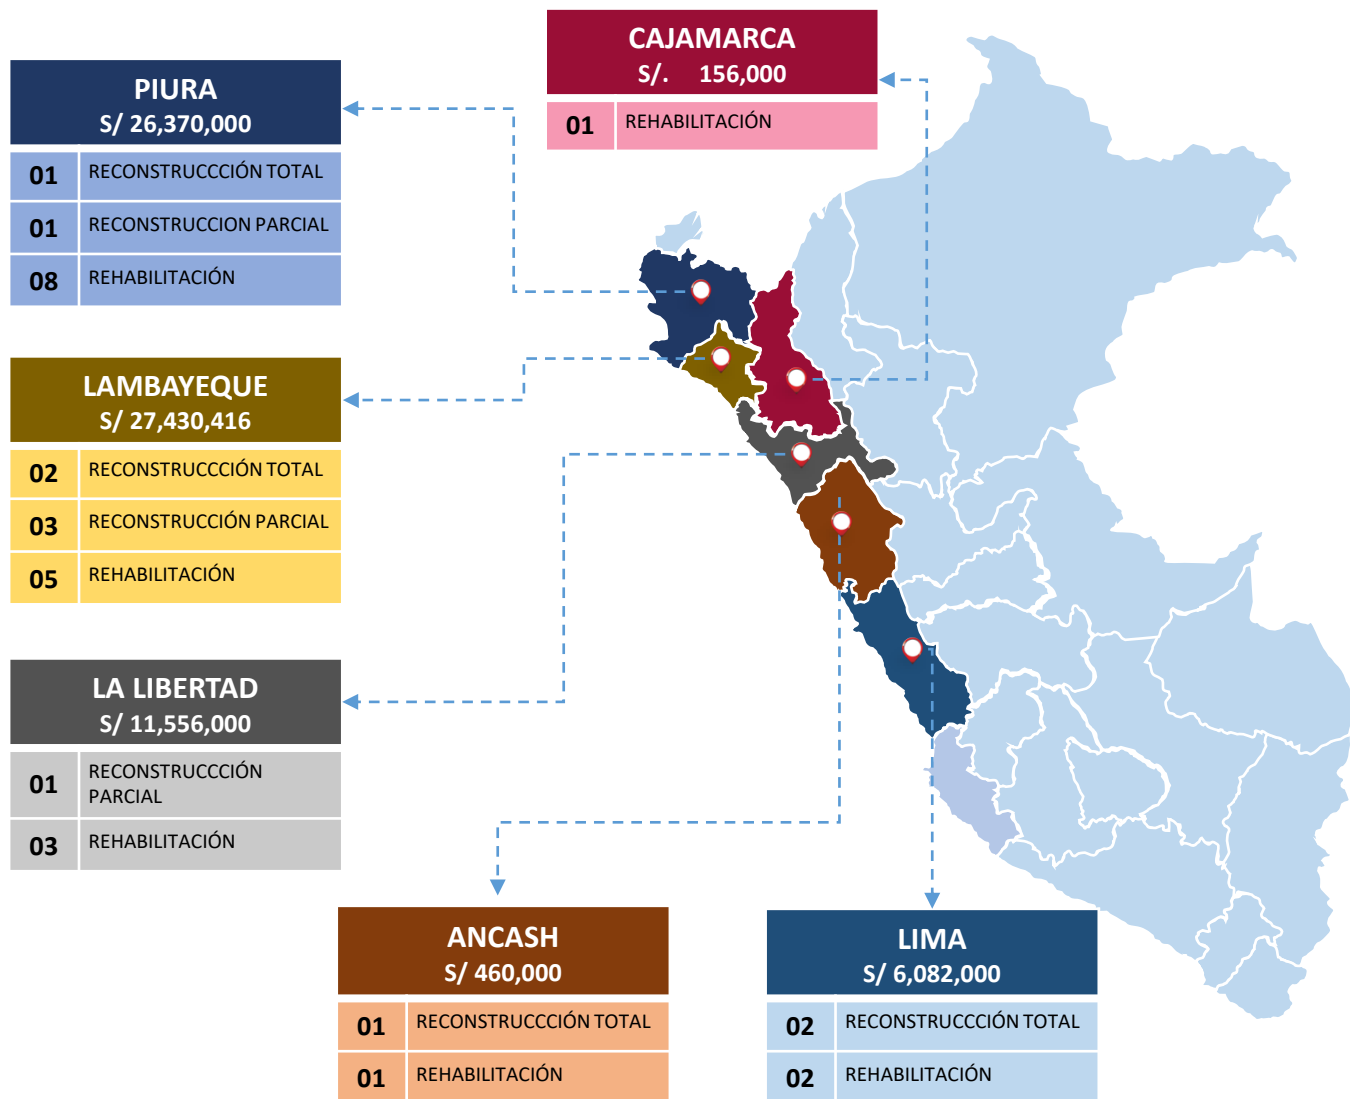

## PLAN INTEGRAL DE RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS

### 32 INTERVENCIONES A CARGO DEL MINSA

06 RECONSTRUCCIÓN TOTAL

06 RECONSTRUCCIÓN PARCIAL

20 REHABILITACIONES

**MONTO SEGÚN PIRCC: S/ 130,054,416**

**VALOR AUTORIZADO: S/ 145,898,023**

**08 EE.SS. con propuesta de cambio de Entidad Ejecutora:**  
 P.S. Pango, P.S. Mocupe Tradicional, P.S. Hierba Buena, P.S. La Tranca,  
 C.S. Quiruvilca, C.S. Calipuy, C.S. Buenos Aires y C.S. Huancaspata.

## 24 Expedientes Técnicos (E.T)

## 08 Ejecución de obra



(\*) P.S. Pango, P.S. Mocupe Tradicional, P.S. Hierba Buena, P.S. La Tranca, C.S. Quiruvilca, C.S. Calipuy y C.S. Huancaspata con Propuesta de Cambio de Entidad Ejecutora

(\*) C.S. Buenos Aires con Propuesta de Cambio de Entidad Ejecutora

# LINEA DE TIEMPO 32 IRI : METAS 2023 - 2025

	<b>INICIO DE EXPEDIENTES TÉCNICOS</b>	<b>03</b>   EXPEDIENTES TÉCNICOS INICIADOS				
	<b>EXPEDIENTE TÉCNICOS CULMINADOS</b>	<b>09</b>   EXPEDIENTES TÉCNICOS CULMINADOS	<b>06</b>   EXPEDIENTES TÉCNICOS CULMINADOS	<b>09</b>   EXPEDIENTES TÉCNICOS CULMINADOS		
		<b>SEMESTRE I (2023)</b>	<b>SEMESTRE II (2023)</b>	<b>SEMESTRE I (2024)</b>	<b>SEMESTRE II (2024)</b>	<b>SEMESTRE I (2025)</b>
	<b>INICIO DE OBRA</b>	<b>02</b>   OBRAS INICIADAS	<b>06</b>   OBRAS INICIADAS	<b>05</b>   OBRAS INICIADAS	<b>09</b>   OBRAS INICIADAS	
	<b>OBRA CULMINADA</b>		<b>03</b>   OBRAS CULMINADAS	<b>05</b>   OBRAS CULMINADAS	<b>12</b>   OBRAS CULMINADAS	<b>02</b>   OBRAS CULMINADAS

**NOTA:**

A la fecha se tienen 02 intervenciones culminadas y liquidadas, pendientes de Cierre, el C.S. Magdalena Nueva y C.S. Sapillica.

# INTERVENCIONES DE RECONSTRUCCIÓN PRONIS - MINSA

1) INFORMACION DETALLADA Y  
ACTUALIZADA SOBRE EL ESTADO  
SITUACIONAL DE TODAS LAS  
INTERVENCIONES DEL PIRCC A  
CARGO DEL MINISTERIO DE SALUD



N°	CUI	EE.SS	Cat.	Etapa	Principales Dificultades	Ejecución Presupuestal	Ejecución Física	Proyección Estimada de Culminación
1	2428425	C.S. MAGDALENA NUEVA	I-2	Cierre	Intervención de Reconstrucción con Cambios. Avance Físico Acumulado: 100% Obra terminada el año 2021. Obra culminada y liquidada con RJ N° 012-2021-UGIR (05.07.2021). <b>Pendiente: Cierre de la intervención.</b>	S/ 1,352,448.84	100.00%	ENERO 2021
2	2409087	P.S. Sapcha	I-1	Ejecución Paralizada	Intervención de Reconstrucción con Cambios. Avance de Obra acumulado 69.63%. Obra con Contrato Resuelto con Carta N° 464-2022-MINSA-PRONIS-CG del 07.11.2022 Constatación Física del 15 al 25 de noviembre del 2022 20.04.2023: Culminación anticipada de la Expresión de Interés N° 10813 <b>Pendiente: Solicitud de Financiamiento para elaboración de Expediente Técnico de Saldo de Obra</b>	S/ 4,275,271.73	69.63%	JULIO 2024
3	2447725	C.S. Sapollica	I-3	Cierre	Intervención de Reconstrucción con Cambios. Avance Físico Acumulado: 100% Obra terminada el año 2020. Obra culminada y liquidada con RJ N° 015-2021-UGIR (17.11.2021). <b>Pendiente: Cierre de la intervención.</b>	S/ 1,810,775.64	100.00%	NOVIEMBRE 2020
5	2412981	P.S. San Pedro	I-2	Ejecución Paralizada	Intervención de Reconstrucción con Cambios. Avance Físico Acumulado: 42.67% Obra con Contrato Resuelto con Carta Notarial N° 1381-2021-MINSA-PRONIS-UAF del 18.10.2021 Constatación Física del 25 al 27 de octubre del 2021 Expediente Técnico de Saldo de Obra aprobado con Ficha de aprobación de expediente técnico N° 05-2022 del 01.03.2022 Convocatoria de Elaboración de Expediente Técnico de saldo de Obra – PEC-PROC-1-2022-PRONIS-1 se declara desierto por incumplimiento del postor en la presentación de los documentos del perfeccionamiento de contrato Expediente Técnico de Saldo de Obra aprobado con Ficha de aprobación de expediente técnico N° 07-2023 del 05.04.2023 <b>Pendiente: Aprobación expediente de Financiamiento adicional por pérdida de vigencia por parte de RCC, remitido con Oficio N° 566-2023-MINSA-PRONIS-CG del 10.04.2023.</b>	S/ 3,778,266.09	42.67%	MARZO 2024
5	2469055	Hospital de la Amistad Perú - Corea Santa Rosa II-2	II-2	Ejecución Paralizada	Intervención de Reconstrucción con Cambios Avance Físico Acumulado: 49.49%. Obra con Contrato Resuelto con Carta N° 14-2022-MINSA-PRONIS-CG del 12.01.2022 Constatación Física del 18 al 20 de enero del 2022 Expediente Técnico de Saldo de Obra aprobado con Ficha de aprobación de expediente técnico N° 04-2022 del 01.03.2022 Expediente Técnico de Saldo de Obra aprobado con Ficha de aprobación de expediente técnico N° 14-2022 del 08.09.2022 <b>Pendiente: Incorporación de recursos por continuidad año 2023</b>	S/ 8,801,633.90	49.49%	MAYO 2024

N°	CUI	EE.SS	Cat.	Etapas	Principales Dificultades	Ejecución Presupuestal	Ejecución Física	Proyección Estimada de Culminación
6	2451748	C.S. Las Lomas	I-3	Ejecución Paralizada	Intervención de Reconstrucción con Cambios Avance Físico Acumulado: 33.73%. Obra con Contrato Resuelto con Carta N° 376-2022-MINSA-PRONIS-UAF del 20.09.2022 Convocatoria de Elaboración del Expediente Técnico del Saldo de Obra - PEC-PROC-1-2023-PRONIS-1 . <b>Pendiente: Solicitud de financiamiento de elaboración de expediente técnico de saldo de obra</b>	S/ 3,375,276.18	33.73%	AGOSTO 2024
7	2523479	C.S. Lancones	I-3	Expediente Técnico Aprobado	Intervención de Reconstrucción con Cambios Expediente técnico actualizado y aprobado. AET N° 006-2023-MINSA/PRONIS-UGIR de fecha 20.ENE.23 por S/ 7,891,606 con 210 días de plazo. 08.02.23 se solicitó ante ARCC financiamiento adicional para poder lanzar convocatoria de ejecución de obra.	S/ 6,086,911.63	0%	JUNIO 2024
8	2523793	C.S. Ignacio Escudero	I-3	Expediente Técnico Aprobado	Intervención de Reconstrucción con Cambios Expediente Técnico actualizado, pendiente de aprobación. Nueva solicitud de financiamiento ante ARCC para priorización 2024.	S/. 9,600,690	0%	AGOSTO 2024
9	2512661	C.S. La Unión	I-4	Expediente Técnico Aprobado	Intervención de Reconstrucción con Cambios Expediente Técnico actualizado. AET N° 001-2023-MINSA/PRONIS-UGIR de fecha 12.ENE.23 por S/ 20,593,265 y un plazo 330 días. 15.02.23 Se solicitó ante ARCC financiamiento adicional para convocar ejecución de obra.	S/. 20,593,265	0%	SETIEMBRE 2024
10	2089754	P.S. Tejedores	I-1	Expediente Técnico Elaboración	Intervención de Reconstrucción con Cambios Se aprobó el anteproyecto ante DIRESA. A la espera del financiamiento por continuidad para poder contratar la ingeniería de detalle y culminar el Expediente Técnico.	S/. 158,193	0%	DICIEMBRE 2024
11	2089754	C.S. Tambogrande	I-4	Expediente Técnico Elaboración	Intervención de Reconstrucción con Cambios Se aprobó el anteproyecto ante DIRESA. A la espera del financiamiento por continuidad para poder contratar la ingeniería de detalle y culminar el Expediente Técnico.	S/. 1,860,000	0%	MAYO 2025



N°	CUI	EE.SS	Cat.	Etapas	Principales Dificultades	Ejecución Presupuestal	Ejecución Física	Proyección Estimada de Culminación
12	2089754	C.S. Comunidad Saludable	I-3	Expediente Técnico Elaboración	Intervención de Reconstrucción con Cambios Se aprobó el anteproyecto ante DIRESA. A la espera del financiamiento por continuidad para poder contratar la ingeniería de detalle y culminar el Expediente Técnico.	S/. 1,740,000	0%	JUNIO 2025
13	2468105	C.S. Moyan	I-3	Obra Paralizada	Intervención de Reconstrucción con Cambios Avance Físico Acumulado: 47.38%. Obra con Contrato Resuelto con Carta N° 376-2022-MINSA-PRONIS-UAF del 20.09.2022	S/. 2,889,686.57	47.38%	
14	2426642	C.S. Salas	I-3	Expediente Técnico Elaboración	Intervención de Reconstrucción con Cambios Se aprobó el anteproyecto ante DIRESA. Con financiamiento por continuidad para poder contratar la ingeniería de detalle y culminar el Expediente Técnico.	S/. 74,900.42	0%	AGOSTO 2025
15	2426613	P.S. Puchaca	I-2	Expediente Técnico Elaboración	Intervención de Reconstrucción con Cambios Se aprobó el anteproyecto ante DIRESA. Con financiamiento por continuidad para poder contratar la ingeniería de detalle y culminar el Expediente Técnico.	S/. 64,818.64	0%	ABRIL 2025
16	2089754	C.S. Tambogrande	I-4	Expediente Técnico Elaboración	Intervención de Reconstrucción con Cambios Se aprobó el anteproyecto ante DIRESA. A la espera del financiamiento por continuidad para poder contratar la ingeniería de detalle y culminar el Expediente Técnico.	S/. 1,860,000	0%	MAYO 2025
17	2089754	C.S. Comunidad Saludable	I-3	Expediente Técnico Elaboración	Intervención de Reconstrucción con Cambios Se aprobó el anteproyecto ante DIRESA. A la espera del financiamiento por continuidad para poder contratar la ingeniería de detalle y culminar el Expediente Técnico.	S/. 1,740,000	0%	JUNIO 2025

## 2) INFORMACION DETALLADA DE LAS INTERVENCIONES A CARGO DEL MINISTERIO DE SALUD DEL PIRCC – CON PROBLEMAS EN SU EJECUCIÓN



N°	CUI	EE.SS	Cat.	Etapas	Costo	Situación 04/05/2023
1	2412981	P.S. San Pedro	I-2	Ejecución Paralizada	S/. 8,765,672	INTERVENCION CON CONTRATO RESUELTO AL 42.67% DE AVANCE A OCTUBRE 2021 Con expediente de Saldo de Obra actualizado, se ha solicitado financiamiento adicional ante ARCC. Actualmente no cuenta con presupuesto, se esta a la espera del financiamiento por continuidad.
2	2469055	Hospital de la Amistad Perú - Corea Santa Rosa II-2	II-2	Ejecución Paralizada	S/. 19,266,730	INTERVENCION CON CONTRATO RESUELTO AL 49.49% DE AVANCE A ENERO 2022 Con expediente de Saldo de Obra aprobado y autorizado por ARCC. Actualmente no cuenta con presupuesto suficiente para la convocatoria, se esta a la espera del financiamiento por continuidad.
3	2451748	C.S. Las Lomas	I-3	Ejecución Paralizada	S/. 6,064,682	INTERVENCION CON CONTRATO RESUELTO AL 33.73% DE AVANCE A SETIEMBRE 2022 Con expresión de interés culminada el 14.03.2023. 17.04.2023 se convoca el PEC-PROC-1-2023-PRONIS-1 para la elaboración del Expediente Técnico de Corte y Saldo de Obra.

### 3) INFORMACION SOBRE INTERVENCIONES A CARGO DEL MINISTERIO DE SALUD DEL PIRCC – QUE HAN SIDO MATERIA DE ACCIONES DE CONTROL



N°	CUI	EE.SS	Cat.	Etapas	Costo	Situación 04/05/2023
1	2469055	Hospital de la Amistad Perú - Corea Santa Rosa II-2	II-2	Ejecución Paralizada	S/. 19,266,730	Como parte del Control Concurrente 2022, se planteó el Hito de Control 2, donde se planean observaciones al expediente técnico de saldo de obra. Estas observaciones motivan una variación en el Expediente Técnico, razón por la cual se retrasa la convocatoria de la ejecución del saldo de obra de abril a octubre 2022.
2	2468105.	C.S. Moyan	I-3	Ejecución Paralizada	S/ 3,459,137.24	El Hito de Control presenta 3 observaciones relacionadas con deficiencia constructivas verificadas y partidas no ejecutadas, verificadas por el órgano de control. En el informe de constatación física derivada de la resolución de contrato, se estarán verificando lo indicado por el órgano de control, a fin de poder emitir el informe correspondiente.
3	2523479	C.S. Lancones	I-3	Expediente Técnico Aprobado	S/. 7,891,607	Como parte del Control Concurrente 2023, el Órgano de Control Institucional de la Contraloría, ha solicitado información del CS Lancones y plante el Hito de Control 1, cuyas observaciones al expediente técnico han motivado la revisión y actualización del expediente técnico.
4	2089754	P.S. DIGNIDAD NACIONAL	I-2	Expediente Técnico en Ejecución	S/ 653,139	El Hito de Control observa la implementación del Plan de Contingencia. Para lo cual se están realizando las gestiones correspondientes ante el Puesto de Salud y la Red Chilca-Mala. Esto ocasionó un retraso en la aprobación del expediente técnico.

## 4) PROPUESTAS O ALTERNATIVAS PLANTEADAS POR SU SECTOR PARA MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LAS INTERVENCIONES A SU CARGO



## Propuestas de Cumplimiento de Metas

- Agilizar la aprobación de los expedientes de financiamiento solicitado ante la ARCC para la incorporación de recursos para el inicio de la ejecución de obra de los expedientes técnicos aprobados y/o actualizados.
- Agilizar la aprobación de los expedientes de financiamiento solicitado ante la ARCC para la incorporación de recursos para la elaboración de los expedientes técnicos de saldo de obra solicitados ante la ARCC.
- Agilizar tramites de incorporación de recursos habilitados mediante Decretos Supremos, en cumplimiento de los plazos normativos.
- Elaboración de los Expedientes Técnicos por Contrata, de manera individual (evitando empaquetar).
- Continuar con las Mesas de trabajo con la Autoridad de la Reconstrucción con Cambios, para agilizar los trámites de financiamiento.

**LAMBAYEQUE****C.S. MOYAN – 93% de avance****CONTRATO RESUELTO PIM 2023 – 407,839****Pendiente 2023**

Constatación de Obra (Abr)

Convocatoria Expediente Técnico (May)

Elaboración de expediente técnico (Jun)

Solicitud Financiamiento adicional (Jul)

Convocatoria de Obra (Set)

Inicio de Ejecución (Nov)



OBRAS EN LEY DE PRESUPUESTO 2023:  
 ELAB. EXPRESION DE INTERES – COSTO ACTUALIZADO  
 1) LAMBAYEQUE - CS INCAHUASI  
 2) PIURA - CS LANCONES  
 3) PIURA - IGNACIO ESCUDERO  
 4) LAMBAYEQUE - CS LA ESTANCIA  
 5) PIURA – LA UNION  
 OBRA SOLIC. FINANCIAMIENTO ARCC – SIN PPTO 2023  
 6) LAMBAYEQUE – HUACAPAMPA – OBS. ARCC

**ANCASH****PS. MAGDALENA NUEVA – 100%****CULMINADO Y LIQUIDADO****Pendiente 2023**

Cierre de intervención

**P.S. SAPCHA – 70% de avance****CONTRATO RESUELTO PIM 2023 – 109,694****Pendiente 2023**

Convocatoria Expediente Técnico (Abr)

Elaboración de expediente Técnico (May-Jul)

Solicitud Financiamiento Adicional (Ago)

Convocatoria de Saldo de Obra (Oct)

Inicio de Ejecución (Nov)

**ICA****P.S. PARCONA – 37% de avance****CONTRATO RESUELTO PIM 2023 – 3'324,889****Pendiente 2023**

Convocatoria Expediente Técnico (Abr)

Elaboración de expediente Técnico (May-Jul)

Solicitud Financiamiento Adicional (Ago)

Convocatoria de Saldo de Obra (Oct)

Inicio de Ejecución (Nov)

**4****PIURA****5****HOSPITAL SANTA ROSA – 49% de avance****CONTRATO RESUELTO PIM 2023 – 3'851,648****Pendiente 2023**Contrato Principal

Liquidación de Contratos de obra y Supervisión

Saldo de Obra

Convocatoria de Saldo de Obra (Abr-May)

Inicio de Ejecución (Jul)

**6****P.S. SAN PEDRO – 43% de avance****CONTRATO RESUELTO PIM 2023 – 0****Pendiente 2023**Contrato Principal

Liquidación de Contratos de obra y Supervisión

Saldo de Obra

Solicitud Financiamiento Adicional (Mar)

Convocatoria de Saldo de Obra (May)

Inicio de Ejecución (Jul)

**7****C.S. LAS LOMAS – 34% de avance****CONTRATO RESUELTO PIM 2023 – 2'011,607****Pendiente 2023**

Convocatoria Expediente Técnico (Abr)

Elaboración de Expediente Técnico (May-Jun)

Solicitud Financiamiento Adicional (Jul)

Convocatoria de Saldo de Obra (Set)

Inicio de Ejecución (Nov)

**8****C.S. SAPILLICA – 100%****CULMINADO Y LIQUIDADO****Pendiente 2023**

Revisión y Pago de Liquidación de Supervisión

Cierre de Intervención



## **OBRAS LEY DE PRESUPUESTO 2023**

### **ELAB. EXPRESION DE INTERES – COSTO ACTUALIZADO**

- 1) LAMBAYEQUE: C. S. INCAHUASI (Presup. 2023: 368% - Prev. Presup: 2024: 64%)
- 2) LAMBAYEQUE: C. S. LA ESTANCIA (Presup. 2023: 50% - Prev. Presup: 2024: 50%)
- 3) PIURA: C. S. LANCONES (Presup. 2023: 26% - Prev. Presup: 2024: 74%)
- 4) PIURA: C. S. IGNACIO ESCUDERO (Presup. 2023: 54% - Prev. Presup: 2024: 46%)
- 5) PIURA: C. S. LA UNION (Presup. 2023: 27% - Prev. Presup: 2024: 73%)

### **OBRA SOLIC. FINANCIAMIENTO ARCC – SIN PPTO 2023**

- 6) LAMBAYEQUE: C. S. HUACAPAMPA: (OBS. ARCC)

## LAMBAYEQUE

## P.S. LA ESTANCIA

Exp. Técnico Culminado

Inversión: S/. 6,644,119.32

En solicitud de Financiamiento  
Pendiente priorización 2024

## P.S. HUACAPAMPA

Exp. Técnico Culminado

Inversión: S/. 9,661,356.08

En solicitud de Financiamiento  
Sin financiamiento 2023-2024

## P.S. PUCHACA

PARALIZADO

Inversión: S/. 704,573.7

ET con Fase 1 aprobada – contrato  
resuelto en liquidación.Incorporación de recursos por  
continuidad 27.04.23.

## P.S. HIERBA BUENA

Cambio Entidad Ejecutora

Inversión: S/. 159,491.00

Con contrato liquidado.  
Con desistimiento de EE.

## P.S. LA TRANCA

Cambio Entidad Ejecutora

Inversión: S/. 158,370.00

Con contrato liquidado.  
Con desistimiento de EE.

## P.S. INCAHUASI

Exp. Técnico Culminado

Inversión: S/. 31,192,162.91

En solicitud de Financiamiento  
Pendiente priorización 2024

## C.S. CAYALTI

PARALIZADA

Inversión: S/. 255,747.00

ET Fase 1 aprobada – con contrato resuelto  
y liquidado.  
Incorporación de recursos por continuidad  
27.04.23.

## C.S. SALAS

PARALIZADO

Inversión: S/. 2,311,285.27

ET con Fase 1 aprobada – contrato  
resuelto en liquidación.Incorporación de recursos por  
continuidad 27.04.23.

## P.S. MOCUPE TRADICIONAL

Cambio Entidad Ejecutora

Inversión: S/. 413,800.00

Liquidación de contrato para cambio EE

## LA LIBERTAD

## P.S. HUANCASPATA

Cambio Entidad Ejecutora

Inversión: S/. 261,718.00

Por Liquidar contrato para cambio EE

## P.S. PANGO

Cambio Entidad Ejecutora

Inversión: S/. 158,724.00

Con contrato en liquidación.  
Con desistimiento de EE.

## C.S. CALIPUY

Cambio Entidad Ejecutora

Inversión: S/. 666,102.00

Por Liquidar contrato para cambio EE

## C.S. M.I. QUIRUVILCA

Cambio Entidad Ejecutora

Inversión: S/. 284,882.00

Por Liquidar contrato para cambio EE

24

Expediente técnicos de  
Reconstrucción con CambiosFINANCIAMIENTO POR CONTINUIDAD 2023 A LA ESPERA  
DE INCORPORACION DE RECURSOS POR PARTE DEL MINSA

PIM 2023 – S/ 35 380 928

Prev 2024 – S/ 110 140 375

## CAJAMARCA

## P.S. CALLANCAS

EN ELABORACIÓN

Inversión: S/. 159,609.00

Con aprobación de Fase 1 y Fase 2  
En actualización de costos  
Incorporación de recursos por  
continuidad 27.04.23.

## LIMA

## P.S. PASAC

EN ELABORACIÓN

Inversión: S/. 298,171.00

Con aprobación de Fase 1 y Fase 2  
Para aprobación de ET  
Incorporación de recursos por  
continuidad 27.04.23.

## C.S. SAYAN

PARALIZADO

Inversión: S/. 244,938.00

ET con Fase 1 aprobada –  
contrato resuelto por liquidar.  
A la espera de incorporación de  
recursos por continuidad.

## P.S. DIGNIDAD NACIONAL

EN ELABORACIÓN

Inversión: S/. 387,943.00

Con aprobación de Fase 1 y Fase 2  
Para aprobación de ET  
Incorporación de recursos por  
continuidad 27.04.23.

## C.S. BUENOS AIRES

EN ELABORACION

Inversión: S/. 653,139.00

Con aprobación de Fase 1 y Fase 2  
Para aprobación de ET  
Incorporación de recursos por  
continuidad 27.04.23.

## PIURA

## P.S. TEJEDORES

PARALIZADO

Inversión: S/. 274,099.04

Con Estudios Básico  
Por contratar Fase 1 y 2

## C.S. TAMBOGRANDE

PARALIZADO

Inversión: S/. 288,800.00

Con Estudios Básico  
Por contratar Fase 1 y 2C.S. COMUNIDAD  
SALUDABLE

PARALIZADO

Inversión: S/. 212,712.04

Con Estudios Básico  
Por contratar Fase 1 y 2

## C.S. LA UNION

Exp. Técnico Culminado

Inversión: S/. 20,593,264.76

En solicitud de Financiamiento  
Pendiente priorización 2024

## C.S. LANCONES

Exp. Técnico Culminado

Inversión: S/. 7 060,870.71

En solicitud de Financiamiento  
Pendiente priorización 2024

## C.S. IGNACIO ESCUDERO

Exp. Técnico Culminado

Inversión: S/. 9,723,996.05

En solicitud de Financiamiento  
Pendiente priorización 2024



PERÚ

Ministerio  
de Salud



BICENTENARIO  
DEL PERÚ  
2021 - 2024

---

# Gracias
