

Control a la Reconstrucción con Cambios: Sector Agricultura

Comisión Especial Multipartidaria de Seguimiento al Proceso de Reconstrucción en las zonas afectadas por el Fenómeno del Niño Costero

LUIS PORTUGAL LOZANO
SUBGERENTE DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN



LIMA, 25 DE MARZO DE
2022

Marco normativo



LEY N°30556 (28/04/2017)

Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del gobierno nacional frente a desastres y que dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios.

Artículo 7.4 "...el control gubernamental se realizará de manera simultánea y posterior y está a cargo de la Contraloría General de la República, el cual podrá desarrollarlo directamente o a través de empresas auditoras..."



DECRETO SUPREMO N° 091-2017- PCM (12/09/2017)

Aprueba el Plan de la Reconstrucción al que se refiere la Ley N° 30556, ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, y sus modificatorias.

Marco normativo



LEY N° 30556 25 de abr. 2017

El Control Gubernamental se realiza de manera simultánea y posterior y esta a cargo de la CGR directamente o a través de empresas auditoras.

Resolución de Contraloría N° 361-2017-CG(29/09/2017)

Objetivo: Determinar si las contrataciones de bienes y servicios, consultorías y obras, que se realicen en el marco de la Reconstrucción con Cambios, en las fases de actuaciones preparatorias, procedimientos de selección simplificada y ejecución contractual, cumplen con la normativa establecida.

- Alcance de tres (03) años
- Inversión de S/ 25,655 millones previstos en el PIRCC
- Distribuidas en obras de prevención y desarrollo urbano (S/ 5,446 millones), fortalecimiento de capacidades institucionales (S/ 450 millones) y obras de reconstrucción de infraestructura (S/ 19,759 millones)

Plan de acción de Control de la Reconstrucción con Cambios (2017 - 2020)

Resolución de Contraloría N° 009-2021-CG (14/06/2021)

Objetivo: Establecer la continuidad de la estrategia de control gubernamental que se efectuará a las intervenciones y disposiciones aprobadas del Plan Integral para la RCC.

Plan de Acción de Control de la Reconstrucción con Cambios (2021 – 2022)

- Alcance: 2 años (2021 – 2022)
- Control a las inversiones del PIRCC
- Control al GTG
- Incremento de alcance a través de operativos de control

Plan de la Reconstrucción con Cambios (RCC)

(Decreto Supremo N° 091-2017-PCM (12/09/2019) y Decreto Supremo N° 040-2019-PCM (27/02/2019))

► INVERSIÓN DEL PLAN INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS (PIRC)

En soles / miles de millones

COMPONENTES DE LA RCC CON MONTO DE INVERSIÓN SEGÚN EL PLAN



Total de Inversión **25 655 490**
(100%)



18 505 449

(72%)

Reconstrucción

Nº Intervenciones: **11 480**



5 446 278

(21%)

Construcción

Nº Intervenciones: **31**



1 253 762

(5%)

Soluciones de vivienda

Nº Intervenciones: **48 731**



450 000

(2%)

Fortalecimiento de capacidades

Nº Intervenciones: **2**

Avance de la ejecución del gasto RCC (Febrero 2022)

AVANCE ACUMULADO RESPECTO A LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS

PLAN PIRRC

Transferencia primaria



25 655 491



21 636 843 498

Devengado acumulado



15 062 399 455



69.6 %

Avance acumulado
2017 - Febrero 2022

AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO ACUMULADO

Por año respecto al total del plan

MONTOS EN SOLES

% AVANCE

Plan
PIRCC

25 655 490 785

100%

AÑO	DEVENGADO S/	DEVENGADO ACUMULADO S/	AVANCE
2017	374,660,974	374,660,974	1.5%
2018	1,785,388,494	2,160,049,468	8.4%
2019	3,334,338,992	5,494,388,460	21.4%
2020	3,491,648,708	8,986,037,168	35.0%
2021	5,576,950,388	14,562,987,556	56.8%
2022	499,411,899	15,062,399,455	58.7%

Ejecución presupuestal de la RCC (2017 - Febrero 2022): SECTOR AGRICULTURA

▶ EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

En millones de soles

PLAN PIRCC (ESTIMADO) SECTOR AGRICULTURA	TRANSFERENCIA PRIMARIA 2017 – 2022	DEVENGADO ACUMULADO	AVANCE ACUMULADO 2017 – 2022
6,724,481,722	5,146,897,895	3,380,195,306	65.7%

AÑO	DEVENGADO S/	DEVENGADO ACUMULADO S/
2017	235,719,262	235,719,262
2018	641,721,335	877,440,597
2019	550,799,156	1,428,239,753
2020	661,349,989	2,089,589,741
2021	1,206,155,633	3,295,745,375

Estado situacional de actividades y proyectos por nivel de gobierno del Sector Agricultura de la RCC

ESTADO	GOBIERNO NACIONAL	GOBIERNO REGIONAL	GOBIERNO LOCAL	TOTAL	%
1. ETAPA PREVIA	79	12	103	194	21.0%
2. CON BUENA PRO O CONTRATADO	1	0	14	15	1.6%
3. EN EJECUCIÓN	93	16	92	201	21.8%
4. PARALIZADA	18	4	7	28	3.0%
5. CONTRATO RESUELTO	5	0	4	9	1.0%
6. EN ETAPA DE RECEPCION	11	8	30	49	5.3%
7. CONCLUIDO	85	23	318	427	46.3%
TOTAL	292	63	568	923	100.0%




Actividades y Proyectos por nivel de gobierno del Sector Agricultura

DEPARTAMENTO	GOBIERNO NACIONAL	GOBIERNO REGIONAL	GOBIERNO LOCAL	TOTAL	%
ANCASH	56	2	84	142	15.4%
AREQUIPA	3	0	3	6	0.7%
AYACUCHO	0	0	4	4	0.4%
CAJAMARCA	2	0	1	3	0.3%
HUANCAVELICA	1	1	11	13	1.4%
ICA	19	5	38	62	6.7%
LA LIBERTAD	50	6	65	121	13.1%
LAMBAYEQUE	30	18	20	68	7.4%
LIMA PROVINCIAS	72	6	250	328	35.5%
LORETO	0	0	6	6	0.7%
PIURA	48	23	71	142	15.4%
TUMBES	11	2	15	28	3.0%
TOTAL	292	63	568	923	100.0%

Estado situacional de actividades y proyectos del Sector Agricultura


NIVEL	PROYECTO MONTO Y AVANCE	1.ETAPA PREVIA	2.CON BUENA PRO O CONTRADO	3.EN EJECUCIÓN	4.PARALIZADO	5.CON CONTRATO RESUELTO	6.EN ETAPA DE RECEPCIÓN	7.CONCLUIDO	TOTAL
GOBIERNO NACIONAL	N° Proyectos y Actividades	79	1	93	17	5	11	86	292
	Transferencia primaria S/	961,509,373	1,243,429	747,184,708	51,564,750	17,011,774	126,853,820	1,361,204,394	3,266,572,248
	Devengado acumulado S/	694,813,694	0	506,247,405	24,645,737	11,054,612	112,857,527	848,517,442	2,198,136,417
	Avance	72.3%	0.0%	67.8%	47.8%	65.0%	89.0%	62.3%	67.3%
GOBIERNO REGIONAL	N° Proyectos y Actividades	12	0	16	4	0	8	23	63
	Transferencia primaria S/	151,405,448	0	556,315,225	109,247,451	0	137,930,992	321,509,891	1,276,409,007
	Devengado acumulado S/	126,504,932	0	243,949,250	22,557,800	0	75,946,416	275,456,834	744,415,231
	Avance	83.6%	0.0%	43.9%	20.6%	0.0%	55.1%	85.7%	58.3%
GOBIERNO LOCAL	N° Proyectos y Actividades	103	14	92	7	4	30	318	568
	Transferencia primaria S/	79,347,129	5,130,283	94,328,975	24,329,309	1,593,955	57,135,272	342,051,717	603,916,640
	Devengado acumulado S/	40,544,108	402,735	33,727,414	13,554,605	665,696	54,497,718	294,251,381	437,643,658
	Avance	51.1%	7.9%	35.8%	55.7%	41.8%	95.4%	86.0%	72.5%
TOTAL GENERAL	N° Proyectos y Actividades	194	15	201	28	9	49	427	923
	Transferencia primaria S/	1,192,261,950	6,373,712	1,397,828,908	185,141,510	18,605,729	321,920,084	2,024,766,002	5,146,897,895
	Devengado acumulado S/	861,862,734	402,735	783,924,069	60,758,141	11,720,308	243,301,661	1,418,225,657	3,380,195,306
	Avance	72.3%	6.3%	56.1%	32.8%	63.0%	75.6%	70.0%	65.7%

Análisis Presupuestal de las Intervenciones del Sector Agricultura y Soluciones Integrales



ANÁLISIS PRESUPUESTAL DEL PLAN INTEGRAL DE LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS

Distribución Presupuestal del PIRCC por Componente

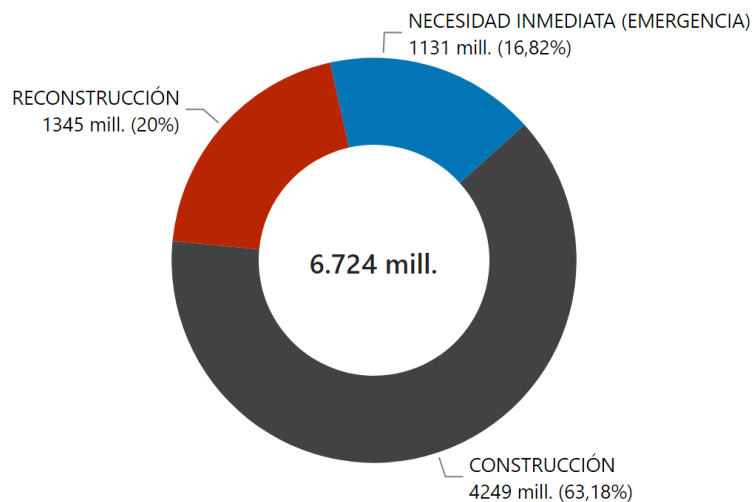

Componente	Nº Interv.	Costo PIRCC Inicial
CONSTRUCCIÓN	65	4.249 mill.
NECESIDAD INMEDIATA (EMERGENCIA)	383	1.131 mill.
RECONSTRUCCIÓN	1.253	1.345 mill.
Total	1.701	6.724 mill.

Distribución Presupuestal del PIRCC por Nivel de Gobierno


Nivel de Gobierno	Nº Interv.	Costo PIRCC Inicial
1 GOBIERNO NACIONAL	1.690	4.545 mill.
2 GOBIERNO REGIONAL	11	2.180 mill.
Total	1.701	6.724 mill.

Distribución Presupuestal del PIRCC por Componente y Sector

Componente / Sector	Nº Interv.	Costo PIRCC Inicial
CONSTRUCCIÓN	65	4.249 mill.
SOLUCIONES INTEGRALES	65	4.249 mill.
NECESIDAD INMEDIATA (EMERGENCIA)	383	1.131 mill.
AGRICULTURA	267	1.055 mill.
CONSTRUCCIÓN - INTERV. CORTO PLAZO	116	76 mill.
RECONSTRUCCIÓN	1.253	1.345 mill.
AGRICULTURA	1.253	1.345 mill.
Total	1.701	6.724 mill.


ANÁLISIS DE LAS EJECUTORAS DEL PLAN INTEGRAL DE LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS

Número de Ejecutoras del PIRCC Inicial

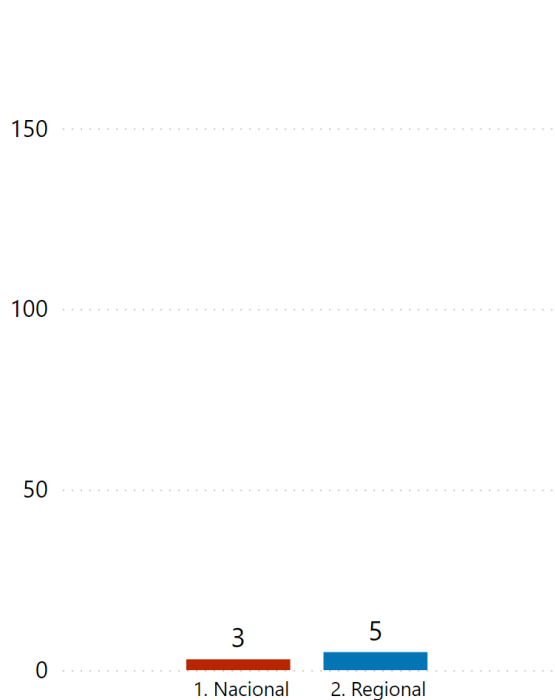

Nivel de Gobierno		Total
1. Nacional	2. Regional	
3	5	8

Número de Ejecutoras del PIRCC Vigente

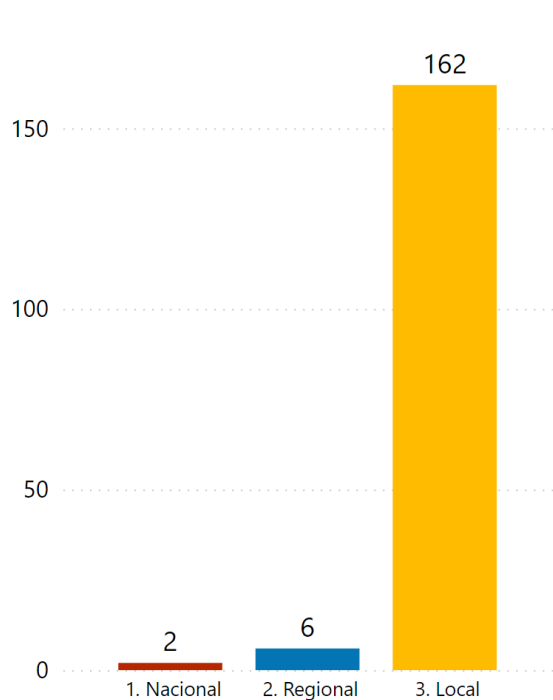

Nivel de Gobierno			Total
1. Nacional	2. Regional	3. Local	
2	6	162	170

NORMATIVAS DE CAMBIO DE E.E.


Año	Cant.
2018	168
D.S. N° 027-2018-PCM	144
RDE 054-2018-RCC/DE	24
2019	590
RDE 008-2019-RCC/DE	339
RDE 054-2019-RCC/DE	221
RDE 064-2019-RCC/DE	27
RDE 069-2019-RCC/DE	2
RDE 074-2019-RCC/DE	1
2020	12
R.D.E N° 037-2020	1
RDE 00128-2020-ARCC/DE	1
RDE 00179-2020-ARCC/DE	2
RDE 026-2020-RCC/DE	2
RDE 058-2020-ARCC/DE	1
RDE 098-2020-RCC/DE	1
RDE 161-2020-ARCC/DE	4
2021	170
RDE N° 00024-2021-ARCC/DE	1
RDE N° 00037-2021-ARCC/DE	2
RDE N° 00062-2021-ARCC/DE	11
RDE N° 00072-2021-ARCC/DE	42
RDE N° 00087-2021-ARCC/DE	41
RDE N° 00124-2021-ARCC/DE	52
RDE N° 00139-2021-ARCC/DE	21
2022	9
RDE N° 007-2022-ARCC/DE	9
Total	949

GESTIÓN DEL PIRCC - VARIACIÓN PRESUPUESTAL POR INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN DE INTERVENCIONES


Normativas de inclusiones y exclusiones de intervenciones

Año	Inicial	Inclusiones	Exclusiones
2017	1.253	570	
D.S. N° 091-2017-PCM	1.253		
D.S. N° 116-2017-PCM		570	
2018		55	111
RDE 055-2018-RCC/DE		55	111
2019			16
RDE 124-2019-RCC/DE			16
2020			8
RDE 003-2020-RCC/DE			1
RDE 026-2020-RCC/DE			4
RDE 082-2020-RCC/DE			2
RDE 098-2020-RCC/DE			1
2021			2
RDE N° 00016-2021-ARCC/DE			1
RDE N° 00124-2021-ARCC/DE			1
2022			4
RDE N° 007-2022-ARCC/DE			4
Total	1.253	625	141

Inclusiones y exclusiones de Intervenciones del PIRCC

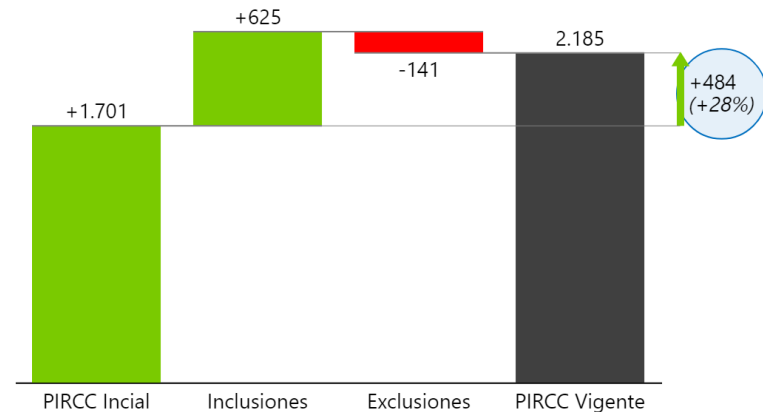


Variación presupuestal por inclusiones y exclusiones

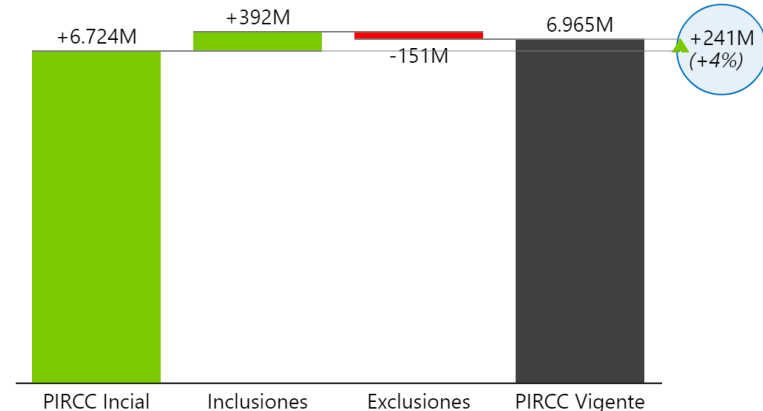


GESTIÓN DEL PIRCC - CAMBIO DE ENTIDADES EJECUTORAS

Intervenciones del PIRCC Inicial por Nivel de Gobierno

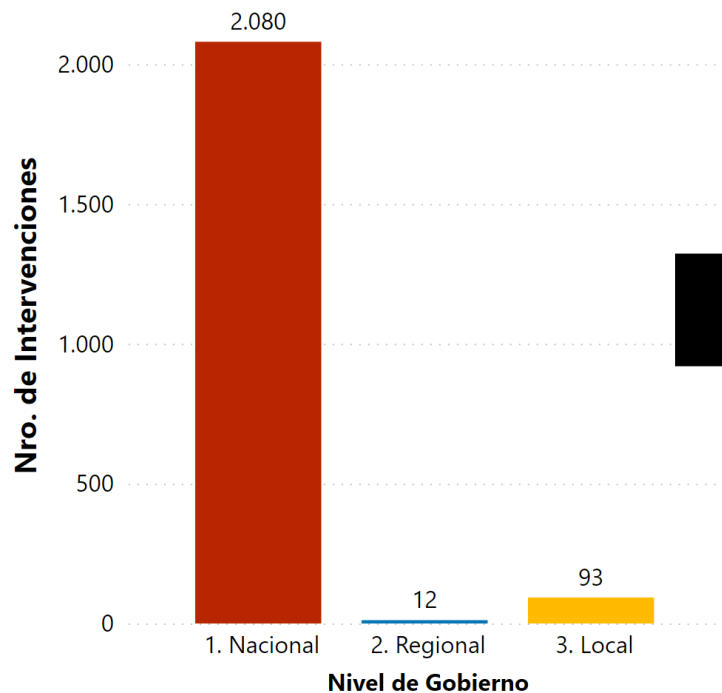

	Nivel de Gobierno			Total
	1. Nacional	2. Regional	3. Local	
Nº Intervenciones	2.080	12	93	2.185
%	95%	1%	4%	100%


Intervenciones del PIRCC Vigente por Nivel de Gobierno

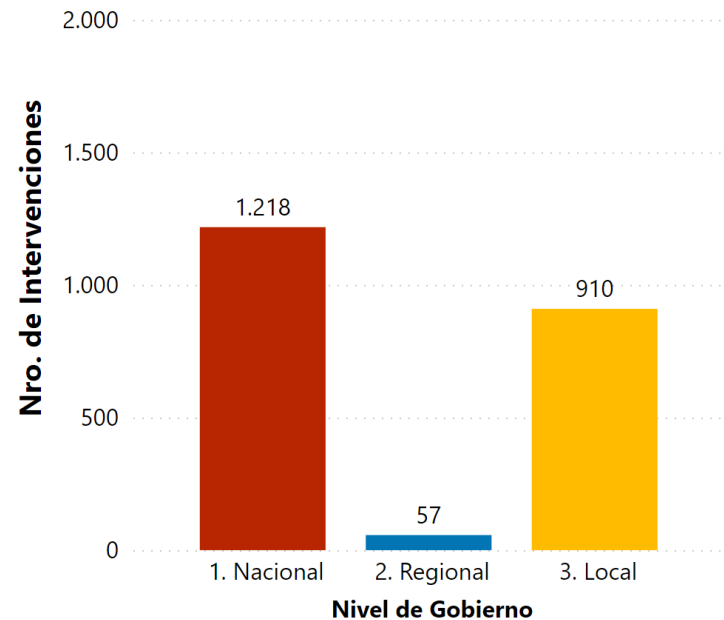


	Nivel de Gobierno			Total
	1. Nacional	2. Regional	3. Local	
Nº Intervenciones	1.218	57	910	2.185
%	56%	3%	42%	100%

GESTIÓN DEL PIRCC - DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAMBIO DE ENTIDADES EJECUTORAS

Costo del PIRCC Inicial por niveles de Gobierno

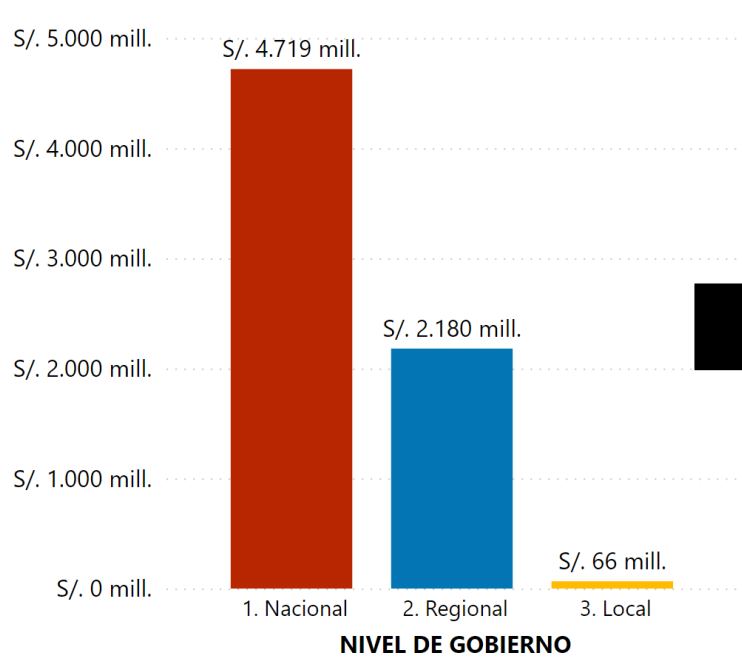

Costo del PIRCC Vigente por niveles de Gobierno

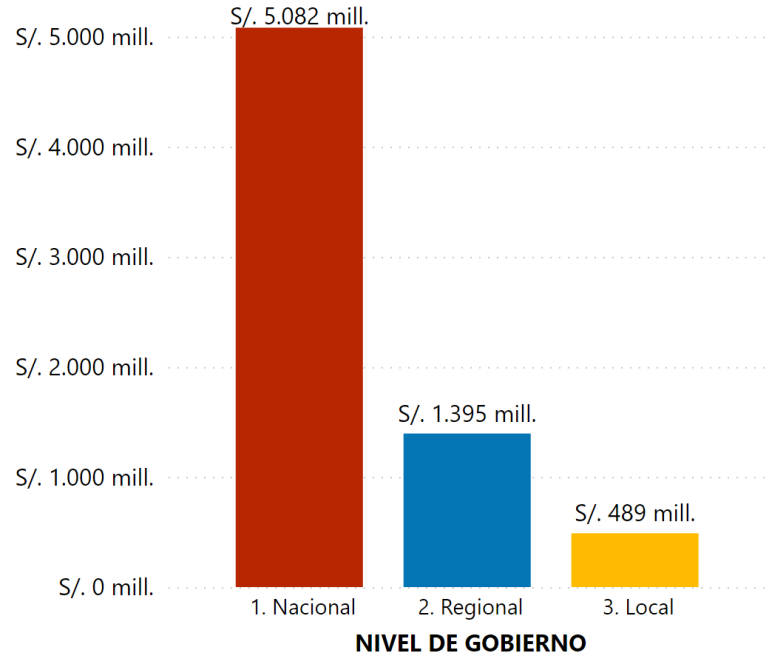


	Nivel de Gobierno			Total
	1. Nacional	2. Regional	3. Local	
Costo	S/. 4.719 mill.	S/. 2.180 mill.	S/. 66 mill.	S/. 6.965 mill.
%	68%	31%	1%	100%

	Nivel de Gobierno			Total
	1. Nacional	2. Regional	3. Local	
Costo	S/. 5.082 mill.	S/. 1.395 mill.	S/. 489 mill.	S/. 6.965 mill.
%	73%	20%	7%	100%


INTERVENCIONES FINANCIADAS DEL SECTOR AGRICULTURA Y SU VARIACIÓN DE COSTOS

Numero de Intervenciones por estado de Financiamiento

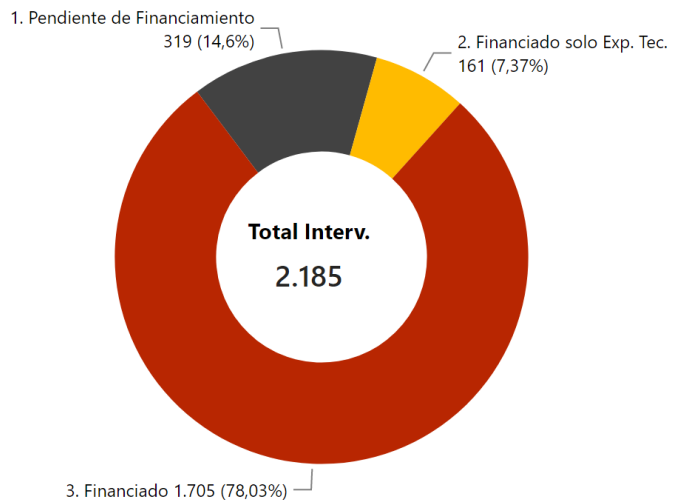

Estado	Nro. Interv.	Nº Proy.	Costo PIRCC Vigente	% de Interv. Financ.
1. Pendiente de Financiamiento	319	0	S/. 369 mill.	15%
2. Financiado solo Exp. Tec.	161	2	S/. 546 mill.	7%
3. Financiado	1.705	923	S/. 6.051 mill.	78%
Total	2.185	925	S/. 6.965 mill.	100%


Variación Presupuestal de las Intervenciones Financiad

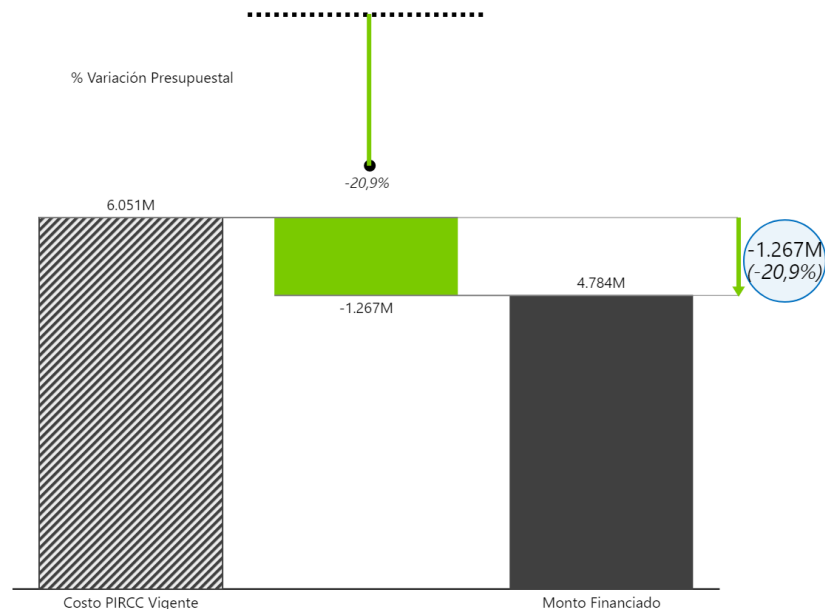

Estado	Nro. Interv.	Nº Proy.	Costo PIRCC Vigente	Monto Financiado	% Var. Fto.	Diferencia
3. Financiado	1.705	923	S/. 6.051 mill.	S/ 4.784 mill.	-20,9 %	-S/ 1.267 mill.
Total	1.705	923	S/. 6.051 mill.	S/ 4.784 mill.	-20,9 %	-S/ 1.267 mill.


INTERVENCIONES FINANCIADAS DEL COMPONENTE RECONSTRUCCIÓN Y SU VARIACIÓN DE COSTOS

Numero de Intervenciones por estado de Financiamiento

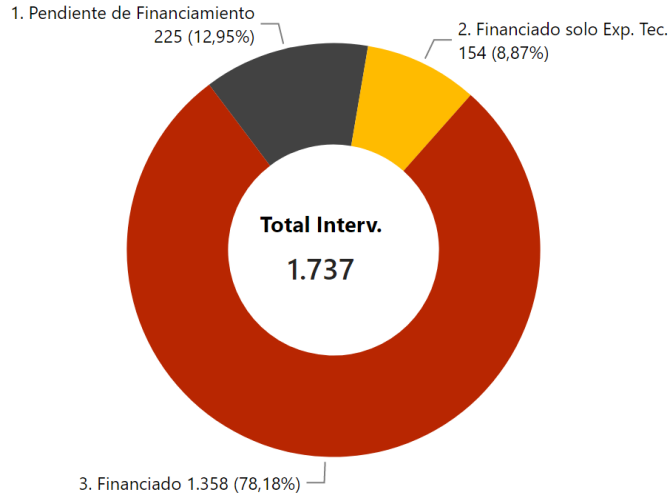

Estado	Nro. Interv.	Nº Proy.	Costo PIRCC Vigente	% de Interv. Financ.
1. Pendiente de Financiamiento	225	0	S/. 95 mill.	13%
2. Financiado solo Exp. Tec.	154	2	S/. 354 mill.	9%
3. Financiado	1.358	723	S/. 1.137 mill.	78%
Total	1.737	725	S/. 1.585 mill.	100%


Variación Presupuestal de las Intervenciones Financieras

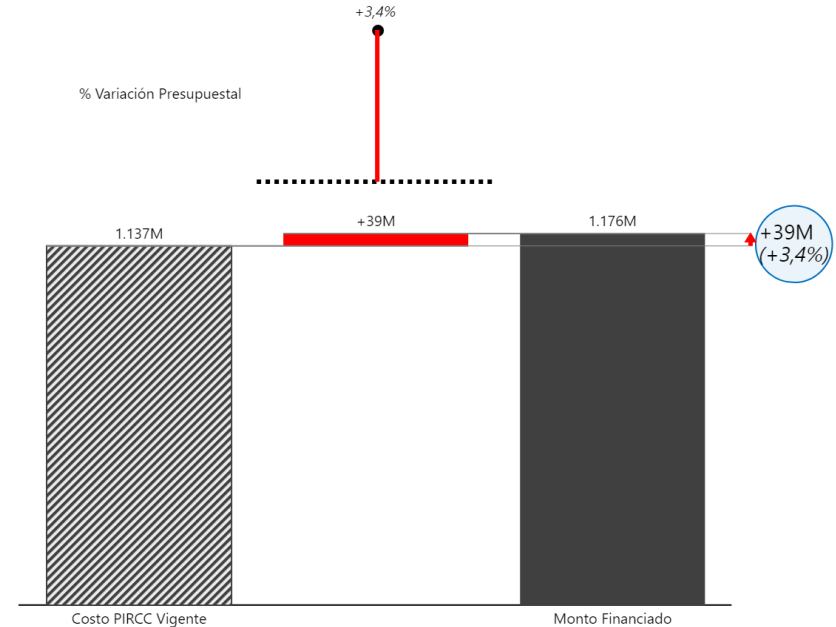

Estado	Nro. Interv.	Nº Proy.	Costo PIRCC Vigente	Monto Financiado	% Var. Fto.	Diferencia
3. Financiado	1.358	723	S/. 1.137 mill.	S/ 1.176 mill.	3,4 %	S/ 39 mill.
Total	1.358	723	S/. 1.137 mill.	S/ 1.176 mill.	3,4 %	S/ 39 mill.

INTERVENCIONES FINANCIADAS DEL COMPONENTE CONSTRUCCIÓN Y SU VARIACIÓN DE COSTOS


Numero de Intervenciones por estado de Financiamiento

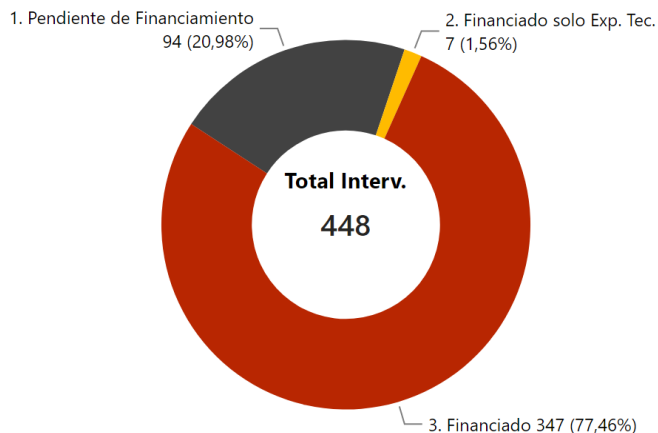

COMPONENTE	Estado	Nro. Interv.	Nº Proy.	Costo PIRCC Vigente	% de Interv. Financ.
CONSTRUCCIÓN	1. Pendiente de Financiamiento	26	0	S/. 251 mill.	6%
	2. Financiado solo Exp. Tec.	6	0	S/. 149 mill.	1%
	3. Financiado	33	74	S/. 3.848 mill.	7%
	Total	65	74	S/. 4.249 mill.	15%
NECESIDAD INMEDIATA (EMERGENCIA)	1. Pendiente de Financiamiento	68	0	S/. 22 mill.	15%
	2. Financiado solo Exp. Tec.	1	0	S/. 43 mill.	0%
	3. Financiado	314	126	S/. 1.066 mill.	70%
	Total	383	126	S/. 1.131 mill.	85%
Total		448	200	S/. 5.380 mill.	100%



Saldo presupuestal para la implementación de Sol. Int.

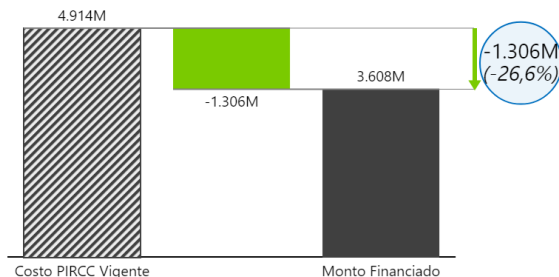


A febrero del 2022, de los siete tipos de intervención solo se han financiado proyectos que atienden la construcción de defensas (riberneas barreras dinámicas) y 2 sistemas alerta tempranas; por lo tanto, los saldos de los techos presupuestales serían insuficiente para implementar todas las Soluciones Integrales..

COMPONENTE	Estado	Nro. Interv.	Nº Proy.	Costo PIRCC Vigente	Monto Financiado	% Ava. Trans.	Saldo
CONSTRUCCIÓN	3. Financiado	33	74	S/. 3.848 mill.	S/ 2.542 mill.	66,1 %	S/ 1.306 mill.
NECESIDAD INMEDIATA (EMERGENCIA)	3. Financiado	314	126	S/. 1.066 mill.	S/ 1.066 mill.	100,0 %	-S/ 0 mill.
Total		347	200	S/. 4.914 mill.	S/ 3.608 mill.	73,4 %	S/ 1.306 mill.


ANÁLISIS DE VARIACIÓN DE COSTOS DE LAS INTERVENCIONES FINANCIADAS POR NIVEL DE GOBIERNO

Financiamiento por Nivel de Gobierno	Nro. Interv.	Nº Proy.	Costo PIRCC Vigente	Monto Financiado	% Var. Fto.	Diferencia
3. Financiado	1.672	849	S/. 2.203 mill.	S/ 2.242 mill.	1,8 %	S/ 39 mill.
2 GOBIERNO REGIONAL	26	26	S/. 231 mill.	S/ 208 mill.	-9,8 %	-S/ 23 mill.
3 GOBIERNO LOCAL	715	460	S/. 315 mill.	S/ 468 mill.	48,6 %	S/ 153 mill.
1 GOBIERNO NACIONAL	931	363	S/. 1.657 mill.	S/ 1.566 mill.	-5,5 %	-S/ 91 mill.
Total	1.672	849	S/. 2.203 mill.	S/ 2.242 mill.	1,8 %	S/ 39 mill.


1. Nacional

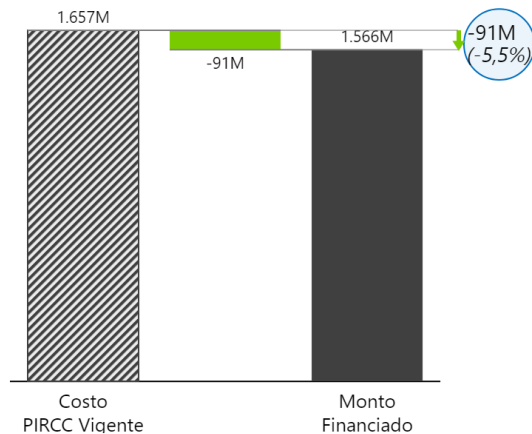

3. Local




2. Regional




ANÁLISIS DE VARIACIÓN DE COSTOS DE LAS INTERVENCIONES FINANCIADAS POR REGIÓN

Estado / Región	Nro. Interv.	Nº Proy.	Costo PIRCC Vigente	Monto Financiado	% Var. Fto.	Diferencia
3. Financiado	1.672	849	S/. 2.203 mill.	S/ 2.242 mill.	1,8 %	S/ 39 mill.
PIURA	599	122	S/. 989 mill.	S/ 917 mill.	-7,3 %	-S/ 72 mill.
LA LIBERTAD	148	97	S/. 328 mill.	S/ 385 mill.	17,4 %	S/ 57 mill.
ANCASH	187	178	S/. 288 mill.	S/ 279 mill.	-3,1 %	-S/ 9 mill.
LAMBAYEQUE	107	66	S/. 193 mill.	S/ 208 mill.	7,9 %	S/ 15 mill.
TUMBES	32	17	S/. 186 mill.	S/ 151 mill.	-18,8 %	-S/ 35 mill.
LIMA PROVINCIAS	395	262	S/. 84 mill.	S/ 126 mill.	49,7 %	S/ 42 mill.
ICA	83	57	S/. 68 mill.	S/ 95 mill.	40,0 %	S/ 27 mill.
LIMA	48	23	S/. 31 mill.	S/ 41 mill.	33,1 %	S/ 10 mill.
CAJAMARCA	36	1	S/. 13 mill.	S/ 12 mill.	-13,4 %	-S/ 2 mill.
AYACUCHO	12	4	S/. 11 mill.	S/ 10 mill.	-9,4 %	-S/ 1 mill.
HUANCAVELICA	12	11	S/. 5 mill.	S/ 9 mill.	62,9 %	S/ 3 mill.
AREQUIPA	7	5	S/. 4 mill.	S/ 6 mill.	76,3 %	S/ 3 mill.
LORETO	6	6	S/. 3 mill.	S/ 3 mill.	0,0 %	S/ 0 mill.
Total	1.672	849	S/. 2.203 mill.	S/ 2.242 mill.	1,8 %	S/ 39 mill.


PIURA




LA LIBERTAD




ANCASH




LAMBAYEQUE




TUMBES




LIMA PROVINCIAS




ICA




LIMA



CAJAMARCA




AYACUCHO




HUANCAVELICA



AREQUIPA




LORETO



Fuente: (1) PIRCC, (2) Normativas de inclusiones, exclusiones (3) normativas de transferencias pptal (4) Respuesta al Oficio 059-2021 (5)Aplicativo Monitor ARCC al 28.02.2022

ANÁLISIS DEL REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN AL 100% DE LAS INTERVENCIONES

COMPONENTE RECONSTRUCCIÓN

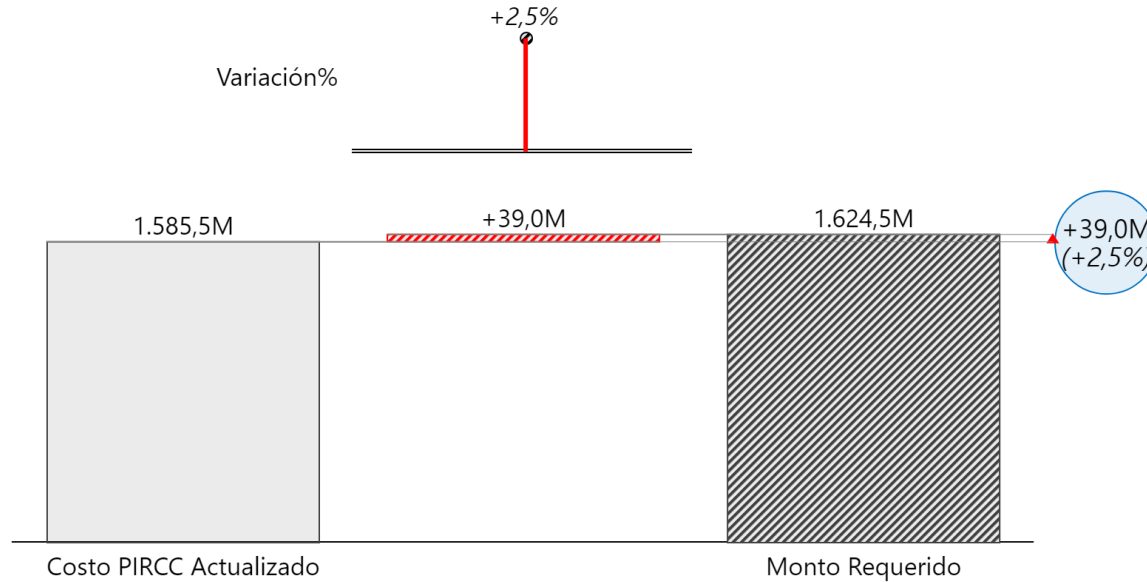

Estado Intervención	Nro. Interv. Inicial	Costo PIRCC Inicial	Nro. Interv. Vigente	Nº Proy.	Costo PIRCC Vigente	Monto Financiado (S/)	Monto Requerido (S/)
1. Pendiente de Financiamiento	270	S/ 181 mill.	225	0	S/ 95 mill.		S/ 95 mill.
2. Financiado solo Exp. Tec.	155	S/ 370 mill.	154	2	S/ 354 mill.		S/ 354 mill.
3. Financiado	828	S/ 794 mill.	1.358	723	S/ 1.137 mill.	S/ 1.176 mill.	S/ 1.176 mill.
Total	1.253	S/ 1.345 mill.	1.737	725	S/ 1.585 mill.	S/ 1.176 mill.	S/ 1.624 mill.

**Control a la reconstrucción
con cambios**

SECTOR AGRICULTURA

Estrategia de Control a la Reconstrucción con Cambios

1

PREVENCIÓN

OBJETIVO PRINCIPAL

Contribuir a la implementación eficiente de la Infraestructura Preventiva.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Verificar la ejecución de las soluciones integrales para el control de inundaciones
- Supervisar la implementación de infraestructura preventiva complementaria.

2

RESTABLECIMIENTO

OBJETIVO PRINCIPAL

Coadyuvar a la ejecución de inversiones de reconstrucción de infraestructura afectada.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Supervisar la ejecución de inversiones de reconstrucción de infraestructura vial.
- Verificar la ejecución de la reconstrucción de infraestructura para la prestación de servicios de saneamiento, así como de reconstrucción viviendas.
- Controlar la ejecución de inversiones para la reconstrucción de infraestructura educativa afectada.
- Supervisar la ejecución de inversiones para la reconstrucción de infraestructura de salud afectada.

3

CONTINUIDAD

OBJETIVO PRINCIPAL

Vigilar la operación de los servicios implementados y repuestos



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Verificar las contrataciones y distribución de bienes en el marco de la vigilancia epidemiológica e investigación de casos COVID-19.
- Supervisar las medidas de distanciamiento, aislamiento e inmovilización social.

Resumen de servicios de control Febrero 2022

► INFORMES

MODALIDAD DE CONTROL	2017	2018	2019	2020	2021	2022	TOTAL	%
CONTROL POSTERIOR	0	0	10	8	14	1	33	3.9%
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO	0	0	3	3	5	0	11	33.3%
CONTROL ESPECIFICO	0	0	7	5	9	1	22	66.7%
CONTROL SIMULTANEO	64	252	142	169	176	7	810	96.1%
CONTROL CONCURRENTE	56	246	122	113	158	6	701	86.5%
ORIENTACIÓN DE OFICIO	0	0	18	30	6	1	55	6.8%
VISITA DE CONTROL	1	6	2	26	12	0	47	5.8%
VISITA PREVENTIVA	7	0	0	0	0	0	7	0.9%
TOTAL	64	252	152	177	190	8	843	100.0%

SITUACIONES ADVERSAS

ETAPA	2017	2018	2019	2020	2021	2022	TOTAL	%
EJECUCIÓN CONTRACTUAL	73	284	215	335	301	6	1214	74.2%
PROCESO DE SELECCIÓN	66	120	81	81	67	8	423	25.8%
TOTAL	139	404	296	416	368	14	1637	100.0%

ESTADO SITUACIONES ADVERSAS

ESTADO	SITUACIONES ADVERSAS	%
CORREGIDO	506	30.9%
DESESTIMADO	155	9.5%
EN PROCESO	131	8.0%
NO CORREGIDO	208	12.7%
SIN ACCIONES	637	38.9%
TOTAL	1637	100.0%

Resumen de servicios de control **Febrero 2022**

▶ **PERJUICIO ECONÓMICO**

ENTIDAD	PERJUICIO ECONÓMICO S/
PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES-PSI	12,977,957
DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA DE LIMA	5,906,409
PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL	4,988,606
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA	4,871,587
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA	2,271,467
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA	2,160,443
PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA	2,016,929
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CRISTO NOS VALGA	1,964,694
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAREDO	1,029,741
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCHACO	864,743
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYÁN	496,672
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA	445,868
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANTA	379,437
MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO	39,688
TOTAL	40,414,241

Resumen de servicios de control Febrero 2022

► FUNCIONARIOS

ENTIDAD AUDITADA	FUNCIONARIOS CON RESPONSABILIDAD
PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES-PSI	37
DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA DE LIMA	17
MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO	15
PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL	11
PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA	8
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA	7
GOBIERNO REGIONAL PIURA	7
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCHACO	6
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA	5
GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA LAMBAYEQUE	4
PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL PUYANGO - TUMBES	4
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYÁN	4
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANTA	3
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA	3
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CRISTO NOS VALGA	3
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURA MORI	3
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA	2
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAREDO	2
TOTAL	134

Resumen de servicios de control Febrero 2022

► TIPO DE RESPONSABILIDAD

ENTIDAD AUDITADA	ADMINISTRATIVA	CIVIL	PENAL	TOTAL
PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES-PSI	44	13	13	70
DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA DE LIMA	31	0	17	48
MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO	10	11	8	29
PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA	18	0	11	29
PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL	10	13	0	23
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA	8	0	9	17
GOBIERNO REGIONAL PIURA	9	0	5	14
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA	8	2	3	13
GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA LAMBAYEQUE	8	0	5	13
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CRISTO NOS VALGA	5	0	5	10
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYÁN	8	0	2	10
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCHACO	6	3	0	9
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAREDO	4	0	4	8
PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL PUYANGO - TUMBES	4	0	3	7
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA	3	0	3	6
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANTA	3	0	3	6
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURA MORI	2	0	3	5
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA	1	0	1	2
TOTAL	182	42	95	319

Principales situaciones adversas comunicadas:

Relacionado al tiempo de ejecución:

- Retraso en el inicio y culminación de las obras por limitaciones relacionadas con la disponibilidad del terreno.
- Demora en la ejecución de trabajos por parte del contratista relacionado con la disponibilidad del equipamiento ofertado, lo que limita el logro de los objetivos previstos en el contrato.
- Deficiencias o demoras en la aprobación de las fichas técnicas de prevención que posterga la ejecución de las intervenciones genera ampliaciones de plazo para la ejecución de los trabajos
- Incumplimiento de condiciones contractuales por parte de la entidad que posterga la ejecución de las obras.
- Retrasos en los trabajos de obra de acuerdo a contrato (partidas no ejecutadas o parcialmente ejecutadas sin el sustento debido).

Relacionado al costo:

- Aprobación de adicionales de obra sin sustento técnico legal o sobreestimaciones de metas ejecutadas propician pagos por servicios no realizados.
- Inconsistencia entre avance físico y valorizado denotaría una ejecución del servicio al margen de las características técnicas previstas y pagos por servicios no realizados.

Relacionado a la calidad:

- Prestación del servicio sin personal y maquinaria ofertada incide en la culminación del servicio sin la calidad prevista.
- Limitada supervisión o retraso en la presentación de informes de supervisión propicia adopción no oportuna de acciones que garanticen el cumplimiento de los trabajos de acuerdo a las características previstas en el contrato.
- Deficiencias en el procedimiento de selección afecta la transparencia/igualdad de trato/ libre concurrencia que rige las contrataciones y propicia incumplimientos contractuales de acuerdo a los objetivos previstos.
- Información desactualizada (SEACE-SNIP-INFOBRAS, etc.) en los sistemas limita la supervisión, controles técnicos y transparencia de los procesos en curso.
- Incumplimiento en el uso o falta de actualización de registros en cuadernos de obra, limita la adecuada supervisión de la misma.

SOLUCIONES INTEGRALES

CARTERA	N°	Región	Intervención
Cuencas			
	1	Tumbes	Río Tumbes
	2	Piura	Río Piura
	3	Lambayeque	Río Olmos
	4		Río Motupe
	5		Río La Leche
	6		Río Chancay
	7		Río Zaña
	8	La Libertad	Río Chicama
	9		Río Virú
	10	Ancash	Río Lacramarca
	11		Río Casma
	12		Río Huarmey
	13	Lima	Río Huaura
	14		Río Cañete
	15		Río Rímac
	16		Río Mala
	17	Ica	Río Matagente
Quebradas			
	1	La Libertad	Quebrada San Ildefonso
	2		Quebrada San Carlos
	3		Quebrada El León
	4	Lima	Quebrada Huaycoloro
	5	Ica	Quebrada Cansas
Drenajes			
	1	Tumbes	Drenaje pluvial ciudad de Tumbes
	2	Piura	Drenaje pluvial ciudad de Piura
	3		Drenaje pluvial ciudad de Sullana
	4		Drenaje pluvial ciudad de Paita
	5		Drenaje pluvial ciudad de Talara
	6	Lambayeque	Drenaje pluvial ciudad de Chiclayo
	7	La Libertad	Drenaje pluvial ciudad de Trujillo

Cada una de las **29 intervenciones de Soluciones Integrales** se componen de:

- Sistemas de Alerta Temprana (SAT)
- Componente A: diques, defensas ribereñas, sistema de drenaje
- Componente B: embalses de regulación.
- Componente C: reforestación, alertas tempranas.

Sumando un total de **80 proyectos**.

Componente	(17) Ríos	(5) Quebradas	(7) Drenajes	TOTAL
SAT	17	1	-	18
Componente A	17	5	7	29
Componente B	16	-	-	16
Componente C	17	-	-	17
TOTAL	67	6	7	80

Para las 80 intervenciones se tiene:

Contratos Suscritos: 26

- SAT : 10
- Componente A: 16

En Proceso de Procura: 14

- Componente A : 5
- Componente C : 9

Pendiente Procura: 40

- SAT: 8
- Componente A : 8
- **Componente B : 16**
- **Componente C : 8**

El Monto estimado de la Cartera Soluciones Integrales es de **S/ 8 054,1** millones inc. IGV.

El monto corresponde sólo a **39 proyectos** declarados viables, incorporados en la Línea Base actualizada a febrero 2022.

Estado Situacional (26 Proyectos Contratados):

- Se tiene avance real de **2,94%** versus el **9,35%** planeado.
- Se ha desembolsado **S/ 698,0** millones correspondiente a trabajos del Componente A y SAT.

COMPONENTE A - SOLUCIONES INTEGRALES

COMPONENTE A - PROYECTOS CONTRATADOS

Monto de inversión según Banco de Inversiones	S/ 4 880,6 millones inc. IGV
Contratista Soluciones Integrales	10 Contratos NEC3 ECC - opción F (gestión)
Alcance	Diseño y ejecución de Diques, defensas ribereñas, entre otros trabajos para 13 ríos, y 3 quebradas.
Subcontratistas	Contratos NEC3 opción A, principalmente
Supervisor de Calidad	4 Contratos de Consultoría - paquete 3, 4, 5 y 6
Monto desembolsado	S/ 689,2 millones inc. IGV

Estado Situacional

- **16 de 29** proyectos contratados (componente A).
- **Un (1) Proyecto** ya inició construcción.
- Los proyectos contratados presentan un avance de **2,83%** versus el **9,48%** de avance planeado.

Nota:

Los montos expresados se encuentran actualizados al mes de febrero de 2022.
Fuente: Plataforma Power BI de la ARCC.

Contratos Componente A (NEC3 SCC – opción F)



PQ	Intervención	Contrato (S/ millones)	Tarifa – Fee (%) (S/ Millones)	Contratista	Plazo Contractual	
					Inicio	Cierre Comercial Final (CCF) (*)
2	Río Tumbes	457,9	11,00% (S/ 50,4)	Consorcio Besalco – Stracon	20/03/21	17/11/23
3	Río La Leche	243,9	13,26% (S/ 32,3)	Consorcio Rios del Norte - Saceem SA sucursal del Perú - Guintoli	31/12/20	25/02/24
	Río Motupe	153,5	13,26% (S/ 20,4)			25/08/23
4	Río Huarmey	545,5	9,25% (S/ 50,5)	OHL Sucursal del Perú	27/05/21	17/01/24
	Río Casma	214,4	9,25% (S/ 19,8)			17/01/23
5	Río Cañete	228,4	9,99% (S/ 22,8)	OHL Sucursal del Perú	16/03/21	23/08/23
	Río Huara	113,9	9,99% (S/ 11,4)			25/05/23
6	Río Matagente	279,1	14,54% (S/ 40,6)	Consorcio ICAFAL-FLESAN	24/12/20	25/10/23
R-06	Río Chicama	291,3	9,25% (S/ 27,7)	OHL Sucursal del Perú	12/06/21	29/01/24
	Río Viru	239,2	9,25% (S/ 22,7)			29/05/23
R-07	Río Lacramarca	377,8	9,25% (S/ 34,9)	OHL Sucursal del Perú	12/06/21	28/04/23
Q-02	Q. El León	473,3	9,25% (S/ 49,7)	Consorcio Besalco - Stracon	05/06/21	29/01/23
1	Q. San Carlos	184,4	12,00% (S/ 22,1)	Consorcio Besalco - Stracon	09/04/21	02/12/23
	Q. San Ildefonso	179,3	12,00% (S/ 21,5)			02/12/23
R-08	Río Olmos	202,7	11,00 % (S/ 22,3)	Consorcio Rovella – Inmac - Inmac Perú SAC - Rovella Carranza SA	26/02/22	13/10/24
	Río Zaña	136,5	11,00 % (S/ 15,0)			26/02/22

COMPONENTE A

4321,1

Nota:

(*) Cierre Comercial Final (CCF).

El monto de la Tarifa Fee consignado es referencial, y ha sido calculado en base al monto contractual.

Contrato de Supervisión de Calidad



PQ	Intervención	Contrato (\$/ millones)	Supervisor de Calidad	Plazo Contractual	
				Inicio	Fin
2	Rio Tumbes	-	-	-	-
3	Rio La Leche Río Motupe	4,1	Consortio Supervisor ARCC - César Fernando Tapia Julca - Julián Jesús Mendoza Flores	04/10/21	04/04/25
4	Río Huarmey Río Casma	5,7	Acruta & Tapia Ingenieros SAC	07/02/22	07/02/25
5	Río Cañete Río Huara	6,4	Acruta & Tapia Ingenieros SAC	10/02/2022	01/11/24
6	Río Matagente	2,9	Consortio Supervisor Matagente - Gexa Ingenieros SAC - Servicios de Ingeniería y Construcción SAS Sucursal del Perú – SERVINC SAS - Proviaal Ingeniería SAC	02/09/21	22/10/23
R-06	Río Chicama Río Viru	-	-	-	-
R-07	Río Lacramarca	-	-	-	-
Q-02	Q. El León	-	-	-	-
1	Q. San Carlos Q. San Ildefonso	-	-	-	-
R-08	Olmos Zaña	-	-	-	-

19,1

COMPONENTE A

Estado Situacional - Avance Físico

PQ	Intervención	Componente	Avance		Cierre Comercial Final (CCF) Contractual	Cierre Comercial Final (CCF) Estimado por Contratista
			Planeado	Real		
2	Río Tumbes	A	7,8%	2,9%	19/11/23	19/11/23
3	Río La Leche	A	26,5%	8,4%	24/02/24	24/02/24
	Río Motupe	A	35,1%	6,3%	25/08/23	25/08/23
4	Río Huarmey	A	4,6%	2,9%	17/01/24	17/01/24
	Río Casma	A	18,3%	4,8%	17/01/23	17/01/23
5	Río Cañete	A	20,3%	2,4%	23/08/23	13/06/24
	Río Huara	A	18,7%	5,8%	25/05/23	13/03/24
6	Río Matagente	A	31,3%	6,4%	25/10/23	25/10/23
R-06	Río Chicama	A	4,9%	2,1%	29/01/24	29/01/24
	Río Viru	A	13,0%	4,9%	29/05/23	29/05/23
R-07	Río Lacramarca	A	6,6%	5,0%	28/04/23	01/09/23
Q-02	Q. El León	A	16,4%	5,6%	29/01/23	29/01/23
1	Q. San Carlos	A	13,8%	4,2%	25/11/23	25/11/23
	Q. San Ildefonso	A	12,9%	4,0%	25/11/23	25/11/23

Nota:

1. El **Avance Planeado**, corresponde al avance planificado en el Baseline aprobado en febrero 2021.
2. El **Avance Real**, corresponde a las avance de las actividades valorizadas y pagadas.
3. La **Fecha de Cierre Comercial Contractual**, corresponde al plazo señalado en el Contrato NEC suscrito.
4. La **Fecha de Culminación estimada por el Contratista**, corresponde a las estimaciones del Contratista.

Estado Situacional - Avance Financiero



PQ	Intervención	Componente	Presupuesto		Desembolso acumulado (S/ millones)
			Viable (S/ millones)	Actual (S/ millones)	
2	Río Tumbes	A	535,6	565,1	96,3
3	Río La Leche	A	320,2	340,3	19,5
	Río Motupe	A	218,5	231,5	12,7
4	Río Huarmey	A	585,5	604,4	109,7
	Río Casma	A	243,1	257,5	49,9
5	Río Cañete	A	236,5	249,4	46,2
	Río Huara	A	151,6	158,9	27,6
6	Río Matagente	A	324,3	337,7	16,2
R-06	Río Chicama	A	324,9	340,4	55,4
	Río Viru	A	299,8	308,4	15,0
R-07	Río Lacramarca	A	463,0	475,2	77,0
Q-02	Q. El León	A	509,5	545,2	86,9
1	Q. San Carlos	A	221,1	233,7	40,5
	Q. San Ildefonso	A	222,1	232,9	31,9
			4655,7	4880,6	684,8

Nota:

1. El **Presupuesto Viable**, corresponde al presupuesto aprobado a la viabilidad: **S/ 4,655.7 Millones.**
2. El **Presupuesto Actual**, corresponde a las variaciones al presupuesto viable, entre otros, por el impacto por eventos compensables y/o instrucciones del Gerente de Proyecto: **S/ 4,880.6 Millones**
3. El **Monto Desembolsado**, corresponde a los pagos acumulados realizados por la ARCC a favor del Contratista Gestor a enero de 2022: **S/ 684.8 Millones**

Nota:

Fuente: Plataforma del Invierte.pe, consulta realizada el 14 de marzo de 2022. Plataforma Power BI, información a febrero de 2022.

SISTEMAS DE ALERTA TEMPRANA (SAT) PARA LAS SOLUCIONES INTEGRALES

SAT de las Soluciones Integrales

Monto de inversión del SAT según Banco de Inversiones	S/ 154,4 millones inc. IGV
Contratista Sistema de Alerta Temprana (SAT)	1 Contrato NEC3 ECC - opción A (precio objetivo con cronograma de actividades).
Monto del Contrato	US\$ 8,4 millones
Alcance	Corresponde a la Etapa 1: Diseño definitivo (expediente técnico) de los SAT para 9 ríos y 1 quebrada; y, adquisición de dos (2) radares.
Plazo Contractual	Hasta noviembre de 2022.
Monto desembolsado	S/ 8,9 millones inc. IGV equivale a US\$ 2,37 millones T.C venta US\$ 1 = S/ 3,759 publicado el 28.02.22 en el portal de la SBS

Estado Situacional

- Se ha contrato **10 de los 18 SAT**.
- Presenta un avance total de **78%** versus el **80%** de avance planeado.
- Se estima **culminar el diseño** de los SAT hasta el **26 de abril de 2022**.
- Se estima la entrega de los **radares (río Piura y río Matagente)** en **octubre 2022**.
- Para la Etapa 2 (implementación y ejecución de obras), el Contratista deberá cumplir requisitos establecidos en el Contrato NEC3 opción A, tales como: Diseño completo aceptado por ARCC, presupuesto, cronograma,; entre otros.

Nota:

Los montos expresados se encuentran actualizados al mes de febrero de 2022.

Fuente: Plataforma Power BI de la ARCC.

Contrato para el SAT (NEC3 SCC – opción A)



	PQ	10 Intervenciones	Contrato (US\$ millones) (**)	Contratista	Plazo Contractual	
					Inicio	Cierre Comercial Final (CCF) (*)
SISTEMA ALERTA TEMPRANA (SAT)	15	Río Tumbes	US\$ 8,4	Consorcio Alerta Perú	28/10/21	21/11/22
		Río Piura		Conformado por:		
		Río Olmos		- GCZ Ingenieros Perú		
		Río Zaña		S.A.C.		
		Río Viru		- Advanced Radar		
		Río Casma		Company LLC.		
		Río Huaura		- Advanced		
		Río Mala		Environmental Monitoring		
		Río Matagente		Intermediate Inc.		
		Q. San Idelfonso		- Telegrafía A.S.		

(*) Cierre Comercial Final (CCF).

(**) El alcance de este contrato, correspondiente a la Etapa 1, incluye: 1) Diseño del sistema integrado de alerta temprana; y, 2) Adquisición de dos (2) radares.

Avance

PQ	Intervención	Componente	Planeado	Real	Cierre Comercial Final (CCF) Contractual	Cierre Comercial Final (CFF) Contratista
15	9 ríos y 1 quebrada	SAT	78%	80%	21/11/22	21/11/22

Fuente: Plataforma Power BI y ACONEX, información a febrero de 2022.

(*)El **Avance Planeado**, corresponde al avance del diseño de los SAT.

Avance Financiero

PQ	Intervención	Componente	Viable	Actual	Desembolso Acumulado
15	9 ríos y 1 quebrada	SAT	S/ 142,5	S/ 154,4	S/ 8,9

Fuente: Invierte.pe, consulta realizada el 14 de marzo de 2022.

(*) El **monto desembolsado** corresponde al contrato NEC3 opción A (etapa 1), esto es el diseño de los SAT y adquisición de dos (2) radares.

INTERVENCIONES DE SOLUCIONES INTEGRALES EN PROCESO DE PROCURA

PQ	Intervención	Componente	CUI	Firma de Contrato (estimado)
R-09	Río Mala	A	2506092, 2505954	Marzo 2022
Q-03	Q. Cansas	A	2524692	Marzo 2022
Q-04	Q. Huaycoloro	A	2525796	Marzo 2022
D-05	Drenaje Sullana	A	2532678	29/04/2022
D-06	Drenaje Talara	A	2532763	29/04/2022
P1	IN Río Tumbes	C	2515287	08/04/2022
	IN Río Zaña	C	2510795	
P6	IN Río Matagente	C	2517877	08/04/2022
P7	IN Río Cañete	C	2509868	08/04/2022
	IN Río Mala	C	2513671	
P4	IN Río Chicama	C	2521997	29/04/2022
	IN Río Casma	C	2520459	
P5	IN Río Huarmey	C	2524730	29/04/2022
	IN Río Lacramarca	C	2514628	

Nota:

1. Proyectos viables.

- La **Fecha de firma de contrato es estimada por ARCC**, podría modificarse, por demora en la presentación de documentos por parte de la empresa adjudicada, entre otros.

INTERVENCIONES DE SOLUCIONES INTEGRALES

PENDIENTES DE PROCURA

Intervenciones pendientes de licitar – Cuencas y Drenaje



PQ	Intervención	Componente	CUI
R-12	Río Piura	A, B y C	
R-11	Río Rímac	A, B y C	
-	Río Virú	B y C	-
Dams-01	Río Tumbes	B	2517829
R-10	Río Chancay	A	2527677, 2529418, 2529233
		B y C	
DM-02	Río Motupe	B	2511840
41		C	2514793
DM-03	Río La Leche	B	2514692
35		C	2514708
DM-07	Río Olmos	B	2524156
-		C	2524317, 2524218
-	Río Zaña	B	2510162
-	Río Cañete	B	2511533
-	Río Mala	B	2513577
-	Río Chicama	B	2518952
-	Río Casma	B	2520180
-	Río Huarmey	B	2524447
-	Río Lacramarca	B	2514159
-	Río Huaura	B	2524387
-	Río Huaura	C	2524311

PQ	Intervención	Componente	CUI
D-07	Drenaje Piura	A	
D-01	Drenaje Tumbes	A	-
D-02	Drenaje Paita	A	-
D-03	Drenaje Chiclayo	A	-
D-04	Drenaje Trujillo	A	2539202

Nota:

- Respecto a los proyectos viables**, se encuentra pendiente definir estrategia de procura, programar presupuesto, o socializar con poblaciones.
- De acuerdo a lo informado por ARCC aún **no se tiene fecha de inicio de proceso de procura**.

PQ	Intervención	Componente	CUI
-	Río La Leche	SAT	-
-	Río Chancay	SAT	-
-	Río Motupe	SAT	-
-	Río Lacramarca	SAT	-
-	Río Rímac	SAT	-
-	Río Chicama	SAT	-
-	Río Cañete	SAT	2514822
-	Río Huarmey	SAT	2521484

Nota:

- (6) de (8) proyectos aún no han sido declarados viables.
- Luego de declararse viable, estos proyectos serían incorporados en el alcance del Contratista que actualmente viene elaborando el diseño de los otros 10 SAT.

SITUACIONES ADVERSAS EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN (ESTADO: CON ACCIONES)

Informe N° 29265-2021-CG/MPROY-SCC (Proyectos Río La Leche y Río Motupe – Componente A)

- Demora en la obtención de certificaciones ambientales (IGAPRO) y arqueológica (PROMA), afecta el inicio de obra de los proyectos Río La Leche y Río Motupe.

Hitos Programados – I semestre 2022

Informes de Hito de Control

- En el primer semestre de 2022, se tiene programado realizar la visita a la ejecución de obra del Río Matagente.
 - El objetivo de los Hitos de Control están referido a la verificación del avance de la ejecución obra, así como el cumplimiento de los términos contractuales del Contratista Gestor y la verificación de los pagos realizados.
-

GRACIAS
