

- ▶ Comisión Especial Multipartidaria de Seguimiento al Proceso de Reconstrucción en las zonas afectadas por el Fenómeno El Niño Costero

ESTADO ACTUAL DE LAS INTERVENCIONES DE RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS

Víctor Raúl Maita Frisancho

Ministro de Desarrollo Agrario y Riego



- 1. Número de intervenciones a cargo del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, de los Gobiernos Regionales y Locales en materia de desarrollo agrario y riego; el trámite en que se encuentran las intervenciones, precisando si la obras ya se iniciaron o aún no, y el motivo de su no inicio, si cuenta con financiamiento o no, los montos desembolsados y ejecutados, y la fecha de culminación y de entrega de la intervención**
-

PLAN INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego

INTERVENCIONES DE CONSTRUCCIÓN

Referidos a proyectos de prevención, defensas ribereñas, presas de laminación, infraestructura natural, Sistema de Alerta Temprana. Tienen por finalidad prevenir los daños como lo ocurrido durante el FEN 2017.



INTERVENCIONES DE RECONSTRUCCIÓN

Contempla la rehabilitación de la infraestructura agrícola (canales, bocatomas, drenes) dañada por el FEN 2017. La rehabilitación incluye mejorar su estado anterior



ESTADO ACTUAL DE LAS INTERVENCIONES DE RECONSTRUCCIÓN




Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego

348 intervenciones a cargo del MIDAGRI

Según el PIRCC, el MIDAGRI tiene a su cargo 348 intervenciones, de las cuales 74 están asignadas a la unidad ejecutora de Agro Rural y 274 a cargo de la unidad ejecutora del PSI.

*Se han realizado 110 cambios de Unidad Ejecutora a favor de Gobiernos Locales y Regionales entre los años 2020 -2021

de intervenciones

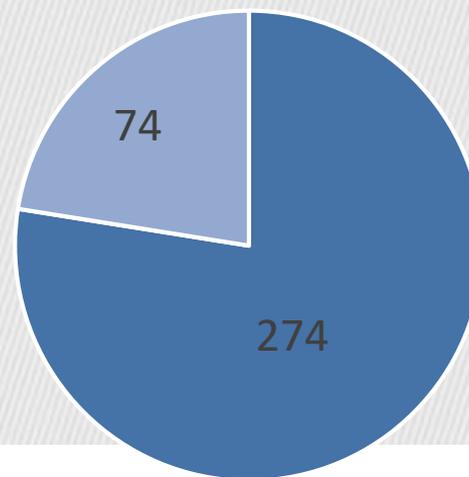

■ PSI ■ AgroRural

ESTADO ACTUAL DE LAS INTERVENCIONES DE RECONSTRUCCIÓN



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego

Etapa: obra

Estado	# intervenciones	Monto S/
OBRA CULMINADA	163	282,126,774
OBRA CULMINADA - NO OPERATIVO	2	4,281,425
EJECUCIÓN DE OBRA	20	42,721,903
POR INICIAR OBRA	2	431,466
OBRA SUSPENDIDA	4	3,973,751
OBRA PARALIZADA	26	70,939,406
PROCESO DE CONTRATACION DE OBRA	17	25,788,679
ACTOS PREVIOS PARA CONTRATACIÓN DE OBRA	3	5,633,861
Sub total	237	435,897,265

Etapa: solicitud de financiamiento para obra

Estado	# intervenciones	Monto S/
EN SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO PARA OBRA	7	126,056,561
PREPARACION DE SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO PARA OBRA	13	25,534,979
Sub total	20	151,591,540



Canal Romero en Tumbes en ejecución

ESTADO ACTUAL DE LAS INTERVENCIONES DE RECONSTRUCCIÓN

Etapa: expediente técnico

Estado	# intervenciones	Monto referencial de obra S/
EN ELABORACION DE EXPEDIENTE TÉCNICO	42	65,482,038
EN PROCESO DE CONTRATACIÓN PARA EXPEDIENTE TÉCNICO	20	17,213,427
Sub total	62	82,695,465

Etapa: cambio de UE

Estado	# intervenciones	Monto referencial S/
PARA CAMBIO DE UNIDAD EJECUTORA	29	61,164,762
Sub total	29	61,164,762

*Inicialmente el MIDAGRI estuvo a cargo de 1,197 intervenciones en el marco en el marco del PIRCC. A la fecha es la UE de 348 intervenciones

Obras en ejecución o culminadas (ejemplos)

Proyecto: Rehabilitación de infraestructura de captación y conducción
Roma-Sector Toma Soldado, distrito de Ascope, provincia de Ascope,
departamento de La Libertad



644
Usuarios



8,952
Hectáreas



S/ 17'034,362



Metas:

- Rehabilitación de 01 bocatoma
- 5 km de canal



En ejecución

Obras en ejecución o culminadas (ejemplos)

Proyecto: Rehabilitación del sistema de captación Romero y canal Romero en el sector Romero (progresiva 0+000 - 4+000), distrito de Tumbes, provincia de Tumbes, región Tumbes



188

Usuarios



560

Hectáreas



S/ 9'635,361

En ejecución



- Rehabilitación de 01 bocatoma por bombeo

Metas: • 4 km de canal



Obras en ejecución o culminadas (ejemplos)



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego

Proyecto: Rehabilitación del servicio de agua para riego del canal Matriz I, distrito de Guadalupe, provincia de Pacasmayo, región La Libertad



438

Usuarios



1,085

Hectáreas

S/



S/ 3'029,762



Metas:

- 60 obras de arte
- 2.9 km de canal



Culminada

Obras en ejecución o culminadas (ejemplos)

Proyecto: Rehabilitación del servicio de agua para riego en el sector Parales, distrito de Castilla, provincia de Piura, departamento de Piura



4,299
Usuarios



2,258
Hectáreas



S/ 9'641,456



Metas:

- Batería de 15 sifones de PVC UF



Culminada

Obras en ejecución o culminadas (ejemplos)



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego

Proyecto: Rehabilitación del servicio de agua para riego del canal Firruñaf, distrito de Pítipo, provincia de Ferreñafe, región de Lambayeque



189

Usuarios



89

Hectáreas



S/ 1'055,125



Metas:

- Rehabilitación de 01 bocatom a y 100 m de canal
- Construcción de 200 m de protección



Culminada

Proyectos de defensa ribereña en el río Zarumilla Tramo I

- ✓ Ejecución física culminada (100%)
- ✓ Costo S/ 82.5 millones
- ✓ 10.7 Km
- ✓ Beneficio para 5,863 familias y protección de 691 ha



Proyectos de defensa ribereña en el río Zarumilla Tramo II

- ✓ En solicitud de financiamiento en el MEF
- ✓ Costo S/ 95.8 millones
- ✓ Meta 11 Km
- ✓ Beneficio para 2,682 familias y protección de 620.15 ha



PLANES INTEGRALES



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego

A

Defensas ribereñas; diques transversales; barreras dinámicas; mejoramiento de drenes




B

Tratamiento de cárcavas; forestación - reforestación; SAT; reubicación de poblaciones; sensibilización a poblaciones; terrazas; andenes, faja marginal



C

Estructuras de almacenamientos, regulación y laminación; represamiento

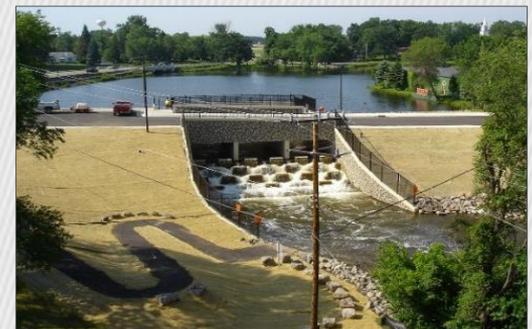

PLANES INTEGRALES



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego

El MIDAGRI formuló y aprobó la viabilidad a 53 proyectos de los Planes Integrales, los cuales fueron remitidos a la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios para su implementación en el marco del Convenio Gobierno a Gobierno con Reino Unido

Según la ARCC, de los 53 proyectos viables, 31 ya cuentan con contrato en el marco del Convenio Gobierno a Gobierno, están en la etapa de diseño y elaboración del expediente técnico

N°	Cuenca	Proyectos viables	Monto S/
1	Río Tumbes	6	S/ 944,988,836
2	Río Olmos	4	S/ 603,686,105
3	Río Motupe	3	S/ 1,298,988,334
4	Río La Leche	1	S/ 320,199,249
5	Río Zaña	3	S/ 228,434,107
6	Río Chicama	4	S/ 627,218,099
7	Río Virú	2	S/ 299,797,715
8	Río Lacramarca	3	S/ 794,958,888
9	Río Casma	3	S/ 451,957,956
10	Río Huarmey	7	S/ 773,678,267
11	Río Huaura	3	S/ 190,852,046
12	Río Mala	4	S/ 413,298,400
13	Río Cañete	5	S/ 471,336,524
14	Río Matagente	5	S/ 380,847,315
	Total	53	S/ 7,800,241,841



Ejecución del Gasto 2021

UNIDAD EJECUTORA	Marco Presupuestal	Devengado	Avance %
Proyecto Especial Jequetepeque Zaña	2,406,428	610,918	25.4
Proyecto Especial Binacional Puyango Tumbes	21,395,825	19,571,174	91.5
AGRO RURAL	34,254,291	8,264,752	24.1
PSI	215,816,916	65,366,693	30.3
TOTAL	273,873,460	93,813,537	34%

FACTORES DEL ESTADO DE LAS INTERVENCIONES PARALIZADAS, SUSPENDIDAS O NO INICIADAS



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego

1. Gastos Operativos.

La no asignación por parte de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. MIDAGRI **tuvo que impulsar la aprobación de dispositivos legales** que le permitan financiar dicho componente: DU 015-2021 (FEB2021) y DU 081-52021 (AGO2021)

2. Extemporaneidad de las asignaciones financieras

Las programaciones presupuestarias fueron realizadas en el primer trimestre del período fiscal 2021 por la UE's; sin embargo, las recursos financieros fueron realizadas hasta en 16 oportunidades durante el año en curso. La asignación parcial de recursos imposibilitó el cumplimiento de los cronogramas de convocatoria de procesos

3. Incumplimiento de contrato y abandono de obras por parte de las empresas.

Las Unidades Ejecutoras en el marco de sus funciones han tenido que resolver los contratos a las empresas

4. Campaña agrícola y factores climáticos

Las organizaciones tienen periodos que riegan sus pedios agrícolas, en ese lapso muchas veces se tiene que suspender la ejecución de la obra.



ASIGNACION VS EJECUCION 2020 - 2021



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego

Grupo de Inversión	N° Proy.	PIM 2020	Devengado 2020	Avance (%)
1. RECONSTRUCCION (EXPEDIENTES, PLANES INTEGRALES Y PUNTOS CRITICOS)	31	99,026,319	35,000,823	35.3%
2. RECONSTRUCCIÓN - IRI	196	321,137,838	98,574,126	30.7%
Total Inversiones	227	420,164,157	133,574,949	31.79%

89% de la cartera de inversión del PSI

Gastos Operativos RCC Asignados para el año

2020:

S/ 6,993,414

07.02.2020: S/ 3,015,126

22.06.2020: S/ 3,978,288

Grupo de Inversion	N° Proy.	PIM 2021	Devengado Projectado 2021	Avance (%)
1. RECONSTRUCCION (EXPEDIENTES, PLANES INTEGRALES Y PUNTOS CRITICOS)	29	35,733,596	24,739,503	69.2%
2. RECONSTRUCCIÓN - IRI	148	172,320,683	46,170,955	26.8%
Total Inversiones	177	315,975,987	113,329,132	35.87%

62% de la cartera de inversión del PSI

Gastos Operativos Asignados RCC para el año

2021:

S/ 3,346,440

26.02.2021: S/ 1,000,000

07.10.2021: S/ 2,346,440

Asignación tardía de recursos

La asignación de recursos operativos se redujo en un **47.8 %**



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego

2.

Si las intervenciones de su sector, han sido materia de acciones de control realizadas por la Contraloría General de la República, desde 2017 a la fecha; y los hallazgos identificados, así como las acciones y recomendaciones formuladas por la Contraloría General de la República.





PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego

La Contraloría General de la República ha realizado 80 acciones de control durante el periodo 2017-2021, a las Unidades Ejecutora dependientes del MIDAGRI en el marco de la implementación de intervenciones del PIRCC, según el siguiente detalle y conforme obra en el portal público de la CGR.

UNIDAD EJECUTORA	SERVICIOS
PSI	73
AGRO RURAL	2
PEJEZA	0
PEBPT	5
TOTAL	80

**PERÚ**Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego

Cada uno de los hallazgos y recomendaciones formulados en las acciones de control de la CGR han sido y/o vienen siendo implementados por cada Unidad Ejecutora.

Destacamos que, sólo 03 de los 80 servicios de control realizados a nuestro Sector, identificaron la presunta responsabilidad administrativa y/o penal de funcionarios, cuyo trámite viene siguiendo su curso:

UNIDAD EJECUTORA	REGION	SERVICIO	NUMERO	INTERVENCION	PRESUNTA RESPONSABILIDAD N° FUNCIONARIOS
PEBPT	TUMBES	SERVICIO DE CONTROL ESPECÍFICO A HECHOS CON PRESUNTA IRREGULARIDAD	9974-2020-CG/GRTB-SCE	Procedimiento de selección pública especial y suscripción del contrato de la obra Instalación del servicio de protección contra las inundaciones en las localidades de La Palma - Canario II, margen izquierda del río Zarumilla (Prog. 0+120 - 11+550) en los distritos de Papayal y Aguas Verdes, provincia -Zarumilla - Tumbes	4
PSI	LIMA	AUDITORIA CUMPLIMIENTO	10402-2020-CG/GRLA-AC	Ejecución del Contrato N° 102-2017-MINAGRI-PSI al Servicio de Elaboración de Ficha Técnica Definitiva y Descolmatación del Cauce del Río Olmos Tramo 1	18
PSI	LIMA	SERVICIO DE CONTROL ESPECÍFICO A HECHOS CON PRESUNTA IRREGULARIDAD	041-2020-2-0052	Valorizaciones n° 1, 2 y 3 de la obra rehabilitación del servicio de agua para riego del sistema Casaconcha en los sectores Casaconcha y Paracas, distrito de Humay, provincia de Pisco, departamento de Ica	6



3. Respuesta y medidas adoptadas por su sector, a las acciones y recomendaciones formuladas por la Contraloría General de la República en sus acciones de control en las intervenciones de su sector.

Nuestro sector promueve el pleno cumplimiento de las recomendaciones formuladas por la Contraloría General de la República, en el ejercicio de su potestad de control. En ese sentido, a raíz de las acciones de control, hemos realizado:

	MEDIDAS ADOPTADAS
1.	La formulación de los planes de control y el envío a la Contraloría General de la República dentro de los plazos previstos en la respectiva normativa.
2.	Coordinación a nivel administrativo y técnico para identificar las oportunidades de mejora en vías de implementar las recomendaciones formuladas en los informes de control.
3.	Requerimiento de medidas correctivas y de ser el caso la aplicación de penalidades a los contratistas y supervisoras para la toma de acciones inmediatas en aras de corregir las acciones adversas en las que hayan sido involucrados.
4.	Monitoreo permanente para verificar el cumplimiento de los Planes de Acción.
5.	Puesta a disposición permanente de los recursos necesarios para coadyuvar con la CGR en el cumplimiento de su función de control.



4.

Propuestas o alternativas planteadas o que actualmente planteé su sector para mejorar la eficiencia y eficacia en las intervenciones a su cargo para la reconstrucción de las zonas afectadas por el Fenómeno de El Niño Costero.

ESTRATEGIAS PARA LA EJECUCION DE INTERVENCIONES 2022

1. GESTION DE INICIATIVAS NORMATIVAS PARA GASTOS OPERATIVOS. Se requiere de gastos operativos oportunamente desde el inicio del año 2022
2. Identificación de intervenciones para cambio de unidad ejecutora a los gobiernos locales y gobiernos regionales.
3. Reasignación de intervenciones entre Unidades Ejecutoras dependientes del MIDAGRI.
4. Contratación de expertos independientes para conformación de Comités, para acelerar procesos de contratación.
5. Propuesta normativa para modificar directiva de la ARCC sobre priorización de financiamiento de intervenciones.
6. Financiamiento oportuno del presupuesto destinado a los proyectos de Reconstrucción con Cambios.
7. Se ejecutará mediante la modalidad de Núcleos Ejecutores (sin problemas sociales, cumplimiento de plazo contractuales, pagos oportunos a los beneficiarios directos, no se evidencia proceso de arbitrajes, etc.).
8. Considerar reuniones de directorio de la ARCC de manera mensual (ya que se retiene tramites como cambios de entidad ejecutora, precisiones al PIRCC, etc)

GRACIAS





PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego



**BICENTENARIO
PERÚ 2021**
