



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024



Comisión Especial Multipartidaria de Seguimiento al Proceso de Reconstrucción en las zonas afectadas por el fenómeno El niño



Christian Barrantes Bravo

Viceministro de Desarrollo de Agricultura Familiar e
Infraestructura Agraria y Riego

Lima, 12 de mayo de 2023



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

1) INFORMACION DETALLADA Y ACTUALIZADA SOBRE EL ESTADO SITUACIONAL DE TODAS LAS INTERVENCIONES DEL COMPONENTE DE RECONSTRUCCION DEL PLAN INTEGRAL DE RECONSTRUCCION CON CAMBIOS QUE ESTAN A CARGO DEL MIDAGRI



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

La Autoridad Nacional del ANA, tiene comprometido el importe de 54 mil soles para la contratación de profesionales para el seguimiento y monitoreo para la monumentación de hitos en los ámbitos del río Chicama y río Piura, el cual estará iniciando su ejecución en los próximos días.

PRINCIPALES AVANCES AL 11 DE MAYO 2023 - UE 001



PRINCIPALES AVANCES AL 11 DE MAYO 2023

FINANCIAMIENTO

- Mediante DS 034-2023-EF, de fecha 12 de marzo de 2023, se habilitaron recursos al Pliego ANA, para la monumentación de las fajas marginales del río Chicama y río Piura, y para el caso de la **UE002 – MGRH**, se **asignaron recursos por un monto de S/ 2,674,591**

PROCESO DE CONTRATACIÓN

- Al respecto, se realizaron dos procesos PEC (Procesos Especiales de Contratación) para ejecutar dichas actividades. La buena pro fue otorgada el 17 de abril y los **contratos fueron suscritos el 03 de mayo de 2023.**
- De acuerdo a las bases, se ha estipulado 30% adelanto que sería ejecutado (devengado) en el mes de mayo y ascendería a un monto de **S/ 527,300.**

EJECUCIÓN FÍSICA

- A la fecha, el equipo de control de la **UE002 – MGRH** viene coordinando con las empresas contratistas para realizar el acta de inicio de la ejecución contractual. Para el caso del río Chicama con una duración de 135 días calendarios y en el río Piura un plazo de 165 días calendarios. **Se estima concluir con la actividad en el mes de noviembre del presente año.**

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS (PIRCC)

Ejecución de Obras – Elaboración de Expedientes Técnicos



INTERVENCIONES DE RECONSTRUCCIÓN

18 Proyectos (22 intervenciones)
a cargo de **AGRO RURAL**

AGRO RURAL tiene a su cargo 18 proyectos, de las cuales 13 corresponden a la ejecución de obras, 02 elaboración de expedientes técnicos y 03 en proceso de cambio de entidad ejecutora (Canal Sampeche, bocatoma Limoncillo, bocatoma San Ignacio).



INTERVENCIONES DE RECONSTRUCCIÓN POR REGIÓN

AGRO RURAL, atiende intervenciones de reconstrucción en 07 regiones del país, relacionado proyectos de:

REHABILITACION
(IRIS: Canales/Bocatomas/Drenes)

REGIÓN	DETALLE	N° PROYECTOS	INVERSIÓN	FAMILIAS BENEFICIARIAS	HECTÁREAS
ANCASH	OBRA	6	10,805,543	3280	8,455
AREQUIPA	OBRA	1	598,840	60	120
LA LIBERTAD	OBRA	1	735,633	92	702
LAMBAYEQUE	OBRA	1	919,187	560	1,800
LIMA	01 OBRA/ 02EXP, TEC.	3	7,612,838	623	711
PIURA	OBRA	2	1,092,732	9217	4,523
TUMBES	OBRA	1	10,258,167	188	560
Cambio de Entidad	Expediente Técnico	03	2,770,195		
TOTAL		18	34,793,135	14020	16,871



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024



**TUMBES
1 INTERVENCIÓN**

01

Monto de Inversión:
S/ 10,258,167

**LAMBAYEQUE
1 INTERVENCIÓN**

01

Monto de Inversión:
S/ 919,187

**PIURA
2 INTERVENCIONES**

02

Monto de Inversión:
S/ 1,092,732

**ANCASH
6 INTERVENCIONES**

06

S/ 10,805,543

**LIMA
1 INTERVENCIÓN Y 2 EXP. TEC.**

03

Monto de Inversión:
S/ 7,612,838

**LA LIBERTAD
1 INTERVENCIÓN**

01

Monto de Inversión:
S/ 735,633

**AREQUIPA
1 INTERVENCIÓN**

01

Monto de Inversión:
S/ 598,840

**INTERVENCIONES EN EL MARCO
DEL PLAN DE RECONSTRUCCIÓN
CON CAMBIOS – AGRO RURAL**

18 Intervenciones a cargo de AGRO RURAL

MONTO DE INVERSIÓN: S/ 34,793,135
PIM 2023: S/ 3,304,773.00



OBRAS LIQUIDADAS / RECEPCIONADAS

Nº	CUI	ARCC	NOMBRE DE PROYECTO / EXPEDIENTE TECNICO	Avance Físico	Costo de Inversión	DEVENGADO ACUMULADO AL 10-05-23	ESTADO SITUACIONAL
1	2482007	1064	Rehabilitación Bocatoma y dique enrocado de protección San Cristobal - Huambo- Arequipa	100%	598,839.77	514,009.80	LIQUIDADADA
2	2482438	25 Y 29	Rehabilitación Captación San Andrés y Alto del Peligro – Distrito de La Unión, Provincia Piura, Departamento de Piura	100%	449,588.09	415,966.17	LIQUIDADADA
3	2482437	17, 19 y 20	Rehabilitación Captación San Jacinto, Cumbibirá y Sinchao, Distrito de Catacaos, Provincia Piura, Dpto. Piura	100%	643,143.76	455,517.89	LIQUIDADADA
4	2482791	891	Rehabilitación Dren Lavandero, Distrito de Chimbote, Provincia de Santa, departamento de Ancash	100%	1,341,848.54	1,219,498.57	RECEPCIONADA
5	2482364	896	Rehabilitación Dren Progreso, Distrito de Chimbote, Provincia de Santa, departamento de Ancash	100%	1,516,657.84	1,178,139.97	RECEPCIONADA
6	2482360	895	REHABILITACIÓN DEL DREN ANCASH DISTRITO DE CHIMBOTE PROVINCIA DE SANTA DEPARTAMENTO ANCASH, CÓDIGO ARCC N° 895	100%	2,599,740.03	1,796,967.65	CULMINADA
7	2482787	894	REHABILITACION DEL DREN LA MORA, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH, CODIGO ARCC N° 894	100%	1,809,758.27	1,413,678.18	RECEPCIONADA
TOTAL					8,959,576.30	6,993,778.23	

Nº	CUI	ARCC	NOMBRE DE PROYECTO / EXPEDIENTE TECNICO	Avance Físico	COSTO DE INVERSION	ESTADO SITUACIONAL
EXPEDIENTE TECNICOS						
1		1253	Rehabilitación de la Represa LLongote, dist. Yauyos, Prov. Yauyos, Dpto. Lima		4,325,000.00	EXPEDIENTE TECNICO /en revisión del levantamiento de observaciones 2do.Entregable/ En trámite la adenda a los contratos por precisión en el nombre del proyecto - en SUA desde el 02.03.2023 (Memo 359-23-UIR), el reiterativo esta desde el 10.05.23 en UIR (Informe 1064-23-SUIRM)
2		191	Rehabilitación de la Bocatoma Limoncillo, Distrito de San Miguel De Acos, Provincia de Huaral, Departamento de Lima	100%		LA ENTIDAD MEDIANTE OFICIO 2635-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE (17.10.2022) SOLICITA A LA ARCC EL CAMBIO DE ENTIDAD EJECUTORA A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL DE ACOS



PROYECTOS RCC- MODALIDAD COF & NER



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

“PROYECTOS RCC-CONCURSO OFERTA”



CANTIDAD TOTAL DE
PROYECTOS

115



PROYECTOS EN
ARBITRAJE

19 (*)



REGIONES
INTERVENIDAS

08



COSTO DE
INVERSIÓN
(TOTAL)


S/ 403 millones



DEVENGADO
ACUMULADO AL 2023
(TOTAL)

S/ 284 millones

ESTADOS SITUACIONALES

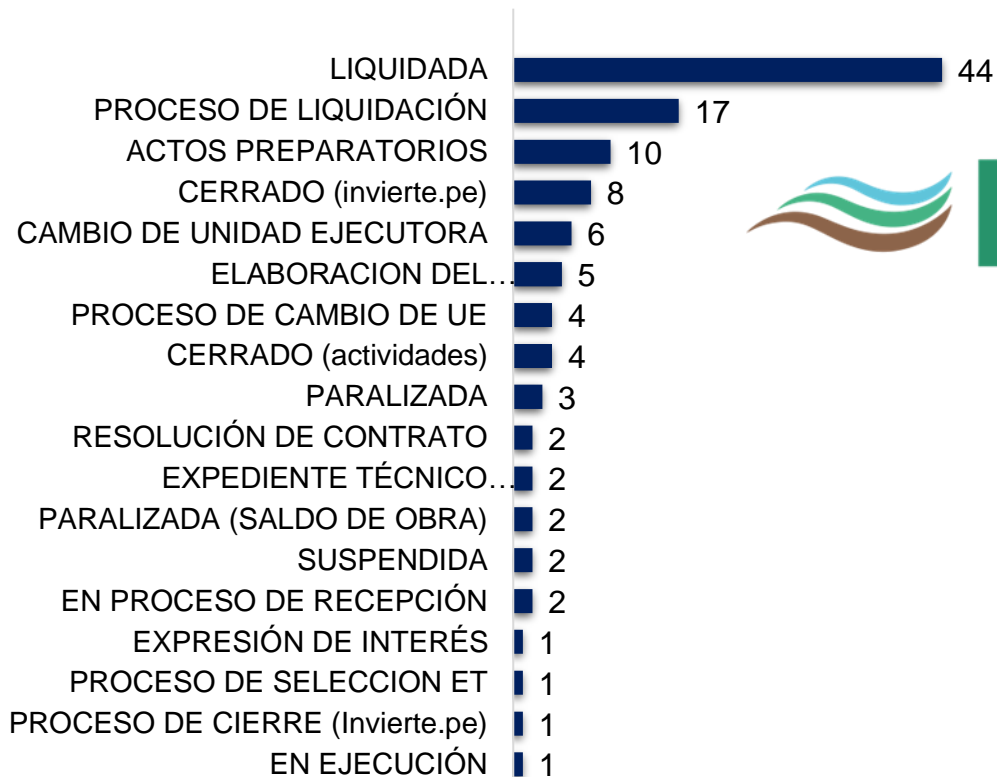

PSI

PROGRAMA
SUBSECTORIAL
DE IRRIGACIONES

REGIONES	CANTIDAD
ANCASH	20
AREQUIPA	1
ICA	8
LA LIBERTAD	22
LAMBAYEQUE	21
LIMA	9
PIURA	33
TUMBES	1
TOTAL	115





PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

“PROYECTOS RCC- NÚCLEO EJECUTOR DE RECONSTRUCCIÓN”



CANTIDAD TOTAL DE
PROYECTOS

129



REGIONES
INTERVENIDAS


08



PPTO CONVENIO
(TOTAL)

S/ 103 millones

ESTADOS SITUACIONALES

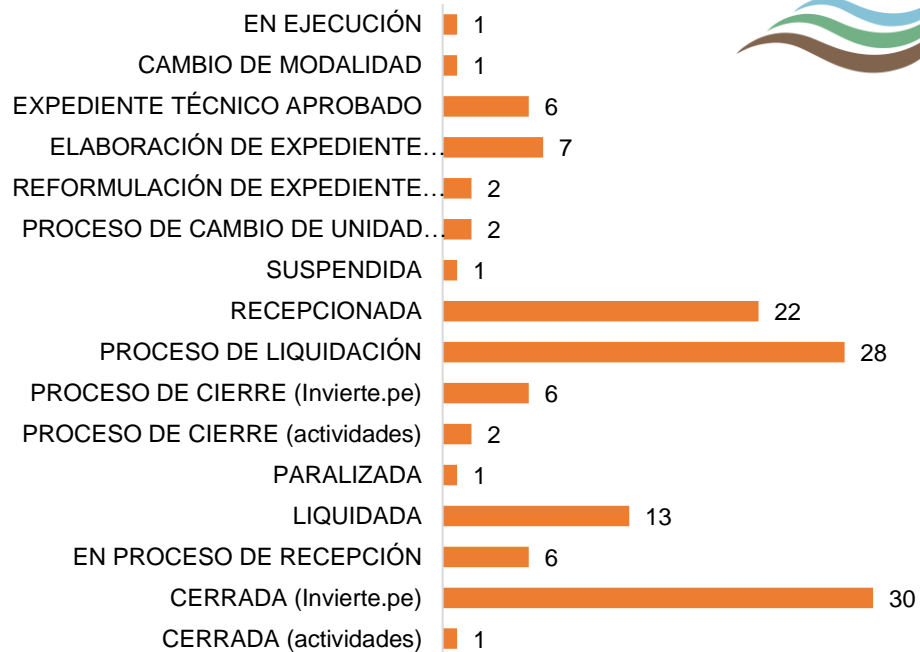

PSI

PROGRAMA
SUBSECTORIAL
DE IRRIGACIONES

REGIONES	CANTIDAD
ANCASH	27
AREQUIPA	1
ICA	13
LA LIBERTAD	18
LAMBAYEQUE	15
LIMA	25
PIURA	29
TUMBES	1
TOTAL	129



2) INFORMACION DETALLADA Y ACTUALIZADA SOBRE EL ESTADO SITUACIONAL DE TODAS LAS INTERVENCIONES DEL COMPONENTE DE CONSTRUCCION DEL PLAN INTEGRAL DE RECONSTRUCCION CON CAMBIOS CON CARGO A LOS DIVERSOS PROGRAMAS, PROYECTOS ESPECIALES Y ORGANISMOS PUBLICOS ADSCRITOS AL MIDAGRI



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

EL COMPONENTE DE CONSTRUCCION ES DE EXCLUSIVA
COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD DE RECONSTRUCCION CON
CAMBIOS A EXCEPCION DEL PROYECTO DE ZARUMILLA QUE ESTA
A CARGO DEL PEBPT

DEFENSA RIBEREÑA CONTRA LAS INUNDACIONES EN LAS LOCALIDADES DE LA PALMA - CANARIO II - DISTRITOS DE PAPAYAL Y AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TRAMO I - OBRA CONCLUIDA Y ENTREGADA

- ✓ El PEBPT culminó este proyecto en octubre de 2021, en el marco del PIRCC.
- ✓ Se ejecutó 10.7 km. de defensa ribereña en el tramo comprendido entre la bocatoma La Palma y Canario II.
- ✓ La infraestructura construida permitirá proteger contra inundaciones las tierras agrícolas del valle de Zarumilla, el Canal Internacional, la carretera Panamericana, los poblados fronterizos de Aguas Verdes – Perú y Huaquillas - Ecuador.
- ✓ **Beneficiarios: 5,863 Familias**
- ✓ **Hectáreas a proteger de inundaciones: 690.67 ha**
- ✓ A la fecha la obra ha sido recepcionada por la entidad, y el monto de la inversión asciende a S/. 83,186,419.28. Estando pendiente su Liquidación, cuyos recursos ya han sido solicitados a la ARCC..



DEFENSA RIBEREÑA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO ZARUMILLA - TRAMO COMPRENDIDO ENTRE PUEBLO NUEVO Y LA BOCATOMA LA PALMA - PAPAYAL - ZARUMILLA – TUMBES - TRAMO II AÑO 2022

- ✓ La ejecución de este proyecto beneficiará a 2,682 productores agrarios de la provincia de Zarumilla y la protección de 620.15 ha, poblaciones e infraestructura pública. con una inversión que asciende a S/. 104,807,983.64, habiéndose ejecutado a la fecha S/. 87,573,545.48.
- ✓ El 26.07.2022 se inició la ejecución física del Tramo II de las defensas ribereñas del río Zarumilla en la Margen Izquierda.
- ✓ Avance físico 71.73% al 06.03.2023
- ✓ Avance financiero de 61.94% en relación al PIM – 2023.
- ✓ **A la fecha la obra se encuentra en suspensión de plazo debido a causas climatológicas (incremento del caudal del río Zarumilla). Se estima reinicio de obras en la quincena de junio 2023**
- ✓ Este proyecto forma parte de las Soluciones Integrales para el control de inundaciones del río Zarumilla en el marco del PIRCC y contempla la construcción 11.5 km. de defensas ribereñas, en el tramo comprendido entre Pueblo Nuevo y la bocatoma La Palma, con lo que se cerrará las brechas de defensa ribereñas de los distritos de Aguas Verdes y Papayal.



DEFENSA RIBEREÑA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO ZARUMILLA - TRAMO COMPRENDIDO ENTRE PUEBLO NUEVO Y LA BOCATOMA LA PALMA - PAPAYAL - ZARUMILLA – TUMBES

- ✓ El 06.03.2023 se suscribió el Acta de suspensión de plazo de ejecución de obra, debido a causas climatológicas (incremento del caudal del río Zarumilla).



3) INFORMACION DETALLADA DEL PLAN INTEGRAL DE RECONSTRUCCION CON CAMBIOS QUE ESTAN A CARGO DEL MIDAGRI COMO ENTIDAD EJECUTORA CON PROBLEMAS EN SU EJECUCION, PRECISANDO SI ESTAN CON RETRASO, PARALIZADOS, CON INTERVENCION ECONOMICA DE OBRA O CON RESOLUCION DE CONTRATO DE OBRA



OBRAS PARALIZADAS/ SUSPENDIDAS

N°	CUI	ARCC	NOMBRE DE PROYECTO / EXPEDIENTE TECNICO	Avance Físico	Costo de Inversión	DEVENGADO ACUMULADO AL 10-05-23	AVANCE FINANCIERO	ESTADO SITUACIONAL	ESTADO SITUACIONAL DETALLADO
1	2484152	3 y 228	Rehabilitación Sistema de Captación y canal Romero, Dist. Tumbes, Prov. Tumbes, Dpto Tumbes	97%	10,258,167.00	9,626,981.64	93.80%	PARALIZADA	EL CONTRATISTA RESOLVIO CONTRATO / se tomaron acciones en salvaguarda de los intereses de la Entidad y se logró la suscripción del Acta de Conciliación N° 163-2023 el 28.03.2023. Retomando la Vigencia de Contrato En tramite Suspensión de Plazo N° 07 (esta en UA con MEMO 813-23-UIR, desde el 05.05.2023) Viabilización de Reducción de Prestación N° 01 y N° 02, así como la Prestación Adicional N° 01.
2	2482440	407	Rehabilitación Canal Pampas de Jaguey, Distrito de Chicama, Provincia de Ascope, Departamento de La Libertad	38.84%	735,633.07	224,273.79	30.50%	PARALIZADA	EN PROCESO DE RESOLUCIÓN DE CONTRATO (acumulación de penalidades máximas) / se encuentra en SUA para la notificación al contratista desde el 26.03.23, cambios de Gestión / Resolución de Contrato al Supervisor / Acciones para el Saldo de Obra.
3	2482244	72	Rehabilitación Bocatoma y Canal Oyotún, Distrito de Oyotún, Provincia de Chiclayo, Departamento de Lambayeque	42.33%	919,186.41	411,437.18	44.80%	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA Por Campaña Agrícola N° 02 . A partir del 02.12.2022 / 02 aliviaderos motivo de Adicional 01 / Observaciones al Mayor Metrado 01.
4	2482440	407	Rehabilitación Canal Pampas de Jaguey, Distrito de Chicama, Provincia de Ascope, Departamento de La Libertad	38.84%	735,633.07	224,273.79	30.50%	PARALIZADA	EN PROCESO DE RESOLUCIÓN DE CONTRATO (acumulación de penalidades máximas) / se encuentra en UAJ (Memo 790-23-UA desde el 20.03.23), se envió reiterativo a UA (Memo 816-2023-UIR desde el 05.05.23 / Memo 086-23-UIR desde el 17.01.23) para notificación al contratista / Resolución de Contrato al Supervisor / Acciones para Saldo de Obra.
5	2482244	72	Rehabilitación Bocatoma y Canal Oyotún, Distrito de Oyotún, Provincia de Chiclayo, Departamento de Lambayeque	42.33%	919,186.41	411,437.18	44.80%	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA Por Campaña Agrícola N° 02 . A partir del 02.12.2022 / 02 aliviaderos motivo de Adicional 01 / Observaciones al Mayor Metrado 01.
6	2483540	890	Rehabilitación Dren Cascajal Bajo, Dist. Chimbote, Prov. SANTA, Dpto. Ancash	87.50%	1,351,309.74	932,972.27	69.00%	PARALIZADA	En proceso de resolución de contrato / obra afectada totalmente por consecuencias del ciclón Yaku / pago al supervisor, informes observados.
7	2482408	897	Rehabilitación Dren Cascajal Alto, Dist. Chimbote, Prov. SANTA, Dpto. Ancash	83.03%	2,186,229.25	1,371,373.56	62.70%	PARALIZADA	SE RESOLVIO CONTRATO (27.03.2023) debido al incumplimiento del Contratista Consorcio Nuevo Horizonte por no mantener el Seguro de Póliza Car vigente, de acuerdo a los TDR's, (acumulación de penalidades) -la Valorización de Mayores Metrados N° 01, se devolvió al supervisor con observaciones persistentes. -En trámite la resolución de contrato del supervisor (en SUA desde 19.04.23 – Memo 0711-23-UIR).
TOTAL					6,847,177.95	3,575,767.77			

4) INFORMACION SOBRE LAS INTERVENCIONES DEL PLAN INTEGRAL DE RECONSTRUCCION CON CAMBIOS QUE ESTAN A CARGO DEL MIDAGRI COMO UNIDAD EJECUTORA QUE HAN SIDO MATERIA DE ACCIONES DE CONTROL REALIZADAS POR LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DEL EL 2017 A LA FECHA



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego

CODIGO	NOMBRE DE INVERSIÓN	REGIÓN	CONTROL CONCURRENTE DE LA CGR	ESTADO DE LA SITUACION ADVERSA
2425721	REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL CARLOS LEIGHT, SECTOR SANTA ELIZA PAMPA DURA LACRAMARCA BAJA, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH	ANCASH	SI	2 EN PROCESO
2436073	REHABILITACIÓN DEL CANAL SEÑOR DE LOS AFLIGIDOS, DISTRITO DE CARHUAZ, PROVINCIA DE CARHUAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH	ANCASH	SI	1 EN PROCESO
2436024	REHABILITACIÓN DE CAPTACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL SECTOR DE RIEGO ROSARIO, SAN PEDRO ALTO Y SAN PEDRO BAJO, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA, DEPARTAMENTO DE ANCASH	ANCASH	SI	2 IMPLEMENTADAS.
2425484	REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL SISTEMA CASAICONCHA EN LOS SECTORES CASAICONCHA Y PARACAS - DISTRITO DE HUMAY, PROVINCIA PISCO, DEPARTAMENTO DE ICA	ICA	SI	1 IMPLEMENTADA 5 EN PROCESO
2425692	REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL CENTELLA EN EL DISTRITO DE CHANGUILLO, PROVINCIA DE NASCA, DEPARTAMENTO DE ICA	ICA	SI	2 IMPLEMENTADA
2425691	REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL LA BANDA - DISTRITO EL INGENIO PROVINCIA DE NASCA, DEPARTAMENTO DE ICA	ICA	SI	1 IMPLEMENTADA 3 EN PROCESO
2425359	REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL LA VENTA, DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA.	ICA	SI	2 IMPLEMENTADAS 3 EN PROCESO
2442714	REHABILITACIÓN DE LA BOCATOMA Y CANAL FACALA, DISTRITO DE ASCOPE, PROVINCIA DE ASCOPE, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.	LA LIBERTAD	SI	1 EN PROCESO
2435204	REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL ASCOPE, DISTRITO DE ASCOPE, PROVINCIA DE ASCOPE, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	SI	1 IMPLEMENTADA 1 EN PROCESO



CONTROL
CONCURRENTE
DE LA CGR



CODIGO	NOMBRE DE INVERSIÓN	REGIÓN	CONTROL CONCURRENTE DE LA CGR	ESTADO DE LA SITUACION ADVERSA
2425736	REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL CHASCARRAPE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PROVINCIA DE PACASMAYO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	SI	1 IMPLEMENTADA 3 EN PROCESO
2425372	REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL EL CHIRIMOYO, CASERÍO DEL PORVENIR, DISTRITO SAYAPULLO, PROVINCIA DE GRAN CHIMU, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	SI	1 EN PROCESO
2425361	REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL MOCHAN, LOCALIDAD DE SANTA ELENA, DISTRITO DE VIRU, PROVINCIA DE VIRU, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD.	LA LIBERTAD	SI	1 EN PROCESO
2425741	REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL TECAPA, SECTOR TECAPA, DISTRITO DE SAN JOSÉ, PROVINCIA DE PACASMAYO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	SI	2 EN PROCESO
2435240	REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL EL CHORRO BLANCO, EN EL SECTOR SAN MIGUEL- CATEDRO, DISTRITO DE YAMANGO, PROVINCIA DE MORROPÓN, DEPARTAMENTO DE PIURA.	PIURA	SI	2 EN PROCESO
2434591	REHABILITACIÓN DEL CANAL PELINGARÁ EN EL SECTOR CHIPILLICO BAJO (PROGRESIVA 0+000/12+000) EN EL DISTRITO LAS LOMAS, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA	PIURA	SI	2 EN PROCESO
2425364	REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL TAMBOGRANDE, SECTORES SANTA ROSA DE YARANCHE Y SAN FRANCISCO, DISTRITO DE TAMBOGRANDE, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA.	PIURA	SI	2 IMPLEMENTADA 12 NO IMPLEMENTADAS
2436029	REHABILITACION DEL DIQUE 1020 A LA ALTURA DE LA ISLA Y LA BOCATOMA DE COLAN, DISTRITO DE COLAN, PROVINCIA DE PAITA, DEPARTAMENTO DE PIURA	PIURA	SI	1 IMPLEMENTADA
2434990	REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL EL CARMEN, DISTRITO SALITRAL, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA	PIURA	SI	2 IMPLEMENTADAS

5) IMPACTO DE LOS RECIENTES EVENTOS CLIMATOLOGICOS Y DE QUE MANERA AFECTA A LAS INTERVENCIONES DEL PLAN INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS QUE ESTAN A CARGO DEL MIDAGRI

- ✓ EN EL CASO DE TUMBES EN LA CONSTRUCCION DE LA DEFENSA RIBEREÑA DEL RIO ZARUMILLA, ESTAS OBRAS VIENEN CUMPLIENDO CON PROTEGER CONTRA LAS INUNDACIONES A MAS 1,300 HAS DE CULTIVOS Y A MAS DE SEIS CENTROS POBLADOS ASENTADOS CERCA DE LA RIVERA DEL RIO ZARUMILLA.
- ✓ SE VIENE CUMPLIENDO CON LA FINALIDAD PUBLICA Y LA INVERSION SE ENCUENTRA JUSTIFICADA TODA VEZ QUE SE VIENE GARANTIZADO EL ENCAUZAMIENTO DEL FLUJO DE LAS AGUAS DEL RIO ZARUMILLA.

GRACIAS



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego



midagriperu



midagriperu



@midagriperu
