



PERÚ

Ministerio  
de Salud



**PRONIS**  
Programa Nacional de Inversiones en Salud



**Siempre**  
con el pueblo

# Intervenciones en el Plan de la Reconstrucción con Cambios

Programa Nacional de Inversiones en Salud


MBA. Arq. Lidia Saccatoma

2022



# ANTECEDENTES

# Situación actual

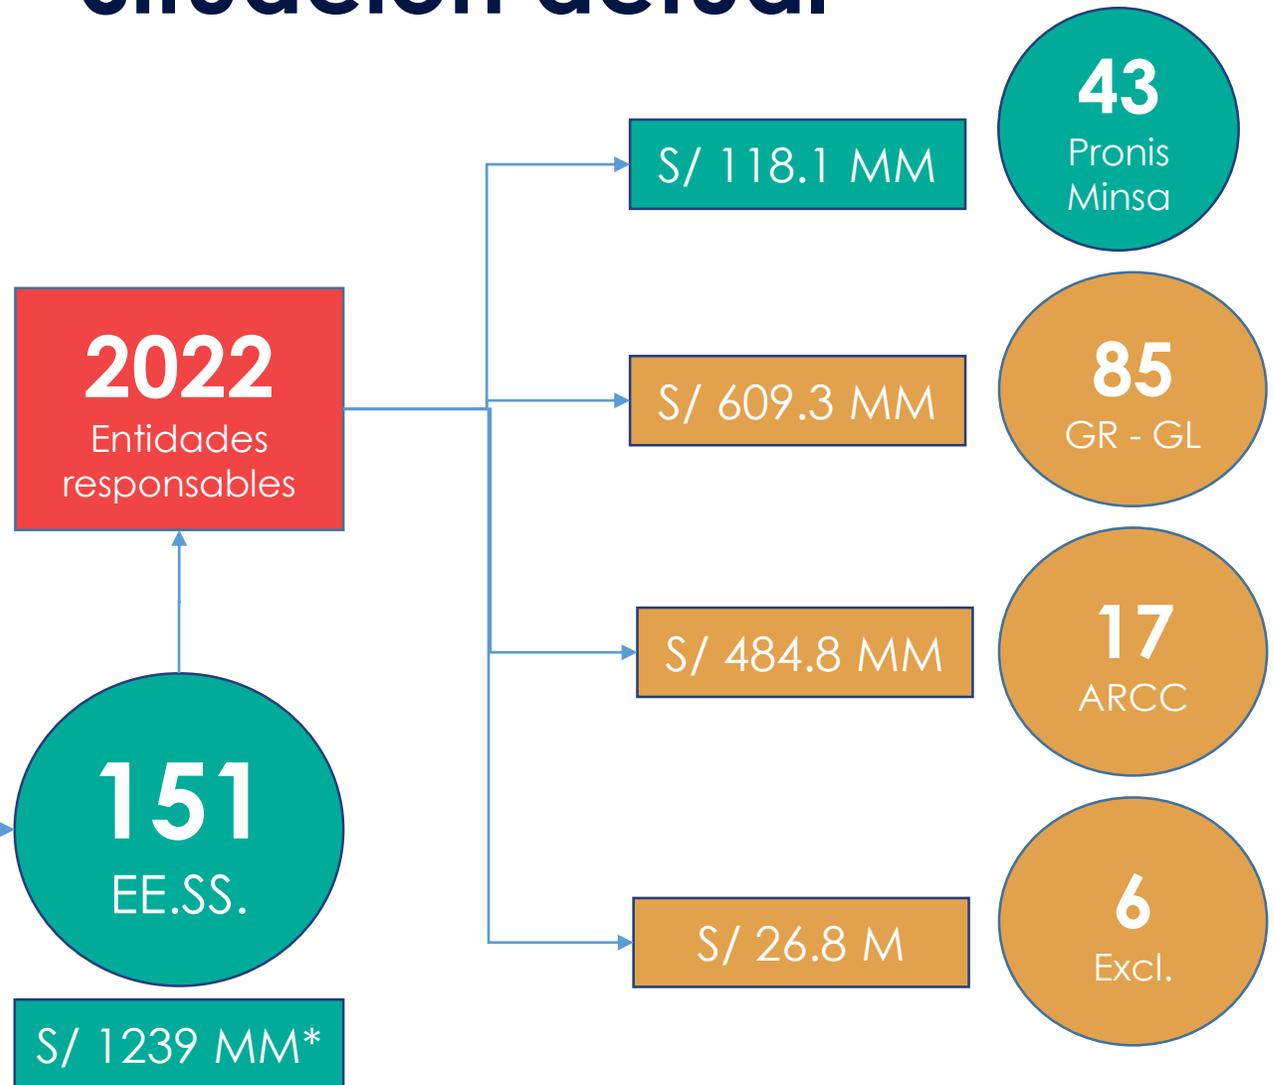

\* Montos PIRCC

# EJECUTORAS

 (responsables de las intervenciones del PIRCC)

UNIDADES EJECUTORAS		2017	2018	2019	2020	2021	2022	SUB TOTAL
GOBIERNO NACIONAL	ARCC				17			17
GOBIERNO REGIONAL	GORE			30				30
GOBIERNO LOCAL	MP			13	4		5	22
	MD		2	16	8	3	4	33
EXCLUIDOS		5	5		1			11
MODIFICACIONES DEL PLAN INTEGRAL DE LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS								113

**43**Pronis  
Minsa**17**

ARCC

**85**

GR - GL

**11**

Excl.

# EJECUTORAS (Regiones responsables de las intervenciones del PIRCC)

REGION / EJECUTORAS		2017	2018	2019	2020	2021	2022
ANCASH	ARCC				7		
	GORE			14			
	MP			1			5
	MD			5			4
	EXCLUIDOS		3				
PIURA	ARCC				6		
	GORE			5			
	MP			5			
	MD			6	1		
	EXCLUIDOS	5	2				
LIMA	ARCC				1		
	MP			3			
	EXCLUIDOS				1		
LAMBAYEQUE	ARCC				2		
	GORE			4			
	MP			2			
	MD			3	2	3	
LA LIBERTAD	ARCC				1		
	GORE			2	4		
	MP				4		
	MD		2				
ICA	GORE			1			
TUMBES	GORE			1			
	MP			2			
	MD			1	1		
CAJAMARCA	GORE			2			
	MD			1			
LORETO	GORE			1			

**Áncash (39) S/ 252.2 MM**

**Piura (30) S/ 230 MM**

**Lima (5) S/ 129.3 MM**

**Lambayeque (16) S/ 91.9 MM**

**La Libertad (13) S/ 40.4 MM**

**Ica (1) S/ 29 MM**

**Tumbes (5) S/ 5.8 MM**

**Cajamarca (3) S/ 5.7 MM**

**Loreto (1) S/ 1.9 MM**

# INTERVENCIÓN-PRONIS



Monto PIRCC  
**S/ 118.1 millones**



PERÚ


Ministerio de Salud

Viceministerio de Prestaciones y Aseguramiento en Salud


Programa Nacional de Inversiones en Salud



# AVANCES EN OBRAS

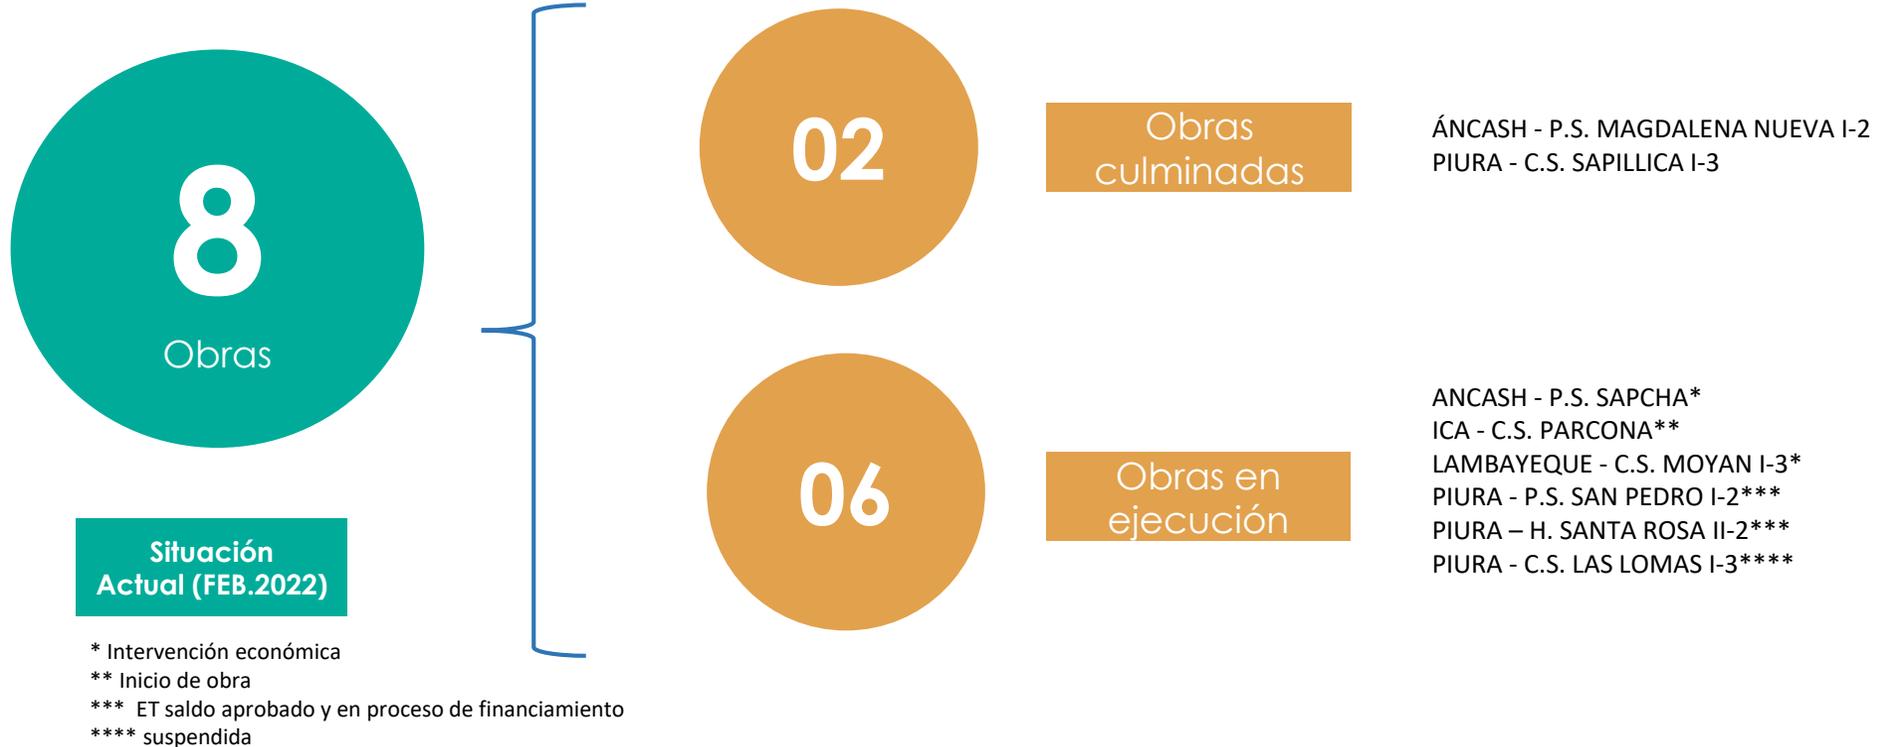

# OBRA P.S. MAGDALENA NUEVA - REHABILITACIÓN

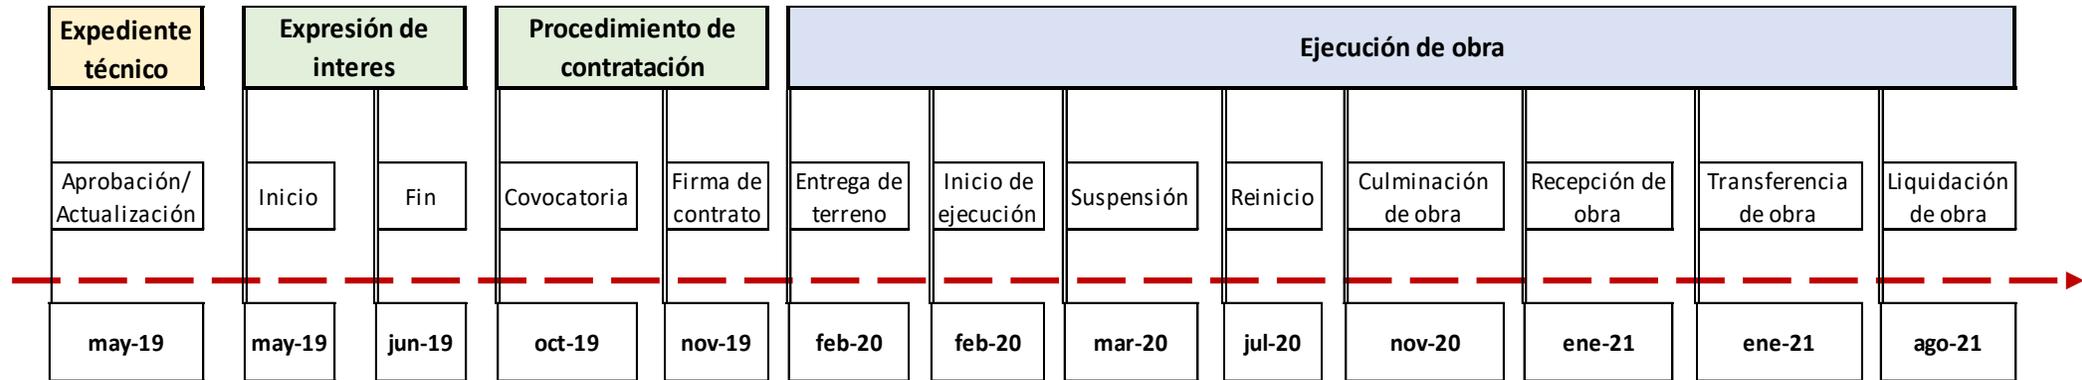

## Datos contractuales

Fecha de suscripción de contrato: 07/11/2019

Fecha de entrega de terreno: 12/02/2020

Fecha de inicio de ejecución de obra: 29/02/2020

Plazo contractual de ejecución de obra: 75 d.c.

Fecha de término contractual: 10/10/2020

Fecha de culminación de obra: 16/11/2020

Monto contractual: S/ 1,112,574.93

## Estado actual


Avance físico ejecutado: 100%

## Liquidada

En gestiones para cierre del proyecto en el mes de abril



# OBRA C.S. SAPILLICA REHABILITACIÓN

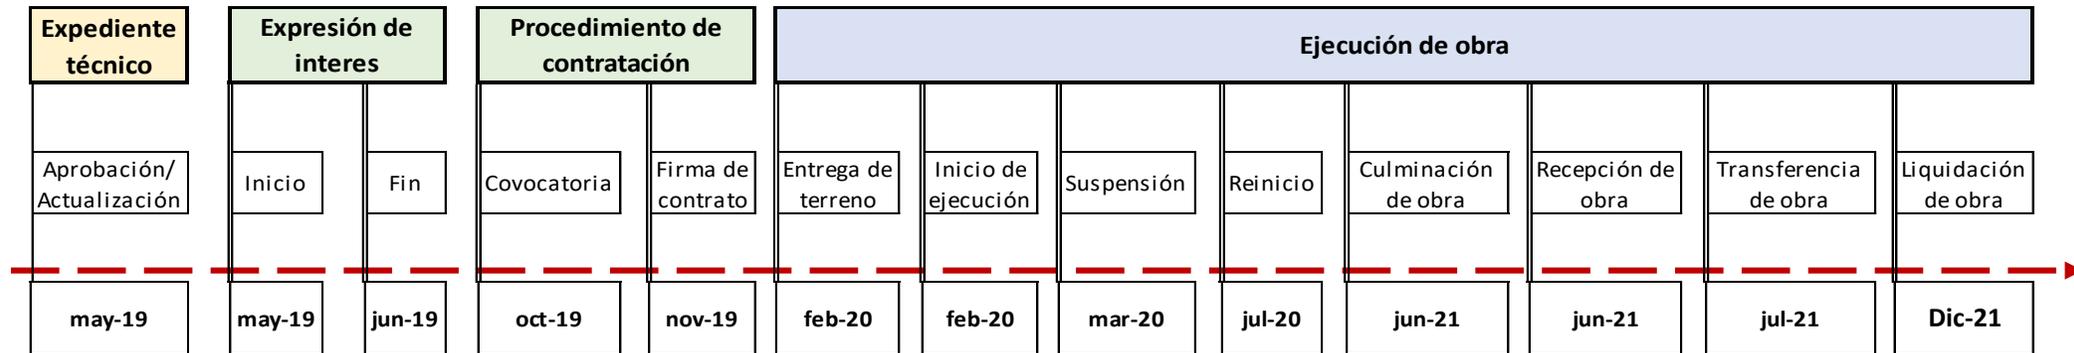

## Datos Contractuales

Fecha de suscripción de contrato: 07/11/2019

Fecha de entrega de terreno: 12/02/2020

Fecha de inicio de ejecución de obra: 29/02/2020

Plazo contractual de ejecución de obra: 90 d.c.

Fecha de término contractual: 25/10/2020

Fecha de culminación de obra civil: 25/10/2020

Monto contractual: S/ 1,610,078.55

## Estado actual

Avance físico ejecutado: 100%

En proceso de liquidación



# OBRA C.S. MOYAN RECONSTRUCCIÓN PARCIAL



## Datos Contractuales

Fecha de suscripción de contrato: 12/10/2020

Fecha de entrega de terreno: 23/10/2020

Fecha de inicio de ejecución de obra: 24/10/2020

Plazo contractual de ejecución de obra: 120 d.c.

Fecha de término contractual: 20/02/2021

Monto contractual: S/ 2,803,946.96

## Estado actual

Avance físico ejecutado a marzo: 78.14%

Obra intervenida económicamente, debido a la solicitud del contratista por no contar la liquidez económica y tener el plazo de ejecución vencido.

04/2022: reinicio de ejecución de obra.



# OBRA P.S. SAPCHA RECONSTRUCCIÓN TOTAL



## Datos Contractuales

Fecha de suscripción de contrato: 28/12/2020

Fecha de entrega de terreno: 24/02/2021

Fecha de inicio de ejecución de obra: 09/03/2021

Plazo contractual de ejecución de obra: 180 d.c.

Fecha de término contractual: 04/09/2021 (Plazo vencido)

Monto contractual: S/ 4,638,372.97

## Estado actual

Avance físico acumulado al 31/12/2021: 69.62%.

Obra intervenida económicamente debido a las demoras y termino del plazo de ejecución.

04/2022: reinicio de ejecución de obra.



# OBRA HOSPITAL SANTA ROSA REHABILITACIÓN



## Datos Contractuales

### Valor del inversión 2020

S/. 14,868,154.00

Fecha de suscripción de contrato: 10/12/2020

Fecha de entrega de terreno: 17/12/2020

Fecha de inicio de ejecución de obra: 29/12/2020

Plazo contractual de ejecución de obra: 180 d.c.

Devengado: S/. 8,697,803.79

### Valor del expediente técnico de saldo de obra

S/. 10,533,926.01

### valor adicional de la inversión por saldo de obra:

S/. 4,363,575.80

## Estado actual

Avance físico acumulado al 31/10/2021: 52.28%

Obra resuelta el 12.01.2022, debido a la demoras y vencimiento de plazo de ejecución, se cuenta con el expediente técnico de saldo de obra aprobado y a la espera del financiamiento por parte de la ARCC, para el reinicio de la obra.



# OBRA P.S. SAN PEDRO RECONSTRUCCIÓN TOTAL



### Datos Contractuales

**Valor del inversión 2020**

S/. 6,507,322.00

Fecha de suscripción de contrato: 13/10/2020

Fecha de entrega de terreno: 22/10/2020

Fecha de inicio de ejecución de obra: 29/10/2020

Plazo contractual de ejecución de obra: 210 d.c.

Devengado: S/. 3,690,637.41

**Valor del expediente técnico de saldo de obra**

S/. 4,517,986.77

**valor adicional de la inversión por saldo de obra:**

S/. 1,722,302.30

### Estado actual

Avance físico acumulado al 31/12/2021: 49.49%

Obra resuelta 20.10.2021 debido al vencimiento del plazo y baja ejecución, se cuenta con el expediente técnico de saldo de obra aprobado y a la espera del financiamiento por parte de la ARCC, para el reinicio de la ejecución de la obra.



# OBRA C.S. LAS LOMAS REHABILITACIÓN



## Datos Contractuales

Fecha de suscripción de contrato: 25/09/2020

Fecha de entrega de terreno: 21/10/2020

Fecha de inicio de ejecución de obra: 23/10/2020

Plazo contractual de ejecución de obra: 150 d.c.

## Estado actual

Avance físico acumulado al 20/01/2022: 34.32%.

Obra suspendida debido a la elaboración del expediente técnico de la media tensión que será aprobada por la concesionaria "ENOSA"- Lambayeque.

Reinicio de obra en 04/2022.



# OBRA C.S. PARCONA RECONSTRUCCIÓN PARCIAL



## Datos Contractuales

Fecha de suscripción de contrato: 11/11/2021

Fecha de entrega de terreno: 23/02/2022

Fecha de inicio de ejecución de obra: 03/03/2022

Plazo contractual de ejecución de obra: 360 d.c.

## Estado actual

En ejecución



# AVANCES EN EXPEDIENTE TÉCNICO





# PIA 2022

E.T.

- C.S. SALAS S/. 2,101,790.00 Oficio N°108-2022-MINSA/PRONIS-CG 25.01.22
- P.S. PUCHACA S/. 535,682.00 Oficio N°108-2022-MINSA/PRONIS-CG 25.01.22

OBRA

- C.S. PARCONA S/. 18,874,860.00
- P.S. SAPCHA S/. 1,424,586.00
- P.S. SAN PEDRO S/. 21,000.00
- C.S. LAS LOMAS S/. 80,307.00
- HOSPITAL SANTA ROSA S/. 20,277.00

**TOTAL PIA-2022**



**S/. 23,058,502.00**



PERÚ

Ministerio  
de SaludViceministerio de Prestaciones y  
Aseguramiento en SaludPrograma Nacional de  
Inversiones en Salud

# SOLICITUD DE RECURSOS

MES	DOCUMENTO	DESCRIPCION
ENERO	OFICIO N° 37-2022-MINSA/PRONIS-CG (11/01/2022)	Solicitud de Financiamiento para el C.S. INCAHUASI de CUI 2492499 por el monto de S/. 22,697,728.00
	OFICIO N° 58-2022-MINSA/PRONIS-CG (14/01/2022)	Solicitud de Financiamiento de los C.S. MOYAN de CUI 2468105 Y C.S. LAS LOMAS de CUI 2451748, por los montos de S/. 1,068,284.79 Y S/. 3,572,481.68 respectivamente.
	OFICIO N° 126-2022-MINSA/PRONIS-CG (28/01/2022)	FINANCIAMIENTO PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS EN LA MODALIDAD DE ADMINISTRACION DIRECTA POR EL MONTO DE S/. 1,243,331.87 .
FEBRERO	OFICIO N° 281-2022-MINSA/PRONIS-CG (21/02/2022)	PRESENTACION DE SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO DE LAS INTERVENCIONES DEL PIRCC POR CONTINUIDAD 2021 S/. 66,397,731.30.
MARZO	OFICIO N° 238-2022-MINSA/PRONIS-CG (01/03/2022)	SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO ADICIONAL PARA EJECUCION DE OBRA DEL CENTRO DE SALUD SAN PEDRO POR EL MONTO DE S/. 1,722,302.30
	OFICIO N° 316-2022-MINSA/PRONIS-CG (09/03/2022)	SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO ADICIONAL PARA EJECUCION DE OBRA DEL HOSPITAL SANTA ROSA POR EL MONTO DE S/. 4,363,575.80

# ACCIONES INMEDIATAS

- CONVOCAR 10 NUEVAS OBRAS (expresiones de interés):

10

E.T.  
aprobados

ÁNCASH - C.S. MORO I-3  
LA LIBERTAD – C.S. ALTO TRUJILLO I-4  
LAMBAYEQUE - C.S. INCAHUASI I-3  
LAMBAYEQUE - P.S. NUEVA ARICA I-2  
LAMBAYEQUE - P.S. TALLAPAMPA I-1  
LAMBAYEQUE - P.S. LA ESTANCIA I-2  
PIURA - C.S. MIGUEL CHECA I-3  
PIURA - C.S. IGNACIO ESCUDERO I-3  
PIURA - C.S. LANCONES I-3  
PIURA - C.S. LA UNION I-4

\* A la espera de recursos financieros por parte de la ARCC



PERÚ

Ministerio  
de Salud



GRACIAS



PERÚ

Ministerio  
de Salud

Viceministerio de Prestaciones y  
Aseguramiento en Salud

Programa Nacional de  
Inversiones en Salud



# Plan de trabajo 2022



PERÚ

Ministerio de Salud

Viceministerio de Prestaciones y Aseguramiento en Salud

Programa Nacional de Inversiones en Salud



# RETOS

## Expedientes Técnicos

Monto

S/ 46,0 millones\*

\* Monto PIRCC

25

E.T. aprobados (dic. 2022)

10

E.T. en elaboración

- LA LIBERTAD - C.S. HUANCASPATA I-3
- LA LIBERTAD - C.S. SAYAPULLO I-3
- LAMBAYEQUE - P.S. HUACAPAMPA I-2
- LAMBAYEQUE - C.S. CAYALTI I-4
- LAMBAYEQUE - P.S. LA TRANCA I-2
- LAMBAYEQUE - P.S. HIERBA BUENA I-2
- LIMA - P.S. DIGNIDAD NACIONAL I-2
- LIMA - P.S. PASAC I-1
- LIMA - C.S. BUENOS AIRES I-3
- CAJAMARCA - P.S. CALLANCAS I-2

09

E.T. por iniciar elaboración

- LA LIBERTAD - C.S. CALIFORNIA I-3
- LA LIBERTAD - P.S. PANGO I-2
- LIMA - C.S. SAYAN I-3
- LIMA - C.S. CHURIN I-3
- PIURA - P.S. TEJEDORES I-1
- PIURA - C.S. COMUNIDAD SALUDABLE I-3
- ÁNCASH - P.S. VICTOR RAUL
- LAMBAYEQUE - P.S. PUCHACA I-2
- LAMBAYEQUE - C.S. SALAS I-3

06

Con estudios básicos

- LA LIBERTAD - C.S. CALIPUY I-3
- LA LIBERTAD - C.S. QUIRUVILCA I-4
- LA LIBERTAD - C.S. CASA GRANDE I-3
- LA LIBERTAD - C.S. LUCMA
- LAMBAYEQUE - P.S. MOCUPE TRAD. I-2
- PIURA - TAMBOGRANDE I-4

# Retos



# Obras

Monto

**S/ 212,7 millones**

12

Obras culminadas  
(dic. 2022)

ÁNCASH - P.S. MAGDALENA NUEVA I-2  
PIURA - C.S. SAPILLICA I-3  
ANCASH - P.S. SAPCHA I-1  
ICA - C.S. PARCONA I-3  
LAMBAYEQUE - C.S. MOYAN I-3  
LAMBAYEQUE - P.S. LA TRANCA I-2  
PIURA - P.S. SAN PEDRO I-2  
PIURA - H. SANTA ROSA II-2  
PIURA - C.S. LAS LOMAS I-3  
CAJAMARCA - P.S. CALLANCAS I-2  
LA LIBERTAD - C.S. HUANCASPATA I-3  
LA LIBERTAD - C.S. SAYAPULLO I-3

25

Obras en  
ejecución  
(dic. 2022)

ÁNCASH - C.S. MORO I-3  
LAMBAYEQUE - C.S. INCAHUASI I-3  
LAMBAYEQUE - P.S. NUEVA ARICA I-2  
LAMBAYEQUE - P.S. TALLAPAMPA I-1  
LAMBAYEQUE - P.S. LA ESTANCIA I-2  
LAMBAYEQUE - P.S. HUACAPAMPA I-2  
LAMBAYEQUE - C.S. CAYALTI I-4  
LAMBAYEQUE - P.S. LA TRANCA I-2  
LAMBAYEQUE - P.S. HIERBA BUENA I-2  
LAMBAYEQUE - P.S. PUCHACA I-2  
LAMBAYEQUE - C.S. SALAS I-3  
PIURA - C.S. MIGUEL CHECA I-3  
PIURA - C.S. IGNACIO ESCUDERO I-3

PIURA - C.S. LANCONES I-3  
PIURA - C.S. LA UNION I-4  
PIURA - TAMBOGRANDE I-4  
LA LIBERTAD - C.S. ALTO TRUJILLO I-4  
LA LIBERTAD - C.S. CALIPUY I-3  
LA LIBERTAD - C.S. QUIRUVILCA I-4  
LA LIBERTAD - C.S. CASA GRANDE I-3  
LA LIBERTAD - C.S. LUCMA  
LIMA - P.S. DIGNIDAD NACIONAL I-2  
LIMA - P.S. PASAC I-1  
LIMA - C.S. BUENOS AIRES I-3  
LIMA - C.S. SAYAN I-3

06

Obras por  
iniciar

LA LIBERTAD - C.S. CALIFORNIA I-3  
LA LIBERTAD - P.S. PANGO I-2  
LIMA - C.S. CHURIN I-3  
PIURA - P.S. TEJEDORES I-1  
PIURA - C.S. COMUNIDAD SALUDABLE I-3  
ÁNCASH - P.S. VICTOR RAUL



PERÚ

Ministerio  
de Salud

Viceministerio de Prestaciones y  
Aseguramiento en Salud

Programa Nacional de  
Inversiones en Salud



# Intervención por región

# Expedientes técnicos

## 9 LAMBAYEQUE

LAMBAYEQUE - C.S. MOYAN I-3



LAMBAYEQUE - P.S. NUEVA ARICA I-2



LAMBAYEQUE - P.S. TALLAPAMPA I-1\*



LAMBAYEQUE - P.S. HUACAPAMPA I-2



LAMBAYEQUE - C.S. INCAHUASI I-3



LAMBAYEQUE - P.S. LA ESTANCIA I-2



LAMBAYEQUE - P.S. MOCUPE TRAD. I-2



LAMBAYEQUE - P.S. PUCHACA I-2\*



LAMBAYEQUE - C.S. SALAS I-3\*



E.T. aprobados



E.T. en elaboración



E.T. por aprobar



Con estudios básicos



En actualización presupuesto



E.T. por iniciar elaboración



## 4 ÁNCASH

ÁNCASH - C.S. MORO I-3\*



ÁNCASH - P.S. MAGDALENA NUEVA I-2



ANCASH - P.S. SAPCHA I-1



ANCASH - P.S. VICTOR RAUL\*



## 1 ICA

ICA - C.S. PARCONA I-3 (E.T.A)



Situación Actual (feb.2022)

\* opinión favorable cambio de UE

\*\* solicitud cambio de UE

\*\*\* incompletos

# Expedientes técnicos

## 11 PIURA

- PIURA - P.S. SAN PEDRO I-2 ●
- PIURA - H. SANTA ROSA II-2 ●
- PIURA - C.S. LAS LOMAS I-3 ●
- PIURA - C.S. SAPILLICA I-3 ●
- PIURA - C.S. MIGUEL CHECA I-3\* ●
- PIURA - C.S. LA UNION I-4 ●
- PIURA - C.S. IGNACIO ESCUDERO I-3 ●
- PIURA - C.S. LANCONES I-3 ●
- PIURA – TAMBOGRANDE I-4\*\*\* (E.B) ●
- PIURA - P.S. TEJEDORES I-1 (EPE) ●
- PIURA - C.S. COMUNIDAD SALUDABLE I-3 ●

E.T. aprobados



E.T. por aprobar



En actualización presupuesto



E.T. en elaboración



Con estudios básicos



E.T. por iniciar elaboración



## 9 LA LIBERTAD

- LA LIBERTAD – C.S. ALTO TRUJILLO I-4\* ●
- LA LIBERTAD - C.S. HUANCASPATA I-3 ●
- LA LIBERTAD - C.S. SAYAPULLO I-3 ●
- LA LIBERTAD – C.S. CALIPUY I-3 ●
- LA LIBERTAD – C.S. QUIRUVILCA I-4 ●
- LA LIBERTAD – C.S. CASA GRANDE I-3\* ●
- LA LIBERTAD – C.S. LUCMA\* ●
- LA LIBERTAD – C.S. CALIFORNIA I-3 ●
- LA LIBERTAD – P.S. PANGO I-2\*\* ●



Situación Actual (feb.2022)

\* Opinión favorable cambio de UE

\*\* Solicitud cambio de UE

\*\*\* Incompletos

# Obras

## 6 LAMBAYEQUE

- LAMBAYEQUE - C.S. MOYAN I-3\* ●
- LAMBAYEQUE - P.S. NUEVA ARICA I-2 ●
- LAMBAYEQUE - P.S. TALLAPAMPA I-1 ●
- LAMBAYEQUE - P.S. HUACAPAMPA I-2 ●
- LAMBAYEQUE - C.S. INCAHUASI I-3 ●
- LAMBAYEQUE - P.S. LA ESTANCIA I-2 ●

## 1 LA LIBERTAD

- LA LIBERTAD – C.S. ALTO TRUJILLO I-4\* ●

## 3 ÁNCASH

- ÁNCASH - P.S. MAGDALENA NUEVA I-2 ●
- ANCASH - P.S. SAPCHA\* ●
- ÁNCASH - C.S. MORO I-3 ●

## 1 CAJAMARCA

- CAJAMARCA - P.S. CALLANCAS I-2 ●

## 1 LIMA

- LIMA - C.S. BUENOS AIRES I-2 ●



- Obras culminadas ●
- Obras en ejecución ●
- Obras por iniciar ●

- \* Intervención económica
- \*\* plazo diferido
- \*\*\* contrato resuelto
- \*\*\*\* suspendida

# Obras

8

## PIURA

- PIURA - C.S. SAPILLICA I-3 ●
- PIURA - P.S. SAN PEDRO I-2\*\*\* ●
- PIURA - H. SANTA ROSA II-2\*\*\* ●
- PIURA - C.S. LAS LOMAS I-3\*\*\*\* ●
- PIURA - C.S. LA UNION I-4 ●
- PIURA - C.S. IGNACIO ESCUDERO I-3 ●
- PIURA - C.S. LANCONES I-3 ●
- PIURA - C.S. MIGUEL CHECA I-3 ●

1

## ICA

- ICA - C.S. PARCONA\*\* ●

- Obras culminadas ●
- Obras en ejecución ●
- Obras por iniciar ●

- \* Intervención económica
- \*\* plazo diferido
- \*\*\* contrato resuelto
- \*\*\*\* suspendida





PERÚ

Ministerio  
de Salud

Viceministerio de Prestaciones y  
Aseguramiento en Salud

Programa Nacional de  
Inversiones en Salud



# Intervenciones mensuales 2022

## I TRIMESTRE - 2022

### 04 | OBRAS EN EJECUCIÓN

REGIÓN	EE.SS.	CATEGORIA	TIPO DE INTERVENCIÓN	PPTO ASIGNADO
ICA	C.S. PARCONA	I-3	RECONSTRUCCION PARCIAL	31,572,595.12
PIURA	C.S. LAS LOMAS	I-3	RECONSTRUCCION PARCIAL	3,492,175.00
ANCASH	P.S. SAPCHA	I-1	RECONSTRUCCION TOTAL	1,571,169.37
LAMBAYEQUE	C.S. MOYAN	I-3	RECONSTRUCCION PARCIAL	1,068,285.00
<b>TOTAL</b>				<b>37,704,224.49</b>

### 02 | OBRAS POR SALDO DE OBRA

REGIÓN	EE.SS.	CATEGORIA	TIPO DE INTERVENCIÓN	PPTO
PIURA	HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU – COREA (II-2)	II-2	REHABILITACION	7,240,951.00
	P.S. SAN PEDRO	I-2	RECONSTRUCCION TOTAL	2,293,561.00
<b>TOTAL</b>				<b>9,534,512.00</b>

### 10 | OBRAS NUEVAS

REGIÓN	EE.SS.	CATEGORIA	TIPO DE INTERVENCIÓN	PPTO
PIURA	C.S. LA UNION	I-4	RECONSTRUCCION PARCIAL	19,753,453
	C.S. MIGUEL CHECA	I-3	RECONSTRUCCION PARCIAL	6,648,195
	C.S. IGNACIO ESCUDERO	I-3	RECONSTRUCCION PARCIAL	8,848,135
	C.S. LANCONES	I-3	RECONSTRUCCION PARCIAL	6,475,116
LIMA	C.S. BUENOS AIRES	I-3	RECONSTRUCCION PARCIAL	3,000,000
LAMBAYEQUE	C.S. INCAHUASI	I-3	RECONSTRUCCION TOTAL	28,975,013
	C.S. LA ESTANCIA	I-2	RECONSTRUCCION PARCIAL	5,958,558
	C.S. TALLAPAMPA	I-1	RECONSTRUCCION PARCIAL	4,722,284
LA LIBERTAD	C.S. ALTO TRUJILLO	I-4	RECONSTRUCCION TOTAL	27,043,090
ANCASH	C.S. MORO	I-3	RECONSTRUCCION TOTAL	9,441,880
<b>TOTAL</b>				<b>120,865,724.00</b>

\* Valor referencial del monto a ejecutar

### 08 | EXPEDIENTES TÉCNICOS (En elaboración)

REGIÓN	EE.SS.	CATEGORIA	TIPO DE INTERVENCIÓN	PPTO ASIGNADO (*)
LAMBAYEQUE	C.S. CAYALTI	I-3	RECONSTRUCCION TOTAL	6,200,000.00
	P.S. HIERBA BUENA	I-2	RECONSTRUCCION TOTAL	2,600,000.00
	P.S. LA TRANCA	I-2	REHABILITACION	156,000.00
LIMA	P.S. DIGNIDAD NACIONAL	I-2	RECONSTRUCCION PARCIAL	390,000.00
	P.S. PASAC	I-2	RECONSTRUCCION PARCIAL	1,900,000.00
CAJAMARCA	P.S. CALLANCAS	I-2	REHABILITACION	156,000.00
LAMBAYEQUE	P.S. HUACAPAMPA	I-2	RECONSTRUCCION TOTAL	2,600,000.00
LIMA	C.S. BUENOS AIRES	I-3	RECONSTRUCCION PARCIAL	312,000.00
<b>TOTAL</b>				<b>14,314,000.00</b>

### 04 | EXPEDIENTES TÉCNICOS (Por iniciar)

REGIÓN	EE.SS.	CATEGORIA	TIPO DE INTERVENCIÓN	PPTO PIRC
LAMBAYEQUE	P.S. PUCHACA	I-2	RECONSTRUCCIÓN PARCIAL	704,574.00
	C.S. SALAS	I-3	RECONSTRUCCIÓN PARCIAL	2,311,285.00
LA LIBERTAD	C.S. HUANCASPATA	I-3	REHABILITACION	4,640,000.00
	C.S. SAYAPULLO	I-3	REHABILITACION	1,740,000.00
<b>TOTAL</b>				<b>9,395,859.00</b>

## II TRIMESTRE - 2022

### 03 | OBRAS CULMINADAS

REGIÓN	EE.SS.	CATEGORIA	TIPO DE INTERVENCION	PPTO ASIGNADO
PIURA	C.S. LAS LOMAS	I-3	RECONSTRUCCION PARCIAL	3,492,175.00
ANCASH	P.S. SAPCHA	I-1	RECONSTRUCCION TOTAL	1,571,169.37
LAMBAYEQUE	C.S. MOYAN	I-3	RECONSTRUCCION PARCIAL	1,068,285.00
<b>TOTAL</b>				<b>6,131,629.00</b>

### 20 | OBRAS EN EJECUCIÓN

REGIÓN	EE.SS.	CATEGORIA	TIPO DE INTERVENCION	PPTO ASIGNADO
ICA	C.S. PARCONA	I-3	RECONSTRUCCION PARCIAL	31572595.12
PIURA	HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU - COREA (II-2)	II-2	REHABILITACION	7,240,951.00
	P.S. SAN PEDRO	I-2	RECONSTRUCCION TOTAL	2,293,561.00
	C.S. LA UNION	I-4	RECONSTRUCCION PARCIAL	19,753,452.78
	C.S. MIGUEL CHECA	I-3	RECONSTRUCCION PARCIAL	6,648,195.00
	C.S. IGNACIO ESCUDERO	I-3	RECONSTRUCCION PARCIAL	8,848,134.70
LIMA	C.S. LANCONES	I-3	RECONSTRUCCION PARCIAL	6,475,116.10
	C.S. BUENOS AIRES	I-3	RECONSTRUCCION PARCIAL	312,000.00
	P.S. DIGNIDAD NACIONAL	I-2	RECONSTRUCCION TOTAL	390,000.00
	P.S. PASAC	I-2	RECONSTRUCCION TOTAL	1,900,000.00
LAMBAYEQUE	C.S. INCAHUASI	I-3	RECONSTRUCCION TOTAL	28,975,012.66
	C.S. LA ESTANCIA	I-2	RECONSTRUCCION PARCIAL	5,958,557.60
	C.S. TALLAPAMPA	I-1	RECONSTRUCCION PARCIAL	4,722,284.00
	P.S. NUEVA ARICA	I-2	RECONSTRUCCION TOTAL	8,061,145.16
	P.S. HUACAPAMPA	I-2	RECONSTRUCCION TOTAL	2,600,000
LA LIBERTAD	C.S. ALTO TRUJILLO	I-4	RECONSTRUCCION TOTAL	27,043,090.00
	C.S. HUANCASPATA	I-3	REHABILITACIÓN	4,640,000.00
	C.S. SAYAPULLO	I-3	REHABILITACIÓN	1,740,000.00
ANCASH	C.S. MORO	I-3	RECONSTRUCCION TOTAL	9,441,880.20
CAJAMARCA	P.S. CALLANCAS	I-2	REHABILITACIÓN	156,000.00
<b>TOTAL</b>				<b>178,771,975.32</b>

### 04 | EXPEDIENTES TÉCNICOS (En elaboración)

REGIÓN	EE.SS.	CATEGORIA	TIPO DE INTERVENCION	PPTO PIRC
LAMBAYEQUE	P.S. PUCHACA	I-2	RECONSTRUCCIÓN PARCIAL	704,574.00
	C.S. SALAS	I-3	RECONSTRUCCIÓN PARCIAL	2,311,285.00
LA LIBERTAD	C.S. HUANCASPATA	I-3	REHABILITACIÓN	4,640,000.00
	C.S. SAYAPULLO	I-3	REHABILITACIÓN	1,740,000.00
<b>TOTAL</b>				<b>9,395,859.00</b>

### 07 | EXPEDIENTES TÉCNICOS (Por iniciar)

REGIÓN	EE.SS.	CATEGORIA	TIPO DE INTERVENCION	PPTO ASIGNADO
LAMBAYEQUE	C.S. MOCUPE TRADICIONAL	I-3	RECONSTRUCCION TOTAL	520,000.00
LA LIBERTAD	C.S. LUCMA	I-3	RECONSTRUCCION PARCIAL	1,740,000.00
	C.S. CALIPUY	I-3	RECONSTRUCCION TOTAL	4,640,000.00
	C.S. CASA GRANDE	I-3	RECONSTRUCCION TOTAL	1,740,000.00
	C.S. QUIRUJILCA	I-4	REHABILITACION	1,860,000.00
LIMA	C.S. SAYAN	I-3	REHABILITACION	3,480,000.00
PIURA	C.S. TAMBO GRANDE	I-4	REHABILITACION	1,860,000.00
<b>TOTAL</b>				<b>15,840,000.00</b>

## III TRIMESTRE - 2022

### 02 | OBRAS CULMINADAS

REGIÓN	EE.SS.	CATEGORIA	TIPO DE INTERVENCIÓN	PPTO
PIURA	HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU – COREA (II-2)	II-2	REHABILITACION	7,240,951.00
	P.S. SAN PEDRO	I-2	RECONSTRUCCION TOTAL	2,293,561.00
<b>TOTAL</b>				<b>9,534,512.00</b>

### 23 | OBRAS EN EJECUCIÓN

REGIÓN	EE.SS.	CATEGORIA	TIPO DE INTERVENCIÓN	PPTO ASIGNADO
ICA	C.S. PARCONA	I-3	RECONSTRUCCION PARCIAL	31572595.12
PIURA	C.S. LA UNION	I-4	RECONSTRUCCION PARCIAL	19,753,452.78
	C.S. MIGUEL CHECA	I-3	RECONSTRUCCION PARCIAL	6,648,195.00
	C.S. IGNACIO ESCUDERO	I-3	RECONSTRUCCION PARCIAL	8,848,134.70
	C.S. LANCONES	I-3	RECONSTRUCCION PARCIAL	6,475,116.10
LIMA	C.S. BUENOS AIRES	I-3	RECONSTRUCCION PARCIAL	312,000.00
	P.S. DIGNIDAD NACIONAL	I-2	RECONSTRUCCION TOTAL	390,000.00
	P.S. PASAC	I-2	RECONSTRUCCION TOTAL	1,900,000.00
LAMBAYEQUE	C.S. INCAHUASI	I-3	RECONSTRUCCION TOTAL	28,975,012.66
	C.S. LA ESTANCIA	I-2	RECONSTRUCCION PARCIAL	5,958,557.60
	C.S. TALLAPAMPA	I-1	RECONSTRUCCION PARCIAL	4,722,284.00
	P.S. NUEVA ARICA	I-2	RECONSTRUCCION TOTAL	8,061,145.16
	C.S. CAYALTI	I-3	RECONSTRUCCION TOTAL	6,200,000.00
	P.S. HIERBA BUENA	I-2	RECONSTRUCCION TOTAL	2,600,000.00
	P.S. LA TRANCA	I-2	REHABILITACION	156,000.00
	P.S. HUACAPAMPA	I-2	RECONSTRUCCION TOTAL	2,600,000.00
	P.S. PUCHACA	I-2	RECONSTRUCCION PARCIAL	704,574.00
	C.S. SALAS	I-3	RECONSTRUCCION PARCIAL	2,311,285.00
	LA LIBERTAD	C.S. ALTO TRUJILLO	I-4	RECONSTRUCCION TOTAL
C.S. HUANCASPATA		I-3	REHABILITACION	4,640,000.00
C.S. SAYAPULLO		I-3	REHABILITACION	1,740,000.00
ANCASH	C.S. MORO	I-3	RECONSTRUCCION TOTAL	9,441,880.20
CAJAMARCA	P.S. CALLANCAS	I-2	REHABILITACION	156,000.00
<b>TOTAL</b>				<b>181,209,322.32</b>

### 07 | EXPEDIENTES TÉCNICOS (Por iniciar)

REGIÓN	EE.SS.	CATEGORIA	TIPO DE INTERVENCIÓN	PPTO ASIGNADO
LAMBAYEQUE	C.S. MOCUPE TRADICIONAL	I-3	RECONSTRUCCION TOTAL	520,000.00
LA LIBERTAD	C.S. LUCMA	I-3	RECONSTRUCCION PARCIAL	1,740,000.00
	C.S. CALIPUY	I-3	RECONSTRUCCION TOTAL	4,640,000.00
	C.S. CASA GRANDE	I-3	RECONSTRUCCION TOTAL	1,740,000.00
	C.S. QUIRUVILCA	I-4	REHABILITACION	1,860,000.00
LIMA	C.S. SAYAN	I-3	REHABILITACION	3,480,000.00
PIURA	C.S. TAMBO GRANDE	I-4	REHABILITACION	1,860,000.00
<b>TOTAL</b>				<b>15,840,000.00</b>

### 06 | EXPEDIENTES TÉCNICOS (Por iniciar)

REGIÓN	EE.SS.	CATEGORIA	TIPO DE INTERVENCIÓN	PPTO ASIGNADO
LA LIBERTAD	P.S. PANGO	I-2	REHABILITACION	416,000.00
	C.S. CALIFORNIA	I-3	REHABILITACION	1,740,000.00
LIMA	C.S. CHURIN	I-3	REHABILITACION	3,480,000.00
PIURA	P.S. TEJEDORES	I-1	REHABILITACION	114,000.00
	C.S. COMUNIDAD SALUDABLE	I-3	REHABILITACION	390,000.00
ANCASH	P.S. VICTOR RAUL	I-2	REHABILITACION	156,000.00
<b>TOTAL</b>				<b>6,296,000.00</b>



PERÚ

Ministerio de Salud

Viceministerio de Prestaciones y Aseguramiento en Salud

Programa Nacional de Inversiones en Salud



## IV TRIMESTRE - 2022

### 02 | OBRAS CULMINADAS

REGIÓN	EE.SS.	CATEGORIA	TIPO DE INTERVENCION	PPTO ASIGNADO
LAMBAYEQUE	P.S. LA TRANCA	I-2	REHABILITACION	156,000.00
LA LIBERTAD	C.S. HUANCASPATA	I-3	REHABILITACION	4,640,000.00
	C.S. SAYAPULLO	I-3	REHABILITACION	1,740,000.00
CAJAMARCA	P.S. CALLANCAS	I-2	REHABILITACION	156,000.00
<b>TOTAL</b>				<b>6,692,000.00</b>

### 26 | OBRAS EN EJECUCIÓN

REGIÓN	EE.SS.	CATEGORIA	TIPO DE INTERVENCION	PPTO ASIGNADO
ICA	C.S. PARCONA	I-3	RECONSTRUCCION PARCIAL	31572595.12
PIURA	C.S. LA UNION	I-4	RECONSTRUCCION PARCIAL	19,753,452.78
	C.S. MIGUEL CHECA	I-3	RECONSTRUCCION PARCIAL	6,648,195.00
	C.S. IGNACIO ESCUDERO	I-3	RECONSTRUCCION PARCIAL	8,848,134.70
	C.S. LANCONES	I-3	RECONSTRUCCION PARCIAL	6,475,116.10
	C.S. TAMBO GRANDE	I-4	REHABILITACION	1,860,000.00
LIMA	C.S. BUENOS AIRES	I-3	RECONSTRUCCION PARCIAL	312,000.00
	P.S. DIGNIDAD NACIONAL	I-2	RECONSTRUCCION TOTAL	390,000.00
	P.S. PASAC	I-2	RECONSTRUCCION TOTAL	1,900,000.00
	C.S. SAYAN	I-3	REHABILITACION	3,480,000.00
LAMBAYEQUE	C.S. INCAHUASI	I-3	RECONSTRUCCION TOTAL	28,975,012.66
	C.S. LA ESTANCIA	I-2	RECONSTRUCCION PARCIAL	5,958,557.60
	C.S. TALLAPAMPA	I-1	RECONSTRUCCION PARCIAL	4,722,284.00
	P.S. NUEVA ARICA	I-2	RECONSTRUCCION TOTAL	8,061,145.16
	C.S. CAYALTI	I-3	RECONSTRUCCION TOTAL	6,200,000.00
	P.S. HIERBA BUENA	I-2	RECONSTRUCCION TOTAL	2,600,000.00
	P.S. HUACAPAMPA	I-2	RECONSTRUCCION TOTAL	2,600,000.00
	P.S. PUCHACA	I-2	RECONSTRUCCION PARCIAL	704,574.00
	C.S. SALAS	I-3	RECONSTRUCCION PARCIAL	2,311,285.00
C.S. MOCUPE TRADICIONAL	I-3	RECONSTRUCCION TOTAL	520,000.00	
LA LIBERTAD	C.S. ALTO TRUJILLO	I-4	RECONSTRUCCION TOTAL	27,043,090.00
	C.S. LUCMA	I-3	RECONSTRUCCION PARCIAL	1,740,000.00
	C.S. CALIPUY	I-3	RECONSTRUCCION TOTAL	4,640,000.00
	C.S. CASA GRANDE	I-3	RECONSTRUCCION TOTAL	1,740,000.00
ANCASH	C.S. QUIRUVILCA	I-4	REHABILITACION	1,860,000.00
	C.S. MORO	I-3	RECONSTRUCCION TOTAL	9,441,880.20
<b>TOTAL</b>				<b>190,357,322.32</b>

### 06 | EXPEDIENTES TÉCNICOS (En elaboración)

REGIÓN	EE.SS.	CATEGORIA	TIPO DE INTERVENCION	PPTO ASIGNADO
LA LIBERTAD	P.S. PANGO	I-2	REHABILITACION	416,000.00
	C.S. CALIFORNIA	I-3	REHABILITACION	1,740,000.00
LIMA	C.S. CHURIN	I-3	REHABILITACION	3,480,000.00
PIURA	P.S. TEJEDORES	I-1	REHABILITACION	114,000.00
	C.S. COMUNIDAD SALUDABLE	I-3	REHABILITACION	390,000.00
ANCASH	P.S. VICTOR RAUL	I-2	REHABILITACION	156,000.00
<b>TOTAL</b>				<b>6,296,000.00</b>



PERÚ

Ministerio  
de Salud

Viceministerio de Prestaciones y  
Aseguramiento en Salud

Programa Nacional de  
Inversiones en Salud



**Siempre**  
con el **pueblo**

# Cronograma



























