

**RESUMEN INFORMATIVO DEL AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL
PIRCC Y DE LOS SERVICIOS DE CONTROL EXPUESTOS EN LA
SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN
(14/03/2023)**

AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL PIRCC

La Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) es la responsable de administrar los recursos y la ejecución de las intervenciones del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios (PIRCC); mientras que la Comisión Especial Multipartidaria de Seguimiento al Proceso de Reconstrucción en las Zonas Afectadas por el Fenómeno de El Niño Costero, en adelante “La Comisión”, se encarga del seguimiento de la ejecución de dichas intervenciones.

La ARCC cuenta con un marco presupuestal de S/ 25 655 490, distribuidos en los siguientes componentes que forman parte del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios (PIRCC):

1. Reconstrucción: S/ 18 505 449 (11 480 intervenciones).
2. Construcción: S/ 5 446 278 (31 intervenciones).
3. Vivienda: S/ 1 253 762 (48,731 intervenciones).
4. Fortalecimiento de capacidades: S/ 450 000 (2 intervenciones).

CONFORMACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE LA ARCC

Alcance en 13 regiones con un costo inicial de S/ 25 655 millones (Ahora cerca de S/ 50 833)



Fuente: ARCC – Exposición en la sexta sesión extraordinaria de la Comisión (14/03/2023) / Elaboración: **Comisión Especial Multipartidaria de Seguimiento al Proceso de Reconstrucción en las Zonas Afectadas por el Fenómeno de El Niño Costero.**

Durante el desarrollo de la sesión, la directora ejecutiva de la ARCC informó que el costo inicial del PIRCC suma S/ 25 655 millones; no obstante, señaló que, actualmente el presupuesto total para atender todas las intervenciones asciende a S/50 833 millones.

PLAN DE LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS (RCC)

Decreto Supremo N° 091-2017-PCM (12/09/2019) y Decreto Supremo N° 040 - 2019-PCM (27/02/2019)

Inversión del Plan Integral para la Reconstrucción con Cambios (PIRCC)

En soles / miles de millones



Fuente: Contraloría General de la República – Exposición en la sexta sesión extraordinaria de la Comisión (14/03/2023) / Elaboración: **Comisión Especial Multipartidaria de Seguimiento al Proceso de Reconstrucción en las Zonas Afectadas por el Fenómeno de El Niño Costero.**

De este marco presupuestal (S/25 655 490), a la fecha, se ha gastado el monto de S/ 21 225 536 863.


Avance de la ejecución del gasto RCC - Enero 2023

AVANCE ACUMULADO RESPECTO A LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS

A enero del 2023



AVANCE ACUMULADO 2017 - Enero 2023



Fuente: Contraloría General de la República – Exposición en la sexta sesión extraordinaria de la Comisión (14/03/2023) / Elaboración: **Comisión Especial Multipartidaria de Seguimiento al Proceso de Reconstrucción en las Zonas Afectadas por el Fenómeno de El Niño Costero.**

AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO ACUMULADO

Por año respecto al total del plan:

MONTO DE INVERSIÓN TOTAL PLAN RCC (S/)		S/ 25 655 490 785	100%
Año	Devengado (S/)	Devengado acumulado (S/)	Avance %
2017	374 660 974	374 660 974	1.5 %
2018	1 785 388 494	2 160 049 468	8.4 %
2019	3 334 338 992	5 494 388 460	21.4 %
2020	3 491 648 708	8 986 037 168	35.0 %
2021	5 576 950 388	14 562 987 556	56.8 %
2022	6 292 998 937	20 855 986 494	81.3 %
2023	369 550 369	21 225 536 863	82.7%

Fuente: Contraloría General de la República – Exposición en la sexta sesión extraordinaria de la Comisión (14/03/2023) / Elaboración: **Comisión Especial Multipartidaria de Seguimiento al Proceso de Reconstrucción en las Zonas Afectadas por el Fenómeno de El Niño Costero.**

El avance actual de la ARCC es el siguiente:

**AUTORIDAD PARA LA
RECONSTRUCCIÓN CON
CAMBIOS**

13 regiones de intervención:

Áncash, Arequipa, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica
Lima, Loreto, Piura y Tumbes.

PLAN INTEGRAL ARCC:

10 810 intervenciones

Reconstrucción

- Colegios
- Hospitales
- Centros de salud
- Carreteras
- Saneamiento

69%
de avance
10 628
de obras

Construcción

- Gestión de ríos y quebradas

25%
de avance
182
de obras

• Además, se implementaron soluciones de vivienda y fortalecimiento de capacidades.

Fuente: ARCC – Exposición en la sexta sesión extraordinaria de la Comisión (14/03/2023) / Elaboración: **Comisión Especial Multipartidaria de Seguimiento al Proceso de Reconstrucción en las Zonas Afectadas por el Fenómeno de El Niño Costero.**


Desde el 2017 hasta el 2020, la decisión de priorizar las intervenciones correspondía a los gobiernos locales y regionales, a partir del 2020 hasta la actualidad esta decisión recae en la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC), según lo informado por la directora ejecutiva de la ARCC, Rosmary Cornejo Valdivia, en la sexta sesión extraordinaria de la Comisión del 14 de marzo del 2023.

Las soluciones integrales, que consisten en las intervenciones para el manejo de los ríos, quebradas y drenajes pluviales, estarán dentro de los Planes Maestros.

A insistencia de esta Comisión, en octubre del 2022, la ARCC entregó el *“Plan Maestro Integral para el Control de Inundaciones y la Gestión de Transporte de Sedimentos de la Cuenca del Río Piura y de Drenaje Pluvial Urbano de los Distritos de Piura, Castilla y Veintiséis de Octubre”*, cuyo monto estimado es de S/ 4 389 056 159.90 que comprende 120 intervenciones principales y los paquetes siguientes:

- Paquete PAR (Plan de Acción Rápida)
- Paquete 1: Presas
- Paquete 2: Salida al mar
- Paquete 3: Defensas MP y BP
- Paquete 4: Puentes
- Paquete 5: Infraestructura Natural

Actualmente el avance en la implementación de las soluciones integrales a cargo de la ARCC es del 9 % del total:

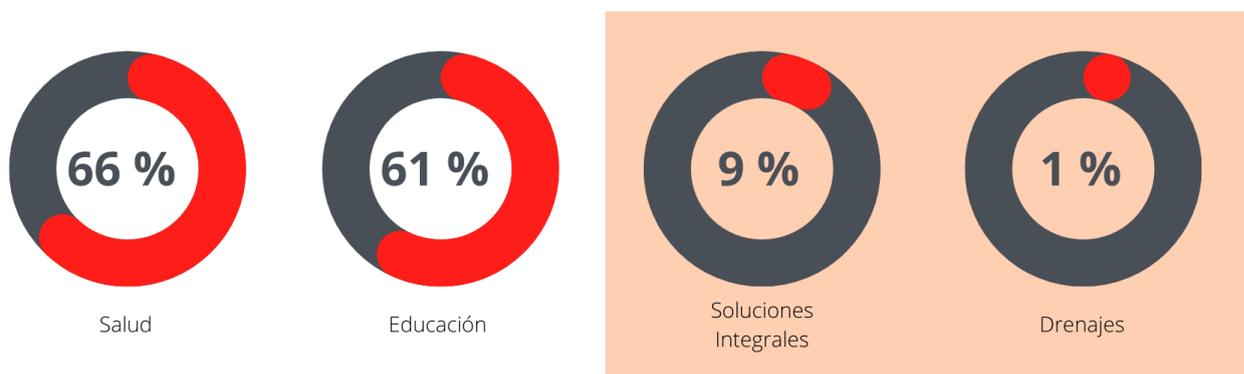

Fuente: ARCC – Exposición en la sexta sesión extraordinaria de la Comisión (14/03/2023) / Elaboración: **Comisión Especial Multipartidaria de Seguimiento al Proceso de Reconstrucción en las Zonas Afectadas por el Fenómeno de El Niño Costero.**

Si bien es cierto, en Salud y Educación se avanzó más del 50 %, resulta preocupante el avance correspondiente a Soluciones Integrales y Drenajes, siendo únicamente de 9 % y 1 %, respectivamente, a pesar de que su finalidad es disminuir el riesgo de desastres producto de los fenómenos climatológicos.

El estado situacional de las actividades y proyectos del proceso de reconstrucción con cambios es el siguiente:

Estado situacional de las actividades y proyectos de la RCC

NIVEL	Proyecto monto y avance	Etapa Previa / Con Buena Pro	En recepción/ Concluido	Total general
GOBIERNO NACIONAL	Nº Proyectos y Actividades	407	945	1 909
	Transferencia primaria S/	1 672 602 263	4 599 273 762	14 604 483 961
	Devengado acumulado S/	883 877 321	3 653 070 450	11 251 549 572
	Avance	52.8%	79.4%	77.0%
GOBIERNO REGIONAL	Nº Proyectos y Actividades	61	117	233
	Transferencia primaria S/	430 834 148	1 476 521 104	3 295 967 039
	Devengado acumulado S/	230 867 121	1 224 386 413	2 165 173 909
	Avance	53.6%	82.9%	65.7%
GOBIERNO LOCAL	Nº Proyectos y Actividades	324	3 872	4 806
	Transferencia primaria S/	541 611 819	6 632 719 009	9 280 289 481
	Devengado acumulado S/	158 982 389	6 262 975 685	7 808 813 381
	Avance	29.4%	94.4%	84.1%
TOTAL GENERAL	Nº Proyectos y Actividades	792	4 934	6 948
	Transferencia primaria S/	2 645 048 230	12 708 513 875	27 180 740 481
	Devengado acumulado S/	1 273 726 831	11 140 432 548	21 225 536 863
	Avance	48.2%	87.7%	78.1%

Fuente: Contraloría General de la República – Exposición en la sexta sesión extraordinaria de la Comisión (14/03/2023).

La Comisión ha generado espacios de coordinación con las diferentes unidades ejecutoras (gobierno nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales) para acelerar la ejecución de sus respectivas intervenciones.

Asimismo, en el siguiente cuadro presentamos el estado situacional de los contratos suscritos comprendidos como soluciones integrales:

Datos generales de los Contratos suscritos de los Paquetes – Cartera Soluciones Integrales

PAQUETE	INTERVENCIÓN	COMPONENTE	AVANCE FINANCIERO (\$ MILLONES)				AVANCE FÍSICO			
			BASE (*)	ACTUALIZADO (*)	DESEMBOLSO ACUMULADO (**)	AVANCE FINANCIERO %	PLANEADO (**)	REAL (**)	CCF (CONTRACTUAL) (***)	CCF (ESTIMADO POR EL CONTRATISTA) (***)
1	Quebrada San Carlos	A	221.10	235.60	63.11	28.79%	68.38%	14.56%	02 12 2023	26 02 2024
	Quebrada San Mateo	A	214.80	318.80	83.43	28.17%	59.24%	15.56%	02 12 2023	02 01 2025
2	Río Tumbes	A	535.60	663.40	148.91	22.15%	64.89%	8.15%	29 12 2023	04 10 2025
3	Río La Leche	A	300.10	353.20	27.20	7.70%	68.64%	17.59%	24 02 2024	06 03 2025
	Río Mátape	A	218.50	240.50	17.96	7.47%	86.58%	17.02%	25 08 2023	22 04 2024
4	Río Huarmey	A	582.40	627.40	126.04	20.99%	38.66%	8.71%	17 01 2024	12 08 2024
	Río Casma	A	243.00	262.90	59.07	22.47%	100.00%	15.99%	17 01 2023	28 11 2023
5	Río Cañete	A	236.40	382.30	126.08	32.98%	93.04%	13.04%	23 08 2023	07 01 2025
	Río Huara	A	151.50	195.00	66.15	33.92%	86.29%	23.32%	25 05 2023	05 12 2024
6	Río Matagorda	A	324.30	538.00	31.13	5.79%	83.78%	20.64%	25 10 2023	21 09 2024
R-06	Río Chicama	A	324.90	433.80	87.03	20.06%	65.60%	7.65%	29 01 2024	02 06 2025
	Río Virú	A	299.70	324.00	25.35	7.82%	96.75%	12.36%	29 05 2023	26 03 2025
R-07	Río Llacramarca	A	463.00	530.70	105.03	19.79%	88.09%	10.26%	28 04 2023	13 11 2024
R-08	Río Olmos	A	243.40	279.20	44.65	15.99%	98.32%	5.01%	13 10 2024	7 11 2024
	Río Zaña	A	160.40	176.10	31.84	18.08%	9.02%	3.09%	15 04 2025	13 05 2025
Q-02	Quebrada El León	A	509.50	686.50	178.60	26.02%	98.51%	22.62%	11 05 2023	31 01 2024
Q-04	Quebrada Huaycolomb	A	320.10	347.80	1.60	0.46%	5.10%	5.23%	22 12 2024	01 01 2025
D-05	Drainaje Sullana	A	474.90	519.50	38.33	7.38%	2.62%	2.08%	21 03 2027	04 04 2027
D-06	Drainaje Tarma	A	200.00	227.70	16.70	7.33%	0.93%	0.83%	11 06 2027	11 06 2027
Q-03	Quebrada Caseros	A	187.40	207.80	32.30	15.54%	2.91%	2.76%	03 08 2024	03 08 2024
PI	Río Chicama – Inf. Natural (+)	C	45.30	52.50	3.23	6.15%	65.60%	7.65%	10 05 2023 (+)	10 05 2023 (+)
D-01	Drainaje Pisco (+)	A	188.00	236.20	0.83	0.39%	1.21%	-	18 05 2024 (+)	18 05 2024 (+)
D-03	Drainaje Chiclayo (+)	A	596.40	1095.30	5.40	0.094%	0.20%	-	23 02 2025 (+)	23 02 2025 (+)
D-04	Drainaje Trujillo (+)	A	420.60	451.70	1.86	0.41%	0.12%	-	11 07 2024 (+)	11 07 2024 (+)
D-02	Drainaje Tumbes (+)	A	310.80	334.20	2.89	0.86%	0.08%	-	09 07 2024 (+)	09 07 2024 (+)
15	10 SAT	SAT	142.50	156.80	24.40	15.32%	53.11%	11.48%	24 03 2023	24 03 2023
Total			S/ 8 332.60	6785.60	S/ 1 347.2	15.32%	55.86%	10.30%		

Nota

(*) Información pública extraída del Banco de Inversiones del MEF (Invierte.pe), consultas realizadas al 27 de febrero de 2023.

(**) Información extraída de la plataforma POWER BI, actualizada al 31 de enero de 2023.

(***) Información extraída de la Plataforma ACONEX al 13 de febrero de 2023. Las fechas indicadas corresponden a aquellas consignadas en el Contrato y, de corresponder, a las nuevas fechas que la Junta de Control de Cambios señaló.

(+) Corresponde sólo al diseño (expediente técnico).

Fuente: Contraloría General de la República – Exposición en la sexta sesión extraordinaria de la Comisión (14/03/2023).

AVANCE DE LOS SERVICIOS DE CONTROL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA


Con las sesiones desarrolladas por la Comisión se ha generado un espacio para que la Contraloría General de la República de manera directa cumpla sus funciones de control de la ejecución del PIRCC, presentando los avances de sus servicios de control, hallazgos y recomendaciones. Este acompañamiento contribuye como una herramienta disuasiva ante posibles actos de corrupción de las entidades que administran fondos públicos provenientes de la ARCC.

De este modo, la Contraloría General de la República ha realizado 5883 servicios de control, de los cuales 5624 son de control simultáneos y 259 son de control posterior:

Servicios de control: Reconstrucción con Cambios 2017-2023

INFORMES CONCLUIDOS POR TIPO DE SERVICIO DE CONTROL


TOTAL GENERAL: 5883

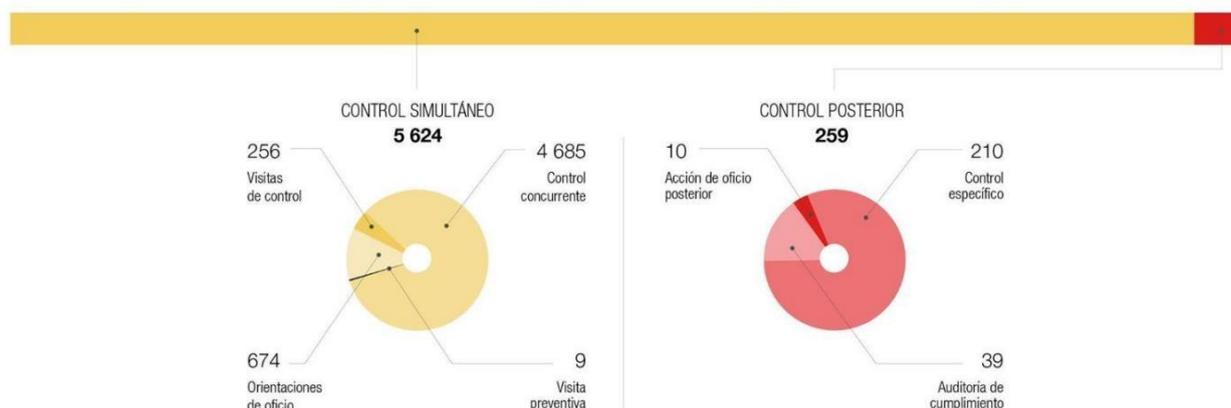

Fuente: Contraloría General de la República – Exposición en la sexta sesión extraordinaria de la Comisión (14/03/2023).

Es así que a la fecha, la Contraloría General de la República efectuó servicios de control en 1530 obras en los 13 departamentos contemplados en el PIRCC:

NÚMERO DE OBRAS POR DEPARTAMENTO

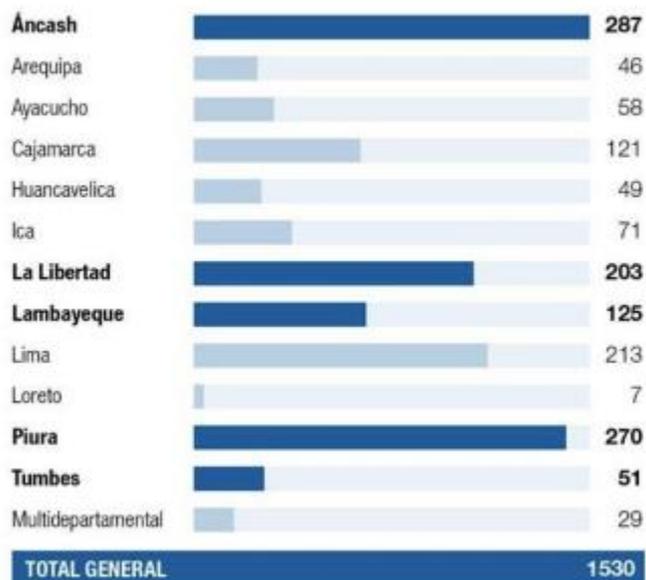

Fuente: Contraloría General de la República – Exposición en la sexta sesión extraordinaria de la Comisión (14/03/2023).

Mediante dichos servicios de control se han logrado detectar hechos y determinar hallazgos, tales como:


	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	INFORME	MONTO	OBSERVACIÓN
TUMBES	MP Tumbes	Rehabilitación del servicio de la calle Benavides, entre la intersección de la Av. Tumbes Norte y Av. Tacna	Hito de control concurrente N° 027-2022-OCI/0475-SCC	S/ 3 592 351	Incumplimiento del expediente técnico y trabajos fuera de plazo en rehabilitación de calles en Tumbes.
	Proyecto especial binacional Puyango Tumbes	Creación de defensa ribereña margen izquierda del río Zarumilla -Tramo comprendido entre Pueblo Nuevo y La Bocatoma. La Palma-Papayal-Zarumilla	Hito de control concurrente N° 0668-2023-CG/GRTB-SCC	S/ 75 575 780	No garantiza continuidad de la creación de defensa ribereña del río Zarumilla.
PIURA	GR PIURA	Ejecución del saldo de obra de mejoramiento y ampliación del servicio de protección contra inundaciones en la ciudad de Piura y Castilla entre el Pte. Cáceres y el futuro Pte. Integración de la margen derecha e izquierda del río Piura (tramo II)	Control concurrente N° 314-2023-CG/GRPI-SCC	S/ 51 765 350	Presencia de interferencias en obra del río Piura aumenta riesgo de desbordes.
	GR PIURA	Ejecución de la obra de servicio de mejoramiento del servicio de protección contra inundaciones de las ciudades de Piura y Castilla, margen derecha e izquierda del río Piura en el tramo: represa Los Ejidos al Pte. Cáceres (tramo 1)	Control concurrente N° 3475-2021-CG/GRPI-SCC	S/ 130 250 901	Advierte modificaciones y deficiencias en construcción de dique en río Piura.
LAMBAYEQUE	Programa Subsectorial de Irrigación - PSI	Ejecución del contrato N°149-2017-MINAGRI-PSI para la "Contratación del servicio de elaboración de ficha técnica definitiva y descolmatación del cauce del río La Leche - Tramo I"	Control concurrente N° 316-2018-CG/CORECH-CC	S/ 21 040 207	Obra de descolmatación del río La Leche incumplió especificaciones técnicas y pone en riesgo a pobladores.
	Programa Subsectorial de Irrigación - PSI	Ejecución del contrato N°113-2017-MINAGRI-PSI para "Contratación del servicio de elaboración de ficha técnica definitiva y descolmatación del cauce del río Zaña - Tramo I"	Control concurrente N° 3789-2018-CG/CORECH-CC	S/ 6 921 359	Obra para controlar caudal del río Zaña no coincide con el diseño aprobado y no evitará inundaciones.

LA LIBERTAD	MP Ascope	Ejecución de la obra "Creación del servicio de protección en riberas del río Chicama vulnerables ante peligro de inundación en los sectores de Pte. Victoria aguas abajo, Alayo y Paiján"	Control concurrente N° 5499-2021-CG/GRLIB-SCC	S/ 18 015 237	Ausencia de personal afecta adecuado control técnico y calidad de obra para defensas ribereñas del río Chicama.
	MD Laredo	"Contratación del servicio de elaboración de ficha técnica definitiva y descolmatación, encauzamiento de las quebradas San Idelfonso, Avendaño, Galindo, La Portada, Pedregal y San Carlos"	Control concurrente N° 359-2018-CG/GRLIB-SCC	S/ 7 748 055	Deficiencias técnicas en encauzamiento de quebradas exponen a la población ante efectos de fenómenos naturales.

Fuente: ARCC – Exposición en la sexta sesión extraordinaria de la Comisión (14/03/2023) / Elaboración: Comisión Especial Multipartidaria de Seguimiento al Proceso de Reconstrucción en las Zonas Afectadas por el Fenómeno de El Niño Costero.

Además, la Contraloría General de la República detalló que existe un total de 845 funcionarios con presunta responsabilidad en los tres niveles de gobierno, en las diferentes categorías. (Tabla 02).

Tabla 02



Fuente: Contraloría General de la República – Exposición en la sexta sesión extraordinaria de la Comisión (14/03/2023) / Elaboración: Comisión Especial Multipartidaria de Seguimiento al Proceso de Reconstrucción en las Zonas Afectadas por el Fenómeno de El Niño Costero.

Asimismo, la Contraloría General de la República ha identificado un total de 1984 presuntas responsabilidades distribuidas de la siguiente forma. (Tabla 03).

Tabla 03



Fuente: Contraloría General de la República – Exposición en la sexta sesión extraordinaria de la Comisión (14/03/2023) / Elaboración: **Comisión Especial Multipartidaria de Seguimiento al Proceso de Reconstrucción en las Zonas Afectadas por el Fenómeno de El Niño Costero.**
