



PERÚ

Ministerio
de Salud

SITUACION DE LA INFRAESTRUCTURA EN SALUD

CUSCO

MINISTERIO DE SALUD

CIRO ABEL MESTAS VALERO

VICEMINISTRO DE PRESTACIONES Y ASEGURAMIENTO EN SALUD

Junio 2024



BICENTENARIO
PERÚ
2024

CATEGORIA	ACOMAYO	ANTA	CALCA	CANAS	CANCHIS	CHUMBIVILCAS	CUSCO	ESPINAR	LA CONVENCIÓN	PARURO	PAUCARTAMBO	QUISPICANCHI	URUBAMBA	TOTAL
III-1							2							2
II-E							1							1
II-1					1	1		1	2					5
I-4	2	2	3	2	2	1	2	1	9	1	2	4	5	36
I-3	1	4	4	1	3	3	14	1	9	2	2	3		47
I-2	2	9	6	10	9	12	10	8	35	7	5	9	3	127
I-1	5	3	22	4	5	27	1	3	46	4	6	7	7	140
TOTAL PNA Y HOSPITALES	10	18	35	17	20	44	30	14	101	14	15	23	15	356

BRECHA I NIVEL	100%	78.95%	97.22%	93.75%	95.45%	100%	93.55%	85.71%	88.6%	100%	93.75%	96%	88.24%
BRECHA HOSPITALES					100%	100%	100%	100%	100%				

Fuente: RENIPRESS y MEF al 8.06.24

92.61 %

100 %

I NIVEL

HOSPITALES

348
8

BRECHA DE LOS EE.SS. CAPACIDAD INSTALADA INADECUADA: INFRAESTRUCTURA Y/O EQUIPAMIENTO



PERÚ

Ministerio
de Salud

HOSPITAL ANTONIO LORENA



BICENTENARIO
PERÚ
2024

1. HOSPITAL ANTONIO LORENA

MINSA

- ☐ **Celebra el Contrato Estado a Estado** para la ejecución del Hospital Antonio Lorena. El modelo basado en FIDIC* plata 99

PRONIS

- ☐ **Unidad ejecutora** del MINSA que **tiene a cargo la administración y supervisión del Contrato de PMO y Consorcio SRT.**

PMO

- ☐ Evaluación situacional del proyecto existente.
- ☐ Asistencia técnica y legal durante las etapas de ingeniería, procura, construcción y puesta en marcha.
- ☐ Asistencia para la externalización de servicios hospitalarios (gestión de batas).
- ☐ Transferencia de conocimientos (capacitaciones en gestión de proyecto y gestión hospitalaria).

CONSORCIO

- ☐ Elaboración de estudios e investigaciones.
- ☐ El desarrollo de la ingeniería.
- ☐ Suministro, instalación y puesta en marcha del equipamiento médico y logístico.
- ☐ El suministro y parametrización de los Sistemas de información Hospitalarios.
- ☐ Parte de las actividades necesarias para la puesta en marcha general del hospital atribuida al CONTRATISTA.
- ☐ Las actividades de ingeniería elaboración y realización de estudios y trámites, obtención de licencias y permisos, gestión de proyectos y capacitación, relacionadas con las actividades anteriores

FUNCIONES

¿QUIEN SUPERVISA EL CONTRATO?

El contrato modelo **FIDIC* plata 99**, que utilizados a nivel internacional en los sectores de ingeniería y construcción; cuyas condiciones de contratación son para Proyectos Llave en mano, **NO CONTEMPLA LA FIGURA DE SUPERVISOR**, por lo que la por lo que **PRONIS Y PMO están realizando las auditorías de calidad, y verificando el avance con el personal en obra.**

El Contrato FIDIC plata estable para la inspección de la obra:

- ☐ **Sub cláusula 6.8: Dirección de obra**, el Contratista debe proporcionar los servicios, entre otros, inspeccionar y ensayar los trabajos que ejecuta los subcontratistas.
- ☐ **Sub cláusula 7.3: Inspección**, El Personal del Cliente** tiene derecho, entre otros, a inspeccionar la ejecución del proyecto.
- ☐ **Sub cláusula 4.9: Aseguramiento de la calidad**, El contratista deberá implementar un sistema de aseguramiento de la calidad que demuestre el cumplimiento del contrato, y el cliente tendrá derecho a auditar cualquier aspecto.

En ese sentido, se aclara que de acuerdo a la filosofía del Contrato FIDIC Plata 99 y al ejecutarse mediante la modalidad de Llave en Mano, no contempla una supervisión, y que el Contratista es el responsable de entregar la obra cumpliendo con los requisitos establecidos en el Programa Técnico y al Mejor Compromiso presentado en la Etapa 01.

* FIDIC "International Federation of Consulting Engineers" (Federación internacional de consultores de ingeniería)

**Cliente: según contrato FIDIC plata 99 es PRONIS

Avance de obra del Consorcio Salud Lorena* antes de ser entregado a PRONIS

- De acuerdo a INFOBRAS la obra tenía un avance del **76.71% antes de ser resuelto el Contrato del Consorcio Salud Lorena.**
- Posteriormente, el **Gobierno Regional del Cusco determinó un avance físico de obra de 62.18 %** vinculante al acta de Constatación Física de Obra en el 2015.
- Sin embargo, **en el 2020, la PMO subcontrató a la Empresa Ingenieros JG para la realización de una Auditoría General** de la Infraestructura del Hospital Antonio Lorena de Cusco. Sobre esta base, y aplicando el porcentaje de terminación por especialidad, estimó el porcentaje global de avance de las obras ejecutadas por el anterior contratista:

Progreso de las obras (infraestructura) 41,6%

Progreso del equipamiento medico..... 0%

- Luego del desmontaje y demolición, se cuenta con la siguiente estimación de la infraestructura que servirá de base para la ejecución:

ESTIMACIÓN DE INFRAESTRUCTURA REUTILIZABLE							
ESPECIALIDAD	CD		GG		UTI		
ESTRUCTURAS	S/	49,047,486.72	S/	8,063,406.82	S/	3,982,655.92	S/ 61,093,549.46
ARQUITECTURA	S/	46,474,317.64	S/	7,640,377.82	S/	3,773,714.59	S/ 57,888,410.05
INST. SANITARIAS	S/	8,223,429.91	S/	1,351,931.88	S/	667,742.51	S/ 10,243,104.30
INST. ELÉCTRICAS	S/	15,667,259.76	S/	2,575,697.50	S/	1,272,181.49	S/ 19,515,138.76
INST. MECANICAS	S/	15,450,385.65	S/	2,540,043.40	S/	1,254,571.31	S/ 19,245,000.37
INT. COMUNICACIONES	S/	4,405,317.13	S/	724,234.14	S/	357,711.75	S/ 5,487,263.02
					CD	S/ 173,472,465.95	S/ 51,258,644.74
					IGV	S/ 31,225,043.87	S/ 9,226,556.05
					TOTAL	S/ 204,697,509.82	S/ 60,485,200.80
							29.55%

* Consorcio Salud Lorena: Anterior ejecutor de obra y contratado por el Gobierno Regional del Cusco

HOSPITAL ANTONIO LORENA



MONTO TOTAL	:	S/ 968,892,547.75
<i>Comprende</i>		
• Etapa 1	:	S/ 28,003,567.17
• Etapa 2	:	S/ 940,888,980.58
FECHA DE INICIO DE OBRA		06 DE DICIEMBRE DEL 2022
PLAZO INICIAL		730 DÍAS CALENDARIOS
AMPLIACIÓN DE PLAZO		120 DÍAS CALENDARIOS (APROB.) VICIOS OCULTOS EN EVALUACION
FECHA DE CULMINACIÓN ACTUALIZADA		ABRIL 2025 (VICIOS OCULTOS EN EVALUACIÓN)
CATEGORÍA DEL HOSPITAL		III-1
CONTRATISTA	:	CONSORCIO (STILER, RIPCONCIV, TECNOEDIL S.A.)
PMO FRANCIA		CONSORCIO EGIS AP HPI
AVANCE FINANCIERO	:	S/ 306,975,385.58

HOSPITAL ANTONIO LORENA

Costos de inversión del proyecto – formato 8a

DETALLE		MONTO (S/)
MINSA	Contrato Consorcio SRT	988,589,035.06
	Contrato PMO Francia	50,028,629.87
	Dispute Adjudicate Board - DAB	489,002.60
	Gestión PRONIS	12,558,662.25
CONTRALORÍA		6,960,100.25
GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO (2009 - 2019)		307,528,056.45
TOTAL (S/)		1,366,153,486.48

Fuente: Invierte.pe

- ☐ SRT: Stiler Ripconciv Tecnoedil.
- ☐ PMO: Oficina de Gestión de Proyectos.
- ☐ DAB: Junta de Resolución de Disputas

HOSPITAL ANTONIO LORENA

Fases del proyecto

FASE	DESCRIPCIÓN	FECHA	
		INICIO	FINAL
CULMINADO	Firma del contrato con PMO francesa	27/06/2020	
	Fase 1-2 Estructuración PMO Francesa y evaluación situacional	26/08/2020	27/10/2020
	Fase 3 Elaboración de los términos de referencia para la contratación del ejecutor del hospital.	26/08/2020	14/02/2021
	Fase 4 Procura internacional y suscripción del contrato.	9/09/2020	23/12/2021
	Fase 5 Etapa 1: Estudios e investigaciones para el diseño	23/12/2021	17/10/2022
	Fase 5 Etapa 2: Elaboración del Expediente técnico, ejecución de obra (modalidad Fast track).	6/12/2022	ABRIL 2025
	Fase 6 Recepción de la obra y puesta en marcha.	29/11/2024	ABRIL 2025
	Fase 7 Elaboración de términos de referencia para la procura de implementación de batas.	29/05/2024	ABRIL 2025

JUNIO 2024

HOSPITAL ANTONIO LORENA

Fase 5 del proyecto

ETAPA 2: Elaboración del Expediente técnico, ejecución de obra (modalidad Fast track).

Finalización de estudios de ingeniería, procura de infraestructura y equipamiento, ejecución de la construcción e instalaciones, puesta en marcha y entrega del proyecto.

Modalidad de ejecución: Fast Track

INGENIERÍA

PROCURA


CONSTRUCCIÓN

VERIFICACIÓN Y PRUEBAS



HOSPITAL ANTONIO LORENA

CURVAS – Avance real vs Avance programado:

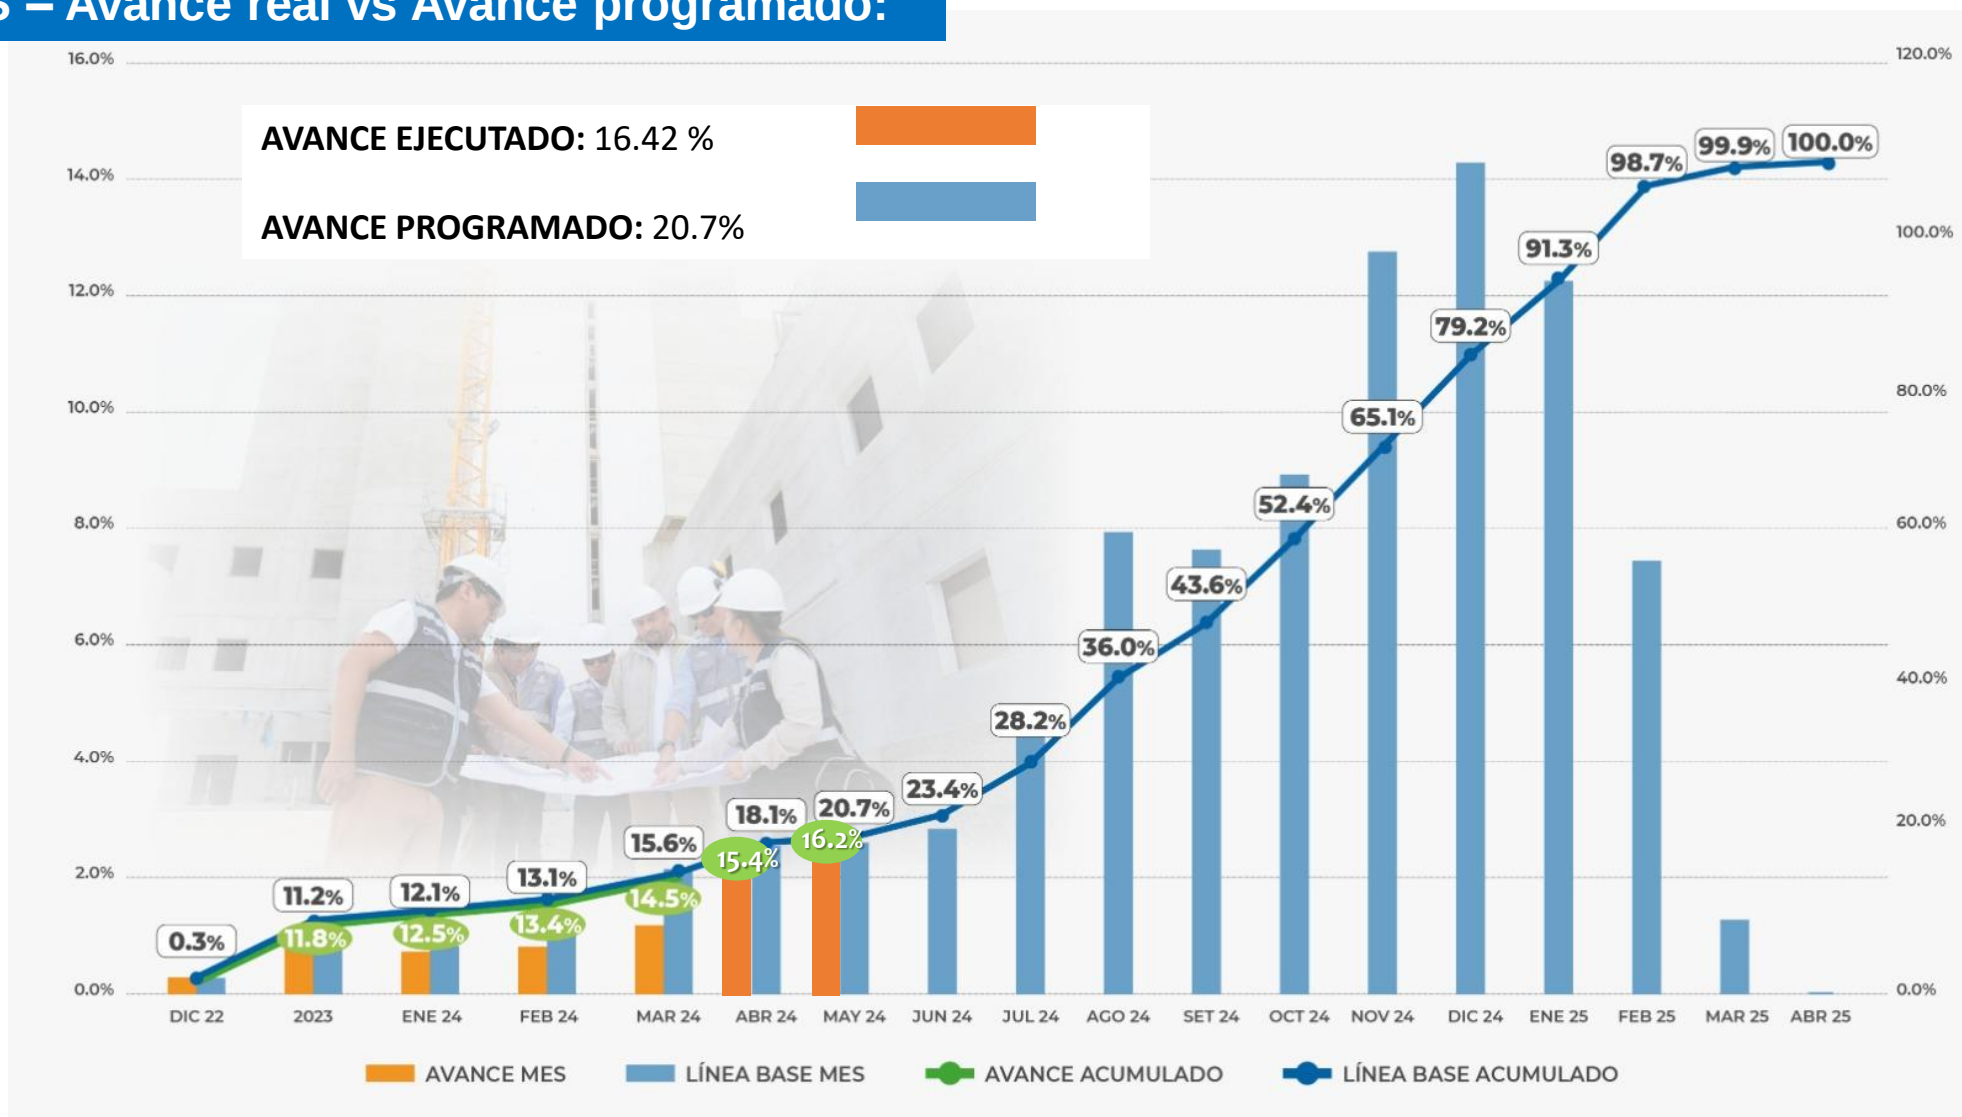

HOSPITAL ANTONIO LORENA

Problemas encontrados durante la ejecución

HALLAZGOS ENCONTRADOS EN LA CONSTRUCCIÓN EXISTENTE:

1. Defectos constructivos por mayores deflexiones en los elementos estructurales.
2. Falta de acero en los elementos estructurales como vigas existentes de concreto armado.
3. Fractura y desprendimiento en losas de falso piso existente.



ACCIONES

- Se ha realizado la evaluación de las estructuras existentes y se viene ejecutando el mayor reforzamiento estructural.

CONSECUENCIAS:

- Demora en el inicio de ejecución las partidas de vaciado de concreto de falso piso, tabiquería húmeda.
- Demora en el término de obra.

HOSPITAL ANTONIO LORENA

Sobre las pruebas de carga estática

- ☐ Actualmente, durante la ejecución de la **Eta**pa 2 del Hospital Antonio Lorena, se están realizando los **reforzamientos estructurales con fibra de carbono**, y está previsto iniciar con el reforzamiento estructural utilizando estructuras metálicas durante la segunda quincena del mes de junio 2024; por lo que, las **pruebas de carga podrían realizarse una vez concluido estos reforzamientos, aproximadamente julio 2024**.
- ☐ Se aclara que estas **pruebas adicionales no están previstas**, por lo que, se debe realizar una evaluación de responsabilidad en el costo, que tienen un valor aproximado de \$16,000.00 (dieciséis mil dólares) por bloque, dependiendo de la evaluación de la estructura y normativa técnica peruana; razón a ello, dichas pruebas físicas deben realizarse de manera aleatoria en ciertos bloques como referencia del total (25 bloques), considerando que han sido reforzados de manera similar.

HOSPITAL ANTONIO LORENA

Implementación de acciones ante los vicios ocultos

Acuerdo de la reunión del 04 de junio del 2024 entre PRONIS, PMO y CSRT.

EMITE	FECHA	SUMILLA
PRONIS	5 – JUN – 2024	TRASLADA OPINIÓN DE PMO AL CONTRATISTA
CONTRATISTA	10 – JUN – 2024	REMITE RESPUESTA A PRONIS
PRONIS	17 – JUN – 2024	ANALISIS DE COSTO BENEFICIO
PMO	21 – JUN – 2024	RESPUESTA POSITIVA A PRONIS
PRONIS Y CSRT	28 – JUN – 2024	SUSCRIPCIÓN DE ADENDA

HOSPITAL ANTONIO LORENA

Panel fotográfico del proyecto



Remoción de suelo para reposición de falso piso



Colocación de acero de columnas y muros del bunker de braquiterapia



Restitución del Bloque 12



Tabiquería húmeda en interiores



Cisterna de riego



Demolición de viga y losa para reforzamiento



Apuntalamiento para luego iniciar demolición.

HOSPITAL ANTONIO LORENA

Panel fotográfico del proyecto



Armado de acero de techo de ascensor
– Bloque 15



Curado de contrapisos.



Armado de contrapiso



Acabado de buzones



Pegado de Fibra de Carbono (FRP).



Armado y encofrado de vigas - Bloque
16



Compactación de suelo - Bloque 16.



Muros perimetrales de los bloques.

HOSPITAL ANTONIO LORENA - HOSPITAL DE

Reposición de EQUIPAMIENTO

GORE formuló, culminó y APROBO el IOARR 2644467 - “ADQUISICION DE MAQUINA DE ANESTESIA, ARCO EN C, MICROSCOPIO QUIRURGICO Y EQUIPO ECOGRAFO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) ANTONIO LORENA DEL CUSCO”

MONTO S/ 6,114,900.00

EQUIPOS:

- MAQUINA ANESTESIA
- ARCO EN C
- MICROSCOPIO QUIRURGICO
- TORRE LAPAROSCOPICA
- ECÓGRAFO
- MESA DE OPERACIONES
- INCUBADORAS NEONATALES (02)

GORE CUSCO a cargo de la gestión de recursos y del proceso de adquisición



PERÚ

Ministerio
de Salud

HOSPITAL ESPINAR



BICENTENARIO
PERÚ
2024

2. HOSPITAL DE ESPINAR

Datos del proyecto



**S/ 133.15
Millones**

MONTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO



**69,146¹
Beneficiarios**



- Construcción: 11,529.12 m²



Consultorios :

- ✓ 7 consultorios médicos especializados
- ✓ 11 consultorios no médicos



- Tópicos de Urgencias y Emergencias: 6



Nº de camas de observación: 7

Nº de camas: 39



Nº de incubadoras: 3



No de cunas de hospitalización : 02



Nº de salas de parto: 2

Nº de salas de operaciones: 2

HOSPITAL ESPINAR

Cronograma de ejecución de obra

I. CRONOGRAMA DE CONVOCATORIA PARA EL **EXPEDIENTE Y EJECUCIÓN SALDO DE OBRA (FAST TRACK)**

COSTO ACTUALIZADO:
105 000 000.00

PIM: 14 260 032

AVANCE FINANCIERO:
60.3%

AVANCE FISICO: 44.2%

Elaboración de TDR para expediente técnico del saldo de obra

- Términos de referencia en revisión.
- Inclusión en el cuadro de necesidades y PAC.

Proceso de contratación

• Junio – julio 2024

Expediente técnico y ejecución de obra

• Inicio: agosto 2024 (tentativo).

El procedimiento de selección se realizará bajo la **modalidad fast track**, con la finalidad de culminar la ejecución del saldo de la obra. Con fecha 12 de enero 2024, la **entidad resuelve el contrato al CONSORCIO HOSPITAL ESPINAR, por incumplimiento de obligaciones contractuales**, por la causal del numeral 203.5 del Artículo 203 del RLCE: Cuando el monto de la valorización acumulada ejecutada es menor al ochenta por ciento (80%) del monto acumulado programado del nuevo calendario.



PERÚ

Ministerio
de Salud

HOSPITAL SANTO TOMAS



BICENTENARIO
PERÚ
2024

3. HOSPITAL DE SANTO TOMAS – CUI 2493108

Datos del proyecto



**S/ 144.09
Millones**

MONTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO



129,450¹

Beneficiarios



RESIDENCIA MEDICA

CASA MATERNA

CATEGORIA PROYECTADA II-1



Construcción: 10,045.69 m2



Consultorios :

- ✓ 08 consultorios médicos especializados
- ✓ 01 teleconsultorio
- ✓ 16 consultorios no médicos
- ✓ 04 salas de procedimientos



No de camas UVI: 2

No de camas de observación: 06

No de camas de Hospitalización: 38



No de cunas de hospitalización : 04




No SOP : 2

No sala parto : 2

HOSPITAL SANTO TOMAS

Datos del proyecto

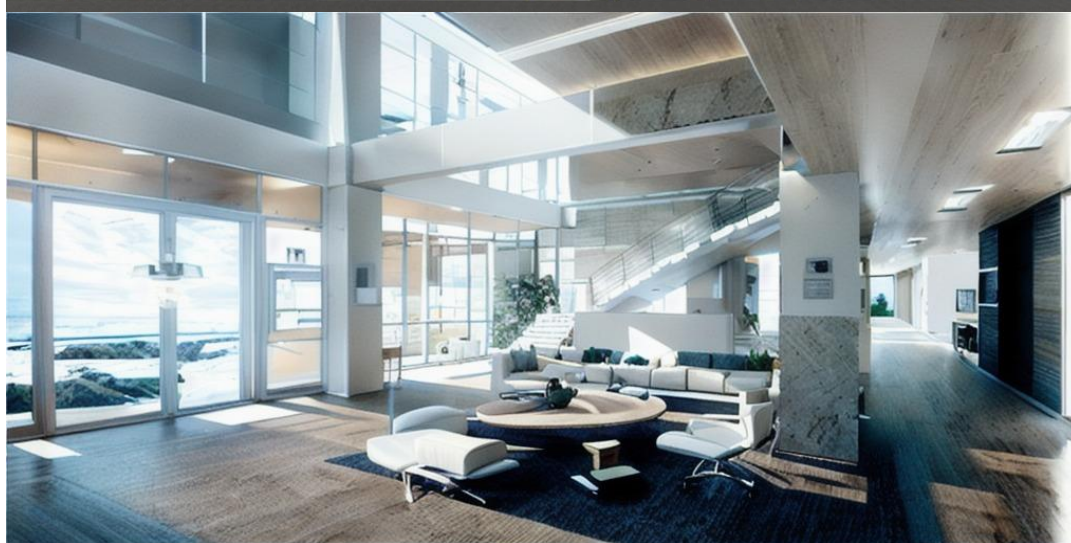

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD
DEL HOSPITAL SANTO TOMAS, DISTRITO DE SANTO TOMAS -
PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO

CARTERA DE SERVICIOS:

consultorios externos médicos y no médicos
Consulta Externa Especializada
Urgencias y Emergencias
Patología Clínica
Anatomía Patológica
Centro Obstétrico
Centro Quirúrgico
Radiología
Mamografía
Ecografía
Rehabilitación
Hemoterapia y Banco de Sangre.

3. HOSPITAL SANTO TOMAS - CHUMBIVILCAS

ESTADO ACTUAL

- ❑ Tiene un PIM de S/ 1.86 MM
- ❑ A la fecha en elaboración del EXPEDIENTE TECNICO a cargo del GORE CUSCO, modalidad administración directa (in house).
- ❑ Avance aproximado del 85%, se estima culminación en AGO.2024, pendiente la certificación ambiental y complementar estudio de suelos
- ❑ Aprobación del expediente para SEP-OCT, previa verificación de la supervisión

Certificación Ambiental (Estudio de Impacto Ambiental)

Estudios de Suelos adicionales para la implementación de aisladores sísmicos

Inicio de Elaboración del ET

Aprobación del ET con Resolución Gerencial

10/2023

Fines de Agosto del 2024



PERÚ

Ministerio
de Salud

HOSPITAL QUILLABAMBA



BICENTENARIO
PERÚ
2024

4. HOSPITAL QUILLABAMBA

Datos del proyecto



**S/ 222.56
Millones**

MONTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO



145,145
Beneficiarios

1



• Construcción:
20,057.87 m²



Consultorios :

- ✓ 12 consultorios médicos especializados
- ✓ 15 consultorios no médicos



N° de
ambulancias : 01



No de camas de
observación: 19

No de camas de
Hospitalización: 88

No de camas UCI: 6

No de cunas UCI: 3

HOSPITAL QUILLABAMBA

Datos del proyecto



CARTERA DE SERVICIOS:
consultorios externos médicos y no médicos:
Consulta Externa Especializada
Urgencias y Emergencias
Centro Obstétrico, 2 Salas de Operaciones,
Radiología, Mamografía, Ecografía,
Rehabilitación, Hemoterapia y Banco de
Sangre.

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL **HOSPITAL QUILLABAMBA** DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCION Y DEPARTAMENTO DE CUSCO

CATEGORIA PROYECTADA	II-1
Proyección Hospital	
N° DE PISOS	04 PISOS + 01 SOTANO
N° ASCENSORES	4
N° MONTA CAMILLAS	2
N° MONTA CARGAS	2
N° DE CONSULTORIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	12
N° DE CONSULTORIO NO MEDICOS	15
N° DE CAMAS DE HOSPITALIZACIÓN	88
N° DE CAMAS DE EMERGENCIA	19
N° CAMAS UCI	6
N° CUNAS UCI	3
N° AMBULANCIAS	1

HOSPITAL QUILLABAMBA

Datos del proyecto


FECHA DE CULMINACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SALDO DE OBRA: FINES DE JUNIO DE 2024
ACTOS PREPARATORIO, INICIO DE CONVOCATORIA Y FIRMA DE CONTRATO: JULIO - AGOSTO
REINICIO DE OBRA: SEPTIEMBRE DE 2024 (Plazo de ejecución: 18 meses)



HOSPITAL QUILLABAMBA

Expediente técnico de saldo de obra

DOCUMENTOS EN PROCESO DE APROBACIÓN

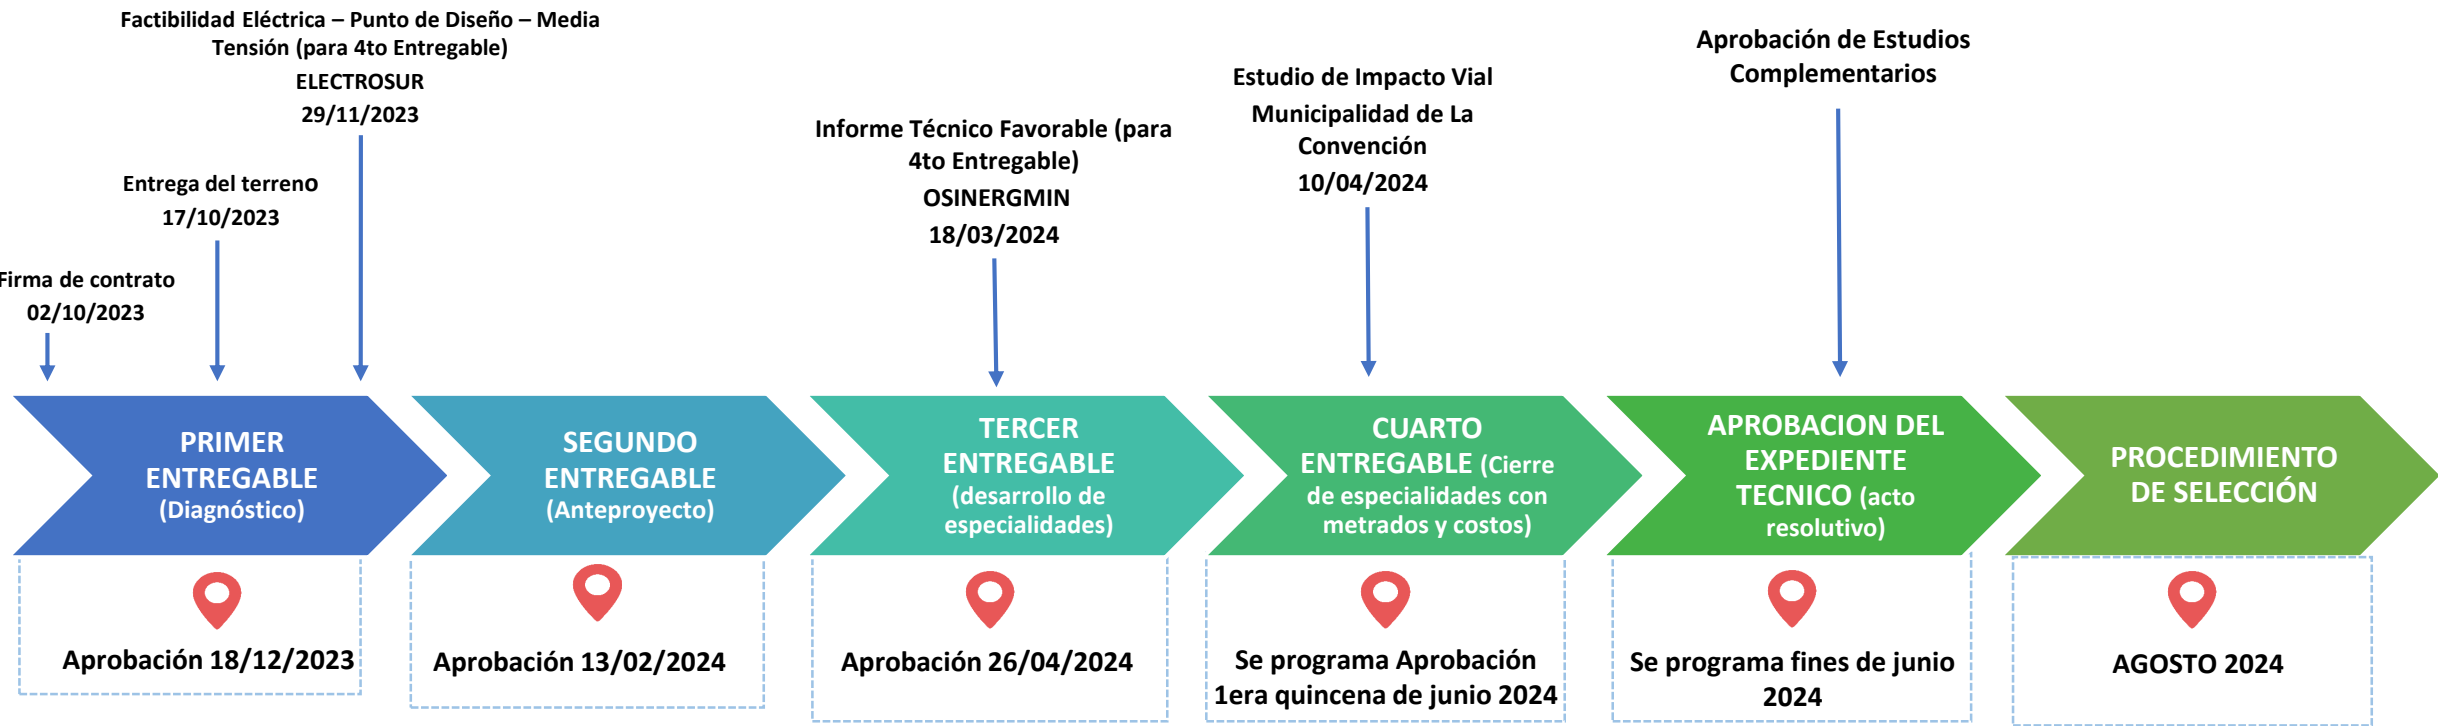

MITIGACION DE RIESGOS

Estabilización de Talud

Se requiere que el Gobierno Regional de Cusco y la Municipalidad Provincial de la Convención, dentro de los compromisos enmarcados en el Convenio de Cooperación Interinstitucional suscrito el 03 de diciembre del 2014, **tome las acciones para el tratamiento geotécnico y estabilización del talud** entre el terreno del Hospital Quillabamba y el cauce del río Vilcanota.

En noviembre de 2020 se remite el Informe Final de Análisis de los Alcances del Estudio de Evaluación de Riesgos (EVAR) del expediente técnico de saldo de obra:

- Mediante Oficio N° 2072-2020-MINSA/PRONIS-CG a la Municipalidad Provincial de La Convención
- Mediante Oficio N°2073-2020-MINSA/PRONIS-CG al Gobierno Regional de Cusco.

PRONIS ha emitido posteriores oficios solicitando implementación e informe sobre las acciones indicadas en el EVAR.

Con fecha 16 de mayo de 2024, mediante Oficio N°362-2024-MPLC/GM la Municipalidad Provincial de la Convención comunica que viene elaborando el estudio de pre inversión denominado “CREACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION EN RIBERAS DE RIO VULNERABLES ANTE EL PELIGRO DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO VILCANOTA POR EROSION DE TALUD ALEDAÑO AL HOSPITAL DE QUILLABAMBA, DISTRITO DE SANTA ANA DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION, DEPARTAMENTO DE CUSCO”





PERÚ

Ministerio
de Salud

HOSPITAL II-E TUPAC AMARU



BICENTENARIO
PERÚ
2024

HOSPITAL TÚPAC AMARU

IOARR CONVENIO ENTRE EL MINSA Y GORE CUSCO

Datos del proyecto

S/ 10.95 millones

MONTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO



+ 300,000 Beneficiarios¹



- Construcción: 120 m²



Implementación de la UPSS Apoyo al Diagnostico :

- ✓ 01 sala de tomografía y 01 sala de mamografía
- ✓ Ambientes Complementarios



No de Equipos:

- 01 Tomógrafo de 128 cortes
- 01 mamógrafo
- 01 maquina de anestesia
- 01 coche de paro equipado

5. HOSPITAL II-E TUPAC AMARU

FORTALECER PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DEL CÁNCER EN REGION CUSCO



- ❑ MINSA mediante la Dirección de Prevención y Control de Cáncer se realiza la asignación presupuestal de la Ley N° 31638 – “**compra centralizada de equipamiento biomédico para el fortalecimiento de las acciones para la prevención y control de cáncer**”
- ❑ **Compromiso MINSA:** adquisición de mamógrafo y tomógrafo (transferidos 2023)
- ❑ **Compromiso GORE:** construcción de ambientes (06) para la instalación de los equipos, incluida sala de lectura y sala preparación paciente.
- ❑ Mamógrafo culminado (ambientes adecuados), entregado con pruebas y permisos, en OPERATIVIDAD programado al 14.JUN
- ❑ Tomógrafo, pendiente culminación de luminarias y acabados eléctricos; además de pruebas operativas (MINSA), y licencia IPEN pendiente (encargado GORE). Operatividad JUL.2024

HOSPITAL SANTO TOMAS


EJECUCIÓN FÍSICA DE LA OBRA

FASE DE EJECUCIÓN FÍSICA



Nudo Crítico

A la fecha la empresa responsable del tomógrafo, no ha levantado las observaciones ante el MINSA, no se ha entregado formalmente al área usuaria

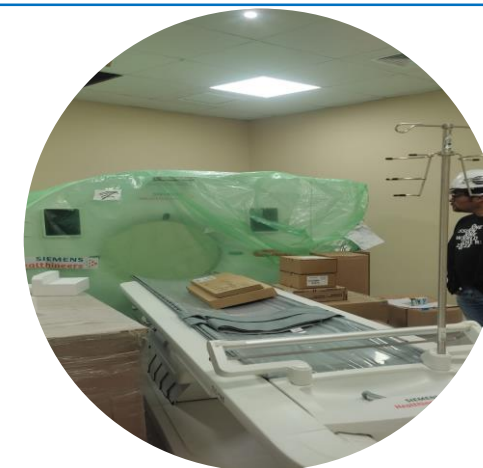

Inicio de Ejecución de obra

10/2023

Conclusión de la Ejecución de Obra

Componente infraestructura concluye Fines de Julio del 2024
Componente equipamiento concluye a fines de setiembre del 2024

HOSPITAL TÚPAC AMARU – PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

Puesta en funcionamiento del mamógrafo



Fecha de inicio del servicio:

14 de junio del 2024

Recurso Humano con que cuenta:

	PERSONAL CON EL QUE SE CUENTA	PERSONAL REQUERIDO
MEDICO RADIOLOGO	1	3
TECNOLOGO MEDICO	0	5
LIC. ENFERMERIA	0	2
RESPONSABLE DE REFERENCIA Y CONTRA REFERENCIA	0	1

NOTA 01: CONVOCATORIA CAS N°002-2024-GR SE LANZO EL 6 DE JUNIO PARA LA CONTRATACION DE 01 TECNOLOGO MEDICO Y 01 MEDICO ESPECIALISTA EN GINECOLOGIA



PERÚ

Ministerio
de Salud

PLAN MIL



BICENTENARIO
PERÚ
2024

PLAN MIL



PIM 2024 : S/ 16.34 M

**(22) EE.SS con financiamiento
PIM 2024**

64 E.S. INTERVENIDOS

(S/ 996 MM aprox.)

48

**PROYECTOS
(S/ 945 MM aprox.)**


16

**INTERVENCIÓN INTEGRAL
(S/ 51 MM aprox.)**

Categoría de EESS:

- 40 nivel I-2
- 20 nivel I-3
- 04 nivel I-4

**C.S. QUIÑOTA – CHUMBIVILCAS en EJECUCION
(S/ 27.47 MM) desde FEB.2024**

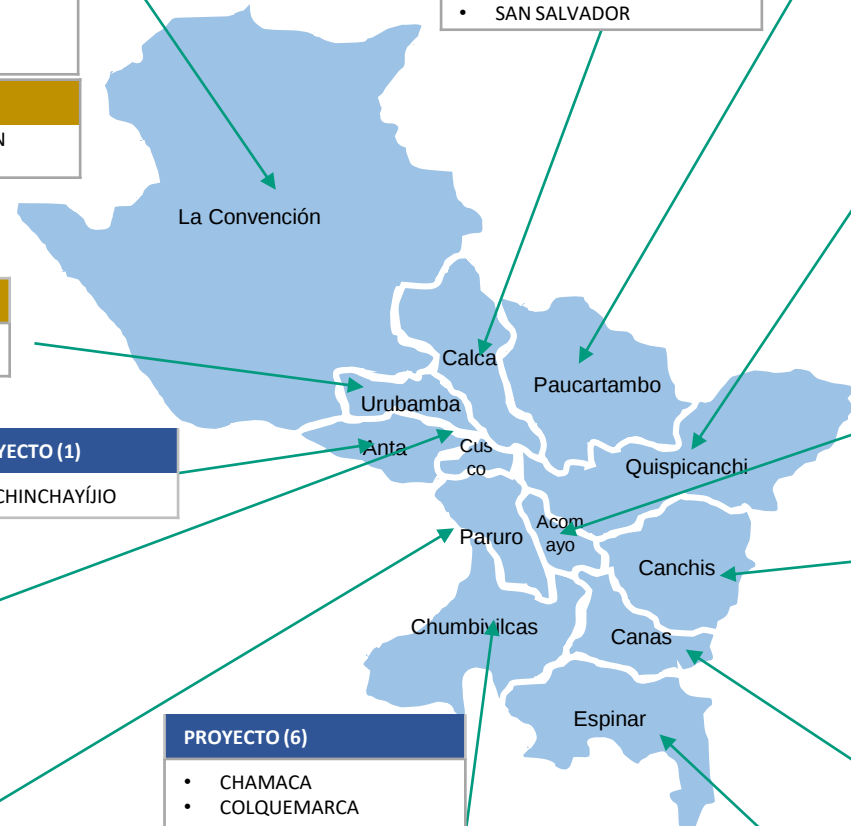

- PROYECTO (4)**
- PONGOA
 - MAPITUNARI
 - SANTA MARIA
 - MANTARO
 - QUISTO CENTRAL
 - PUENTE SANTIAGO
 - ARMA
 - CHONTABAMABA
 - PUEBLO LIBRE
 - VILLA KINTIARINA
 - VILLA VIRGEN

- INTERVENCIÓN INTEGRAL (2)**
- OCOBAMBA-LA CONVENCION
 - SAN MARTÍN

- INTERVENCIÓN INTEGRAL (2)**
- CHILLCA
 - HUAYLLABAMBA

- PROYECTO (1)**
- CHINCHAYÍJO

- PROYECTO (3)**
- SIETE CUARTONES
 - BUENA VISTA
 - TUPAC AMARU

- INTERVENCIÓN INTEGRAL (2)**
- SAN SEBASTIÁN
 - SANTA ROSA

- PROYECTO (1)**
- HUANOQUITE

- INTERVENCIÓN INTEGRAL (2)**
- ACCHA
 - YAUROSQUE

- PROYECTO (4)**
- COMBAPATA YANATILE
 - LAMAY
 - LARES
 - PUTUCUSI
 - COYA
 - HUANCALLE

- INTERVENCIÓN INTEGRAL (1)**
- SAN SALVADOR

- PROYECTO**
- MOLLOMARCA
- INTERVENCIÓN INTEGRAL (2)**
- COLQUEPATA
 - PILCOPATA

- PROYECTO (5)**
- CUSIPATA
 - HUARO
 - LUCRE
 - URCOS
 - TINKE

- INTERVENCIÓN INTEGRAL (1)**
- OCONGATE

- PROYECTO (3)**
- ACOS.
 - ACOMAYO
 - RONDOCÁN

- INTERVENCIÓN INTEGRAL (1)**
- SANGARARÁ

- PROYECTO (4)**
- MARANGANI
 - CHECACUPE
 - CCUYO
 - CHECTUYO

- PROYECTO (4)**
- CHECCA
 - HUANCHIRI
 - LANGUI
 - QUEHUE

- PROYECTO (2)**
- PALLPATA
 - HUAYHUAHUASI

- INTERVENCIÓN INTEGRAL (2)**
- PICHIGUA
 - URINSAYA

- PROYECTO (6)**
- CHAMACA
 - COLQUEMARCA
 - LLIQUE
 - PULPERA
 - QUIÑOTA
 - VELILLE
 - ALHUACCHULLO

- INTERVENCIÓN INTEGRAL (1)**
- PFLULLPURI CONDEPAMPA

PLAN MIL

GERESA CUSCO ha remitido 45 expedientes culminados para su EVALUACION al MINSA, y la gestión del financiamiento.

- 34 proyectos de inversión
- 11 intervenciones integrales

La Municipalidad Provincial el Cusco, ha cumplido con culminar expediente técnico de 2 EE.SS. a cargo:

- C.S. SIETE CUARTONES (I-3) – monto S/ 17.12 MM
- C.S. BUENA VISTA (I-3) – monto S/ 25.57 MM

MINSA enviará comisión de OPMI – INVERSIONES, para que los días 12 y 13.JUN se evalúe con equipo GERESA el cumplimiento de requisitos y registros en marco de INVIERTE.pe y normas sectoriales de los 34 expedientes.

E.S PLAN 1000	REGION	PROVINCIA	DISTRITO	CODIGO RENIPRESS	NOMBRE E.S	CATEGORIA	TIPO DE INTERVENCION	HORARIO DE ATENCION	DIA
Seleccionadas	CUSCO	ACOMAYO	ACOS	2319	ACOS	I-2	PI	08:30 a. m.	MIERCOLES 12 DE JUNIO
Seleccionadas	CUSCO	CANAS	QUEHUE	2374	HUANCHIRI	I-2	PI	08:50 a. m.	
Seleccionadas	CUSCO	PAUCARTAMBO	COLQUEPATA	2516	COLQUEPATA	I-2	PI	09:10 a. m.	
Seleccionadas	CUSCO	LA CONVENCION	ECHARATE	2440	PONGOA	I-2	PI	09:30 a. m.	
Seleccionadas	CUSCO	CALCA	YANATILE	2359	PUTUCUSI	I-3	PI	09:50 a. m.	
Seleccionadas	CUSCO	CALCA	YANATILE	6971	COMBAPATA YA	I-2	PI	10:10 a. m.	
Seleccionadas	CUSCO	CANAS	LANGUI	2369	LANGUI	I-2	PI	10:30 a. m.	
Seleccionadas	CUSCO	CHUMBIVILCAS	QUIÑOTA	2408	QUIÑOTA	I-2	PI	10:50 a. m.	
Seleccionadas	CUSCO	CHUMBIVILCAS	VELILLE	2409	VELILLE	I-3	PI	11:10 a. m.	
Seleccionadas	CUSCO	CANAS	QUEHUE	2373	QUEHUE	I-2	PI	11:30 a. m.	
Seleccionadas	CUSCO	CANCHIS	MARANGANI	2388	MARANGANI	I-3	PI	11:50 a. m.	
Seleccionadas	CUSCO	CHUMBIVILCAS	SANTO TOMAS	2399	PULPERA	I-2	PI	12:10 p. m.	
Seleccionadas	CUSCO	CUSCO	CUSCO	2291	SIETE CUARTONE	I-3	PI	12:30 p. m.	
Seleccionadas	CUSCO	LA CONVENCION	PICHARI	7114	QUISTO CENTRA	I-2	PI	12:50 p. m.	VIERNES 14 DE JUNIO
Seleccionadas	CUSCO	LA CONVENCION	VILLA VIRGEN	2479	VILLA VIRGEN	I-2	PI	01:50 p. m.	
Adicionales	CUSCO	CUSCO	CUSCO	2295	BUENA VISTA	I-3	PI	02:10 p. m.	
Seleccionadas	CUSCO	ACOMAYO	SANGARARA	2324	SANGARARÁ	I-2	PI	02:30 p. m.	
Seleccionadas	CUSCO	CHUMBIVILCAS	CHAMACA	2402	CHAMACA	I-2	PI	08:30 a. m.	
Seleccionadas	CUSCO	QUISPICANCHI	HUARO	2532	HUARO	I-2	PI	08:50 a. m.	
Seleccionadas	CUSCO	CHUMBIVILCAS	SANTO TOMAS	6746	LLIQUE	I-2	PI	09:10 a. m.	
Seleccionadas	CUSCO	LA CONVENCION	QUELLOUNO	2468	SAN MARTÍN	I-2	PI	09:30 a. m.	
Seleccionadas	CUSCO	LA CONVENCION	VILCABAMBA	2490	ARMA	I-2	PI	09:50 a. m.	
Seleccionadas	CUSCO	QUISPICANCHI	CUSIPATA	2530	CUSIPATA	I-2	PI	10:10 a. m.	
Seleccionadas	CUSCO	QUISPICANCHI	URCOS	2523	URCOS	I-4	PI	10:30 a. m.	
Adicionales	CUSCO	LA CONVENCION	QUELLOUNO	22363	TUPAC AMARU - QUELLOUNO	I-2	PI	10:50 a. m.	
Adicionales	CUSCO	LA CONVENCION	QUELLOUNO	2467	PUENTE SANTIAGO	I-2	PI	11:10 a. m.	
Adicionales	CUSCO	CANCHIS	MARANGANI	2391	OCCOBAMBA MA	I-2	PI	11:30 a. m.	
Adicionales	CUSCO	PARURO	HUANOQUITE	2504	HUANOQUITE	I-2	PI	11:50 a. m.	
Adicionales	CUSCO	CANCHIS	SAN PEDRO		SAN PEDRO	I-2	PI	12:10 p. m.	
Adicionales	CUSCO				PILLPINTO	I-2	PI	12:30 p. m.	
Adicionales	CUSCO	CUSCO	SANTIAGO		OCCOPATA	I-2	PI	12:50 p. m.	
Adicionales	CUSCO				CANCAHUANI	I-2	PI	01:10 p. m.	
Adicionales	CUSCO	PAUCARTAMBO	PAUCARTAMBO		PAUCARTAMBO	I-4	PI	01:30 p. m.	
Seleccionadas	CUSCO	CALCA	LARES	2347	LARES	I-3	PI	01:50 p. m.	



GRACIAS.



GORE CUSCO

68 Ambulancias

S/ 26.65 Millones

PROVINCIA DE URUBAMBA

- E.S. URUBAMBA (2596384)
- CHINCHERO (2596328)
- OLLANTAYTAMBO (2616207)

PROVINCIA DE ANTA

- E.S. LIMATAMBO (2600611)
- E.S. PANTIPATA (2600611)
- E.S. MOLLEPATA (2597994)
- E.S. ANTA (2596304)
- E.S. ZURITE (2616207)

PROVINCIA DE CUSCO

- E.S. BELEMPAMPA (2602876)
- E.S. SAN SEBASTIAN (2596390)

PROVINCIA DE PARURO

- E.S. HUANOQUITE (2600677)
- E.S. OMACHA (2600677)
- E.S. ANTAPALLPA (2600677)
- E.S. YAUQUISQUE (2596599)
- E.S. PARURO (2596403)
- E.S. CCOYABAMBA (2616207)

PROVINCIA DE ACOMAYO

- E.S. ACOMAYO (2600677)
- E.S. SAN JUAN DE POMACANCHI (2600677)
- E.S. RONDOCAN (2600677)
- E.S. POMACANCHI (2596395)

PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS

- E.S. ALHUACCHULLO (2603243)
- E.S. SANTO TOMAS (2602863)
- E.S. AÑAHUICHI (2600576)
- E.S. COLQUEMARCA (2600576)
- E.S. PATAQUEÑA – LIVITACA (2600576)
- E.S. PULPERA (2600576)
- E.S. CCAPACMARCA (2596174)

PROVINCIA DE ESPINAR

- E.S. YAURI (2600615)
- E.S. PICHIGUA ESPINAR (2616207)
- E.S. SUYKUTAMBO (2616207)

PROVINCIA DE PAUCARTAMBO

- E.S. COLQUEPATA (2605438)
- E.S. PATRIA (2601546)
- E.S. HUANCARANI (2600677)
- E.S. PILCOPATA (2596391)

PROVINCIA DE LA CONVENCION

- E.S. LOBO TAHUANTINSUYO (2602047)
- E.S. VILLA KINTIARINA (2602047)
- E.S. VILLA VIRGEN (2602047)
- E.S. KITENI (2600595)
- E.S. IVOCHOTE (2600595)
- E.S. KEPASHIATO (2600595)
- E.S. PALMA REAL (2600595)
- E.S. OCCOBAMBA LA CONVENCION (2600595)
- E.S. SANTA TERESA (2600595)
- E.S. MANTARO (2596320)
- E.S. SAN MARTIN (2596312)
- E.S. QUELLOUNO (2596307)

PROVINCIA DE CALCA

- E.S. LAMAY (2600611)
- E.S. LARES (2600611)
- E.S. SAN SALVADOR (2600611)
- E.S. AMPARAES (2596596)
- E.S. PUTUCSI (2616207)

PROVINCIA DE QUISPICANCHI

- E.S. CARHUAYO (2601564)
- E.S. CCATCCA (2600677)
- E.S. CUSIPATA (2600677)
- E.S. MARCAPATA (2596601)
- E.S. OCONGATE (2596394)
- E.S. URCOS (2596393)

PROVINCIA DE CANCHIS

- E.S. PAMPAPHALLA (2600615)
- E.S. CHECACUPE (2600615)
- E.S. COMBAPATA CANCHIS (2600615)
- E.S. MARANGANI (2600615)
- E.S. TINTA (2600615)
- E.S. TECHO OBRERO (2596398)
- E.S. SAN PABLO CANCHIS (2616207)

PROVINCIA DE CANAS

- E.S. EL DESCANSO (2602035)
- E.S. LANGUI (2600615)
- E.S. YANAOCA (2596400)
- E.S. QUEHUE (2616207)

EN FORMULACIÓN

01 Ambulancia

S/ 0.54 Millones

PROVINCIA DE RONDOCAN

- E.S. RONDOCAN (2615453)

GORE CUSCO, encargado de aprobar los IOARRs, gestionar presupuesto y convocar proceso de adjudicación

TOTAL CUSCO

69 ambulancias

27.19 millones
