



Gobierno del Perú

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PLAN Y MODIFICACIONES A LA LEY 30556

*Comisión Especial de Seguimiento al Proceso de Reconstrucción en las Zonas  
Afectadas por el Fenómeno de El Niño Costero*

Edgar Quispe Remón  
Director Ejecutivo

15 de junio de 2018

**EL PERÚ PRIMERO**



## CONTENIDO

1. Estado situacional de ejecución del Plan Integral
2. Modificaciones aprobadas mediante el Decreto Legislativo N° 1354



PERÚ

Presidencia  
Del Consejo de Ministros

Autoridad para la  
Reconstrucción Con Cambios



# 1. ESTADO SITUACIONAL DE EJECUCIÓN DEL PLAN INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS

## LIDERA

La reconstrucción de la infraestructura pública y la prevención para el control de inundaciones con un enfoque integral

## ARTICULA

Las intervenciones multisectoriales de 5 ministerios, GR y GL de 13 regiones

## MONITOREA

la ejecución y transparencia del plan

## PROMUEVE E IMPULSA

La generación de proyectos de inversión

## FORTALECE

Las capacidades de los ejecutores



### 13 Regiones

- Gobiernos Regionales
- Gobiernos Locales
- 881 Municipalidades



### 5 Ministerios

- Vivienda
- Transportes y Comunicaciones
- Agricultura
- Educación
- Salud




Total PIRCC **S/ 25,655 MM**



Distribución de **recursos en S/ MM** (setiembre 2017)

## PIRCC Inicial (12,761)


(Setiembre 2017)

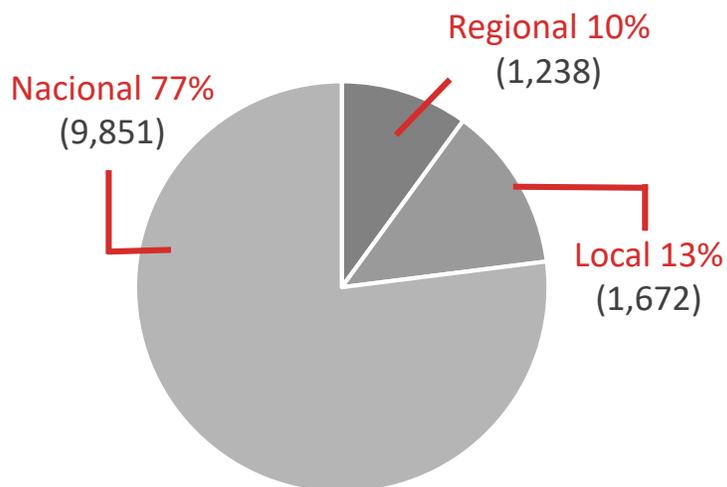

+ 48,731 viviendas

## PIRCC Modificado (12,514)

(Mayo 2018)

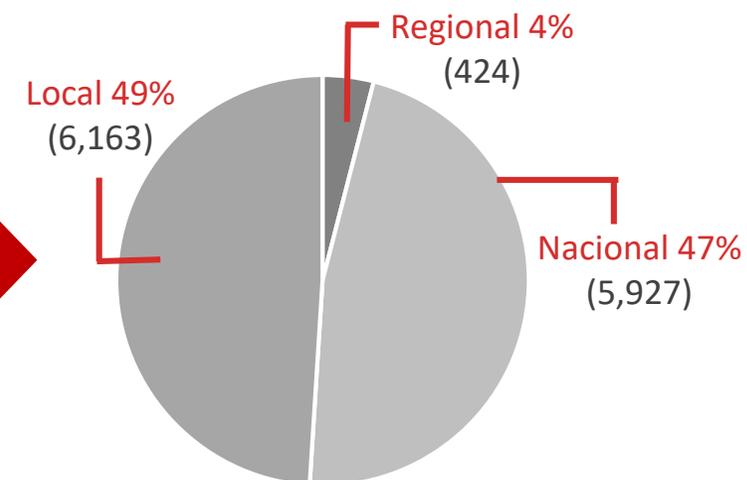

+ 45,854 viviendas

Distribución **intervenciones** según nivel de gobierno ejecutor (**% y N°**)

Número de **ejecutores**

Gobierno Nacional:  
5 ejecutoras

Gobierno Regional:  
10 ejecutoras

Gobierno Local:  
708 ejecutoras



PERÚ

Presidencia  
Del Consejo de Ministros

Autoridad para la  
Reconstrucción Con Cambios



# Programación 2018

Hemos ajustado la programación de la ejecución a S/ 4,361 MM.

MÁS DE

**2,000**

PROYECTOS QUE INICIARÁN OBRAS



AGRICULTURA

S/ 200 MM

34 proyectos



EDUCACIÓN

S/ 58 MM

29 proyectos



PISTAS Y VEREDAS

S/ 474 MM

689 proyectos



SALUD

S/ 176 MM

75 proyectos



SANEAMIENTO

S/ 223 MM

427 proyectos



TRANSPORTES

S/ 908 MM

286 proyectos



PREVENCIÓN

S/ 1,137 MM

501 proyectos



ESTUDIOS\*

S/ 215 MM

3,277

✓ **Más de 33 mil** viviendas convocadas (100% del total).



PERÚ

Presidencia  
Del Consejo de Ministros

Autoridad para la  
Reconstrucción Con Cambios




# Avances

A la fecha, hemos asignado recursos a la reconstrucción y a la prevención con énfasis en la atención de sectores críticos.

## Recursos del FONDES transferidos a ejecutores

(junio 2017 – junio 2018)

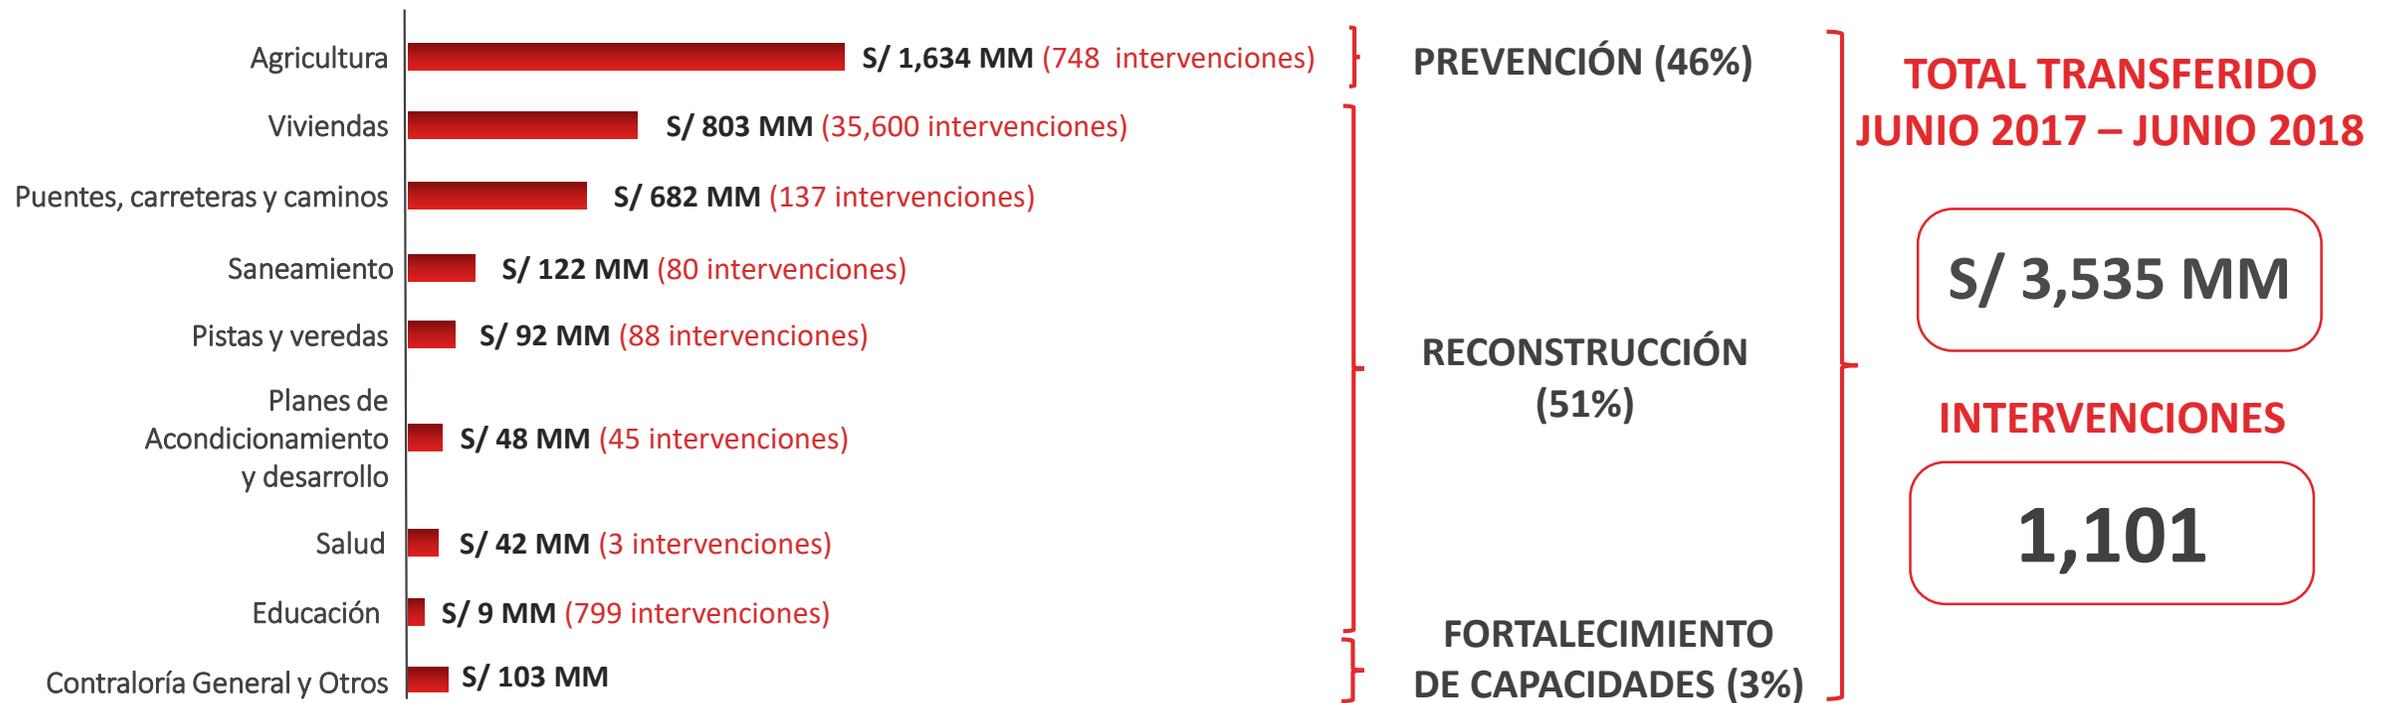



PERÚ

Presidencia  
Del Consejo de Ministros

Autoridad para la  
Reconstrucción Con Cambios



# Avances: Región Piura

**TOTAL TRANSFERIDO  
JUNIO 2017 - JUNIO 2018**

**S/ 1,598 MM**


**INTERVENCIONES**

**584**

**+ VIVIENDAS**

**12,878**

## Estado de las intervenciones (S/ MM)

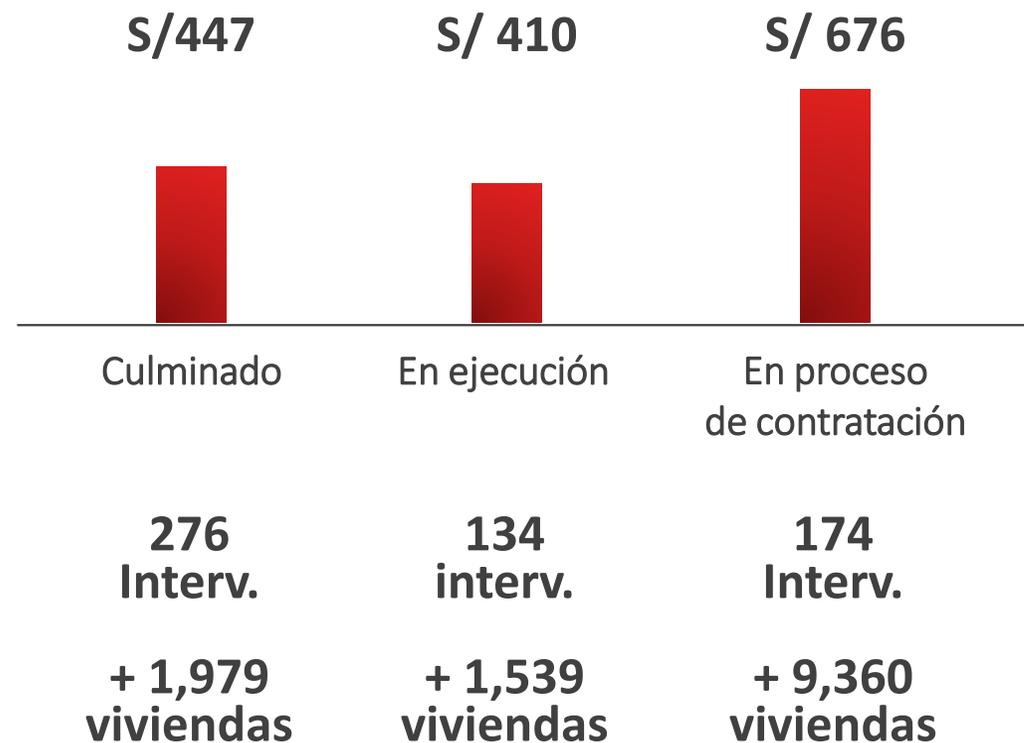

- **1,979 viviendas culminadas por un monto de S/ 43,7 MM**
- **Descolmatación de los ríos Piura (84 km) y Chira (31 km)**  
Inversión: S/ 291 MM  
Fecha de culminación: enero 2018
- **Rehabilitación de 8 avenidas principales en Piura: Av. Grau, Francia, Loreto, Tallanes, Gullman, Sánchez Cerro, Prolongación Grau y Av. R y Calle Antonio Raimondi**  
Inversión: S/ 13 MM  
Fecha de culminación: entre enero y mayo del 2018
- **Puente Independencia en Catacaos**  
Inversión: S/ 18 MM  
Fecha de culminación: enero 2018
- **Av. Progreso (Castilla - Piura)**  
Inversión: S/ 8,8 MM  
Fecha de culminación: febrero 2018
- **Desvío Catacaos - Ovalo Bayóvar - Piura**  
Inversión: S/ 26,5 MM  
Fecha de culminación: junio 2018
- **Río Piura: Culminado dique derecho (7 MM) y descolmatación dren DS 13.08 (5,8 MM) y dren Sechura (5,9 MM)**

- **1,539 viviendas en construcción por un monto de S/ 34 MM**
- **Ampliación del reservorio Poechos**  
Inversión: S/ 111 MM (inversión multianual de S/ 144,4 MM)  
Avance físico: 32%  
Fecha estimada de culminación: febrero del 2019
- **Carretera Sullana-Talara, se encuentra asfaltada**  
Inversión: S/ 53,5 MM  
Avance físico: 90%  
Fecha estimada de culminación: julio 2018
- **Mejoramiento del sistema de saneamiento en AAHH Nuevo Catacaos.**  
Inversión: S/ 7,6 MM  
Avance físico: 71%  
Fecha estimada de culminación: julio 2018
- **Se ha iniciado la rehabilitación del sistema de agua potable y alcantarillado en el distrito La Unión**  
Inversión: S/ 27 MM  
Avance físico: 2%  
Fecha estimada de culminación: mayo del 2019
- **Se están rehabilitando las avenidas Irazola y Cáceres (tramos de los distritos de Piura y Castilla)**  
Inversión: S/ 5 MM  
Avance físico: 90%  
Fecha estimada de culminación: fines de junio 2018

- **2,457 viviendas convocadas por más de S/ 56 MM**
- **Rehabilitación de carretera Costanera (tramo 1 y 2)**  
Inversión 2018: S/ 184 MM (Inversión multianual: 252 MM)  
Fecha estimada de buena pro: Tercera semana de junio. Fecha estimada de inicio: julio 2018 (elaboración de expediente técnico)  
Fecha estimada de culminación: mayo del 2019
- **Mejoramiento de carretera La Islilla**  
Inversión 2018: S/ 30 (Inversión Multianual: 33 MM)  
Fecha estimada de inicio: 26 de junio 2018  
Fecha estimada de culminación: junio del 2019
- **71 intervenciones para la descolmatación de canales y drenes a cargo de los Municipios Distritales de Cura Mori (24) y Tambo Grande (47)**  
Inversión: S/ 20,9 MM  
Fecha estimada de inicio: julio 2018  
Fecha estimada de culminación: octubre 2018
- **Rehabilitación de carretera de acceso al campamento Illescas - Bayóvar**  
Inversión: S/ 1,8 MM  
Fecha estimada de inicio: julio 2018  
Fecha estimada de culminación: septiembre 2018

- **Av. Montero e Independencia en el distrito de Castilla**  
Inversión 2018: 4,5 MM
- **Instalación de 12 puentes modulares en Ayabaca (3), Huancabamba (7), Morropón (1) y Piura (1)**  
Inversión 2018: 15 MM
- **Rehabilitación de 12 caminos vecinales en Morropón (3), Ayabaca (5), Huancabamba (3) y Sullana (1)**  
Inversión: 36,9 MM
- **Creación del Puente sobre el río Hualtacal en el distrito de Canchaque - Huancabamba**  
Inversión: 4,4 MM

### Se tiene programado transferir más de S/ 1,000 millones:

- Instalación de 6 puentes modulares en la provincia de Huancabamba en Canchaque y Carmen de La Legua (S/ 18 millones)
- Rehabilitación de la carretera Canchaque-Huancabamba (S/ 45 millones)
- Rehabilitación del Dren Telefónica, Dren Paredes-Macedo y Dren Pumacagua del distrito de 26 de Octubre (S/ 11 millones)
- Rehabilitación de Dren Los Rosales, Gullman, 6 de Setiembre en la provincia de Piura
- Rehabilitación del Hospital de Sullana y el C.S Chulucanas (S/ 249 millones)
- Rehabilitación de caminos vecinales en Tambo Grande y Sondorillo (S/ 6 millones)
- Rehabilitación del Canal vía Sullana (S/ 18 millones)
- Rehabilitación de los hospitales: Algarrobos, Huarmaca, Huancabamba y Ayabaca (S/ 332 millones)
- Rehabilitación del PTAR Villa Pedregal Grande en Catacaos (S/ 3 millones)
- Mejoramiento del sistema drenaje de Tambo Grande (S/ 25 millones)
- Rehabilitación de 64 pistas en Paita (S/ 32 millones)
- Construcción del sistema de riego La Gallega (S/ 192 millones)
- Adquisición de 74 módulos prefabricados (S/ 7,4 millones)
- Conservación de 1 corredor en vías naciones (S/ 90 millones)



PERÚ

Presidencia  
Del Consejo de Ministros

Autoridad para la  
Reconstrucción Con Cambios



# Avances: Región La Libertad

**TOTAL TRANSFERIDO  
JUNIO 2017 - JUNIO 2018**

**S/ 409 MM**


**INTERVENCIONES**

**84**

**+ VIVIENDAS**

**3,787**

## Estado de las intervenciones (S/ MM)

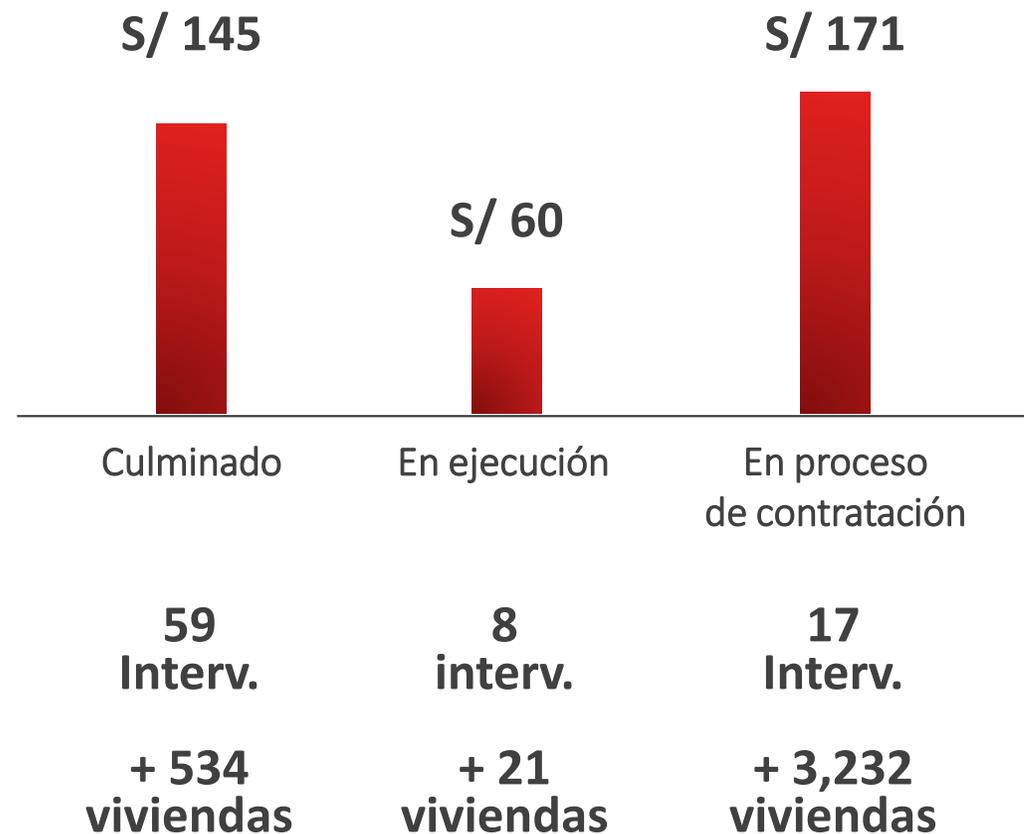

- **Se culminó la limpieza y descolmatación en los tramos 1 y 2 del río Virú (24.0 km) por S/ 32,60 millones.**  
**Tramo 1 culminado en marzo y el tramo 2 en enero 2018**  
Inversión: S/ 32,6 MM  
Fecha de culminación: Tramo 1 en marzo 2018 y Tramo 2 en enero 2018
- **Limpieza y descolmatación del río Chicama**  
Tramo 1: monto inversión: S/ 49 MM, fecha de culminación: junio 2018
- **Rehabilitación de 3 avenidas: Víctor Larco, Bolivia, Juan Pablo 2 y Huamán por el GORE La Libertad**  
Inversión: S/ 5,7 MM  
Fecha de culminación: Víctor L. en enero, Bolivia en febrero y Huamán en marzo 2018
- **Rehabilitación de 5 avenidas por la Municipalidad de Trujillo: Av. Mansiche, Antenor Orrego y Colibrí culminadas en enero y febrero; Av. Juan Pablo y Jesús de Nazareth culminadas en mayo**  
Inversión: S/ 2,9 MM  
Fecha de culminación: Av. Mansiche, Antenor Orrego y Colibrí en enero y febrero 2018; y Juan Pablo y Jesús de Nazareth en mayo 2018
- **Se culminó la descolmatación de la quebrada El León a fines de febrero 2018, con un monto de inversión de S/ 8,7 MM**  
Inversión: S/ 8,7 MM  
Fecha de culminación: febrero 2018
- **Se culminó la limpieza y descolmatación de la quebrada San Idelfonso**  
Inversión: S/ 2,2 MM  
Fecha de culminación: abril 2018

- **Limpieza y descolmatación del río Chicama (4 tramos):**
  - Tramo 2-A: monto inversión: S/ 12 MM, avance físico: 82%, fecha estimada de culminación: junio 2018
  - Tramo 2-B: monto inversión: S/ 10 MM, avance físico: 54%, fecha estimada de culminación: junio 2018
  - Tramo 2-C: monto inversión: S/ 7 MM, avance físico: 48%, fecha estimada de culminación: junio 2018
- **Limpieza y descolmatación del río Moche en provincia de Laredo:**
  - Inversión: S/ 11 MM
  - Avance físico: 70%
  - Fecha estimada de culminación: junio 2018
- **Limpieza y descolmatación de quebradas en distrito de Laredo:**
  - Inversión: S/ 7 MM
  - Avance físico: Avendaño: 80%, Galindo: 100%, Bello Horizonte: 100%, Pedregal-Conache: 100%, San Carlos: 100% y Las Uvas: 100%
  - Fecha estimada de culminación: junio 2018

- **Rehabilitación de carretera Pallasca - Mollepata - Mollebamba - Santiago de Chuco**  
Inversión: S/ 235 MM  
Fecha estimada de inicio: julio 2018  
Fecha estimada de culminación: enero del 2020
- **15 Intervenciones de descolmatación de ríos, quebradas, canales y rehabilitación de defensas ribereñas**  
Inversión: S/ 15 MM  
Fecha estimada de inicio: junio 2018  
Fecha estimada de culminación: agosto 2018

### Se tiene programado transferir más de S/ 300 millones:

- Adquisición de 54 módulos prefabricados (S/ 5,4 millones)
- Conservación de 3 corredores en vías nacionales ( S/ 50,9 millones)
- Instalación de 22 puentes modulares en las provincias de Santiago de Chuco, Gran Chimú, Bolívar, Chepén, Julcán, Sánchez Carrión, Pataz (S/ 75 millones)
- Rehabilitación de sistemas de saneamiento y redes colectoras en los distritos de Trujillo, Pacasmayo, Virú, Otuzco y Ascope (S/ 8 millones)
- Rehabilitación de la Calle Grau en el distrito de Ascope (S/ 5 millones)
- Rehabilitación de las avenidas Los Paujiles, Vallejo, Miraflores, Federico Villareal (S/ 20 millones)



PERÚ

Presidencia  
Del Consejo de Ministros

Autoridad para la  
Reconstrucción Con Cambios



# Avances: Región Lambayeque

**TOTAL TRANSFERIDO  
JUNIO 2017 - JUNIO 2018**

**S/ 481 MM**


**INTERVENCIONES**

**79**

**+ VIVIENDAS**

**11,519**

## Estado de las intervenciones (S/ MM)

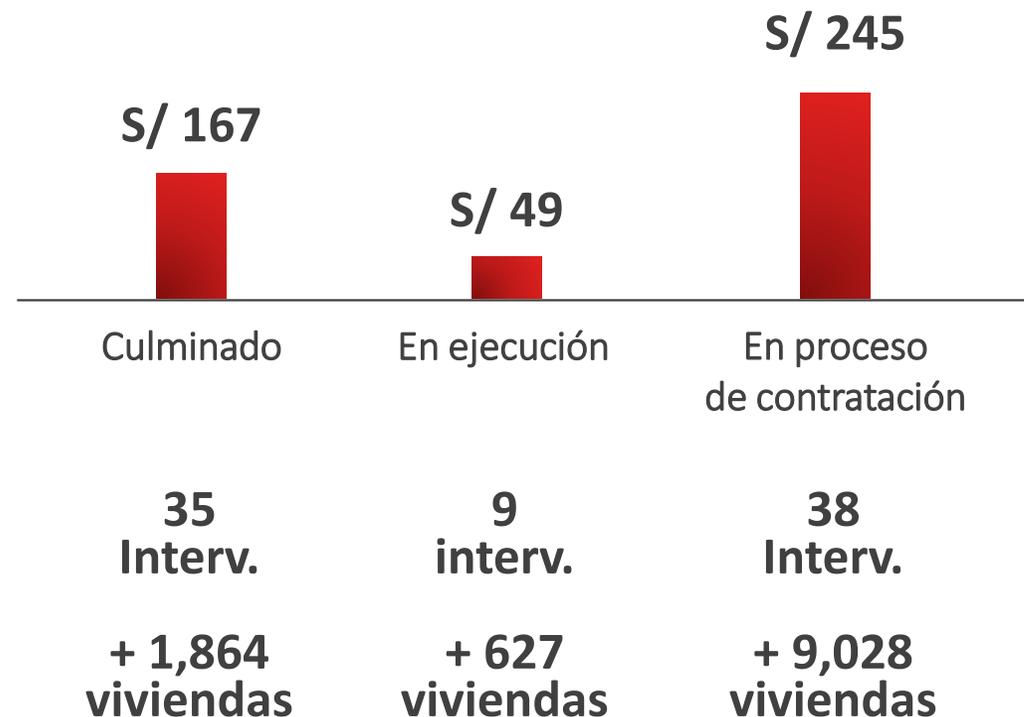

- **Descolmatación de 185 km de los ríos Olmos, La Leche, Zaña, Motupe, tramos 2 y 3 del río Chancay, 4 km de la quebrada La Pared y 7 km de la quebrada Juana Ríos**  
Inversión: S/ 109,08 millones  
Fecha de culminación: Entre enero y abril del 2018
- **Rehabilitación de 9 pistas de la calle Sáenz Peña, 7 de enero, José Quiñones, Miguel Grau, Hipólito Unanue, Av. Fitzcarrald, Av. Pacasmayo, Calle Garcilazo de la Vega y Elvira García**  
Inversión: S/ 10,56 millones  
Fecha de culminación: entre marzo y mayo del 2018
- **Descolmatación de 67.41 km de los drenes 1400, 2000, 3100 4000 y 4000 FAP**  
Inversión: S/ 5,28 millones  
Fecha de culminación: entre marzo y abril del 2018

- **Mejoramiento del sistema de saneamiento en el Pueblo Joven Santa Rosa**  
Inversión: S/ 7,40 millones  
Avance físico: 29,80 %  
Fecha estimada de culminación: 30 de agosto del 2018
- **Mejoramiento del sistema de saneamiento en el Pueblo Joven Ricardo Palma**  
Inversión: S/ 3,00 millones  
Avance físico: 20,50%  
Fecha estimada de culminación: 11 de agosto del 2018
- **Servicio de reparaciones menores de colectores primarios y secundarios colapsados en el distrito de José Leonardo Ortiz**  
Inversión: S/ 6,28 millones  
Avance físico: 74,30%  
Fecha estimada de culminación: 30 de junio del 2018
- **Servicio de reparaciones menores de redes colectoras y de agua potable colapsados en los distritos de Chiclayo, Pimentel, Túcume y Santa Rosa**  
Inversión: S/ 2,44 millones  
Avance físico: 94,70%  
Fecha estimada de culminación: 15 de junio del 2018
- **Instalación del puente modular Laquipampa de una longitud de 55 metros**  
Inversión: S/ 1,40 millones  
Avance físico: 5 %  
Fecha estimada de culminación: agosto del 2018

- **Rehabilitación de colectores primarios y secundarios del distrito de José Leonardo Ortiz en elaboración de términos de referencia**
  - Inversión: S/ 14,48 millones
  - Fecha estimada de inicio: III trimestre del 2018
  - Fecha estimada de culminación: II trimestre del 2019
- **28 intervenciones de rehabilitación de canales y drenes en proceso de verificación en campo de ficha para iniciar contratación**
  - Inversión: S/ 6,57 millones
  - Fecha estimada de inicio: 15 de julio del 2018

**Se tiene programado la transferencia de más de S/ 200 millones para obras de rehabilitación y reconstrucción en la región Lambayeque, entre las que están próximas a financiarse:**

- Reconstrucción puente Laquipampa y Magmapampa (Ferreñafe) (S/ 715 mil)
- Rehabilitación del sistema de saneamiento en el distrito Pacora (S/ 2 millones)
- Rehabilitación de las principales avenidas en los distritos de Chiclayo, Ferreñafe, La Victoria y Reque (S/ 23 millones)
- Reparación de sistemas de bombeo en la localidad Mochimú, pozo en la localidad de Pacora y sistemas de alcantarillado en el distrito de Zaña (S/ 8 millones)
- Adquisición de 17 módulos prefabricados de instituciones educativas (S/ 1,7 millones)



PERÚ

Presidencia  
Del Consejo de Ministros

Autoridad para la  
Reconstrucción Con Cambios



# Avances: Región Áncash

**TOTAL TRANSFERIDO  
JUNIO 2017 - JUNIO 2018**

**S/ 217 MM**


**INTERVENCIONES**

**93**

**+ VIVIENDAS**

**1,917**

## Estado de las intervenciones (S/ MM)

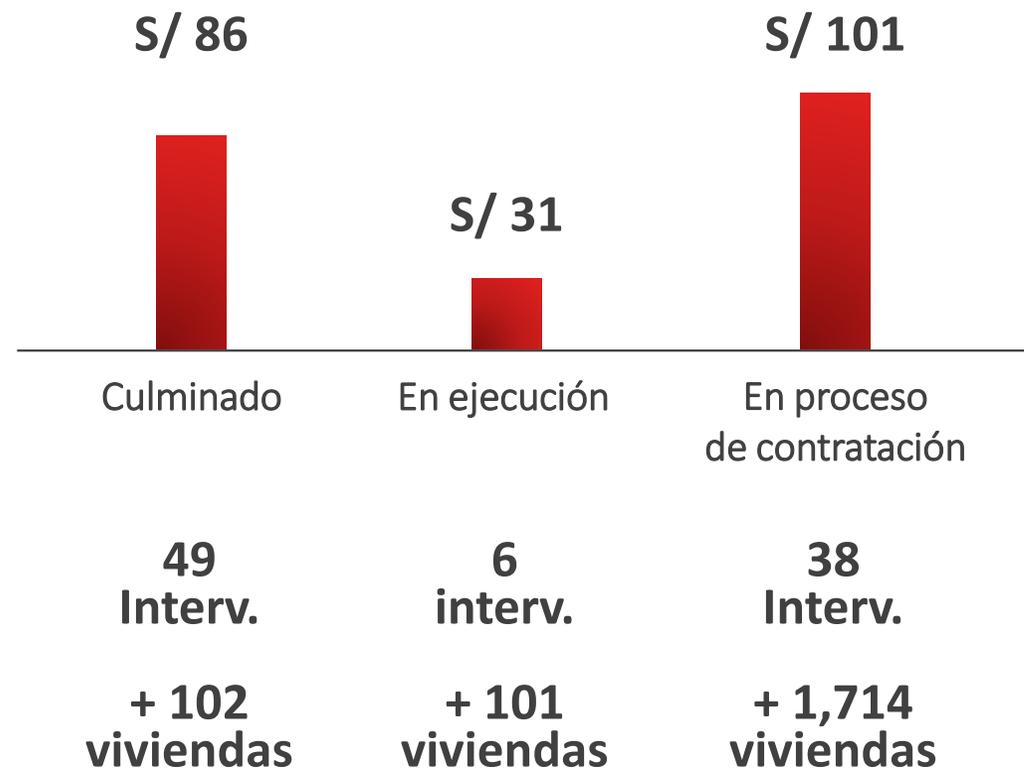

- **Descolmatación de 85,14 km en los tramos 1, 2 y 3 del río Huarmey, tramo 1 y 2 del río Casma, río Lacramarca, del río Nepeña y río Cascajal**  
Inversión: S/ 56,75 millones  
Fecha de culminación: Entre enero y mayo del 2018
- **8 puentes modulares instalados: Huaroyapampa, Paucho, Quircabamba, Yungayapampa, Sacsha, Calvario, Pasamayo y San Marcos**  
Inversión: S/ 8,48 millones  
Fecha de culminación: entre marzo y mayo del 2018

- **Descolmatación de 12.25 km en el río Huarmey**  
Inversión: S/ 6,87 millones  
Avance físico: 3440 %  
Fecha estimada de culminación: quincena de julio del 2018
- **Descolmatación de 13.96 km en el río Culebras**  
Inversión: S/ 5,11 millones  
Avance físico: 61,48 %  
Fecha estimada de culminación: quincena de julio del 2018
- **Descolmatación de 13.00 km en el río Santa**  
Inversión: S/ 15,48 millones  
Avance físico: 54,44 %  
Fecha estimada de culminación: quincena de julio del 2018

- **Rehabilitación del hospital de apoyo Yungay. En trámite de previsión presupuestal multianual próximo a convocarse por concurso oferta**
  - Inversión: S/ 66,42 millones
  - Fecha estimada de inicio: IV trimestre del 2018
  - Fecha estimada de culminación: IV trimestre del 2019
- **Rehabilitación del hospital de apoyo Antonio Caldas Domínguez. En trámite de previsión presupuestal multianual próximo a convocarse por concurso oferta**
  - Inversión: S/ 94,75 millones
  - Fecha estimada de inicio: IV trimestre del 2018
  - Fecha estimada de culminación: III trimestre del 2022
- **Rehabilitación del hospital de apoyo San Juan de Dios. En trámite de previsión presupuestal multianual próximo a convocarse por concurso oferta**
  - Inversión: S/ 111,96 millones
  - Fecha estimada de inicio: IV trimestre del 2018
  - Fecha estimada de culminación: III trimestre del 2021
- **21 intervenciones de rehabilitación de canales y drenes en proceso de verificación en campo de ficha para iniciar contratación**
  - Inversión: S/ 6,25 millones
  - Fecha estimada de inicio: 15 de julio del 2018
  - Fecha estimada de culminación: 30 de agosto del 2018

**Se tiene programado la transferencia de más de S/ 200 millones para obras de rehabilitación y reconstrucción en la región Ancash, entre las que están próximas a financiarse:**

- Instalación de 31 puentes modulares en las provincias de Huarmey, Huaraz, Pallasca, Santa, Sihuas, Pomabamba (S/ 91 millones)
- Conservación de 4 corredores en vías nacionales (S/ 101 millones)
- Rehabilitación de pistas y veredas en la localidad de Sihuas (S/ 15 millones)
- Adquisición de 114 módulos prefabricados de instituciones educativas (S/ 11,4 millones)
- Rehabilitación de líneas de conducción en distrito de Yaután y Chimbote (S/ 5 millones)
- Rehabilitación de la Av. Asunción hasta la Av. 31 de mayo (S/ 2 millones)



PERÚ

Presidencia  
Del Consejo de Ministros

Autoridad para la  
Reconstrucción Con Cambios



# Avances: Región Tumbes

**TOTAL TRANSFERIDO  
JUNIO 2017 - JUNIO 2018**

**S/ 232 MM**

**INTERVENCIONES**

**30**

**+ VIVIENDAS**

**62**

## Estado de las intervenciones (S/ MM)



## PRINCIPALES INTERVENCIONES CULMINADAS

- **3 puentes definitivos: Pontón, Abejal y Puentes del Cenepa**  
Inversión: S/ 24,00 millones  
Fecha de culminación: Julio del 2017
- **Descolmatación de 80,30 km de los ríos Zarumilla, Tumbes, Quebrada Bocapán Luay y Pedregal**  
Inversión: S/ 103,72 millones  
Fecha de culminación: entre enero y mayo del 2018

## PRINCIPALES INTERVENCIONES EN PROCESO DE CONTRATACIÓN

- **13 puentes definitivos. A la espera de aprobación de expediente técnico mediante Resolución Directoral**  
Inversión: S/ 79,26 millones  
Fecha estimada de inicio: agosto del 2018  
Fecha estimada de culminación: III trimestre del 2019
- **21 intervenciones de rehabilitación de canales y drenes en proceso de verificación en campo de ficha para iniciar contratación**  
Inversión: S/ 6,25 millones  
Fecha estimada de inicio: 15 de julio del 2018  
Fecha estimada de culminación: 30 de agosto del 2018

**Se tiene programado la transferencia de más de S/ 300 millones para obras de rehabilitación y reconstrucción en la región Tumbes, entre las que están próximas a financiarse:**

- Rehabilitación de pistas y veredas en el distrito Papayal (S/ 2 millones)
- Rehabilitación de 2 pistas y veredas en Tumbes (S/ 1 millón)
- Rehabilitación de 3 caminos vecinales en San Juan de la Virgen y San Jacinto (S/ 2 millones)
- Rehabilitación de puestos de salud de Bocapán y Trigal (S/ 680 mil)
- Adquisición de 14 módulos prefabricados de instituciones educativas (S/ 1,4 millones)



PERÚ

Presidencia  
Del Consejo de Ministros

Autoridad para la  
Reconstrucción Con Cambios



# Avances: Región Lima

**TOTAL TRANSFERIDO  
JUNIO 2017 - JUNIO 2018**

**S/ 407 MM**


**INTERVENCIONES**

**67**

**+ VIVIENDAS**

**2,216**

## Estado de las intervenciones (S/ MM)

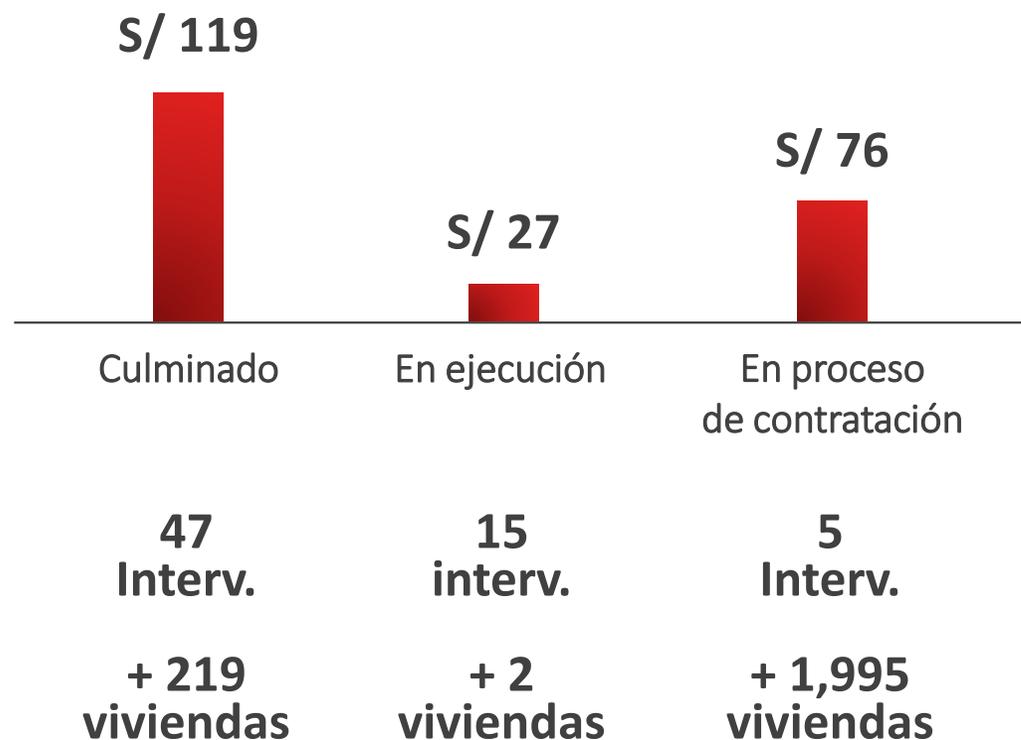

- **Descolmatación de 134.66 kilómetros de los ríos: Huaura, Supe, Mala, Cañete, Chancay, Pativilca, Fortaleza, Rímac y quebrada Huaycoloro**  
Inversión: S/ 96,72 millones  
Fecha de culminación: Entre diciembre y abril del 2018
- **3 puentes modulares instalados: Las Torres, Carhuán y Choques**  
Inversión: S/ 6,66 millones  
Fecha de culminación: entre diciembre del 2017 y febrero del 2018
- **Descolmatación de 22 barreras dinámicas en las quebradas de Mariscal Castilla, Rayo de Sol, Santo Domingo, La ronda, san Antonio de Pedregal, Nicolás de Piérola, La Libertad, Huampaní y Carossio**  
Inversión: S/ 3,29 millones  
Fecha de culminación: entre enero y junio del 2018

- **Descolmatación de 4,50 kilómetros del río Lurín**  
Inversión: S/ 4,80 millones  
Avance físico: 90 %  
Fecha estimada de culminación: 18 de junio del 2018
- **Descolmatación de 8,50 km del río Chillón**  
Inversión: S/ 8,27 millones  
Avance físico: 50 %  
Fecha estimada de culminación: quincena de julio del 2018
- **3 obras de saneamiento en las localidades de Pampa Libre, Pativilca y Huaral**  
Inversión: S/ 17,04 millones  
Avance físico: 40 %  
Fecha estimada de culminación: fines de diciembre del 2018

- **Descolmatación de 30 km de los ríos Rímac, Chillón y Lurín. A la espera de firma de contrato la quincena de junio**  
Inversión: S/ 14,41 millones  
Fecha estimada de inicio: fines de junio del 2018  
Fecha estimada de culminación: primera semana de agosto del 2018
- **Instalación de puentes modulares San José, Mayoli y Lacsá en proceso de contratación**  
Inversión: S/ 2,47 millones  
Fecha estimada de inicio: julio del 2018  
Fecha estimada de culminación: agosto del 2018
- **Obra de saneamiento en el distrito de Supe Puerto. En proceso de convocatoria, buena pro programada para el 08 de junio**  
Inversión: S/ 3,06 millones  
Fecha estimada de inicio: julio del 2018  
Fecha estimada de culminación: II trimestre del 2019

- Rehabilitación de la Av. Los Cisnes en Lurigancho (S/ 4 millones)
- Reconstrucción de Jr. Lima en el distrito Cajatambo (S/ 640 mil)
- Rehabilitación del camino vecinal Churín - Curay (S/ 2 millones)
- Instalación de puentes modulares en las provincias de Canta, Cajatambo, Oyón, Yauyos (S/ 29 millones)
- Rehabilitación de PTAR en Cañete (S/ 4 millones)
- Construcción de defensa ribereña de líneas de conducción: Vinto - Los Molinas en Barranca (S/ 6 millones)
- Adquisición de 19 módulos prefabricados en instituciones educativas (S/ 1,9 millones)



PERÚ

Presidencia  
Del Consejo de Ministros

Autoridad para la  
Reconstrucción Con Cambios



# Avances: Región Ica

**TOTAL TRANSFERIDO  
JUNIO 2017 - JUNIO 2018**

**S/ 52 MM**

**INTERVENCIONES**

**23**

**+ VIVIENDAS**

**384**

## Estado de las intervenciones (S/ MM)



## PRINCIPALES INTERVENCIONES CULMINADAS

- **Descolmatación de 28,70 kilómetros de los ríos Cansas y Matagente**  
Inversión: S/ 18,08 millones  
Fecha de culminación: Entre enero y marzo del 2018
- **Descolmatación de 43,48 km de canales de riego**  
Inversión: S/ 2,04 millones  
Fecha de culminación: entre diciembre del 2017 y enero del 2018

## PRINCIPALES INTERVENCIONES EN EJECUCIÓN

- **Descolmatación de 33,60 kilómetros del río Ica. Se ejecutó el 33% y se resolvió el contrato. Se reiniciará la ficha técnica considerando los cambios efectuados en el cauce del río por las últimas lluvias**  
Inversión: S/. 14,24 millones  
Avance físico: 33 %  
Fecha estimada de culminación: IV trimestre del 2018

## PRINCIPALES INTERVENCIONES EN PROCESO DE CONTRATACIÓN

- **7 intervenciones de descolmatación de ríos y canales en tramos críticos y defensas ribereñas en proceso de verificación en campo de ficha para iniciar contratación**  
Inversión: S/ 2,85 millones  
Fecha estimada de inicio: fines de junio del 2018  
Fecha estimada de culminación: primera semana de agosto del 2018

## PRINCIPALES INTERVENCIONES POR TRANSFERIR

- Rehabilitación de las calles Caracas y Julio Cevasco en el distrito La Tanguiña (S/ 4 millones)
- Rehabilitación y mejoramiento de camino vecinal - 18.75 km en San José de Pinilla-Callango (S/ 11 millones)
- Instalación de puente modular Marccarencca en IC-109 (S/ 7 millones)
- Instalación de puente modular Pinilla (S/ 5 millones)
- Rehabilitación de camino vecinal Huarangal (S/ 9 millones)
- Rehabilitación de camino vecinal Casablanca (S/ 6 millones)



PERÚ

Presidencia  
Del Consejo de Ministros

Autoridad para la  
Reconstrucción Con Cambios



# Avances: Otras regiones\*

\*Cajamarca, Loreto, Huancavelica, Arequipa

**TOTAL TRANSFERIDO  
JUNIO 2017 - JUNIO 2018**

**S/ 139 MM**


**INTERVENCIONES**

**70**

**+ VIVIENDAS**

**3,151**

## Estado de las intervenciones (S/ MM)

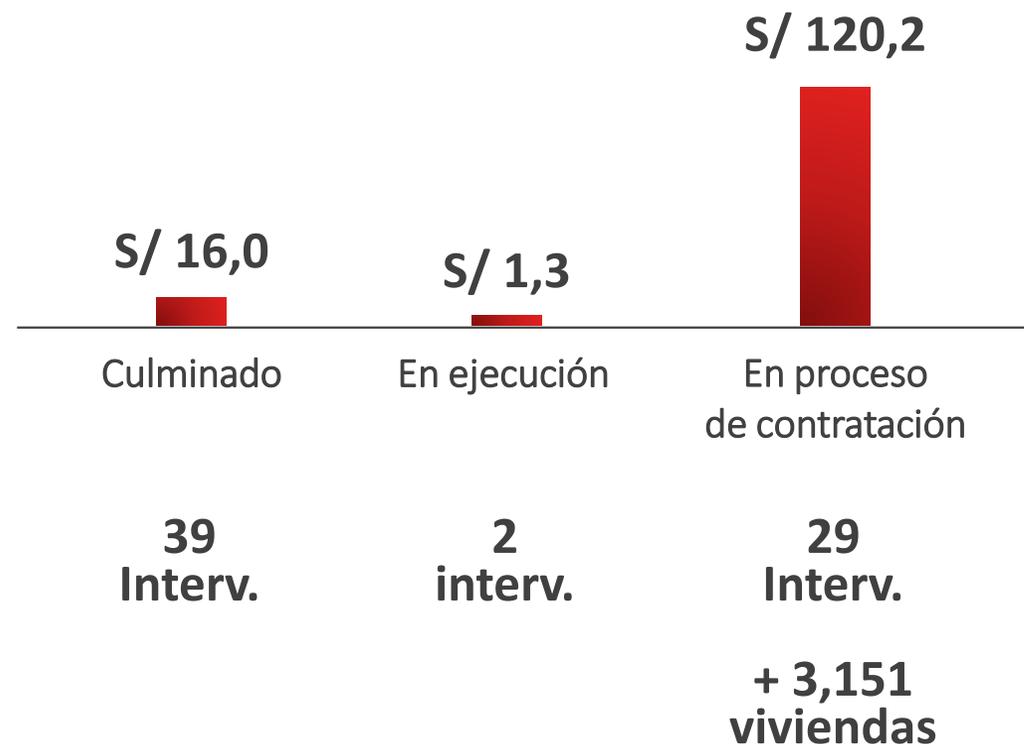

### Cajamarca

- **10 intervenciones de limpieza y descolmatación de canales y bocatomas en los distritos de Pomahuaca, Chirinos, Bellavista y San Felipe**  
Inversión: S/ 3,52 millones  
Fecha de culminación: Entre enero y marzo del 2018
- **Mejoramiento de transitabilidad vehicular y peatonal distrito de San Pablo.**  
Inversión: S/ 0,8 millones  
Fecha de culminación: mayo del 2018

### Loreto

- **08 intervenciones de mejoramiento de pistas y veredas**  
Inversión: S/ 3,72 millones  
Fecha de culminación: Entre enero y marzo del 2018
- **Mejoramiento de transitabilidad vehicular y peatonal distrito de San Pablo.**  
Inversión: S/ 0,8 millones  
Fecha de culminación: mayo del 2018.

## Huancavelica

- **02 intervenciones de defensa ribereña en el Río Paccari y río Cusicancha**  
Inversión: S/ 1,32 millones  
Fecha de culminación: Entre enero y marzo del 2018
- **05 intervenciones de mejoramiento de pistas y veredas en los distritos de Acobamba y Marcas.**  
Inversión: S/ 2,59 millones  
Fecha de culminación: Entre enero y marzo del 2018.
- **02 intervenciones de saneamiento en el CP de Curimaray y Sector Casa Blanca.**  
Inversión: S/ 1,46 millones  
Fecha de culminación: Entre enero y marzo del 2018
- **08 intervenciones de descolmatación de canales en los distritos de Ayahuanca, Carapo - Huancasancos y Víctor Fajardo**  
Inversión: S/ 0,83 millones  
Fecha de culminación: Entre enero y marzo del 2018
- **03 intervenciones de mejoramiento de pistas y veredas en el distrito de Anchihua**  
Inversión: S/ 1,44 millones  
Fecha de culminación: Entre enero y marzo del 2018

## Loreto

- **01 intervención de mejoramiento de pistas y veredas**

Inversión: S/ 1,04 millones

Avance físico: 71%

Fecha estimada de culminación: fines de julio del 2018

- **01 intervención de saneamiento en el distrito de Punchana. Contrato resuelto por retomar**

Inversión: S/ 0,33 millones

Avance físico: 96%

Fecha estimada de culminación: fines de septiembre del 2018

## Cajamarca

- **25 intervenciones de descolmatación de canales, ríos, quebradas y defensas ribereñas en los distritos de San Benito, Jaen, Bellavista, Sallique, y San Felipe en proceso de contratación**

Inversión: S/ 6,95 millones

Fecha estimada de inicio: fines de junio del 2018

Fecha estimada de culminación: primera semana de agosto del 2018

## Huancavelica

- **01 intervención de protección contra inundaciones de Anchaclla, Lircay y Ocopa: S/ 43,87 millones. Estudio de impacto ambiental aprobado. Se estima inicio de convocatoria 15 de junio.**

Inversión: S/ 43,87 millones

Fecha estimada de inicio: agosto del 2018

Fecha estimada de culminación: enero del 2019

## Arequipa

- **01 mejoramiento de servicio de agua para riego en el canal principal El Pueblo. Hasta el momento el Municipio Distrital de Huanca no ha garantizado la cantidad mínima de participantes por lo tanto se resolvió el contrato antes de iniciar**

Inversión: S/ 1,15 millones

- **02 intervenciones de descolmatación de río Acarí y creación de defensa ribereña cauce del río Lihualla en le sector Cuyhuas. Se encuentra en verificación en campo y se estima inicie la primera semana de julio**

Inversión: S/ 0,44 millones

Fecha estimada de inicio: julio del 2018

Fecha estimada de culminación: agosto del 2018



PERÚ

Presidencia  
Del Consejo de Ministros

Autoridad para la  
Reconstrucción Con Cambios



## 2. MODIFICACIONES APROBADAS MEDIANTE EL DECRETO LEGISLATIVO N° 1354

# CONTAREMOS CON UN PROCESO ESPECIAL PARA REPONER EL SERVICIO/INFRAESTRUCTURA AFECTADA (INTERVENCIONES DE RECONSTRUCCIÓN)

## Programación

No se requerirá Programación.

## Preinversión

No se requerirá Preinversión.

## Inversión

Desarrollo del ET exceptuándose del SEIA, SERFOR, ANA fortaleciendo componente ambiental en esta fase.

## Financiamiento

Proceso de financiamiento de intervenciones a través de acuerdos de Directorio.

Procedimiento adhoc para la previsión presupuestal.

### PROYECTO DE LEY

Lineamientos sectoriales para definir duplicidades de inversión y responsabilidades de ejecutores y Autoridad.

## Contratación

### PROCEDIMIENTO ESPECIAL

Convocatoria del proceso: 30d. cal. A partir de incorporación de recursos.

Presentación de ofertas: 8d.h.

Obligación de usar bases estándar. Firma contrato: 5d.h. desde Buena Pro.

Apelación es resuelto y notificado a través del SEACE: 10d.h. desde presentación o subsanación.

Titular de la entidad resolverá procesos < 2.4MM para GR y GL y S/10MM para sectores.

Nuevas modalidades de contratación: Convenios de encargo, núcleos ejecutores, administración directa.

## Ejecución

Se iniciará directamente con el expediente técnico.

Saneamiento físico legal con proceso regulado en la Ley 30230. Para inicio de obras no se requerirá contar con terreno 100% saneado.

Entrega de terrenos del Estado: máximo 17d.h. desde que ejecutor solicita.

Procedimiento acelerado para expropiar y trato directo para terrenos privados.

Autorización de la Contraloría para pagos de adicionales: 7d.h.

# CONTAREMOS CON UN TRATAMIENTO ESPECIAL PARA LAS INTERVENCIONES DE CONSTRUCCIÓN (SOLUCIONES DEFINITIVAS)

## Programación

Ciclo de inversión regular del Invierte.pe

## Preinversión

## Inversión

Desarrollo del ET con instrumento ambiental especial que será aprobado por SENACE en 30d.h.

## Financiamiento

Proceso de financiamiento de intervenciones a través de acuerdos de Directorio.

Procedimiento adhoc para la previsión presupuestal.

### PROYECTO DE LEY

Lineamientos sectoriales para definir duplicidades de inversión y responsabilidades de ejecutores y Autoridad.

## Contratación

### PROCEDIMIENTO ESPECIAL

Convocatoria del proceso: 30 d. cal. A partir de incorporación de recursos.

Presentación de ofertas: 8d.h.

Obligación de usar bases estándar.

Firma contrato: 5d.h. desde Buena Pro.

Apelación es resuelta y notificada a través del SEACE: 10d.h. desde presentación o subsanación.

Titular de la entidad resolverá procesos < 2.4MM para GR y GL y S/10MM para sectores.

Nuevas modalidades de contratación:  
Convenios Estado-Estado.

## Ejecución

Saneamiento físico legal con proceso regulado en la Ley 30230. Para inicio de obras no se requerirá contar con terreno 100% saneado.

Entrega de terrenos del Estado: máximo 17 d.h. desde que ejecutor solicita.

Procedimiento acelerado para expropiar y trato directo para terrenos privados.

Autorización de la Contraloría para pagos de adicionales: 7 d.h.

- Se otorga competencias al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento en materia de drenaje pluvial.
- Para soluciones de vivienda, se financiarán habilitación, de corresponder.
- Para construcción de viviendas en sitio propio, se exceptúa de requisitos y procedimiento para la obtención de la licencia de edificación.
- Para soluciones de vivienda, se faculta la transferencia a título gratuito de predios estatales a favor de particulares.
- MINAM establecerá lineamientos que contribuyan a la gestión de riesgos en un contexto de cambio climático.
- Otorgamiento de 120 días calendario a la ANA para monumentación de fajas marginales. Municipalidades notifican la delimitación y monumentación a la población para su retiro.



PERÚ

Presidencia  
Del Consejo de Ministros

Autoridad para la  
Reconstrucción Con Cambios



| **Gracias**
