



PERÚ

Ministerio  
de Desarrollo Agrario  
y Riego

Viceministerio de Desarrollo de  
Agricultura Familiar e Infraestructura  
Agraria y Riego

Proyecto Especial Binacional  
Puyango Tumbes

 PROYECTO ESPECIAL  
BINACIONAL  
PUYANGO TUMBES



BICENTENARIO  
DEL PERÚ  
2021 - 2024

# Proyecto Especial Binacional Puyango Tumbes

---

ING. JUAN E. FARIAS BARRETO  
DIRECTOR EJECUTIVO

SEPTIEMBRE 2023

# 1.

## EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 07 DE SEPTIEMBRE 2023

### Por Fuente de Financiamiento:

Fuente de Financiamiento	PIA	PIM	Certificación	Devengado	% AVANCE
RECURSOS ORDINARIOS	68,608,106	81,934,469	80,047,985	66,245,296	81%
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	619,198	1,169,200	1,169,200	881,996	75%
<b>TOTAL</b>	<b>69,227,304</b>	<b>83,103,669</b>	<b>81,217,185</b>	<b>67,127,293</b>	<b>81%</b>

PRIMER PUESTO en el ranking de ejecución del gasto UE´s del Pliego MIDAGRI (enero – agosto)

## 2. INVERSIONES - 2023

Proyecto	PIA	PIM	Certificación	Devengado	Avance %
2192835: CREACION DEFENSA RIBEREÑA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO ZARUMILLA - TRAMO COMPRENDIDO ENTRE PUEBLO NUEVO Y LA BOCATOMA LA PALMA - PAPAYAL - ZARUMILLA - TUMBES	45,246,469	45,246,469	44,631,436	37,202,138	82%
2192836: INSTALACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA LAS INUNDACIONES EN LAS LOCALIDADES DE LA PALMA - CANARIO II, MARGEN IZQUIERDA DEL RIO ZARUMILLA (PROGRESIVA 0+120 - 11+550) EN LOS DISTRITOS DE PAPAYAL Y AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA, TUMBES	1,188	1,188	0	0	0%
2308698: AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DEL SECTOR LAS ESTUFAS, DISTRITO SAN JUAN DE LA VIRGEN, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES	0	4,471	4,471	4,471	100%
2448332: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL VIVERO FRUTICOLA DEL CENTRO EXPERIMENTAL TUMPIS DISTRITO DE PAPAYAL - PROVINCIA DE ZARUMILLA - DEPARTAMENTO DE TUMBES	265,489	1,642,248	1,275,336	38,500	2%
2492999: AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO SECTOR ARENA LA PALMA DEL DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES	0	182,856	182,856	0	0%
2597602: CREACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN ALGARROBAL DISTRITO DE MATAPALO DE LA PROVINCIA DE ZARUMILLA DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES	0	275,203	274,963	0	0%
2597820: AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN SECTOR LA TUNA DISTRITO DE TUMBES DE LA PROVINCIA DE TUMBES DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES	0	278,027	274,967	0	0%
2602937: AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN OIDOR DISTRITO DE SAN JACINTO DE LA PROVINCIA DE TUMBES DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES	0	113,887	113,887	0	0%
<b>TOTAL</b>	<b>45,513,146</b>	<b>47,744,349</b>	<b>46,757,916</b>	<b>37,245,109</b>	<b>78%</b>

# 3. ACTIVIDADES PERMANENTES - 2023

Proyecto	PIA	PIM	Certificación	Devengado	Avance %
GESTIÓN INSTITUCIONAL	19,203,588	11,657,207	11,211,030	7,798,374	67%
CENTRO EXPERIMENTAL TUMPIS	700,000	1,065,553	860599	780569	73%
ESTACIÓN DE BOMBREO PUERTO EL CURA Y ESTACIONES HIDROMETEREOLÓGICAS	200000	350,000	280,571	202,685	58%
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MAYOR DE RIEGO DEL CANAL ZRUMILLA	291,372	441,372	383,681	334,931	76%
PAGO DE SEGURO DE OBRAS	2700000	5,579,408	5,579,407	5579407	100%
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN	0	3,922,093	3,921,678	3510218	89%
ATENCIÓN DE ACTIVIDADES DE EMERGENCIA	0	11,164,725	11,034,844	10794002	97%
PROGRAMA DE CREDITO AGRÍCOLA	619,198	1,169,200	1,169,200	881,996	75%
PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES	0	9,762	0	0	0%
<b>TOTAL</b>	<b>23,714,158</b>	<b>35,359,320</b>	<b>34,441,010</b>	<b>29,882,182</b>	<b>85%</b>

# 4.

## PROYECTO DE INVERSIÓN CUI N° 2192835 Tramo II - Defensas Ribereñas del río Zarumilla

**META FISICA :** Construcción de 11.9 kilómetros de defensa ribereña en la Margen izquierda del río Zarumilla

2.1 kilómetros de dique y geo bolsa de conformación

7.9 kilómetros con dique de concreto



**COSTO TOTAL DE LA INVERSIÓN**

**S/. 104,807,983.64**



**MONTO EJECUTADO AL 2023**

**S/. 96,752,238.21**


**AVANCE FÍSICO DE OBRA**  
**89%**

- ✓ Suspensión de plazo por causas climatológicas del 06.03.2023 al 14.06.2023.
- ✓ El 14 de junio se ha reiniciado los trabajos en ejecución de obra.
- ✓ Nueva fecha de término 28.10.2023.

**META MES DE**  
**SEPTIEMBRE**  
**S/. 4,839,567.41**

# 5.

## PROYECTO DE INVERSIÓN CUI N° 2448332 Mejoramiento y ampliación del VIVERO – CET

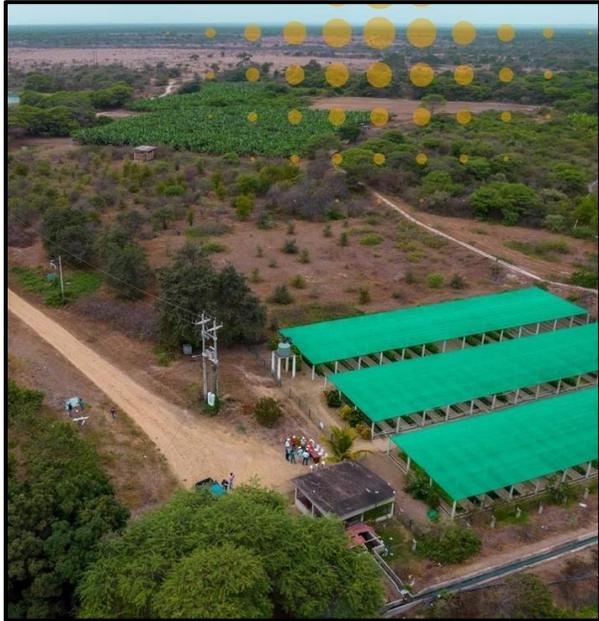

**META FISICA :** Construcción de vivero para la producción de plántones para frutales de adecuada calidad, equipamiento para producción y asistencia técnica manejo del cultivo.

**MONTO DE INVERSIÓN:**  
**S/3'160,364.20**

**MONTO EJECUTADO AL 2022 :**  
**S/. 1,543,066**

**AVANCE FÍSICO DE OBRA AL 2022**  
**41.5%**

### **COMPONENTES EJECUTADOS AL 2022:**

- ✓ **Obras civiles 55.84%**

- ✓ El 20.07.2023 – Aprobación de Expediente Técnico de Saldo de Obra – RD N° 070-2023-MIDAGRI-PEBPT
- ✓ Costo de Saldo de obra : S/. 1,236,835.63
- ✓ Inspección de obra : A cargo del PEBPT
- ✓ Suscripción de contrato : 25/08/2023
- ✓ Entrega de terreno : 01/09/2023
- ✓ Inicio de ejecución : 01/09/2023
- ✓ Plazo de ejecución : 60 días calendarios
- ✓ Fecha de Terminación : 31.10.2023

### **COMPONENTES POR EJECUTAR 2023:**

- ✓ **Obras civiles 44.16%**
- ✓ **Sistema de riego.**
- ✓ **Asistencia Técnica**

# 6. EXPEDIENTES TÉCNICOS

Proyecto	MONTO DE INVERSIÓN	PIM	ESTADO	APM 2024	DEMANDA ADICIONAL 2024
2492999: AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO SECTOR ARENA LA PALMA DEL DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES	2,866,889.92	182,856	EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACIÓN	2,684,034.00	0.00
2516510: AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO IRRIGACIÓN HUAQUILLAS BARRIO SAN JOSE DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES	3,335,420.61	105,000	EXPEDIENTE TÉCNICO EN REVISIÓN	1,841,377.00	1,389,043.61
2597602: CREACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN ALGARROBAL DISTRITO DE MATAPALO DE LA PROVINCIA DE ZARUMILLA DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES	4,879,600.33	275,203	EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACIÓN	4,604,398.00	0.00
2597820: AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN SECTOR LA TUNA DISTRITO DE TUMBES DE LA PROVINCIA DE TUMBES DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES	12,239,212.06	278,027	EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACIÓN	0.00	11,961,185.06
2602937: AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN OIDOR DISTRITO DE SAN JACINTO DE LA PROVINCIA DE TUMBES DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES	3,249,107.17	113,887	ACTOS PREPARATORIOS PARA PROCESO DE SELECCIÓN	0.00	3,135,220.17
2601408: AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN ELEFANTE, LA ISLA Y EL REDONDO DISTRITO DE SAN JACINTO DE LA PROVINCIA DE TUMBES DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES	3,293,418.66	116,487	ACTOS PREPARATORIOS PARA PROCESO DE SELECCIÓN	0.00	3,176,931.66
2605825: AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN IRRIGACION SANTA MARIA LOS LAURELES DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL DE LA PROVINCIA DE TUMBES DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES	2,296,135.19	98,450	ACTOS PREPARATORIOS PARA PROCESO DE SELECCIÓN	0.00	2,197,685.19
<b>TOTAL</b>	<b>32,159,783.94</b>	<b>1,169,910.00</b>		<b>9,129,809.00</b>	<b>21,860,065.69</b>

# 7. IRI: CANAL LA PEÑA

## ESTADO ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA:



El sistema de captación fue afectada por los caudales extraordinarios del fenómeno El Niño Costero 2017; la estructura en general ha sido afectada por la fuerza del agua, el terreno alrededor ha sido erosionado y la estructura ha quedado inoperativa.

## COMPONENTES A EJECUTAR:

- Reposición de la red área de media tensión
- Reposición del grupo electrógeno auxiliar de 50 KW
- Reposición del tablero de transferencia
- Rehabilitación de 04 compuertas metálicas verticales
- Reposición del sistema eléctrico de 04 compuertas verticales y 04 compuertas radiales.
- Rehabilitación de 930 ml de canal
- Rehabilitación de una estructura de protección para el acueducto.

TIPO DE INVERSIÓN	Intervención de Reconstrucción mediante Inversiones (IRI)
FUNCIÓN	Agropecuaria
DIVISIÓN FUNCIONAL	Riego
GRUPO FUNCIONAL	0050 Infraestructura de riego
TIPOLOGÍA	Infraestructura de Riego
SERVICIO	Servicio de provisión de agua para riego
Hectáreas mejoradas	5,442
BENEFICIARIOS	350 familias

## COMPONENTES DEL PROYECTO

VALOR REFERENCIAL DE LA OBRA	25,655,937.19
SUPERVISON DE LA OBRA	1,210,056.96
AFECTACION DE TERRENOS (CANAL ALTERNO)	60,000.00
<b>COSTO TOTAL A FINANCIAR POR EL PEBPT</b>	<b>26,925,994.15</b>

## **CON OPINION FAVORABLE PARA FINANCIAMIENTO DE ARCC EN TRAMITE DE DS PARA TRANSFERENCIA DE RECURSOS**

PLIEGO	UNIDAD EJECUTORA	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PROYECTO	GENERA DE GASTO	TOTAL
				2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
<b>013 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO</b>					
	014: MINAG - BINACIONAL PUYANGO TUMBES	0042: APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO	2425378 REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL LA PEÑA, DISTRITOS DE CORRALES, LA CRUZ Y SAN JACINTO, PROVINCIA DE TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES	26,925,995.00	26,925,995.00
<b>TOTAL</b>				<b>26,925,995.00</b>	<b>26,925,995.00</b>

# 8. CARTERA DE INVERSIONES

N°	PROYECTO	MONTO DE INVERSION S/.	AVANCE PERFIL	BENEFICIARIOS	HECTÁREAS	CONTRIBUCIÓN AL CIERRE DE BRECHA (%)	OBSERVACIONES
1	AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO SECTOR EL PALMAR, DISTRITO Y PROVINCIA Y DEPTO. TUMBES	3,349,984.76	90%	88	500	3	Áreas a beneficiar cuentan con Licencia otorgada 2005.
2	AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO IRRIGACIÓN OIDOR ALTO, DISTRITO SAN JACINTO, PROVINCIA Y DEPTO DE TUMBES	1,470,839.91	90%	49	66.6	0.4	Requiere de Licencia de acreditación hídrica.
3	CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO PARA EL SECTOR SUAREZ PEDREGAL – CASITAS - CONTRALMIRANTE VILLAR - TUMBES	4,185,539.12	90%	25	117.5	6.2	Requiere de Licencia de acreditación hídrica.
4	AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO, SECTOR HUACO CHICO PARTE ALTA – PAPAYAL - ZARUMILLA - TUMBES	2,444,155.75	90%	50	40	0.4	Requiere de Licencia de acreditación hídrica.
5	AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CENTRO EXPERIMENTAL TUMPI - PAPAYAL - ZARUMILLA - TUMBES	4,185,539.12	90%	3,000	90	0.7	Requiere de Licencia de acreditación hídrica.
6	AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL SECTORLOS LAURELES – CASITAS - CONTRALMIRANTE VILLAR - TUMBES	30,554,097.21	90%	500	1,200	63	Requiere de Licencia de acreditación hídrica.
7	AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL SECTOR BELLAVISTA CASITAS - CONTRALMIRANTE VILLAR - TUMBES	1,497,484.71	90%	32	177	9.28	Requiere de Licencia de acreditación hídrica.
8	CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO SECTOR BARRANCO BLANCO PAPAYAL - ZARUMILLA - TUMBES	22,783,641.95	90%	50	500	3.9	Requiere de Licencia de acreditación hídrica.
9	AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO SECTOR QUIÑONEZ, DISTRITO PAPAYAL, PROVINCIA ZARUMILLA Y DEPTO TUMBES	5,327,351.01	90%	26	128	1	Requiere de Licencia de acreditación hídrica.
10	AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO, SECTORES PRADO BAJO Y PRADO ALTO - PAMPAS DE HOSPITAL - TUMBES	11,900,639.09	90%	765	356.55	2.06	Requiere de Licencia de acreditación hídrica.
<b>TOTAL</b>		<b>87,699,272.63</b>					

# PROGRAMACION DE GASTO – AGOSTO 2023

RESPONSABLE	DENOMINACION	META AGOSTO - 2023	EJECUCION 31.08.2023
DIAR	TRAMO II	5,023,906.47	6,209,480.41
DIAR	EXPEDIENTE TECNICO – ARENA	73,142.4	0.00
DIAR	ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN	654,268.62	352,217.29
ADMINIST	GESTIÓN INSTITUCIONAL - PEBPT	1,106,034.89	498,847.46
DDA	CENTRO EXPERIMENTAL TUMPIS	60,000.00	226,685.62
DIAR	O & M PUERTO EL CURA Y ESTACIONES	36,000.00	46,406.40
DIAR	O & M CANAL INTER. Y BOCA TOMA	50,000.00	31,119.36
<b>TOTAL</b>		<b>7,003,352.38</b>	<b>7,364,756.54</b>

MONTO QUE SUPERA LA META

361,404.16

105%

# PROGRAMACION DE GASTO – SEPTIEMBRE 2023

RESPONSABLE	DENOMINACION	META SEPTIEMBRE - 2023
DIAR	TRAMO II	4,839,567.41
DIAR	EXPEDIENTE TECNICO - ARENA LA PALMA	109,713.60
DIAR	ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN	594,329.57
ADMINIST	GESTIÓN INSTITUCIONAL - PEBPT	925,071.68
DDA	CENTRO EXPERIMENTAL TUMPIS	70,000.00
DIAR	O & M PUERTO EL CURA Y ESTACIONES	36,000.00
DIAR	O & M CANAL INTER. Y BOCA TOMA	35,000.00
<b>TOTAL</b>		<b>6,609,682.26</b>

**GRACIAS**



PERÚ

Ministerio  
de Desarrollo Agrario  
y Riego



midagriperu



midagriperu



@midagriperu
