



Reconstrucción con Cambios en Piura


11º Sesión Descentralizada
de la CEMRCFC

Agenda


- 1. Avance de la Reconstrucción en Piura**
- 2. Avance de la Reconstrucción en Paita**

Reconstrucción en Piura

Avance Financiero: se ejecutó el 80% del monto financiado

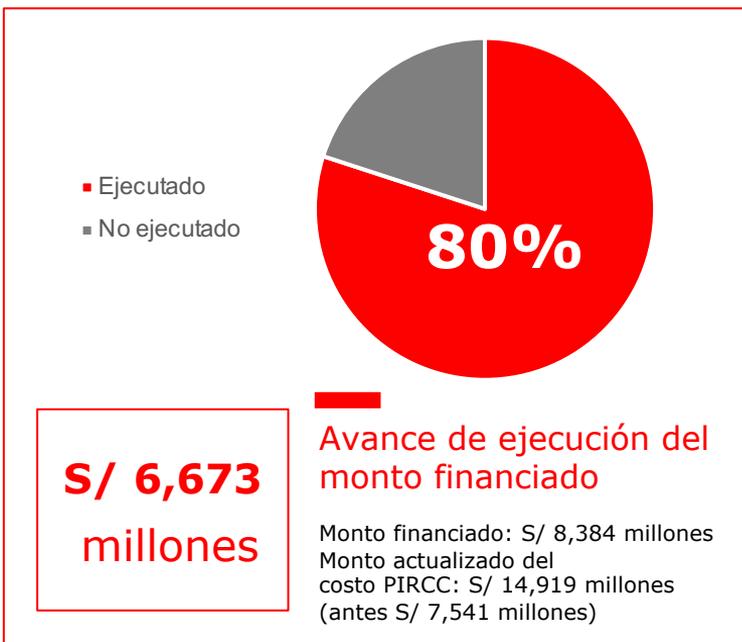

Avance Físico: 68% de intervenciones culminadas de un total de 2,317

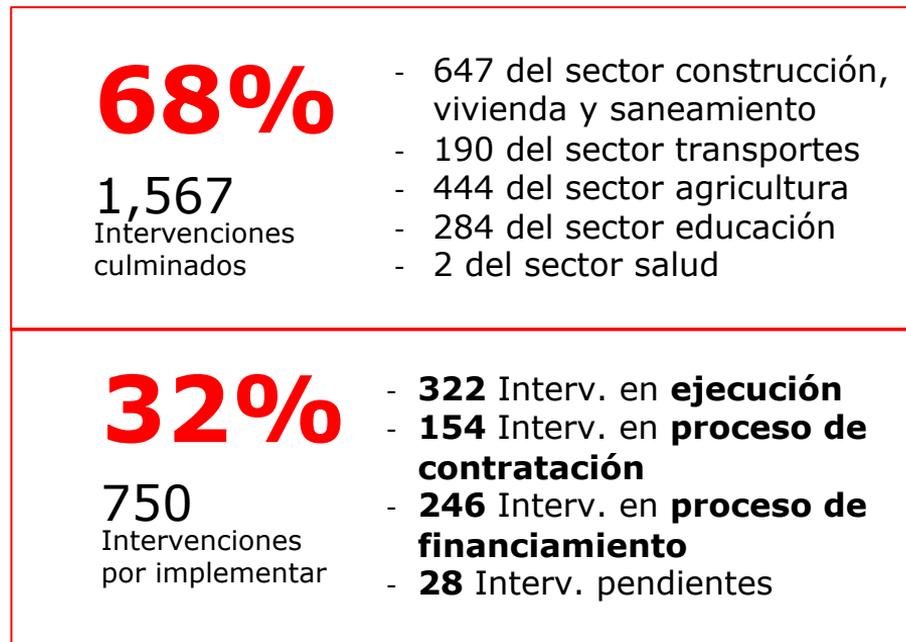

Ejecución del año 2022

Para 2022, el departamento de Piura registró un PIM de S/ 2,948 millones, donde se ejecutó el 69% al 31 Dic

Nivel de Gobierno	PIM 2022 (S/ Millones)	Ejecución al 31 Dic (S/ Millones)	Avance %
GOBIERNO NACIONAL	S/ 1,464	S/ 1,118	76%
ARCC	S/ 1,258	S/ 1,049	83%
MTC	S/ 29	S/ 14	48%
MINEDU	S/ 118	S/ 46	39%
MINAGRI	S/ 34	S/ 2	6%
VIVIENDA	S/ 16	S/ 6	38%
SALUD	S/ 9	S/ 1	11%
MINDEF	S/ 0.4	S/ 0.1	25%
GOBIERNO REGIONAL	S/ 341	S/ 157	46%
GOBIERNO LOCAL	S/ 1,143	S/ 762	67%
TOTAL	S/ 2,948	S/ 2,037	69%

Intervenciones con problemas en Piura

53 obras paralizadas a cargo de los tres niveles de Gobierno, con una inversión de S/ 1,071,063,222.37 millones

N°	Sector PIRCC	Ejecutora	Nivel de Gobierno	Total obras	Costo FUR (S/)
1	PISTAS Y VEREDAS	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA	GOBIERNO LOCAL	1	1,247,105.68
2	AGRICULTURA	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO	GOBIERNO NACIONAL	1	30,050,233.95
3	AGRICULTURA	REGION PIURA - PROYECTO ESP. CHIRA PIURA	GOBIERNO REGIONAL	1	5,408,226.28
4	AGRICULTURA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CATALINA DE MOSSA	GOBIERNO LOCAL	1	8,023,858.41
5	EDUCACION	AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS - RCC	GOBIERNO NACIONAL	5	154,148,178.03
6	EDUCACION	MINISTERIO DE EDUCACIÓN	GOBIERNO NACIONAL	2	10,654,533.53
7	EDUCACION	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARMACA	GOBIERNO LOCAL	1	6,696,357.64
8	EDUCACION	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO GRANDE	GOBIERNO LOCAL	3	9,465,806.82
9	EDUCACION	MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA UNION	GOBIERNO LOCAL	2	21,590,721.42
10	EDUCACION	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA	GOBIERNO LOCAL	1	2,216,605.98
11	EDUCACION	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SECHURA	GOBIERNO LOCAL	1	8,679,211.14
12	EDUCACION	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA	GOBIERNO LOCAL	1	19,836,145.58
13	EDUCACION	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA - PARÍÑAS	GOBIERNO LOCAL	1	8,065,530.40
14	PISTAS Y VEREDAS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL VEINTISEIS DE OCTUBRE	GOBIERNO LOCAL	1	9,207,544.25
15	SALUD	MINISTERIO DE SALUD	GOBIERNO NACIONAL	3	32,544,837.00
16	SALUD	GOBIERNO REGIONAL DE PIURA	GOBIERNO REGIONAL	4	341,726,364.08
17	SALUD	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALACO	GOBIERNO LOCAL	1	49,177,912.83
18	SANEAMIENTO	MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	GOBIERNO NACIONAL	9	1,826,120.10
19	TRANSPORTE	GOBIERNO REGIONAL DE PIURA	GOBIERNO REGIONAL	5	164,029,330.28
20	TRANSPORTE	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANCHAQUE	GOBIERNO LOCAL	1	4,799,074.43
21	TRANSPORTE	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALACO	GOBIERNO LOCAL	1	12,702,193.64
22	TRANSPORTE	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL CARMEN DE LA FRONTERA	GOBIERNO LOCAL	1	16,058,146.09
23	TRANSPORTE	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARMACA	GOBIERNO LOCAL	2	40,378,982.73
24	TRANSPORTE	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACAIPAMPA	GOBIERNO LOCAL	1	15,530,570.77
25	TRANSPORTE	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA	GOBIERNO LOCAL	2	19,717,132.72
26	TRANSPORTE	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA	GOBIERNO LOCAL	1	77,282,498.59
Total				53	1,071,063,222.37

Intervenciones con problemas en Piura

53 obras paralizadas según tipo de paralización:

Sector PIRCC	OBRA PARALIZADA CON ACUERDO	Inversión (Costo FUR) (S/ millones)	OBRA PARALIZADA POR INCUMPLIMIENTO	Inversión (Costo FUR) (S/ millones)	OBRA PARALIZADA POR RESOLUCION DE CONTRATO	Inversión (Costo FUR) (S/ millones)	OBRA PARALIZADA POR ARBITRAJE	Inversión (Costo FUR) (S/ millones)	OBRA PARALIZADA POR FALTA DE OTORGAMIENTO DE RECURSOS ADICIONALES, SALDOS DE OBRA	Inversión (Costo FUR) (S/ millones)	NULIDAD DEL CONTRATO	Inversión (Costo FUR) (S/ millones)	Total obras
AGRICULTURA	-	-	-	-	2	S/ 13	-	-	-	-	1	S/ 30	3
EDUCACION	6	S/ 27	2	S/ 27	8	S/ 184	-	-	-	-	1	S/ 3	17
PISTAS Y VEREDAS	2	S/ 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
TRANSPORTE	9	S/ 221	2	S/ 13	1	S/ 77	1	S/ 32	1	S/ 7	-	-	14
SALUD	1	S/ 49	7	S/ 374	-	-	-	-	-	-	-	-	8
SANEAMIENTO	9	S/ 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
Total	27	S/ 309	11	S/ 414	10	S/ 274	1	S/ 32	1	S/ 7	2	S/ 33	53

Avance de cartera G2G



/1 Incluye 4 proyectos, actualmente esta en ejecución 1 proyecto: SAT - Sistema de Alerta Temprana.

01 Soluciones Integrales

4 Drenajes
S/ 1,662 millones

En ejecución (diseño):
Paíta, Talara y Sullana

Estrategia de
contratación: Piura

Rio Piura/1
S/ 948 millones

En ejecución:
SAT

Est. de contratación:
Control de inundaciones

02 Sector Educación

29 obras
S/ 1,070 millones

2 Culminadas:
14032-Catacaos
Jose Matias-Sullana

03 Sector Salud

8 obras
S/ 1,417 millones

1 Culminado:
C.S. Limón

4 en ejecución:
Hospital Chulucanas
Hospital Sullana
C.S. Castilla
C.S. Faique

3 en asistencia técnica:
C.S. Máncora
C.S. Sechura
C.S. Talara

Agenda


1. Avance de la Reconstrucción en Piura
2. **Avance de la Reconstrucción en Paita**

Reconstrucción en la provincia de Paita

Avance Financiero: se ejecutó el 90% del monto financiado



Avance Físico: 63% de intervenciones culminadas de un total de 119

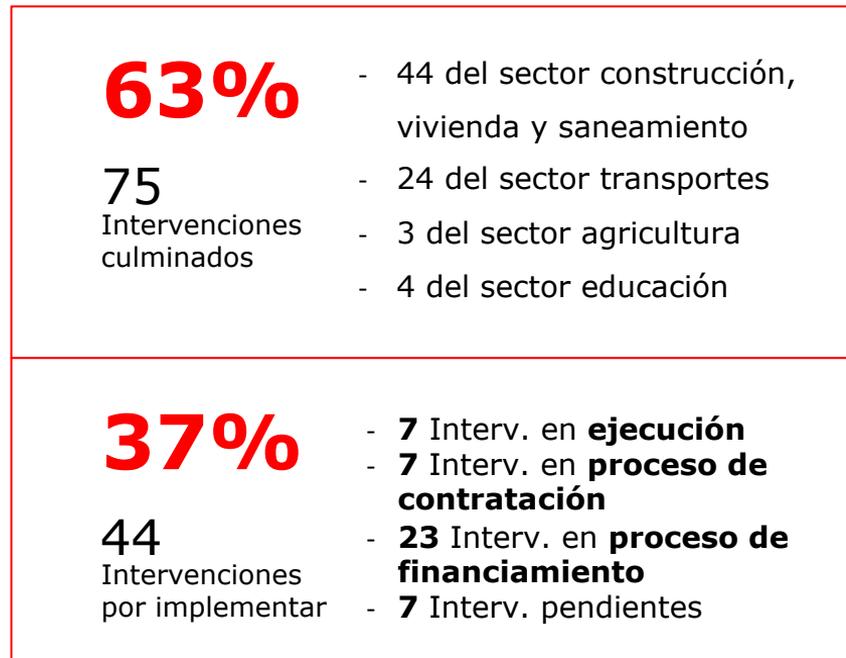

Ejecución del año 2022

Para 2022, el departamento de Piura registró un PIM de S/ 60 millones, donde se ejecutó el 75% al 31 Dic

Nivel de Gobierno	PIM 2022 (S/ Millones)	Ejecución al 31 Dic (S/ Millones)	Avance %
GOBIERNO NACIONAL	S/ 17.4	S/ 17.2	99%
ARCC	S/ 16.9	S/ 16.9	100%
MINAGRI	S/ 0.01	S/ 0.01	100%
VIVIENDA	S/ 0.5	S/ 0.3	60%
GOBIERNO REGIONAL	S/ 13	S/ 3	23%
GOBIERNO LOCAL	S/ 30	S/ 25	83%
TOTAL	S/ 60	S/ 45	75%

Intervenciones con problemas en Paita

1 obra paralizada a cargo de Muni Provincial Paita, con una inversión de S/ 1.2 millones

Nº	Sector PIRCC	Nivel de Gobierno	CUI	Nombre	Causa paralización	Costo FUR (S/)
1	PISTAS Y VEREDAS	Municipalidad Provincial de Paita	2537975	RECONSTRUCCIÓN DE LA BAJADA A LA PLAYA, DESDE LA CALLE SUCRE HASTA LA PLAYA LA TORTUGA, CENTRO POBLADO LA TORTUGA, DISTRITO DE PAITA	No se cuenta con Supervisor o Inspector designado por la entidad ejecutora	S/ 1.2 millones

Acciones de la ARCC:

- Dirección Sectorial de Vivienda, Construcción y Saneamiento brindó asistencia técnica virtual a la Sub-Gerente de Obras de la Municipalidad el 16.01.23. Personal de contacto ARCC: Arq. Jorge Linares.
- Se ha planteado reunión de asistencia técnica 20.01.23, pendiente de enviar lista de asistentes de la Entidad Ejecutora.

Intervenciones con problemas en Paita

1 obra paralizada a cargo del Gobierno Regional de Piura, con una inversión de S/ 77.2 millones

Nº	Sector PIRCC	Nivel de Gobierno	CUI	Nombre	Causa paralización	Costo FUR (S/)
1	TRANSPORTE	Gobierno Regional de Piura	2022551	MEJORAMIENTO DE CARRETERA VECINAL 533-EMPALME-534-LA ISLILLA	Resolución de Contrato	S/ 77.2 millones

Acciones de la ARCC:

- La Entidad Ejecutora elaboró el saldo de obra con sus propios recursos y continúa con la ejecución de la misma forma (sin financiamiento de la ARCC).
- Último avance reportado con el financiamiento de ARCC: 67%.
- Durante la ejecución del saldo de obra, la EE reportó como último avance a diciembre 2022: 2.5%..

Acciones de control realizadas por la Contraloría

En torno a las acciones de Control a Entidades Ejecutoras del PIRCC


- Son realizadas directamente a las entidades que la ARCC brinda financiamiento
- No cumplimos rol fiscalizador sobre las observaciones u hallazgos que pudieran haberse encontrado
- A las entidades ejecutoras les compete implementar las recomendaciones

En torno al control concurrente a obras bajo el marco del G2G

- Hasta la fecha la CGR ha emitido 43 informes de control, 2 de los cuales aluden a intervenciones ubicadas en la provincia Paita (Hitos de Control Nos. 9 y 12, acciones implementadas)
- Las situaciones adversas identificadas son dos (2) y están relacionadas a retrasos en las procuras y ejecución contractual.

Respuestas de la ARCC

Razones que generaron retrasos en la implementación de las intervenciones



Drenaje Pluvial Paita

1. Proyecto complejo y baja oferta de proveedores en el rubro
2. En el 2021, la procura se canceló debido a que se encontraba pendiente la obtención de la viabilidad del proyecto.



Colegio Ricardo Palma - Paita

1. Dificultades en el reclutamiento de personal debido al alto nivel de especialización requerido.
2. Insuficiente capital humano.
3. Impacto del COVID-19 en las actividades de la ARCC.

Medidas adoptadas por la ARCC

1 —————> **Prórroga de la vigencia del Contrato Operativo (Adenda N° 4) con UKDT**

2 —————> **Específicamente en Soluciones Integrales:**

- Desarrollo de estudios de pre-inversión “in house” para garantizar que se culminen oportunamente y con estándares que sean aplicables a los procesos de contratación en el marco del Acuerdo Gobierno a Gobierno.
- Optimizar soluciones técnicas y de tiempo durante etapa de diseño.

Las medidas adoptadas por la ARCC permitieron la suscripción del Contrato para el Drenaje Pluvial Paíta el 23DIC2022.

3 —————> **Específicamente en el sector Educación:**

- Reuniones colaborativas “Mesa de Trabajo Presenciales”
- Solicitó al Contratista la presentación de “Planes de Recuperación”

Las medidas adoptadas por la ARCC permitieron la aceptación del Diseño final del Local Escolar Ricardo Palma – Paíta el 31AGO2022 (Informe N° 068-2022-ARCC/DE/DISE-MEPM)

Avance de cartera G2G



01 Soluciones Integrales

1 Drenaje
S/ 191 millones

En ejecución:

- Paíta (en diseño)

Avance físico: 0%

Avance financiero: 0%

Entrega estimada: Jul 2026

02 Sector Educación

1 obra
S/ 26 millones

En ejecución:

- Colegio Ricardo Plama

Avance físico: 63%

Avance financiero: 72%

Entrega estimada: May 2023

