



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros



Gobierno del Perú



**Décimo Primera Sesión Descentralizada:
Avances, problemática y propuestas en las intervenciones para la
reconstrucción de las zonas afectadas por el fenómeno de El Niño
Costero, en la provincia de Paita, región Piura**

Subdirección Regional de Piura

17 de enero de 2023

Sector: AGRICULTURA

Cod ARCC	CUI	Provincia	Distrito	Entidad Ejecutora	Intervención	Monto de inversión (S/.)	Monto devengado actual S/.	Estado	Comentario
989	2377435	PAITA	LA HUACA	GR Piura	DIQUE D-2060 DEL RIO CHIRA (KM 7+344 AL KM 7+843).	8,749,708.68	59,900.00	PENDIENTE DE FINANCIAMIENTO	Intervención con opinión favorable de la DSI. Trámite de financiamiento en OPP-ARCC.
292		PAITA	TAMARINDO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL TAMARINDO	CANAL SAN PEDRO EN EL SECTOR DE SAN PEDRO HUAN DEBAJO Y ALTA (PROGRESIVA 1+921 AL 2+308) DEL DISTRITO DE TAMARINDO – PAITA - PIURA.			EN EXPEDIENTE TÉCNICO	Intervención en asistencia técnica. Se coordinará con los nuevos funcionarios a fin de que alcancen el expediente técnico actualizado para proseguir con el trámite.
986	2533157	PAITA	COLAN	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLAN	RECUPERACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO DEL VALLE DEL DEBAJO CHIRA MARGEN IZQUIERDA, EN EL DISTRITO DE COLÁN, PROVINCIA DE PAITA, DEPARTAMENTO DE PIURA.	554,991.58	0.00	EN EJECUCIÓN	Contrato de ejecución firmado el 28/12/2022, supervisión contactada el 15/12/2022, inicio de plazo: 12/01/2023.

Fuente: PIRCC SDRPIURA al 31.12.2022

Sector: EDUCACIÓN

Cod ARCC	CUI	Provincia	Distrito	Entidad Ejecutora	Intervención	Monto de inversión (S/.)	Monto devengado actual S/.)	Estado	Comentario
1782	2548568	PAITA	PAITA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA	REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES CON CÓDIGO LOCAL 434003	8,261,958.01	0.00	ADJUDICADA	Procedimiento para la ejecución en estado de adjudicado. Supervisión sin procedimiento especial de contratación (PEC).
2811	2531189	PAITA	PAITA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA	INTERVENCIÓN EN EL LOCAL ESCOLAR 407, CON CÓDIGO LOCAL 433980	3,866,833.70	2,136,724.45	EN EJECUCIÓN	Avance físico actual de 39%. La intervención se encuentra atrasada por demora de la EE en responder consultas del contratista.

Fuente: PIRCC SDRPIURA al 31.12.2022

Sector: SANEAMIENTO

Cod ARCC	CUI	Provincia	Distrito	Entidad Ejecutora	Intervención	Estado	Comentario
9399		PAITA	PAITA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CÁMARA DE BOMBEO 1 (AH. KEIKO SOFÍA) Y CÁMARA 2 (A.H MARÍA CONSUELO DE VELASCO), DE LAS CUENCAS 1, 2 Y 3	EN EXPEDIENTE TÉCNICO	La Entidad Ejecutora debe presentar el documento de Cenepred en el cual se emita opinión respecto a la ubicación de la EB N° 01, ya que de las evidencias fotográficas se visualiza que esta en una zona vulnerable y de riesgo. Debe revisar el planteamiento técnico.
9194	2504164	PAITA	PAITA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA	REHABILITACIÓN DE LA CASETA DE BOMBEO N°01 DEL DISTRITO DE PAITA - PROVINCIA DE PAITA-PIURA	EN EXPEDIENTE TÉCNICO	La Entidad Ejecutora debe presentar el documento de Cenepred en el cual se emita opinión respecto a la ubicación de la EB N° 01, ya que de las evidencias fotográficas se visualiza que esta en una zona vulnerable y de riesgo. Debe revisar el planteamiento técnico.
9198	2430452	PAITA	VICHAYAL	MUNICIPALIDAD DISTRITAL VICHAYAL	REHABILITACIÓN DE 350 ML DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DN 200 MM. SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE VICHAYAL - PAITA - PIURA	EN EXPEDIENTE TÉCNICO	Se recomendó a la entidad ejecutora que debe coordinar con la empresa prestadora de servicio (EPS GRAU S.A), a fin de obtener la conformidad al planteamiento técnico.
9184	2490892	PAITA	AMOTAPE	MUNICIPALIDAD DISTRITAL AMOTAPE	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE AMOTAPE, DEL DISTRITO DE AMOTAPE, PROVINCIA DE PAITA, REGION PIURA AFECTADA POR EL FENÓMENO DEL NIÑO COSTERO	POR EXCLUIR A SOLICITUD DE LA ENTIDAD	La entidad ejecutora informó a la ARCC a finales del 2022 que solicitará la exclusión de la intervención.
9185		PAITA	AMOTAPE	MUNICIPALIDAD DISTRITAL AMOTAPE	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE C. P. TAMBO, DEL DISTRITO DE AMOTAPE, PROVINCIA DE PAITA, REGION PIURA AFECTADA POR EL FENÓMENO DEL NIÑO COSTERO	EN EXPEDIENTE TÉCNICO	Se alcanzó a la entidad los comentarios al expediente técnico y se confirma que presenta correspondencia, sin embargo no se recibió mayor información por parte de la entidad.
9188		PAITA	ARENAL	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ARENAL	REHABILITACION DE UN TRAMO DE COLECTOR PRINCIPAL Y UN TRAMO DEL EMISOR DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL DIST. EL ARENAL DE Ø 10" CSN - L= 175 ML, DE LA PROVINCIA DE PAITA - PIURA	PENDIENTE POR ENTIDAD	La EE se comprometió en remitir el documento de acreditación de los profesionales. No se recepciona mas información de parte de la EE.
9187		PAITA	ARENAL	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ARENAL	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE TABLAZO, DEL DISTRITO DE ARENAL, PROVINCIA DE PAITA, REGION PIURA AFECTADA POR EL FENÓMENO DEL NIÑO COSTERO	PENDIENTE POR ENTIDAD	La EE se comprometió en remitir el documento de acreditación de los profesionales. No se recepciona mas información de parte de la EE.

Sector: PISTAS Y VEREDAS

Cod ARCC	CUI	Provincia	Distrito	Entidad Ejecutora	Intervención	Estado	Comentario
6114		PAITA	PAITA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA	REHABILITACION DE CALLE JORGE CHÁVEZ DEL P.J SAN MARTIN ORIENTE	PENDIENTE POR LA ENTIDAD	Intervención en asistencia técnica, sin embargo hasta la fecha no se han tenido entregas u avances por parte de la EE.
3238		PAITA	PAITA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA	REHABILITACION DE TRAMO 1-370 - JIRON ZANJON DESDE VIA DE EVITAMIENTO HASTA MALECON JORGE CHAVEZ	PENDIENTE POR LA ENTIDAD	Intervención en asistencia técnica. EE no se presenta en mesa técnica, telefónicamente se reprogramó pero tampoco hubo comunicación por parte de la entidad. Hasta la fecha no se han tenido entregas u avances por parte de la EE.
3241		PAITA	PAITA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA	REHABILITACION DE TRAMO 1-373 - JIRON NUEVE DE OCTUBRE DESDE JR ZANJON HASTA AV VICTOR RAUL	PENDIENTE POR LA ENTIDAD	Intervención en asistencia técnica. EE no se presenta en mesa técnica, telefónicamente se reprogramó pero tampoco hubo comunicación por parte de la entidad. Hasta la fecha no se han tenido entregas u avances por parte de la EE.
3006	2466229	PAITA	TAMARINDO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMARINDO	RECONSTRUCCION DE TRAMO 1-137 - CALLE MARISCAL CASTILLA DESDE CDRA 1 HASTA CDRA 3	PENDIENTE POR LA ENTIDAD	Intervención en asistencia técnica. La EE se comprometió en entregar ET saneamiento a EPS GRAU para la reconstrucción del sistema.
3007	2466229	PAITA	TAMARINDO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMARINDO	RECONSTRUCCION DE TRAMO 1-138 - CALLE INTERSECCION DE LA CALLE TUPAC AMARU CDRA 1	PENDIENTE POR LA ENTIDAD	Intervención en asistencia técnica. La EE se comprometió en entregar ET saneamiento a EPS GRAU para la reconstrucción del sistema.
3009	2466229	PAITA	TAMARINDO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMARINDO	RECONSTRUCCION DE TRAMO 1-140 - CALLE MOQUEGUA, CALLE AREQUIPA ALREDEDOR PLAZA LIBERTAD DESDE CDRA 1 HASTA CDRA 2	PENDIENTE POR LA ENTIDAD	Intervención en asistencia técnica. La EE se comprometió en entregar ET saneamiento a EPS GRAU para la reconstrucción del sistema.
3010	2466229	PAITA	TAMARINDO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMARINDO	RECONSTRUCCION DE TRAMO 1-141 - CALLE S/N ALREDEDOR DE LA PLAZA SECTOR LIBERTAD DESDE CDRA 1 HASTA CDRA 2	PENDIENTE POR LA ENTIDAD	Intervención en asistencia técnica. La EE se comprometió en entregar ET saneamiento a EPS GRAU para la reconstrucción del sistema.

Fuente: PIRCC SDRPIURA al 31.12.2022

Sector: PISTAS Y VEREDAS

Cod ARCC	CUI	Provincia	Distrito	Entidad Ejecutora	Intervención	Monto de inversión (S/.)	Monto devengado actual S/.)	Estado	Comentario
6093	2537975	PAITA	PAITA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA	RECONSTRUCCION DE LA BAJADA A LA PLAYA (DESDE CALLE SUCRE HASTA LA PLAYA LA TORTUGA), CENTRO POBLADO LA TORTUGA	1,247,105.68	344,350.43	EN EJECUCIÓN	Intervención suspendida, debido a que no se cuenta con supervisor contratado o inspector designado por parte de la EE. La ARCC solicitó reunión inmediata para tratar la problemática
2999	2425671	PAITA	VICHAYAL	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICHAYAL	RECONSTRUCCION DE TRAMO 1-130 - AVENIDA MARISCAL CASTILLA DESDE CDRA 1 HASTA CDRA 2	1,882,087.45	1,065,558.30	EN EJECUCIÓN	Intervención en ejecución normal (inicio 07/12/2023).
3000	2425671	PAITA	VICHAYAL	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICHAYAL	RECONSTRUCCION DE TRAMO 1-131 - AVENIDA SAN MARTIN DESDE CDRA 1 HASTA CDRA 2			EN EJECUCIÓN	

Fuente: PIRCC SDRPIURA al 31.12.2022

Cod ARCC	CUI	Provincia	Distrito	Entidad Ejecutora	Intervención	Estado	Comentario
7050		PAITA	PAITA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA	RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL - 1.066851812936 KM EN EMP. R75 - CAMPO DE ATERRISAJE - TIERRA COLORADA	PENDIENTE DE FINANCIAMIENTO	Asistencia técnica brindada por la ARCC, con lo que la entidad inició actividades previas a la elaboración del expediente técnico, sin llegar a solicitar el financiamiento en el año 2022. En la actualidad se viene coordinando con la nueva gestión municipal a fin de retomar las gestiones.
7049	2532575	PAITA	PAITA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA	RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL - 2.331369549495 KM EN EMP. R73 - TIERRA COLORADA	EN EXPEDIENTE TÉCNICO	Asistencia técnica brindada por la ARCC, sin embargo la EE no solicitó el financiamiento en el año 2022. En la actualidad se viene coordinando con la nueva gestión municipal a fin de retomar acciones que permitan realizar la actualización del expediente técnico.
7055		PAITA	PAITA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA	RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL - 2.515636931423 KM EN EMP. R72 - EMP. R87	PENDIENTE POR LA ENTIDAD	Solicitud de exclusión devuelta a la entidad por carecer de sustento. En la actualidad se viene coordinando con la nueva gestión municipal a fin de retomar las gestiones.
7027		PAITA	PAITA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA	RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL - 2.55750960465 KM EN EMP. PI102 (PIURA-PAITA) - EMP. PE-02	PENDIENTE POR LA ENTIDAD	Asistencia técnica brindada por la ARCC, con lo que la entidad inició actividades previas a la elaboración del expediente técnico, sin llegar a solicitar el financiamiento en el año 2022. En la actualidad se viene coordinando con la nueva gestión municipal a fin de retomar las gestiones.
7045		PAITA	PAITA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA	RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL - 3.300441170796 KM EN EMP. R72 - TIERRA COLORADA - PUNTA HORADA	PENDIENTE POR LA ENTIDAD	Asistencia técnica brindada por la ARCC, con lo que la entidad inició actividades previas a la elaboración del expediente técnico, sin llegar a solicitar el financiamiento en el año 2022. En la actualidad se viene coordinando con la nueva gestión municipal a fin de retomar las gestiones.
7061	2457848	PAITA	VICHAYAL	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICHAYAL	RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL - 0.922920812352 KM EN EMP. R11 (SAN LUIS) - SAN LUIS - EMP. R13(VEGA DEL CHINO)	EN EXPEDIENTE TÉCNICO	La ARCC alcanzó observaciones a la solicitud de financiamiento a la EE, sin embargo esta no remitió el levantamiento de las mismas. En la actualidad se viene coordinando con la nueva gestión municipal a fin de retomar las gestiones
7057	2438693	PAITA	TAMARINDO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMARINDO	RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL - 5.41456666009 KM EN EMP. PI528 - PLAZA TAMARINDO	PENDIENTE POR LA ENTIDAD	Asistencia técnica cerrada en el año 2021, por parte de la ARCC. La entidad deberá retomar las acciones previas que venía ejecutando para la elaboración del expediente técnico.

Sector: TRANSPORTES

Cod ARCC	CUI	Provincia	Distrito	Entidad Ejecutora	Intervención	Monto de inversión (S/.)	Monto devengado actual S/.)	Estado	Comentario
7032	2548150	PAITA	ARENAL	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL ARENAL	RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL - 3.472 KM EN FRONTERA ARENAL COLÁN - EMP. PI101 (PTE SIMÓN RODRÍGUEZ)	1,487,888.94	141,703.71	EN EJECUCIÓN	En ejecución normal. La EE no a reportado avance, por cambio de gestión.
7107	2022551	PAITA	PAITA	GR Piura	MEJORAMIENTO DE CARRETERA VECINAL 533-EMPALME-534-LA ISLILLA	77,282,498.59	47,968,889.52	POR ARCC PARALIZADA – ENTIDAD EJECUTA SALDO CON RECURSOS PROPIOS	Resolución de contrato por llegar a penalidad máxima. La EE elaboró el saldo de obra con sus propios recursos y continúa con la ejecución de la misma forma (sin financiamiento de la ARCC). Último avance reportado con el financiamiento de ARCC: 67%. Durante la ejecución del saldo de obra, la EE reportó como último avance a diciembre 2022: 2.5%.

Proyectos G2G de drenaje pluvial en la región PIURA


Proyecto	CUI	Presupuesto viable (soles)	Presupuesto actualizado (soles)	Tiempo ejecución	Modalidad Ejecución	Unidad Ejecutora	Estado de desarrollo
Drenaje Pluvial de Sullana	2532678	S/.474,975,795.84	S/.519,492,337.85	17 meses (Diseño) 44 meses (Construcción)	G2G - Modalidad Fast Track	ARCC a través de la Dirección de Articulación de Inversiones	Firma contrato 22 Junio 2022
Drenaje Pluvial de Talara	2532763	S/.200,021,657.13	S/.226,104,204.88	19 meses (Diseño) 44 meses (Construcción)	G2G - Modalidad Fast Track	ARCC a través de la Dirección de Articulación de Inversiones	Firma contrato 20 Julio 2022
Drenaje Pluvial de Paita	2542271	S/.186,029,723.20	S/.191,235,220.80	12 meses (Diseño) 30 meses (Construcción)	G2G - Modalidad Fast Track	ARCC a través de la Dirección de Articulación de Inversiones	Adjudicación 24 diciembre 2022
Drenaje Pluvial de Piura, Castilla y Veintiséis de Octubre	En elaboración	S/.3,100,000,000.00	--	12 meses en elaboración de Perfiles de Inversión	En evaluación	ARCC a través de la Dirección de Articulación de Inversiones	En elaboración de Perfil de Inversión a partir de febrero 2023

DRENAJE PLUVIAL PAITA

DISTRITO: PAITA

RESUMEN DEL PROYECTO: Alcance: Casco urbano del distrito de Paita

- Construcción de diques de protección,
- Mejoramiento de capacidad hidráulica de vías, colectores, emisores de descarga, sumideros, rejillas,.
- Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS) del tipo infiltración,
- Estructuras de almacenamiento (parques, losas, jardines, tanques de retención).
- Componente no estructural, con la elaboración de instrumentos de gestión para la operación y mantenimiento del servicio de drenaje pluvial urbano.

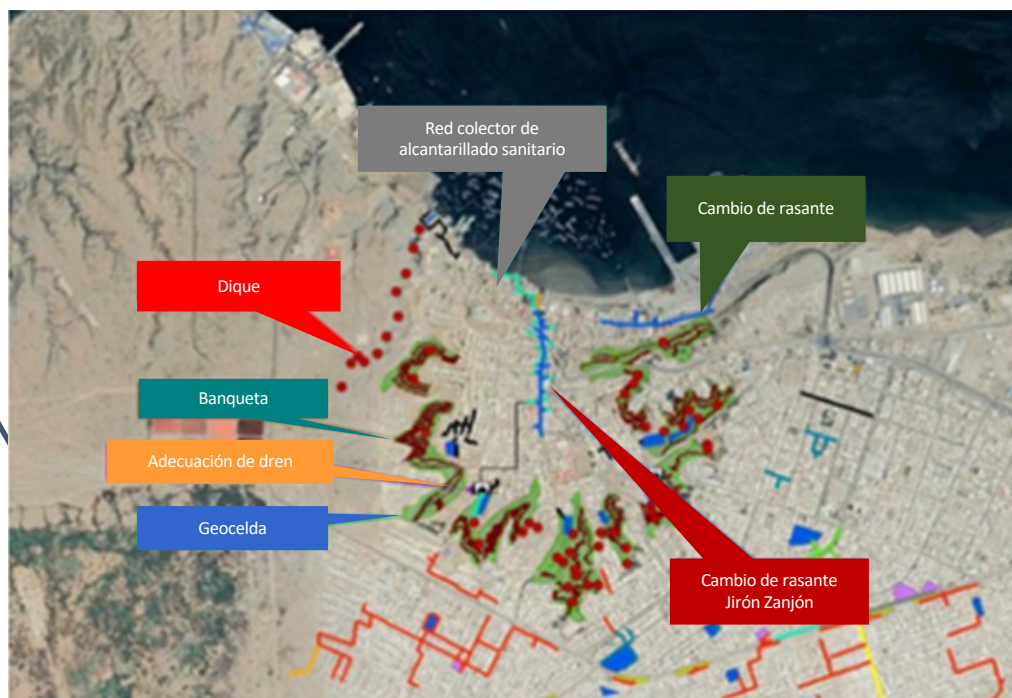

CONSULTOR

CONTRATO NEC 3 OPCIÓN A:
Contrato a suma alzada con listado de actividades

Técnica y Proyectos S.A. Sucursal del Perú (Elaboración de diseño)

DURACIÓN

Diseño: 15 meses

HITOS CONTRACTUALES DE DISEÑO

- Inicio Contractual : 24.12.2022
- Fase 1 (Entregables 1 al 13) : 24.10.2022
- Fase 2 (Entregables 14 al 16) : 24.03.2024

PRESUPUESTO ESTIMADO DE DISEÑO

- Diseño : S/ 51,547,281.66 (Suma Alzada)

- Inclusión de la metodología RIBA para la elaboración del expediente técnico.
- Inclusión del cambio climático que tiene como objetivo proponer alternativas de solución resilientes, seguras y sostenibles.
- Requerimiento a mayor detalle de estudios básicos de ingeniería:
 - ❖ Topografía por el relieve accidentado y la diferencia de cotas entre Paita Alta y Paita Baja de aproximadamente 70m
 - ❖ Geotecnia, mayor cantidad de pruebas de campo y ensayos de penetración estándar para profundidades mayores a 8m, asociados a la propuestas de Estructuras de retención e infiltración del perfil.
