


RE
CONSTRUCCIÓN
CON CAMBIOS

Dirección Ejecutiva

Mayo 2023

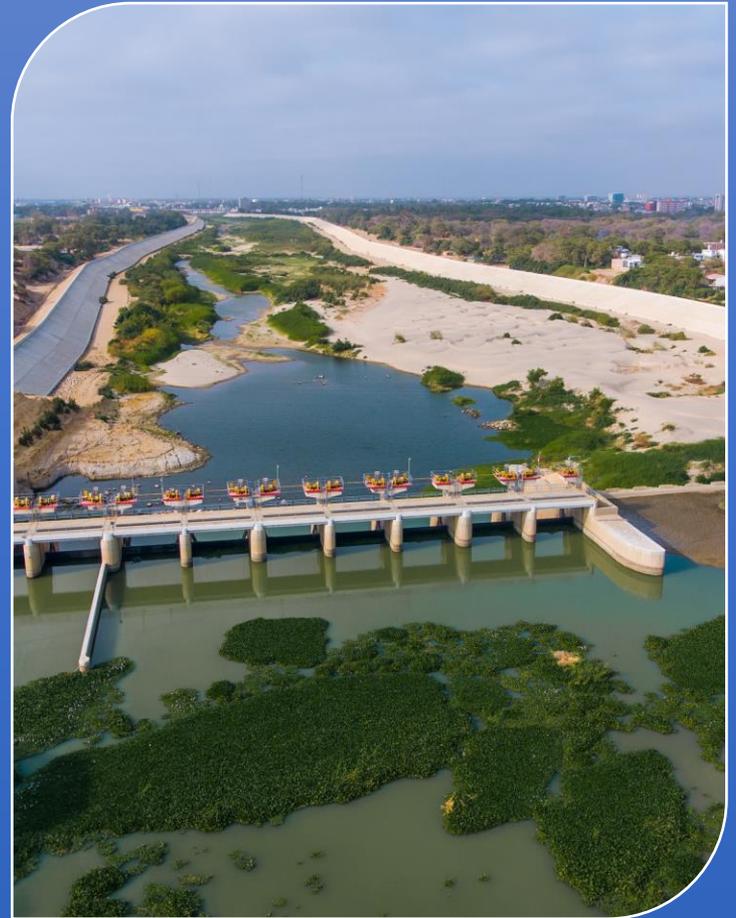


Agenda


1. Estado situacional de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios.
2. Estado situacional del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios.
3. Acciones que se vienen implementando y siguientes pasos.

1

Estado Situacional de la ARCC

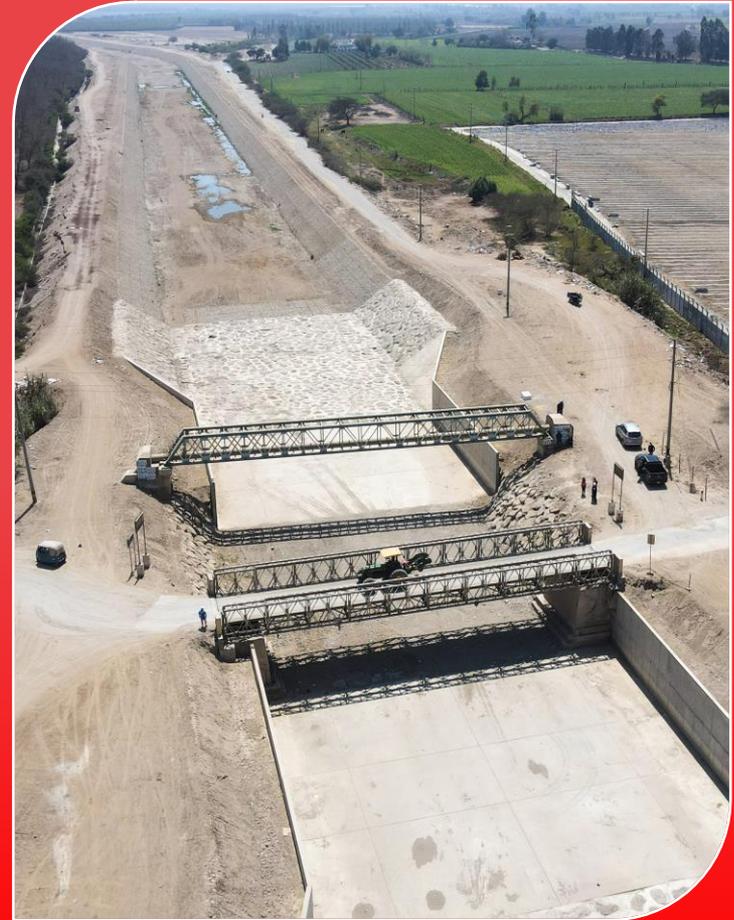

1. Avance de la cartera de proyectos G2G




71%

Salud




72%

Educación




10%

Sol. Integrales



1%

Drenajes



28%*

ARCC

■ Corresponde al Avance de la cartera de proyectos G2G.

139 proy



Con contrato

13 proy



En proceso de contratación

6 proy



En estrategia de procura

32 proy



En asistencia técnica

S/ 16,059 millones

S/ 4,940 millones

S/ 1,451 millones

S/ 6,670 millones

(*) Avance Real que es equivalente al avance Físico

Fuente: Información remitida por las Direcciones Sectoriales – ARCC al 31.03.2023 | Elaboración: Oficina de Gestión de Proyectos ARCC


1. Avance de la cartera de proyectos G2G: Detalle de Soluciones Integrales y Drenajes – Cartera G2G

98 intervenciones G2G

Departamento	Cuenca	Nro. Int.	Estado de Intervenciones	Costo de Inversión* S/	Avance Financiero %	Avance Físico %
Áncash	Río Casma	4	02 py. en ejecución y 02 en asistencia técnica	475,667,144	13%	9%
	Río Huarmey	7	05 py. en ejecución y 02 en asistencia técnica	820,919,780	13%	14%
	Río Lacramarca	4	01 py. en ejecución y 03 en asistencia técnica	865,879,064	7%	5%
Ica	Quebrada Cansas	1	En ejecución	207,763,597	19%	4%
	Río Matagente	6	05 py. en ejecución y 01 en asistencia técnica	650,611,301	15%	14%
La Libertad	Drenaje Pluvial Trujillo	1	En ejecución	451,654,380		
	Quebrada El León	1	En ejecución	694,989,240	35%	23%
	Quebrada San Carlos	1	En ejecución	235,629,534	29%	16%
	Quebrada San Idelfonso	2	02 py. en ejecución	328,878,469	32%	11%
	Río Chicama	5	03 py. en ejecución y 02 py. en asistencia técnica	795,215,765	13%	10%
	Río Virú	6	04 py. en ejecución y 02 py. en asistencia técnica	525,984,715	19%	10%
Lambayeque	Drenaje Pluvial Chiclayo	1	En ejecución	1,095,304,279		
	Río Chancay	6	03 py. en procura y 03 py. en asistencia técnica	834,328,261		
	Río La Leche	4	01 py. en ejecución, 01 py. en procura y 02 py. en asistencia técnica	1,378,878,712	20%	19%
	Río Motupe	4	01 py. en ejecución, 01 py. en procura y 02 py. en asistencia técnica	1,323,535,165	9%	18%
	Río Olmos	5	02 py. en ejecución, 01 py. en procura y 02 py. en asistencia técnica	663,456,936	4%	4%
	Río Zaña	4	02 py. en ejecución y 02 py. en asistencia técnica	249,109,790	7%	6%
Lima	Quebrada Huaycoloro	1	En ejecución	347,786,270	19%	6%
	Río Rímac	6	01 py. en ejecución, 02 py. en procura y 03 py. en asistencia técnica	1,771,577,007	2%	10%
	Río Cañete	5	03 py. en ejecución y 02 py. en asistencia técnica	617,090,348	20%	20%
	Río Huaura	5	02 py. en ejecución y 03 py. en asistencia técnica	302,606,008	13%	20%
	Río Mala	5	01 py. en ejecución, 02 py. en procura y 02 py. en asistencia técnica	420,860,132	1%	2%
	Piura	Drenaje Paita	1	En ejecución	238,201,849	
Drenaje Pluvial Piura		1	En asistencia técnica	752,220,596		
Drenaje Pluvial Sullana		1	En ejecución	519,492,338	9%	4%
Drenaje Pluvial Talara		1	En ejecución	227,738,646	8%	1%
Río Piura		4	01 py. en ejecución y 03 py. en asistencia técnica	947,729,495	24%	22%
Tumbes	Drenaje Tumbes	1	En ejecución	334,150,901		
	RíoTumbes	5	04 py. en ejecución y 01 py. en asistencia técnica	679,280,765	25%	5%


(*) Costo actualizado del Banco de Inversiones al 31.03.2023

2. Avance de la cartera de proyectos No G2G




5%

Salud 1/



57%

Educación



62%

Transportes 2/



74%

Vivienda



76%

Agricultura



57%

Soluciones
Integrales



70%

No G2G

■ Corresponde al Avance físico de la implementación del PIRCC.

1/ Incluye un (01) establecimiento culminado que se ejecuta por modalidad PEC en el rol ejecutor.

2/ Incluye cinco (05) intervenciones de Defensa.

Fuente: Información remitida por las direcciones sectoriales al 31.03.2023.

Elaboración: Oficina de Gestión de Proyectos.

2. Avance de la cartera de proyectos No G2G: : Detalle de Soluciones Integrales – Cartera No G2G

Departamento	Culminado	En ejecución	En proceso de contratación	Con estudios financiados	En evaluación	Asistencia técnica	Pendiente de financiamiento	Total
Áncash	5						1	6
Ica	6	1						7
La Libertad	6		1				1	8
Lambayeque	8			1			2	11
Lima	9	1		1			2	13
Piura	10	1	1	7	2	5	6	32
Tumbes	4	1					2	7
Total	48	4	2	9	2	5	14	84

Fuente: Información remitida por las Direcciones Sectoriales – ARCC al 31.03.2023 | Elaboración: Oficina de Gestión de Proyectos ARCC

2

Estado situacional del PIRCC



Línea de Tiempo de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios



Fenómeno del Niño

Ene - Mar 2017

Ley 30556
Creación de la ARCC

D.S. 091-2017-PCM
Aprobación del PIRCC

D.L. 1354
Cambio normativo para acelerar la ejecución de las intervenciones del PIRCC

D.S. 003-2019-PCM
Reglamento de la Ley 30556

D.U. 040-2019
Medidas para impulsar la ejecución y ARCC se constituye como Entidad Ejecutora

Firma de Acuerdo
Gobierno a Gobierno con Reino Unido

- PMO
- Procura
- Asistencia técnica especializada
- Transferencia de conocimientos

Proyecto Ley
Extensión de la vigencia de la ARCC



Elaboración del PIRCC

Con posteriores modificaciones

Actividades necesidad inmediata

Reconstrucción de infraestructura dañada (Educación, salud, transportes, vivienda y agricultura)

Elaboración de planes integrales de prevención (GN y GR)

ARCC con un rol financiador
(a través de los 3 niveles de gobierno)

ARCC con un rol Ejecutor
(Mediante el acuerdo de Gobierno a Gobierno)

Inicio colegios y establecimientos de salud G2G

Revisión y elaboración de planes integrales mediante G2G

Inicio obras de prevención G2G

Conformación del Plan Integral de la ARCC

Alcance en 13 regiones con un costo inicial de S/ 25,655 millones (Costo Actual de S/ 50,833 millones).

Reconstrucción

10,628

intervenciones:

- 998 Transportes
- 3,206 Saneamiento
- 3,053 Pistas y veredas
- 1,717 Agricultura
- 149 Salud
- 1,500 Educación
- 5 Defensa

Sol. De vivienda

Financiamiento para la construcción de:

48,961 Viviendas (MVCS).

Atendibles **33,711** viviendas

Construcción

Megaproyectos en:


19 ríos

5 quebradas

7 drenajes pluviales

Fortalecimiento

Financiamiento para operatividad de Entidades Ejecutoras, CGR y ARCC



13 regiones de intervención:
Áncash, Arequipa, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Lima, Loreto, Piura y Tumbes.

PLAN INTEGRAL ARCC
10,810 intervenciones

ARCC

Reconstrucción

Construcción

- Colegios
- Hospitales
- Centros de salud
- Carreteras
- Saneamiento



- Gestión de ríos y quebradas



Avance financiero:

Se ha ejecutado el **73%** del monto financiado.

Costo Actualizado: S/ 26,969 millones
Monto Financiado: S/ 24,075 millones
Monto Ejecutado: S/ 17,601 millones

Avance físico:

70%

de intervenciones culminadas.
Total de intervenciones: 10,628
Intervenciones culminadas: 7,413

Avance financiero:

Se ha ejecutado el **61%** del monto financiado.

Costo Actualizado: S/ 20,854 millones*
Monto Financiado: S/ 6,236 millones
Monto Ejecutado: S/ 3,797 millones

Avance físico:

26%

de intervenciones culminadas.
Total de intervenciones: 182 Intervenciones culminadas: 48

Fuente: Monitor ARCC, Consulta Amigable - MEF y Direcciones Sectoriales al 31.03.2023 | Elaboración: OGP – ARCC.

* No incluye Necesidades Inmediatas (monto S/ 995 millones).

ARCC

Soluciones de Vivienda

- Reforzamiento y mejoramiento de vivienda
- Construcción en sitio propio
- Adquisición de vivienda nueva



Avance físico: 74%

de viviendas ejecutadas del total de las atendibles.

Total de viviendas: 48,961

Viviendas atendibles: 33,711

Viviendas ejecutadas: 24,932

Fortalecimiento de Capacidades

- Desarrollo de capacidades de las Entidades Ejecutoras
- Desarrollo institucional para la ejecución de los componentes del Plan



Avance financiero: 85%

Se ha ejecutado el del monto financiado.

Costo Actualizado: S/ 732 millones

Monto Financiado: S/ 681 millones

Monto Ejecutado: S/ 580 millones

Fuente: Monitor ARCC y Direcciones Sectoriales al 31.03.2023 | Elaboración: OGP – ARCC.

Avance Financiero*

Se ejecutó

72%

del monto
financiado



* Incluye Soluciones de Vivienda y Fortalecimiento de Capacidades.
Fuente: Monitor ARCC y FONDES al 31.03.2023 | Elaboración: OGP – ARCC.

Monto ejecutado

S/ 22,914 millones

Monto financiado:

S/ 31,928 millones

Monto actualizado del costo PIRCC(*):

S/ 50,833 millones

(antes S/ 25,655 millones)

(*) Corresponde al costo actualizado a noviembre de 2022, según Informe N° 04-2023-ARCC/DE/OGP.

Cartera de proyectos ARCC (G2G y NO G2G)

Nivel de Gobierno	Financiamiento 2017 – 2023 (S/ Millones)	Ejecutado (S/ Millones)	Avance %	PIM 2023 (S/ Millones)
Financiamiento EE*	22,488	16,377	73%	3,633
Nacional	8,375	5,960	71%	1,091
Regional	3,390	2,168	64%	707
Local	10,723	8,249	77%	1,835
ARCC	9,440	6,537	69%	3,963
Total	31,928	22,914	72%	7,596

1/ PIM de proyectos marzo 2023 (OPP)

*EE=Entidades Ejecutoras

Fuente: Monitor ARCC al 31.03.2023 para avance financiero y Direcciones Sectoriales – ARCC

Avance Físico*

69% de intervenciones culminadas de un total de 10,810

31%

3,349 intervenciones por implementar

- **1,451** Interv. en ejecución
- **539** Interv. en **proceso de contratación**
- **1,125** Interv. en **proceso de financiamiento**
- **234** Interv. pendientes

69%

7,461 Intervenciones culminadas

- **4,642** del sector **construcción, vivienda y saneamiento**
- **617** del sector **transporte**
- **1,353** del sector **agricultura**
- **9** del sector **salud**
- **835** del sector **educación**
- **5** de **defensa**

(*) Corresponde al componente construcción y reconstrucción.

Fuente: Monitor ARCC y Direcciones Sectoriales al 31.03.2023 | Elaboración: OGP – ARCC.



Estado situacional: Obras con dificultades en su ejecución

Al 31 de marzo de 2023, se tiene **376** obras con dificultades por un monto de inversión que asciende a **S/ 3,593.0 millones**.

Causas tipo de las dificultades:

Sector	Campaña agrícola y factores climatológicos ^{1/}	Incumplimiento de obligaciones contractuales	Deficiencias del expediente técnico, en proceso y/o resolución del contrato ^{2/}	Controversias, valorizaciones y/o adicionales ^{3/}	Demora en los trámites administrativos y legales ^{4/}	Liberación de predios y/o conflictos sociales	Sin causal registrada	Total
Educación	44	33	5	15	12	3	2	114
Vivienda	33	26	12	5	4	8	-	88
Transportes	47	8	2	4	4	4	-	69
Agricultura	40	6	8	4	4	7	-	69
Salud	15	11	4	-	1	-	2	33
Soluciones Integrales	1	1	1	-	-	-	-	3
Total	180	85	32	28	25	22	4	376

1/ Comprende: Factores climatológicos (lluvias) y Riego de cultivos por campaña agrícola de los usuarios.

2/ Comprende: Deficiencias del expediente técnico (por diseño y/o estimación de costos), En proceso de resolución de contrato de la supervisión y Resolución del contrato por exceder el límite máximo de penalidad.

3/ Comprende: Controversias con el contratista y/o en proceso de arbitraje, Impago de valorizaciones o falta de liquidez del contratista (subcontratista), Solicitud de adicionales y Superposición, duplicidad y/o carencia de necesidad y priorización.

4/ Comprende: Demora en la adecuación de las condiciones físicas y/o administrativas, Falta de gestión técnica y legal por parte de la entidad ejecutora y Falta de personal, supervisor y/o residente (renuncia o no renovación de contrato).

Fuente: Información remitida por la Subdirección Sectorial – ARCC al 31.03.2023 | Elaboración: Oficina de Gestión de Proyectos ARCC

Estado situacional: Obras paralizadas

Son **58 obras paralizadas**^{1/} a cargo de los tres niveles de Gobierno, con una inversión de **S/ 561.7 millones**.

Causas tipo:

Sector	Incumplimiento de obligaciones contractuales	Campaña agrícola y factores climatológicos ^{2/}	Deficiencias del expediente técnico, en proceso y/o resolución del contrato ^{3/}	Controversias, valorizaciones y/o adicionales ^{4/}	Liberación de predios y/o conflictos sociales	Demora en los trámites administrativos y legales ^{5/}	Total
Vivienda	17	2	7	3	3	1	33
Agricultura	2	4	-	2	-	1	9
Transportes	4	1	-	1	1	-	7
Educación	4	-	-	1	-	-	5
Salud	4	-	-	-	-	-	4
Total	31	7	7	7	4	2	58

1/ Se considera obra paralizada aquellas que cuenta con un avance físico mayor o igual al 40% y que no reportan ejecución en los últimos 6 meses.

2/ Comprende: Factores climatológicos (lluvias) y Riego de cultivos por campaña agrícola de los usuarios.

3/ Comprende: Deficiencias del expediente técnico (por diseño y/o estimación de costos) y Resolución del contrato por exceder el límite máximo de penalidad.

4/ Comprende: Controversias con el contratista y/o en proceso de arbitraje, Impago de valorizaciones o falta de liquidez del contratista (subcontratista) y Solicitud de adicionales.

5/ Comprende: Demora en la adecuación de las condiciones físicas y/o administrativas y Falta de gestión técnica y legal por parte de la entidad ejecutora.

Fuente: Información remitida por la Subdirección Sectorial – ARCC al 31.03.2023 | Elaboración: Oficina de Gestión de Proyectos ARCC

Estado situacional: Obras suspendidas

Al 31 de marzo de 2023, se tiene **318 obras suspendidas** por un monto de inversión que asciende a **S/ 3,031.3 millones**.

Causas tipo:

Sector	Campaña agrícola y factores climatológicos ^{1/}	Incumplimiento de obligaciones contractuales	Deficiencias del expediente técnico, en proceso y/o resolución del contrato ^{2/}	Demora en los trámites administrativos y legales ^{3/}	Controversias, valorizaciones y/o adicionales ^{4/}	Liberación de predios y/o conflictos sociales	Sin causal registrada	Total
Educación	44	29	5	12	14	3	2	109
Transportes	46	4	2	4	3	3	-	62
Agricultura	36	4	8	3	2	7	-	60
Vivienda	31	9	5	3	2	5	-	55
Salud	15	7	4	1	-	-	2	29
Soluciones Integrales	1	1	1	-	-	-	-	3
Total	173	54	25	23	21	18	4	318

1/ Comprende: Factores climatológicos (lluvias) y Riego de cultivos por campaña agrícola de los usuarios.

2/ Comprende: Deficiencias del expediente técnico (por diseño y/o estimación de costos), En proceso de resolución de contrato de la supervisión y Resolución del contrato por exceder el límite máximo de penalidad.

3/ Comprende: Demora en la adecuación de las condiciones físicas y/o administrativas, Falta de gestión técnica y legal por parte de la entidad ejecutora y Falta de personal, supervisor y/o residente (renuncia o no renovación de contrato).

4/ Comprende: Controversias con el contratista y/o en proceso de arbitraje, Impago de valorizaciones o falta de liquidez del contratista (subcontratista), Solicitud de adicionales y Superposición, duplicidad y/o carencia de necesidad y priorización.

Fuente: Información remitida por la Subdirección Sectorial – ARCC al 31.03.2023 | Elaboración: Oficina de Gestión de Proyectos ARCC

Presupuesto para el año fiscal 2023

ARCC - ROL EJECUTOR

● Componente construcción	Soluciones integrales S/ 1,812
Componente reconstrucción	Educación S/ 1,012
	Salud S/ 1,218

S/4,043
En millones de soles

ARCC - ROL FINANCIADOR

Componente reconstrucción

Continuidad S/ 1,843
Priorizaciones S/ 1,128
Nuevos financiamientos S/ 1,096

S/4,107
En millones de soles

S/ 8,150
96.7%

Total Presupuesto de Inversiones 2023

Operatividad:
(S/ 120 mm; 1.4%) ●

Contraloría:
(S/ 40 mm; 0.5%)

Otros:
(S/ 120 mm; 1.4%)

Total:
(S/ 280 mm; 3.3%)

Cartera de proyectos G2G ARCC

4.8 millones

de habitantes beneficiarios



Soluciones integrales

98 obras
S/ 18,757 millones

7 drenajes
(7 obras – S/ 3,619 millones)

5 quebradas
(6 obras - S/ 1,815)

17 ríos
(85 obras – S/ 13,323)



Educación

74 obras
S/ 2,683 millones

25 obras culminadas
(S/ 910 millones)

49 obras en ejecución
(S/ 1,773 millones)



Salud

18 obras
S/ 3,597 millones

2 obras culminadas
(S/ 133 millones)

13 obras en ejecución
(S/ 3,110 millones)

3 obras en asistencia técnica
(S/ 354 millones)

(*) Costo actualizado del Banco de Inversiones al 31.03.2023



PERÚ

Autoridad para la
Reconstrucción con Cambios
