



Gobierno del Perú

# ESTADO SITUACIONAL DE LAS INTERVENCIONES A CARGO DE ENTIDADES EJECUTORAS DE LOS 3 NIVELES DE GOBIERNO

**Dirección de Intervenciones del Sector Salud**  
**Autoridad para la Reconstrucción con Cambios**

*Marzo 2022*

# 1. INTERVENCIONES DEL SECTOR SALUD INCLUIDAS EN EL PIRCC INICIAL Y ACTUALIZADO




N° de intervenciones PIRCC INICIAL

Nivel de gobierno	1 Ancash	2 Cajamarca	3 Ica	4 Lambayeque	5 La Libertad	6 Loreto	7 Lima	8 Piura	9 Tumbes	Total
Nacional PRONIS	43	4	2	28	22	1	10	36	5	<b>151</b>
Regional	-	-	-	-	-	-	-	5	-	<b>5</b>
<b>TOTAL</b>	<b>43</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>28</b>	<b>22</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>41</b>	<b>5</b>	<b>156</b>

N° de intervenciones PIRCC ACTUALIZADO

Nivel de gobierno	Ancash	Cajamarca	Ica	Lambayeque	La Libertad	Loreto	Lima	Piura	Tumbes	Total
Nacional PRONIS	4	1	1	12	9	-	5	11	-	<b>43</b>
Nacional ARCC	7	-	-	3	1	-	1	8	-	<b>20</b>
Regional	12	2	1	3	2	1	-	6	1	<b>28</b>
Local	17	1	-	10	10	-	3	13	4	<b>58</b>
<b>TOTAL</b>	<b>40</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>28</b>	<b>22</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>38</b>	<b>5</b>	<b>149</b>

## 2. INTERVENCIONES DEL SECTOR SALUD – PIRCC ACTUALIZADO

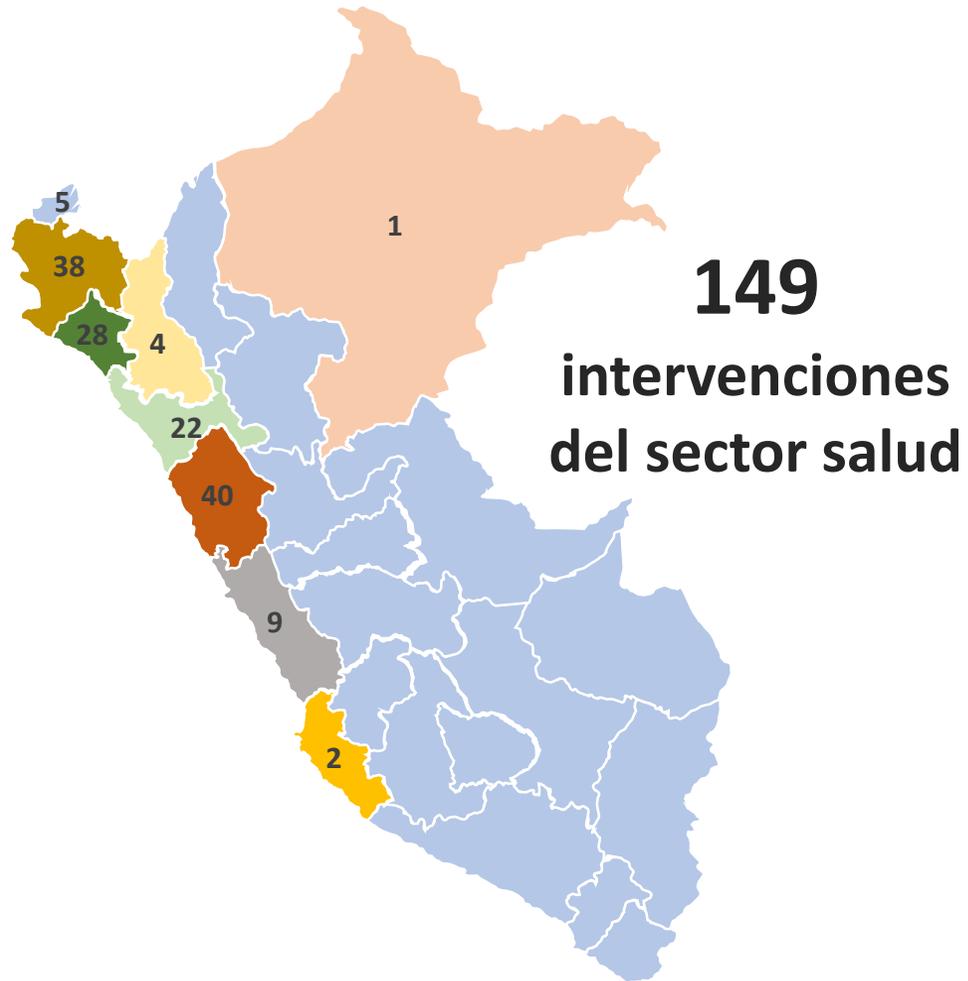


### N° de intervenciones por tipo de EESS

NIVEL DE ATENCION	TIPO DE EESS	Cantidad
2° NIVEL	HOSPITAL	16
	CENTRO DE SALUD	72
1° NIVEL	PUESTO DE SALUD	61
	<b>TOTAL</b>	<b>149</b>

### N° de intervenciones por fase de ejecución

MODALIDAD DE EJECUCION	Cantidad
<b>PEC</b> (EJECUTORAS DE LOS 3 NIVELES DE GOBIERNO)	134
<b>GTOG</b> (CONTRATO DE GOBIERNO A GOBIERNO)	15
<b>TOTAL</b>	<b>149</b>

### 3. INTERVENCIONES DEL SECTOR SALUD A CARGO DE ENTIDADES EJECUTORAS DE LOS 3 NIVELES DE GOBIERNO

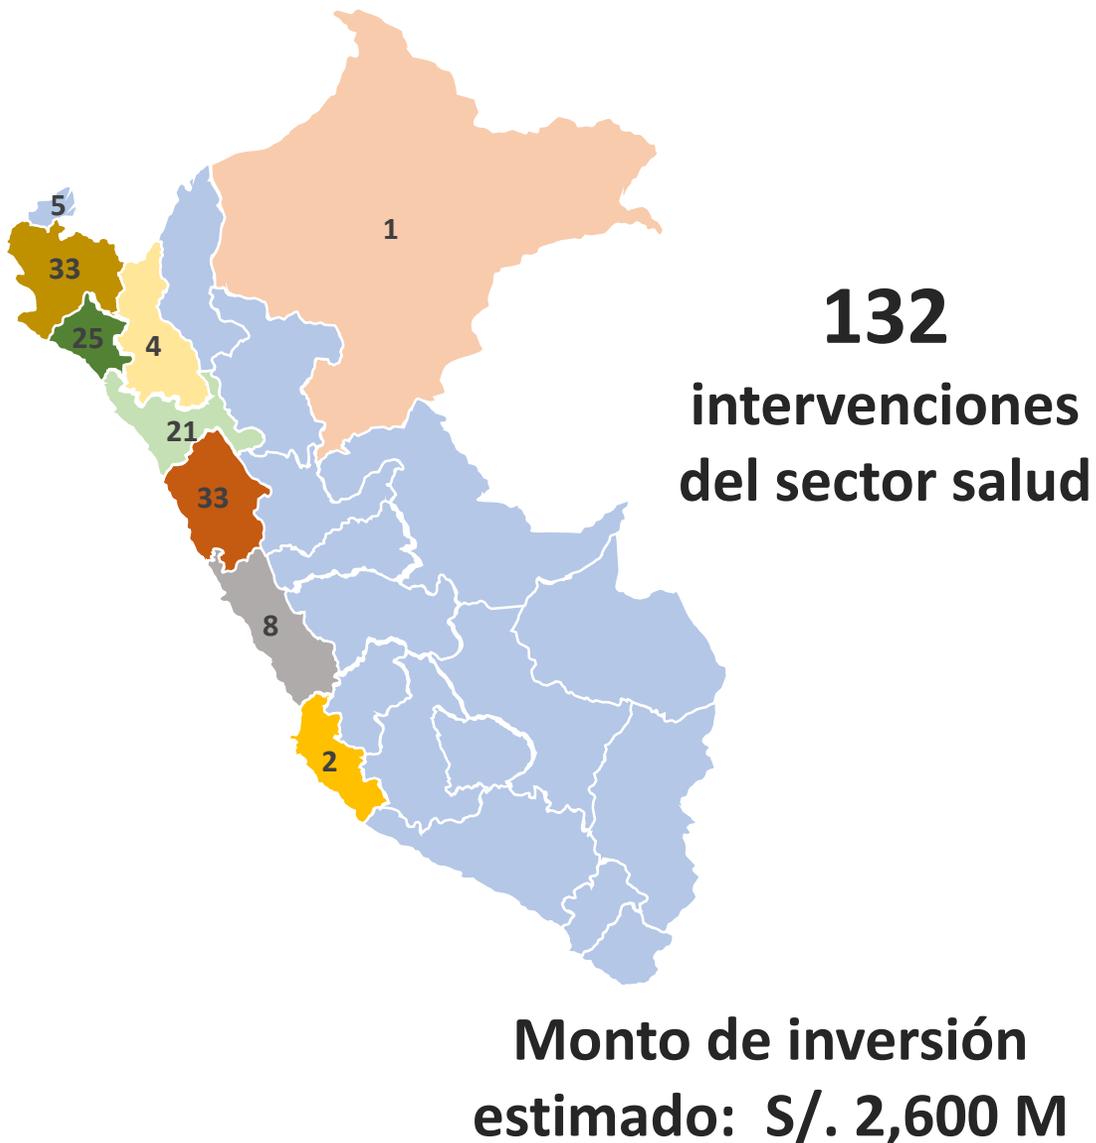

N° de intervenciones por tipo de EESS

NIVEL DE ATENCION	TIPO DE EESS	Cantidad
2° NIVEL	HOSPITAL	7
	CENTRO DE SALUD	65
1° NIVEL	PUESTO DE SALUD	60
	<b>TOTAL</b>	<b>132</b>

N° de intervenciones por nivel de gobierno

Nivel de gobierno	Ancash	Cajamarca	Ica	Lambayeque	La Libertad	Loreto	Lima	Piura	Tumbes	Total
Nacional PRONIS	4	1	1	12	9	-	5	11	-	<b>43</b>
Nacional ARCC	-	-	-	-	-	-	-	3	-	<b>3</b>
Regional	12	2	1	3	2	1	-	6	1	<b>28</b>
Local	17	1	-	10	10	-	3	13	4	<b>58</b>
<b>TOTAL</b>	<b>33</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>25</b>	<b>21</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>33</b>	<b>5</b>	<b>132</b>

## 4. EJECUCION FINANCIERA Y FINANCIAMIENTO

### Ejecución financiera 2018 - 2022

Año de Transferencia	Monto transferido	Monto ejecutado	% Avance
2018	137.0 M	53.7 M	40 %
2019	304.7 M	80.3 M	26 %
2020	262.6 M	107.7 M	41 %
2021	274.7 M	70.7 M	26 %
2022	76.0 M	2.5 M	3 %

### Financiamiento para ejecución física de las intervenciones a febrero 2022

Año de opinión favorable de financiamiento	N° Intervenciones	Monto de Inversión
2018	3	265.4 M
2019	6	81.9 M
2020	5	124.1 M
2021	29	357.2 M
2022	4	52.8 M
<b>TOTAL</b>	<b>47</b>	<b>881.6 M</b>

Año de Transferencia	FASE	N° Interv.	Monto transferido	Monto ejecutado	% Avance
2018	OBRA	3	123.5 M	51.2 M	41 %
	E.T.	9	13.5 M	2.5 M	19 %
2019	OBRA	9	252.2 M	70.9 M	28 %
	E.T.	103	52.5 M	9.4 M	18 %
2020	OBRA	14	213.5 M	96.0 M	45 %
	E.T.	93	49.1 M	11.7 M	24 %
2021	OBRA	36	245.5 M	60.7 M	25 %
	E.T.	70	29.2 M	10.0 M	34 %

### Intervenciones en etapa de expediente técnico (pendientes de financiamiento)

Año de opinión favorable de financiamiento	N° Intervenciones	Monto de Inversión
2022	69	1,315.1 M
2023	13	410.2 M
<b>TOTAL</b>	<b>82</b>	<b>1,725.3 M</b>

## 5. ESTADO SITUACIONAL DE LAS INTERVENCIONES

### ESTADO DE INTERVENCIONES EN FASE DE OBRA

FASE	ESTADO GENERAL	SITUACION ACTUAL	N° INTERV.	SUB TOTAL	TOTAL
OBRA	CULMINADA	RECEPCIONADA	1	2	50
		LIQUIDADA	1		
	EJECUCION	EJECUCION DE OBRA	11	20	
		SUSPENDIDA	3		
		PARALIZADA	6		
	PROCESO DE CONTRATACION	ACTOS PREPARATORIOS	12	13	
		CONTRATO	1		
	SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO	SOLICITADO A ARCC	1	15	
		OBSERVADO	3		
		APROBADO	7		
ELEVADO AL MEF		4			

### ESTADO DE INTERVENCIONES EN FASE DE E.T.

FASE	ESTADO GENERAL	SITUACION ACTUAL	N° INTERV.	SUB TOTAL	TOTAL
EXP. TECNICO	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO	ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO	47	59	82
		PARALIZADO POR RESOLUCION DE CONTRATO	11		
		SUSPENDIDO POR ACUERDO	1		
	EXPEDIENTE TECNICO CULMINADO	CULMINADO	12	12	
	PROCESO DE CONTRATACIÓN	ACTOS PREPARATORIOS	11	11	

## 6. PROGRAMACION DE EJECUCION DE LAS INTERVENCIONES

Programación de culminación física y ejecución financiera

AÑO	N° Intervenciones	Ejecución programada
2022	12	410.8 M
2023	104	1504.5 M
2024	14	688.6 M
<b>TOTAL</b>	<b>130</b>	<b>2603.9 M</b>

Programación de culminación física por región.

Año	Ancash	Cajamarca	Ica	Lambayeque	La Libertad	Loreto	Lima	Piura	Tumbes	Total
2022	3	2		2			1	4		<b>12</b>
2023	28	2	2	21	16	1	7	23	4	<b>104</b>
2024	1			2	5			5	1	<b>14</b>
<b>TOTAL</b>	<b>32</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>25</b>	<b>21</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>32</b>	<b>5</b>	<b>130</b>

## 7. CAUSAS PRINCIPALES QUE FRENAN LA IMPLEMENTACION DE LAS INTERVENCIONES

- Atraso en el inicio de la implementación de las intervenciones del sector salud por la deficiente gestión para el inicio de elaboración de los expedientes técnicos.
- Desconocimiento de la normativa sectorial y normativa de Reconstrucción en la entidades ejecutoras.
- Falta de coordinación entre las autoridades de las entidades ejecutoras y los actores involucrados del sector salud (Direcciones / Gerencias Regionales de salud), en la materia relacionada a infraestructura hospitalaria.
- Constante rotación y cambios de funcionarios de manera continua en las entidades ejecutoras genera retrasos en la gestión de proyectos en fase de expediente técnico y obra.
- Incumplimiento por parte de las entidades ejecutoras en el cumplimiento de los plazos establecidos en la normativa de reconstrucción respecto al inicio de las etapas de implementación de las intervenciones.
- Desaceleración en la implementación de las intervenciones del Sector Salud en las fases de elaboración de expediente técnico y obra ante la propagación del COVID 19 en el año 2020.
- Obras en ejecución paralizadas o atrasadas por incumplimiento de contratistas, deficiencias en expedientes técnicos y deficiencias en la gestión y administración técnica de los proyectos por parte de las Entidades Ejecutoras a cargo.
- Falta de comunicación o respuesta a pedidos de información de la ARCC por parte de las Entidades, hace que no se tome conocimiento de la problemática existente y se pueda coadyuvar a brindar soluciones adecuadas y asistencia técnica oportuna.

## 8. ACCIONES REALIZADAS PARA ACELERAR LA IMPLEMENTACION DE LAS INTERVENCIONES

- Brindar asistencia técnica constante a las entidades ejecutoras en relación a la normativa de la Reconstrucción y sectorial respectiva desde el año 2020.
- Realizar un seguimiento y monitoreo a cada intervención identificando la problemática existente para brindar la asistencia técnica oportuna.
- Coordinaciones directas con las autoridades sanitarias regionales para acelerar la implementación de las intervenciones.
- Con la finalidad de acelerar la implementación de las intervenciones se viene realizando el cambio de entidad ejecutora de las intervenciones sin avance.
