



PERÚ

Autoridad para la
Reconstrucción con Cambios



CONGRESO DE LA REPÚBLICA


Sesión Descentralizada – Región La Libertad

*Comisión Especial Multipartidaria de Seguimiento al
Proceso de Reconstrucción en las Zonas afectadas por el
Fenómeno de El Niño Costero*


Lima, 07 de enero del 2022




LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS COMO IMPULSOR DE LA INVERSIÓN PÚBLICA Y LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA

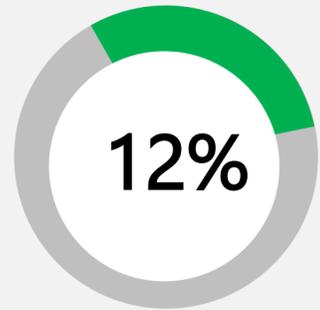


Representa la ejecución de la **ARCC (G2G) respecto del total ejecutado por el Gobierno Nacional** (2^{do} mayor ejecutor)



Representa la ejecución de la **ARCC (G2G) respecto del crecimiento de la inversión pública del GN**




Representa la ejecución de **ARCC + EE respecto del total de la inversión pública**



De incremento en la ejecución **total de la Reconstrucción con Cambios** respecto a lo logrado el año anterior

Evolución de la ejecución recursos FONDES en **inversiones de Reconstrucción con cambios** (Millones S/)

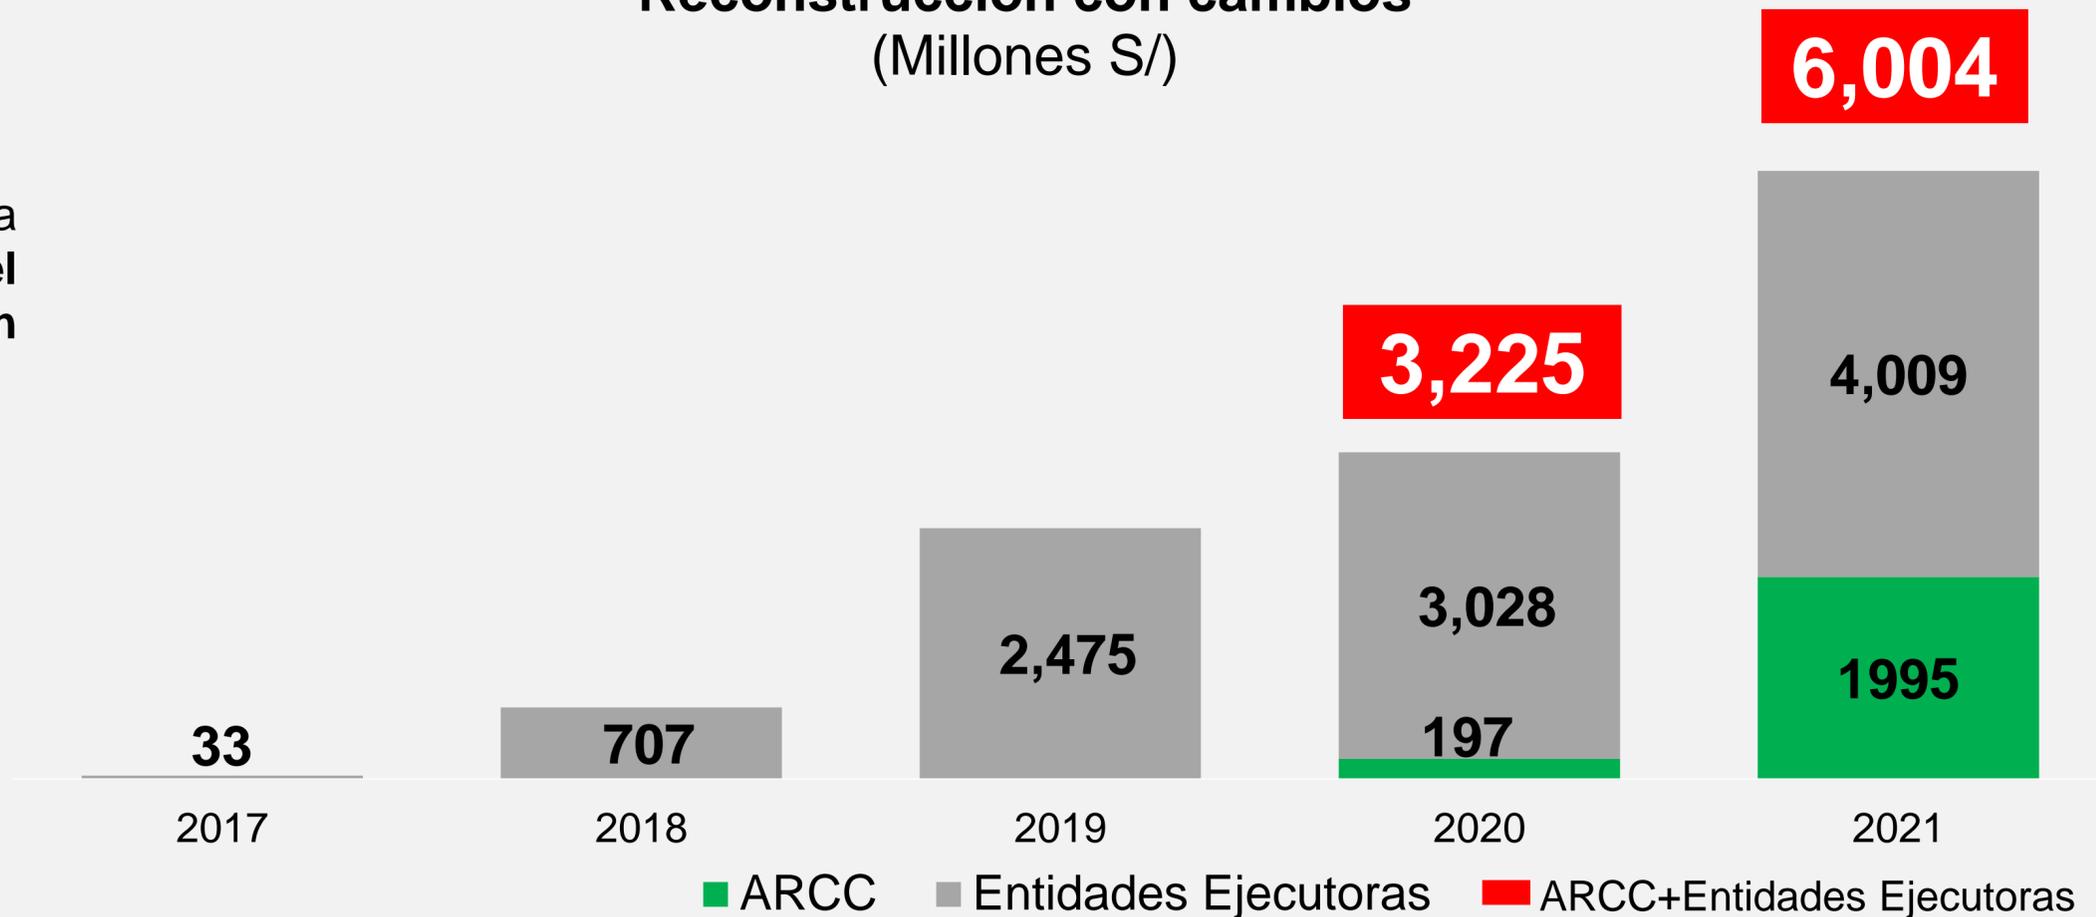

Nota: Solo considera proyectos. No considera ejecución de actividades como IRAS, viviendas, fortalecimiento de capacidades y otras actividades.
Fuente: Consulta FONDES y Monitor ARCC al 31.12.21
Elaboración: PMO ARCC

Avance de la Reconstrucción



PERÚ

Autoridad para la
Reconstrucción con Cambios



ALCANCE DEL PLAN

Costo estimado de los componentes del
PLAN

(DS 091-2017-PCM)

Prevención de futuros desastres

(Soluciones integrales)

Soluciones definitivas en:

19 ríos

5 quebradas

7 Ciudades con drenajes pluviales



S/25,655 millones

Reconstrucción de infraestructura

+5 sectores

11,117 intervenciones:

- 1,200 Transportes
- 3,342 Saneamiento
- 3,172 Pistas y veredas
- 1,741 Agricultura
- 149 Salud
- 1,508 Educación
- 5 Defensa

49,088 viviendas

PLAN = PIRCC: Plan Integral para la Reconstrucción con Cambios
Información al corte: 30.11.21

ESTADO DE LAS INTERVENCIONES DE RECONSTRUCCIÓN

8,837 Interv. financiadas (80%)

5,667

Interv. culminadas

1,686

Interv. en ejecución

302

Estudios Financiados

1,377

Interv. en Asistencia Técnica

51%

15%

11%

3%

5%

12%

3%

- 170 carreteras
- 362 caminos
- 116 puentes
- 2 establecimientos de salud

- 522 centros educativos
- 1,600 de saneamiento
- 1,912 pistas y veredas
- 980 de agricultura
- 3 obras en el Ejército Peruano

1,182
Interv. en proceso de contratación

591
Interv. en evaluación

312
Interv. pendientes

Fuente: Direcciones Sectoriales al 30.11.21 (P)
Elaboración: PMO ARCC

ACUERDO G2G



PERÚ

Autoridad para la
Reconstrucción con Cambios



AVANCE DEL ACUERDO GOBIERNO A GOBIERNO



Proyectos en ejecución contractual

114 proyectos obras y
11 proyectos SAT en
ejecución

S/ 8,151
millones

16 proyectos en
procura

S/ 1,886
millones

Estadísticas clave



Proy. con acceso al sitio: 95



Proy. inicio construcción: 52



Mano de obra total:
(Noviembre) 28,161



Beneficiarios (millones): 2.4

Obras en ejecución

- 74 Instituciones Educativas
- 15 establecimientos de salud
- 25 proyectos de control de inundaciones
- 11 SAT

En procura

Soluciones Integrales (Proyectos de Infraestructura Natural, Drenajes, Control de inundaciones)

Transferencia de Conocimientos

Total programa*



No. de cursos disponibles 91

No de Modulos disponibles 200

No. de personas capacitadas en vivo (último mes) 313

No. de personas capacitadas por socios académicos (último mes) 32

No. de personas capacitadas en línea (último mes) 270

Nota: El monto de inversión corresponde al registrado en el Banco de Inversiones del MEF



PERÚ
Autoridad para la
Reconstrucción con Cambios

Siempre
con el pueblo

La Libertad



PERÚ

Autoridad para la
Reconstrucción con Cambios



ALCANCE DEL PLAN

Costo estimado de los componentes del
PLAN

(DS 091-2017-PCM)



S/4,286 millones

Prevención de futuros desastres

(Soluciones integrales)

Soluciones definitivas en:

Ríos Chicama y Virú, drenaje pluvial de la ciudad de Trujillo y **quebradas** en Trujillo

Reconstrucción de infraestructura

+5 sectores

1,264 intervenciones:

- 212 Transportes
- 293 Saneamiento
- 284 Pistas y veredas
- 158 Agricultura
- 22 Salud
- 294 Educación
- 1 Defensa

5,419 viviendas

PLAN = PIRCC: Plan Integral para la Reconstrucción con Cambios
Información al corte: 30.11.21



PERÚ

Autoridad para la
Reconstrucción con Cambios



1. AVANCES EN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Se ha logrado un avance de alrededor del **76%** del presupuesto disponible para La Libertad, resaltando la aceleración de la implementación en los dos últimos años:

Costo estimado del Plan (D.S 091-2017-PCM)	Financiamiento	Ejecución
S/ 4,286 millones	S/ 3,074 millones	S/ 2,328 millones

Fuente: Direcciones Sectoriales al 31.12.21
Elaboración: OGP ARCC

1. AVANCES EN EJECUCIÓN FÍSICA (RECONSTRUCCIÓN)

1,107 Interv. financiadas (88%)

689

Interv. culminadas

253

Interv. en ejecución

48

Estudios
Financiados

88

Interv. en
Asistencia Técnica

55%

20%

9%

4%

3%

7%

2%

- 6 carreteras
- 78 caminos
- 21 puentes
- 135 centros educativos

- 146 obras de saneamiento
- 244 pistas y veredas
- 68 obras de agricultura

117

Interv. en
proceso de
contratación

36

Interv. en
evaluación

24

Interv.
pendientes

Fuente: Direcciones Sectoriales al 30.11.21
Elaboración: PMO ARCC

FINANCIAMIENTO 2021 POR NIVEL DE GOBIERNO – LA LIBERTAD

Nivel	Marco presupuestal 2021	Devengado	Avance %
Gobierno Nacional	563	417	74%
ARCC	394	332	84%
Ministerios ^{1/}	169	85	50%
Gobierno Regional	139	83	60%
Gobiernos Locales	826	609	74%
Total	1,528	1,009	63%

1/ Incluye: MINEDU, MINSA, MIDAGRI, MTC, MVCS y DEFENSA

Fuente: SIAF - FONDES. Actualizado al 31.12.2021.

Elaboración: PMO ARCC

2. INTERVENCIONES CON PROBLEMAS (1 de 3)

Por tipo de problema.

Sector PIRCC	Obra paralizada con acuerdo	Costo FUR (S/ millones)	Obra paralizada por incumplimiento	Costo FUR (S/ millones)	Obra paralizada por resolución de contrato	Costo FUR (S/ millones)	Total proyectos
Agricultura	3	S/.17.1					3
Defensa			1	S/.2.5			1
Educación	11	S/.68.6			2	S/.5.6	13
Red subnacional caminos	13	S/.164.5	1	S/.2.6	5	S/.31.3	19
Red subnacional puentes	1	S/.34.4					1
Saneamiento			5	S/.2.2			5
Total	28	S/.284.7	7	S/.7.3	7	S/.36.7	42

Nota: Considera solo aquellas en fase de ejecución de obras.

Fuente: Direcciones Sectoriales ARCC al 30.11.2021

Elaboración: OGP ARCC



PERÚ

Autoridad para la
Reconstrucción con Cambios



2. INTERVENCIONES CON PROBLEMAS (2 de 3)

Por Entidad Ejecutora, proyecto y tipo de problema.

Sector	N° de proyectos	Costo FUR	Entidades Ejecutoras	Principales proyectos
RED SUBNACIONAL - CAMINOS	19	S/ 198	<ul style="list-style-type: none"> Gobierno Regional de La Libertad (1) M.D. Agallpampa (2) M.D. Calamarca (1) M.D. Chugay (1) M.D. Huaranchal (1) M.D. Laredo (1) M.D. Sinsicap (1) M.D. Bolivar (1) M.D. Julcan (3) M.D. Otuzco (4) M.P. Sanchez Carrión (3) 	<ul style="list-style-type: none"> Sartimbamba (S/ 33 MM) - <i>Paralizado con acuerdo</i> Agallpampa (S/ 22 MM) - <i>Paralizado con acuerdo</i> Santa Fe – El carrizal - Huaguil (S/ 18 MM) - <i>Paralizado con acuerdo</i> Cabargon – Cruz de las Flores - Mallan (S/ 18 MM) - <i>Paralizado con acuerdo</i>
RED SUBNACIONAL - PUENTES	1	S/ 34	<ul style="list-style-type: none"> MTC (1) 	<ul style="list-style-type: none"> Puente Arenita – Segunda Calzada (S/ 34 MM) - <i>Paralizado con acuerdo</i>
EDUCACION	13	S/ 74	<ul style="list-style-type: none"> M.D. Casa Grande (2) M.D. El Porvenir (1) M.D. Guadalupe (1) M.D. Pacanga (1) M.D. Poroto (1) M.D. San José (1) M.D. Sayapullo (1) M.P. Chepen (1) M.P. Pacasmayo (1) M.P. Trujillo (2) M.P. Gran Chimú (1) 	<ul style="list-style-type: none"> Local escolar 81032 (S/ 11 MM) - <i>Paralizado con acuerdo</i> Local escolar 82209 (S/ 10 MM) - <i>Paralizado con acuerdo</i> I.E. N° 80403 – Cristo Rey (S/ 10 MM) - <i>Paralizado con acuerdo</i> Local escolar 82542 (8 MM) - <i>Paralizado con acuerdo</i> I.E. N° 81514 – Francisco Bolognesi (8 MM) - <i>Paralizado con acuerdo</i>
DEFENSA	1	S/ 3	<ul style="list-style-type: none"> MINDEF (1) 	<ul style="list-style-type: none"> Brigada de Infantería (S/ 3 MM) - <i>Paralizado por incumplimiento</i>
SANEAMIENTO	5	S/ 2	<ul style="list-style-type: none"> M.P. Ascope (1) MVCS (4) 	<ul style="list-style-type: none"> Cauce Rio Chicama (S/ 2 MM) - <i>Paralizado por incumplimiento</i> Saneamiento Llahuit – Lucma- Gran Chimú (S/ 0.7 MM) - <i>Paralizado por incumplimiento</i>
AGRICULTURA	3	S/ 17	<ul style="list-style-type: none"> M.D. Chocope (1) M.P. Gran Chimú (2) 	<ul style="list-style-type: none"> Canal San Jacinto – Chocope (S/ 8 MM) - <i>Paralizado con acuerdo</i> Agua para riego Caserío Chuquillanqui - – Lucma- Gran Chimú (S/ 6 MM) - <i>Paralizado con acuerdo</i>
Total	42	S/ 328		



PERÚ

Autoridad para la
Reconstrucción con Cambios

Nota: Considera solo aquellas en fase de ejecución de obras.
Fuente: Direcciones Sectoriales ARCC al 30.11.2021
Elaboración: OGP ARCC



2. INTERVENCIONES CON PROBLEMAS (3 de 3)

Proyectos con resolución de contrato.

Nombre	Provincia	Distrito	Ejecutora	Sector	Costo FUR	Total Transferido (Millones S/.)	Total Devengado (Millones S/.)	Avance financiero acumulado
Rehabilitación de camino vecinal Otuzco - Carnachique	Otuzco	Otuzco	MP. otuzco	Red subnacional - caminos	4.9	4.8	3.8	79%
Rehabilitación de camino vecinal emp. r651-Pollo	Otuzco	Otuzco	MP. otuzco	Red subnacional - caminos	4.5	4.5	3.5	77%
Rehabilitación de camino vecinal Cerro Zango-Pueblo Libre-Llauchan-Labunday	Otuzco	Agallpampa	MD. Agallpampa	Red subnacional - caminos	7.1	7.1	5.6	78%
Rehabilitación de camino vecinal La Morada-Tres Rios-Caballera-Alfonso Ugarte	Otuzco	Agallpampa	MD. Agallpampa	Red subnacional - caminos	13.6	13.5	12.7	94%
Rehabilitación de camino vecinal emp. pe-10a - Ciudad de Dios	Trujillo	Laredo	MD. Laredo	Red subnacional - caminos	1.2	1.2	0.2	16%
Local escolar N° 80379	Pacasmayo	San Pedro de Lloc	MP. Pacasmayo - San Pedro de Lloc	Educación	3.0	2.9	2.2	74%
Local escolar Tecapa	Pacasmayo	San José	MD. San Jose	Educación	2.6	2.6	2.2	85%

Nota: Considera solo aquellas en fase de ejecución de obras.
Fuente: Direcciones Sectoriales ARCC al 30.11.2021
Elaboración: OGP ARCC



PERÚ

Autoridad para la
Reconstrucción con Cambios



3. ACCIONES DE CONTROL REALIZADAS POR LA CONTRALORÍA

La Contraloría General de la República (CGR) ejecuta sus acciones de control en el marco de sus planes de acción de control aprobados desde el año 2017.

En torno a acciones de control a Entidades Ejecutoras

- Son realizadas directamente a las entidades que la ARCC brinda financiamiento.
- No cumplimos rol fiscalizador sobre las observaciones u hallazgos que pudieran haberse encontrado.
- A las entidades ejecutoras les compete implementar las recomendaciones.
- La ARCC no cuenta con la data de hallazgos identificados, pues ello está a cargo de la CGR.

En torno al control concurrente a obras bajo el marco del G2G

- Como parte del control concurrente, hasta la fecha la CGR ha emitido 12 informes de control, los Hitos de Control N° 5 y 8 aluden a intervenciones ubicadas en la Libertad.
- Las situaciones adversas que podrían generar un riesgo en la implementación de las intervenciones están principalmente relacionadas a retrasos en el lanzamiento de algunas procuras y retrasos en la ejecución contractual.



PERÚ

Autoridad para la
Reconstrucción con Cambios



4. RESPUESTA Y MEDIDAS ADOPTADAS POR LA ARCC

- Mercado restringido: Se evitó saturarlo para fomentar competencia y evitar desiertos.
- Proyectos de alta complejidad: Se dieron mayores plazos para presentación de ofertas, se buscaron espacios de difusión (COP).
- Retrasos en las viabilidades a cargo de EE.
- Recursos especializados reducidos que dificultaron el inicio temprano (personal clave, diseñadores): Durante la etapa de diseño se buscará optimizar soluciones técnicas y de tiempo.
- Brecha de conocimiento del sector privado y de los servidores públicos: Plan de Transferencia de Conocimientos.
- Proyección de plazos de ejecución sobre información referencial: Actualización de la Línea de Base.
- Retrasos en el IGAPRO: Coordinación con SENACE para compatibilizar procesos con el Contrato NEC.
- Apropiación inicial de algunos procesos por parte de personal ARCC (Retroalimentación la brinda UKDT y no viceversa como al inicio del Programa).
- 100% de los proyectos del sector Salud y Educación se encuentran en ejecución.

5. PROPUESTAS O ALTERNATIVAS PLANTEADAS POR LA ARCC PARA MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA

- Presupuesto nulo para nuevos financiamiento 2022: Necesidad de recursos adicionales.
- Priorización para continuidad de proyectos en ejecución, articulación institucional para obtención temprana de financiamiento (ya contamos con informes de opinión favorable para asignar recursos una vez se cuente con ellos).
- Mejora de capacidades operativas de la ARCC.
- Adecuación de la regulación y sistemas administrativos nacionales para ejecución de contratos NEC.

ESTADO SITUACIONAL DEL G2G



*Referido a la Implementación de obras de control de inundaciones
SAT: Sistema de Alerta Temprana

► Soluciones Integrales:

2 Cuencas: ríos Chicama y Virú (ambos en diseño de coordinación espacial* y Río Virú con SAT con contrato)

1 Drenaje pluvial: Trujillo (En estrategia de Procura)

3 Quebradas:

- El León (En diseño de coordinación espacial*)
- San Carlos (En diseño de coordinación espacial*)
- San Ildefonso (En diseño de coordinación espacial* y SAT con contrato)

► Sector Salud:

Todos en ejecución

1 Establecimientos de salud

- Hospital de Cascas

► Sector Educación:

Todos en ejecución

8 Establecimientos educativos

- 2 colegios en Chepén
- 2 colegios en Pacasmayo
- 2 colegios en Ascope
- 1 colegio en Trujillo
- 1 colegio en Sánchez Carrión

6. ESTADO SITUACIONAL DEL G2G


Proyectos	Avance físico	Avance financiero acumulado	Entrega estimada
Sector Salud	7%	32%	
Hospital de Cascas	7%	32%	I Trimestre 2023
Sector Educación	27%	49%	
2 colegios en Ascope	10%	39%	II - III Trimestre 2022
2 colegios en Chepen	42%	59%	II Trimestre 2022
2 colegios en Pacasmayo	30%	44%	II - III Trimestre 2022
1 colegios en Sanchez Carrion	14%	44%	II Trimestre 2022
1 colegios en Trujillo	37%	65%	II Trimestre 2022
Soluciones Integrales			
Río Virú y SAT – contrato suscrito	3%	15%	III Trimestre 2023
Río Chicama – contrato suscrito	1%	16%	I Trimestre 2024
Quebrada El León – contrato suscrito	2%	15%	I Trimestre 2023
Quebrada San Carlos – contrato suscrito	3%	17%	IV Trimestre 2022
Quebrada San Idelfonso y SAT – contrato suscrito	3%	13%	IV Trimestre 2022
Drenaje Trujillo – en estrategia de procura	--	--	Adjudicación III Trimestre 2022
Infraestructura Natural Río Chicama – en procura	--	--	Adjudicación II Trimestre 2022

Elaboración: OGP ARCC

PBI 2021 POR ZONAS

El norte crece por encima del promedio nacional

ENE-SET 2021: PBI TOTAL Y POR ZONA¹
Índice Ene-set 2019=100

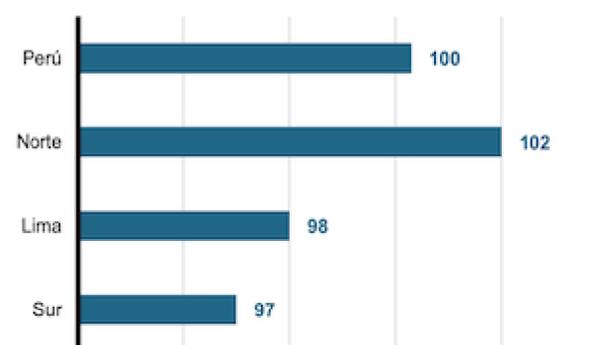

¹ Estimado en octubre del 2021.

FUENTE: INEI, APOYO Consultoría

NORTE: CONSTRUCCIÓN


55% de los proyectos adjudicados en el marco del acuerdo G2G de la RCC se ubican en la zona norte

G2G-RCC: PROYECTOS ADJUDICADOS EN LA ZONA NORTE




FUENTE: ARCC, Seace, APOYO Consultoría¹¹

“La actividad en el norte tendría impulso por la agroindustria y la CONSTRUCCIÓN”

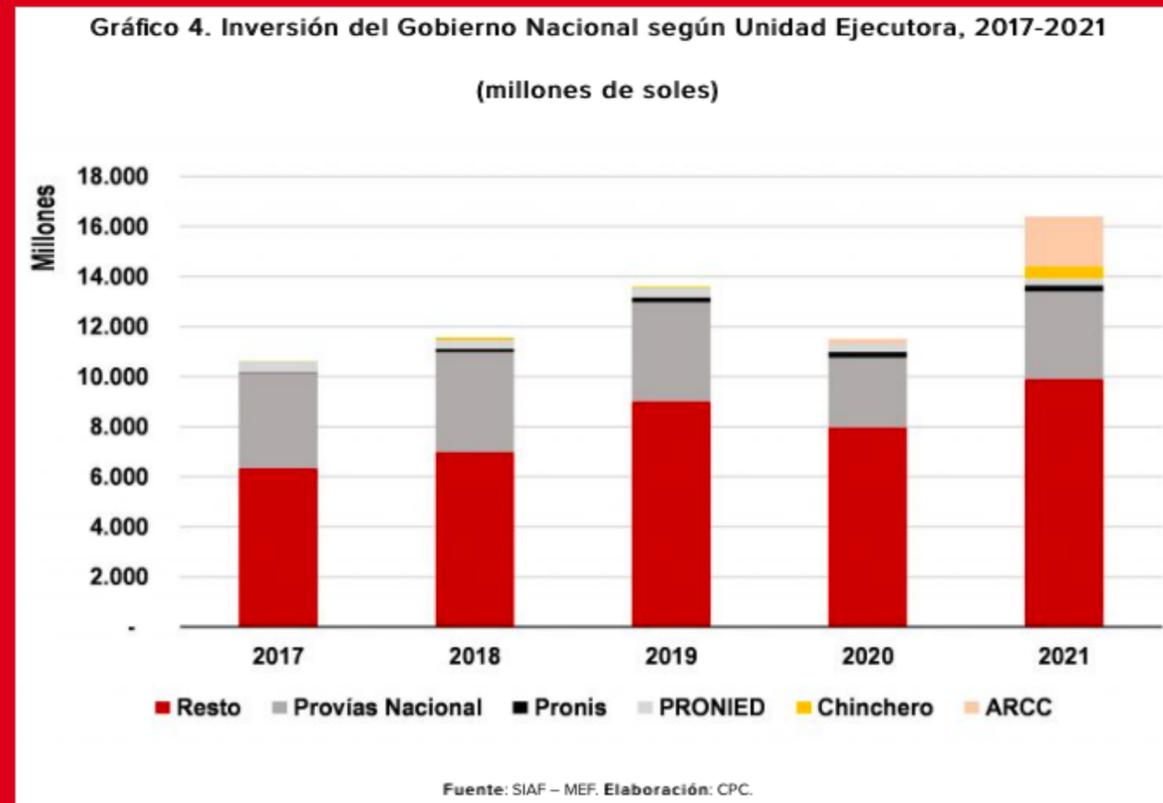

Fuente: Consejo Privado de Competitividad (CPC)

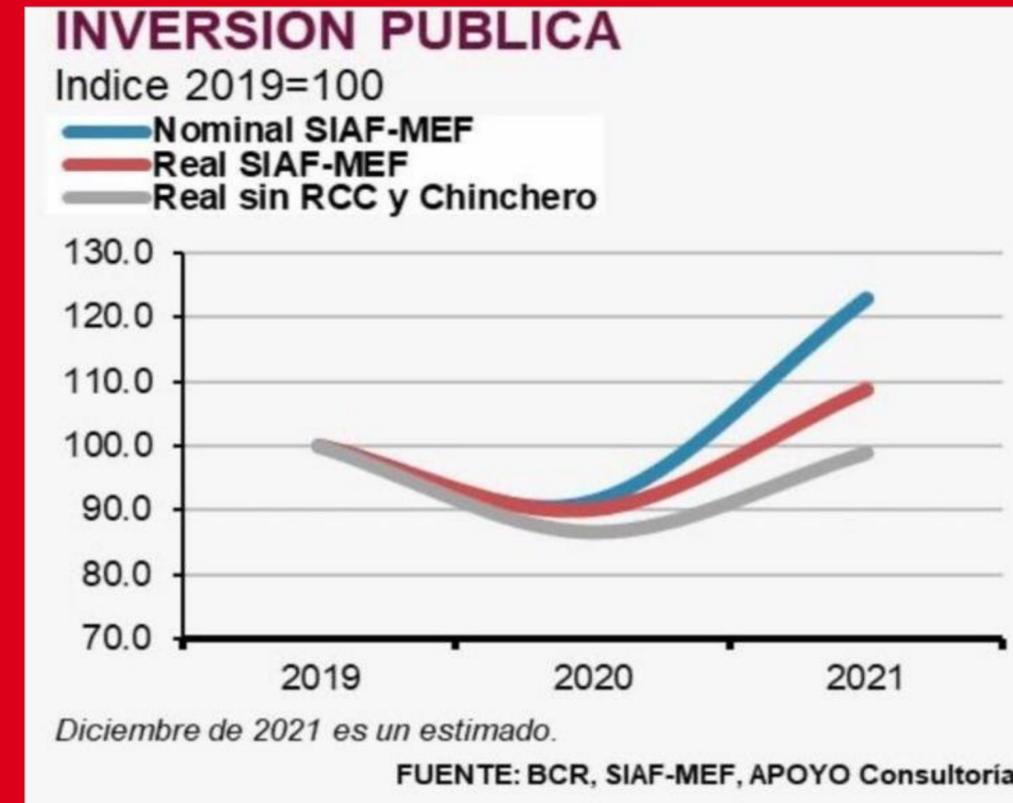

Fuente: Servicio de Asesoría Empresarial – SAE / Apoyo

El Consejo Privado de Competitividad (CPC) y SAE-APOYO resaltan que cerca de la mitad del crecimiento de la inversión pública del Gobierno Nacional en 2021 se explicó por la contribución de la ejecución de la ARCC mediante G2G.

El MEF y BCRP resaltan el impulso de la ARCC en la inversión pública y reactivación económica



https://www.mef.gob.pe/contenidos/pol_econ/marco_macro/IAPM_2021_2024.pdf?fbclid=IwAR16eq9nS4DuXvJOGb89rFDYe04oCGMzC_7HIRj0KloLERWSPnYh4b6oCO



<https://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Reporte-Inflacion/2021/diciembre/reporte-de-inflacion-diciembre-2021.pdf>

- La ejecución impulsada por el Acuerdo G2G con Reino Unido, conjuntamente con la ejecución de las Entidades Ejecutoras de intervenciones del PIRCC, tiene una **representación del 15% de total de la inversión pública**.
- El BCRP resalta la ejecución de la ARCC como **impulsor de la inversión pública en 2021**, así como en sus proyecciones para 2022 y 2023

La ARCC es reconocida a nivel internacional



Hospital de Cascas

La Libertad



6/1/2022
Hospital de Cascas II.1




PERÚ

Autoridad para la
Reconstrucción con Cambios



Rehabilitación del Local Escolar N° 80892 Los Pinos – La Libertad

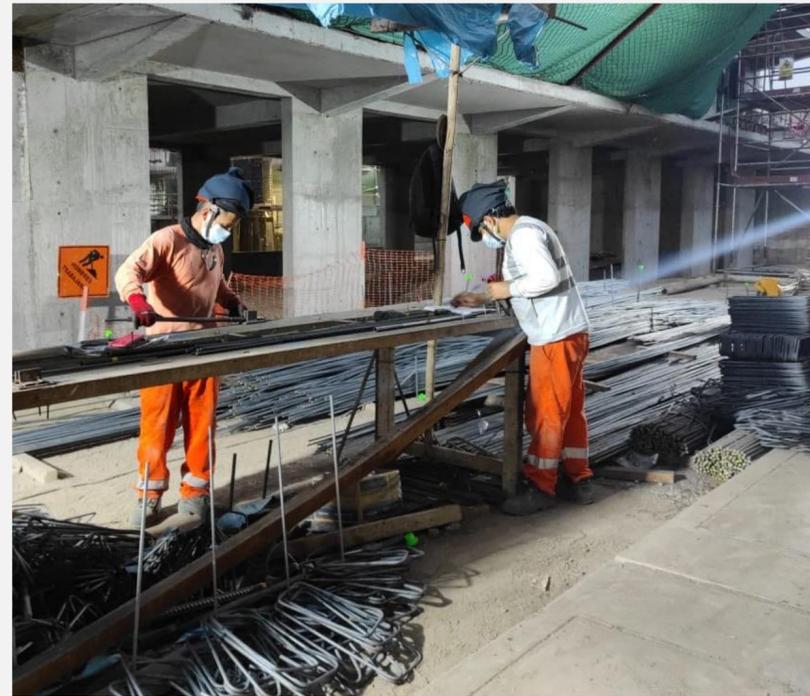

PERÚ

Autoridad para la
Reconstrucción con Cambios





PERÚ

Autoridad para la
Reconstrucción con Cambios



Siempre
con el pueblo
