



PERÚ

Autoridad para la
Reconstrucción con Cambios



Siempre
con el pueblo

Presentación para Comisión Reconstrucción del Congreso

Reconstrucción con Cambios en Arequipa

Agosto 2022



1. Avance físico al 2022 en Arequipa

- **Avance físico: 36%** de intervenciones culminadas de un total de 442.

36%

162
Interv.
culminadas

- 140 del sector construcción, vivienda y saneamiento
- 13 del sector transportes
- 7 del sector agricultura
- 2 del sector educación

64%

280
Interv. **por
implementar**

- **84** Interv. en **ejecución**
- **44** Interv. en **proceso de contratación**
- **122** Interv. en **proceso de financiamiento**
- **30** Interv. pendientes



PERÚ

Autoridad para la
Reconstrucción con Cambios


Fuente: Monitor ARCC al 30.06.22
Elaboración: OGP ARCC



1. Avance financiero al 2022 en Arequipa

- **Avance financiero:** se ha ejecutado el **62%** del monto financiado.

Plan, financiamiento y ejecución acumulada (en millones de soles)

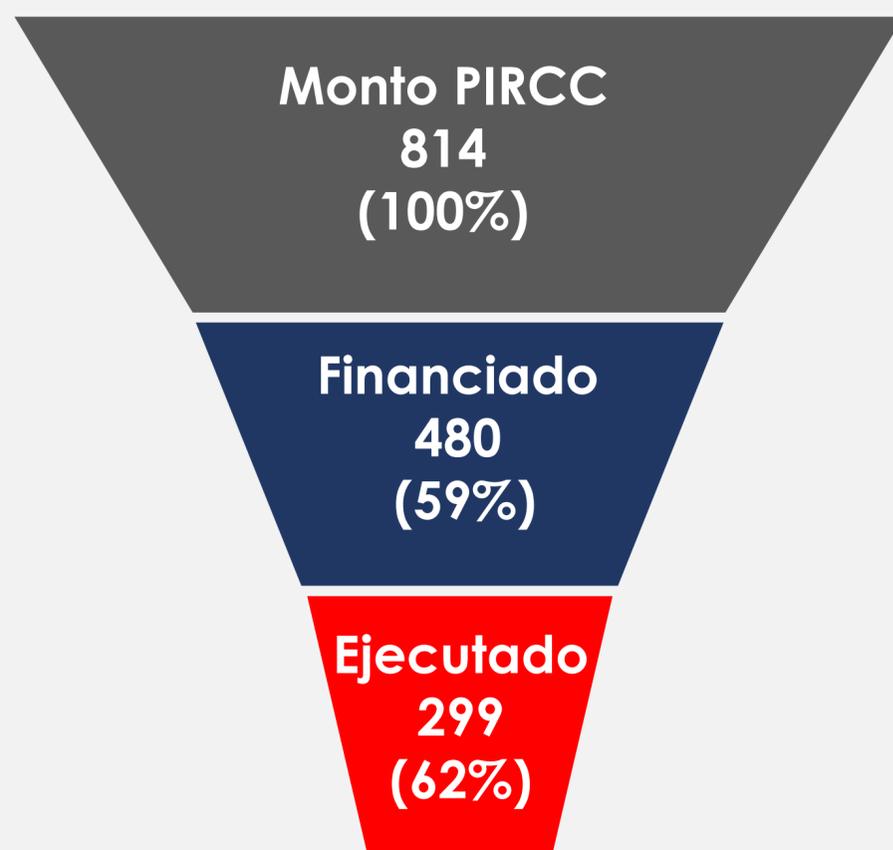

Financiamiento y ejecución acumulada de los tres Niveles de Gobierno (en millones de soles)

Para **442** intervenciones de reconstrucción

Nivel de Gobierno	Financiado	Ejecutado	Avance %
Nacional	205	121	59%
Regional	81	72	89%
Local	194	106	55%
ARCC	-	-	-



PERÚ

Autoridad para la
Reconstrucción con Cambios

Nota: en la región de Arequipa no hay proyectos en el marco del Acuerdo de Gobierno a Gobierno (G2G).
Fuente: Monitor ARCC y SIAF-FONDES al 30.06.22
Elaboración: OGP ARCC



1. Avance de ejecución del año 2022 por nivel de gobierno

- Para 2022, la region Arequipa tiene un **PIM de S/ 206** millones, donde se **ejecutó el 28%** al 30.06.22

Nivel de Gobierno	PIM 2022 (S/ Millones)	Ejecución al 30.06 (S/ Millones)	Avance %
GOBIERNO NACIONAL	99	19	19%
MTC	96	19	20%
MINAGRI	0.1	0	0%
VIVIENDA, CONST. Y SANEAMIENTO	3	0.2	6%
GOBIERNO REGIONAL	4	1	25%
GOBIERNO LOCAL	103	37	36%
TOTAL	206	57	28%



PERÚ

Autoridad para la
Reconstrucción con Cambios

Fuente: FONDES al 30.06.22
Elaboración: PMO ARCC



2. Intervenciones con problemas

13 obras paralizadas, por una inversión total de S/ 245 millones.

Sector PIRCC	Obra paralizada por Acuerdo ^{/1}	Inversión (Costo FUR) (S/)	Obra paralizada Por Incumplimiento ^{/2}	Inversión (Costo FUR) (S/)	Obra paralizada por resolución de contrato ^{/3}	Inversión (Costo FUR) (S/)	Total Obras
Transportes	2	S/ 28 MM	2	S/ 53 MM	4	S/ 146 MM	8
Saneamiento	2	S/ 3 MM					2
Pistas y veredas	1	S/ 4 MM					1
Educación	2	S/ 11 MM					2
Total	7	S/ 46 MM	2	S/ 53 MM	4	S/ 146 MM	13

/1 Tiene como causas: solicitudes de adicionales, factores climatológicos, causas atribuibles al contratista y causas atribuibles a la Entidad ejecutora.

/2 Tiene como causa: demora en la adecuación de las condiciones físicas y/o administrativas para realizar trabajos de obra.

/3 Tiene como causa: se excedió el límite máximo de penalidad.



PERÚ

Autoridad para la
Reconstrucción con Cambios

Fuente: Direcciones Sectoriales al 30.06.22
Elaboración: PMO ARCC



2. Detalle de Intervenciones con problemas

Ejecutora	Sector PIRCC	Provincia	Distrito	Costo FUR (en soles)
GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA	RED SUBNACIONAL - CAMINOS	LA UNION	MULTIDISTRITAL	13,102,305
GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA	RED SUBNACIONAL - CAMINOS	CASTILLA	VIRACO	7,851,193
GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA	RED SUBNACIONAL - CAMINOS	LA UNION	ALCA	7,496,477
GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA	RED SUBNACIONAL - CAMINOS	ISLAY	DEAN VALDIVIA	3,708,008
GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA	RED SUBNACIONAL - CAMINOS	CASTILLA	PAMPACOLCA	14,482,044
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	RED SUBNACIONAL - CAMINOS	CARAVELI	BELLA UNION	126,861,114
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	RED SUBNACIONAL - PUENTES	CONDESUYOS	RIO GRANDE	46,788,237
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO NICOLAS VALCARCEL	SANEAMIENTO	CAMANA	MARIANO NICOLAS VALCARCEL	142,635
MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	SANEAMIENTO	AREQUIPA	CERRO COLORADO	3,202,177
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE	EDUCACION	AREQUIPA	ALTO SELVA ALEGRE	6,442,029
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHICHAS	RED SUBNACIONAL - CAMINOS	CONDESUYOS	CHICHAS	5,923,643
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VIRACO	PISTAS Y VEREDAS	CASTILLA	VIRACO	4,204,114
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VIRACO	EDUCACION	CASTILLA	VIRACO	4,681,771
		13		244,885,746



PERÚ

Autoridad para la
Reconstrucción con Cambios

Fuente: FONDES al 30.06.22
Elaboración: PMO ARCC



3. Acciones de control realizadas por la Contraloría

La Contraloría General de la República (CGR) ejecuta sus acciones de control concurrente en el marco de sus planes de acción de control aprobados desde el año 2017.

En torno a
**acciones de
control a
Entidades
Ejecutoras
del
PIRCC**

- Son realizadas directamente a las entidades que la ARCC brinda financiamiento
- No cumplimos rol fiscalizador sobre las observaciones u hallazgos que pudieran haberse encontrado
- A las Entidades Ejecutoras les compete implementar las recomendaciones
- La ARCC no cuenta con la data de hallazgos identificados, pues ello está a cargo de la CGR



PERÚ

Autoridad para la
Reconstrucción con Cambios



5. Acciones de Propuesta o alternativas planteadas por la ARCC

En Arequipa:

- Seguimiento a las acciones de la Entidad Ejecutora: mediante Oficio se solicita información técnica
- Se brinda **asistencia técnica** para el reinicio de la obra
- Se realizan **visitas de campo** a la obra

En general:

- MECANISMOS PARA DESTABAR INTERVENCIONES PARALIZADAS DEL PIRCC
- PROYECTO DE LEY QUE ESTABLECE MEDIDAS NECESARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PIRCC Y DISPONE OTRAS MEDIDAS. Donde se propone:
 - Ampliar el plazo de vigencia de la ARCC hasta el mes de diciembre del 2026
 - Mejorar los mecanismos para optimizar la ejecución de las inversiones



PERÚ

Autoridad para la
Reconstrucción con Cambios



Siempre
con el pueblo
