



PERÚ

Autoridad para la
Reconstrucción con Cambios



Comisión - Congreso de la República

Reconstrucción con Cambios en Ayacucho

Amalia Moreno Vizcardo
Directora Ejecutiva

Abril 2022



Avances de la Reconstrucción



PERÚ

Autoridad para la
Reconstrucción con Cambios



Alcance del Plan

Alcance del PIRCC contempla 13 regiones:

1. Áncash
2. Arequipa
- 3. Ayacucho**
4. Cajamarca
5. Huancavelica
6. Ica
7. Junín
8. La Libertad
9. Lambayeque
10. Lima
11. Loreto
12. Piura
13. Tumbes

Reconstrucción de infraestructura

+5 sectores

11,009 intervenciones:

- 1,191 Transportes
- 3,319 Saneamiento
- 3,100 Pistas y veredas
- 1,737 Agricultura
- 149 Salud
- 1,508 Educación
- 5 Defensa

Prevención de futuros desastres

(Soluciones integrales)

Megaproyectos^{/1} en:

- 19 ríos
- 5 quebradas
- 7 Ciudades con drenajes pluviales

Costo inicial **referencial**
de los componentes del
PIRCC
(DS 091-2017-PCM)

S/ 25,655
millones



11,009 intervenciones Reconstrucción (56% culminadas),
atendiendo a **más de 800 entidades ejecutoras**



33,711 viviendas atendibles (23,732 atendidas / 70%)

Avances de la Reconstrucción en Ayacucho



PERÚ

Autoridad para la
Reconstrucción con Cambios



Costo estimado de los
componentes del PLAN
(DS 091-2017-PCM)

S/ 375
millones

Reconstrucción de infraestructura

+5 sectores

463 intervenciones:

- 236 Saneamiento
- 178 Pistas y veredas
- 41 Transportes
- 7 Educación
- 1 Agricultura

78 viviendas

1. Avances en ejecución presupuestal

Se ha logrado un avance de alrededor del **96%** del presupuesto disponible para Ayacucho, resaltando la aceleración de la implementación en los dos últimos años:




PERÚ

Autoridad para la
Reconstrucción con Cambios

Fuente: Monitor ARCC al 28.02.22
Elaboración: OGP ARCC




1. Avances en ejecución física (Reconstrucción)

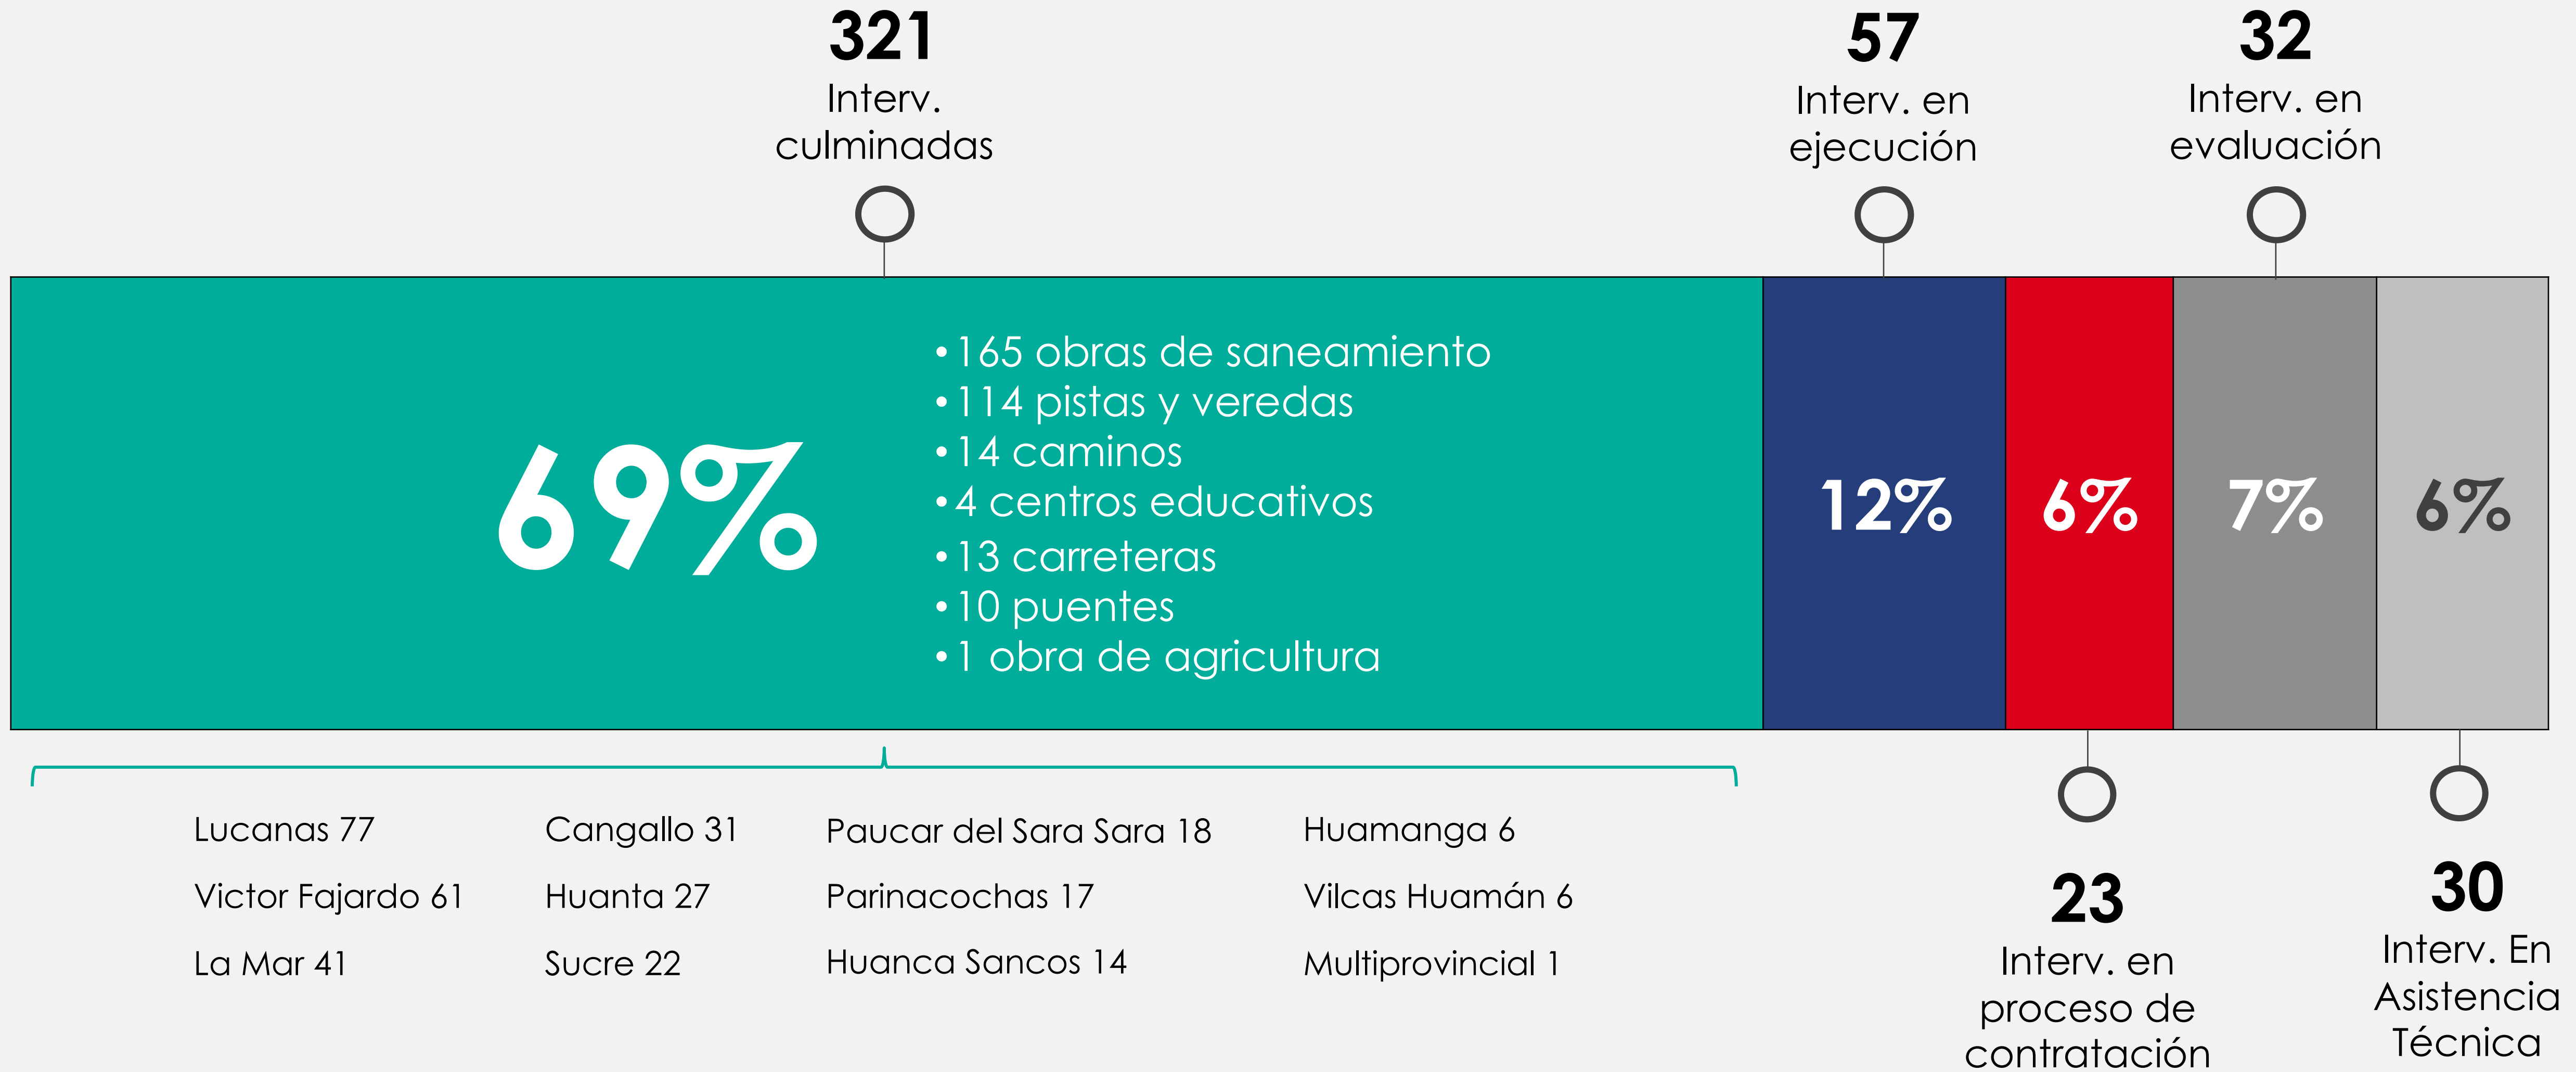

1. Avances en ejecución física desde 2019

Avance por periodo de gestión

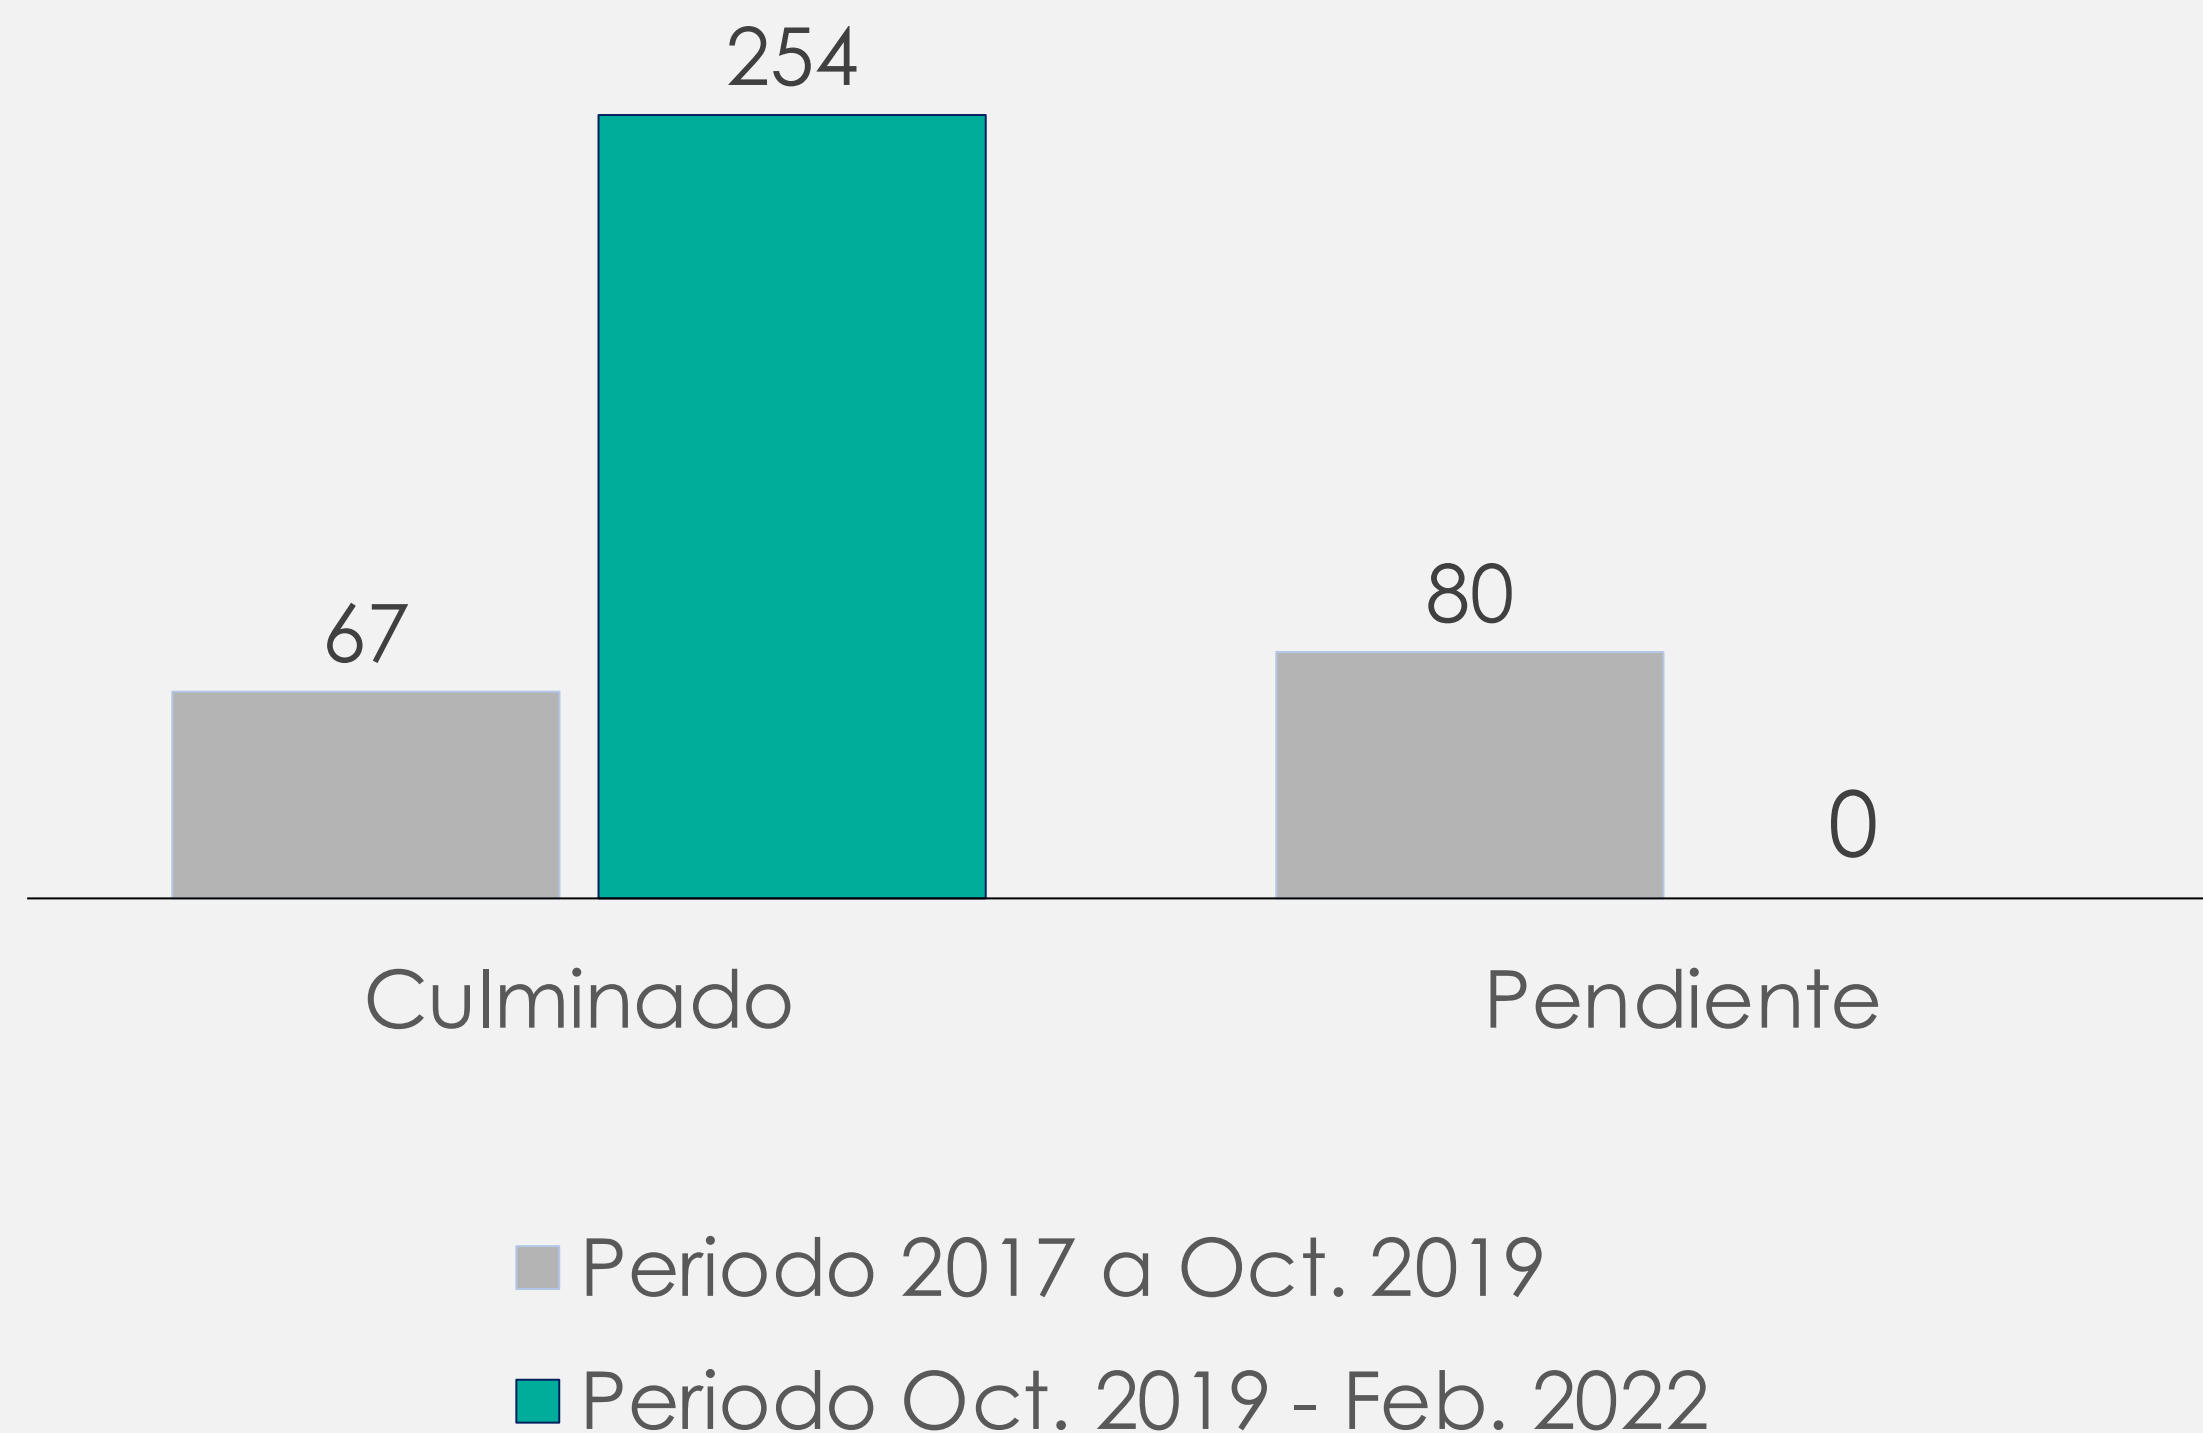

Se ha logrado **cuadruplicar** las intervenciones culminadas en su comparación con el periodo anterior. Asimismo, ya no se tienen pendientes de gestionar financiamiento, ya que el grupo faltante solo está en evaluación o asistencia técnica.



PERÚ

Autoridad para la
Reconstrucción con Cambios

Fuente: Direcciones Sectoriales ARCC al 28.02.22
Elaboración: OGP ARCC



2. Intervenciones con problemas

Por tipo de problema y sector:

Sector PIRCC	Obra paralizada con acuerdo	Costo FUR (en soles)	Obra paralizada por resolución de contrato	Costo FUR (en soles)	Total proyectos
Educación	1	8,679,510.10			1
Red Subnacional - Caminos	1	8,361,020.59			1
Saneamiento			1	696,060.66	1
Total	2	17,040,530.69	1	696,060.66	3



2. Intervenciones con problemas

Por proyecto:

Nombre	Provincia	Distrito	Ejecutora	Sector	Estado	Costo FUR (S/.)	Total Transferido (S/.)	Total Devengado (S/.)	Avance financiero acumulado
Recuperación del local escolar Alberto Sánchez Pérez, Centro Poblado de Pucacolpa.	Huanta	Pucacolpa	Municipalidad provincial de Huanta	Educación	Obra paralizada con acuerdo	8,679,510.10	8,679,510.10	6,953,341.34	80 %
Rehabilitación y mejoramiento de camino vecinal - 34.5 km EMP. AY-647 (tranca) - AY-646 (Sayhua-Docecorrales).	Sucre	San Pedro	GORE Ayacucho	Red subnacional - caminos	Obra paralizada con acuerdo	8,361,020.59	8,361,020.59	2,593,543.63	31 %
Rehabilitación de los sistemas de saneamiento básico de las localidades de San José de Ticllas.	Huamanga	San José de Ticllas	Municipalidad distrital de San José de Ticllas	Saneamiento	Obra paralizada por resolución de contrato	696,060.66	696,060.66	362,074.09	52 %
Total						17,736,591.35	17,736,591.35	9,908,959.06	56%



PERÚ

Autoridad para la
Reconstrucción con Cambios

Nota: Considera solo aquellas en fase de ejecución de obras.

Fuente: Direcciones Sectoriales ARCC al 28.02.22

Elaboración: OGP ARCC



3. Acciones de control realizadas por la Contraloría

La Contraloría General de la República (CGR) ejecuta sus acciones de control concurrente en el marco de sus planes de acción de control aprobados desde el año 2017.

En torno a acciones
de control a
Entidades Ejecutoras

- Son realizadas directamente a las entidades que la ARCC brinda financiamiento
- No cumplimos rol fiscalizador sobre las observaciones u hallazgos que pudieran haberse encontrado
- A las entidades ejecutoras les compete implementar las recomendaciones
- La ARCC no cuenta con la data de hallazgos identificados, pues ello está a cargo de la CGR

- En el **rol financiador** de la ARCC, a nivel de intervenciones, se han culminado 6,180 y se encuentran en ejecución 1,647, que representan en conjunto un avance del 71% de la reconstrucción. La ARCC atiende a más de 800 entidades ejecutoras.
- En Ayacucho, a nivel de las 463 intervenciones, se han culminado 321 (69%), se encuentran en ejecución 57 (12%), se encuentran en proceso de contratación 23 (6%) y las restantes están en evaluación o asistencia técnica por parte de la ARCC. No se cuenta con ninguna intervención pendientes de gestionar.
- En Ayacucho, el financiamiento de la ARCC asciende a S/ 247 millones, de los cuales se ejecutó el **96%**.



PERÚ

Autoridad para la
Reconstrucción con Cambios



Siempre
con el pueblo
