



Situación actual del PIRCC Integral

DIRECCIÓN DE INTERVECNIONES DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS
Lima, 28 de marzo de 2022



PLAN INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS

CUATRO (4) COMPONENTES

1. Soluciones de Vivienda

48,961 viviendas

2. Fortalecimiento de Capacidades

3. Soluciones Integrales (Prevención)

4. Reconstrucción

11,009 intervenciones:

- 1,191 Transportes
- 3,319 Saneamiento
- 3,100 Pistas y veredas
- 1,737 Agricultura
- 149 Salud
- 1,508 Educación
- 5 Defensa

AVANCES DEL PIRCC

% AVANCE	AGRICULTURA	DEFENSA	EDUCACION	PISTAS Y VEREDAS	RED NACIONAL - CARRETERAS	RED SUBNACIONAL - CAMINOS	RED SUBNACIONAL - PUENTES	SALUD	SANEAMIENTO	TOTAL
TOTAL	1,737	5	1,508	3,100	273	691	227	149	3,319	11,009
% Avance Culminadas	60%	80%	41%	65%	77%	57%	53%	1%	53%	56%
% Avance Financiadas	79%	100%	89%	83%	90%	78%	95%	38%	66%	78%
Culminadas	1,049	4	621	2,016	210	393	121	2	1,764	6,180
En ejecución	203	1	535	408	37	133	86	36	208	1,647
Proceso de contratación	115		193	149		10	8	18	232	725
Estudios financiados	42					56	4	76	75	253
Evaluación	100		59	184		16	1	15	456	831
Asistencia técnica	151		70	343	6	15		2	568	1,155
Pendientes	77		30		20	68	7		16	218

PIRCC: Plan Integral para la Reconstrucción con Cambios al corte: 28.02.2022

PRINCIPIOS DEL PIRCC

- **Subsidiaridad:** El responsable de la implementación debe ser la entidad que está más cerca al ciudadano.
- **Simplificación administrativa:** Saneamiento físico-legal, plazos cortos de contratación, habilitación urbana

- **Reconstrucción con Cambios:**


Si bien el objeto del plan es restablecer el servicio y/o reponer la infraestructura afectada por el fenómeno El Niño 2017, considerando el nivel de servicio de la infraestructura afectada, los planteamientos técnicos deben considerar:

- **Infraestructura resiliente** (mejor calidad y más resistente a los embates de la naturaleza). Componente de Cambio. Ej. Pavimento de concreto en lugar de asfalto; tuberías de PVC en lugar de asbesto cemento; componentes de drenaje y captación de aguas pluviales; muros de contención; PTAP; PTAR.
- **Gestión de Riesgos:** Las entidades debe tomar en cuenta un criterio de gestión de riesgos. Para ello, las solicitudes de financiamiento cuentan con algunos requisitos, entre ellos, el Formato MINAM en donde se precisa:
 - i) Si la infraestructura está ubicada en zona de riesgo mitigable o no (reubicación)
 - ii) Elementos de protección para la infraestructura (cámaras rompe presión, cercos, muros)

Componentes de cambio y Gestión de Riesgos



EJ. CERCO PERIMÉTRICO

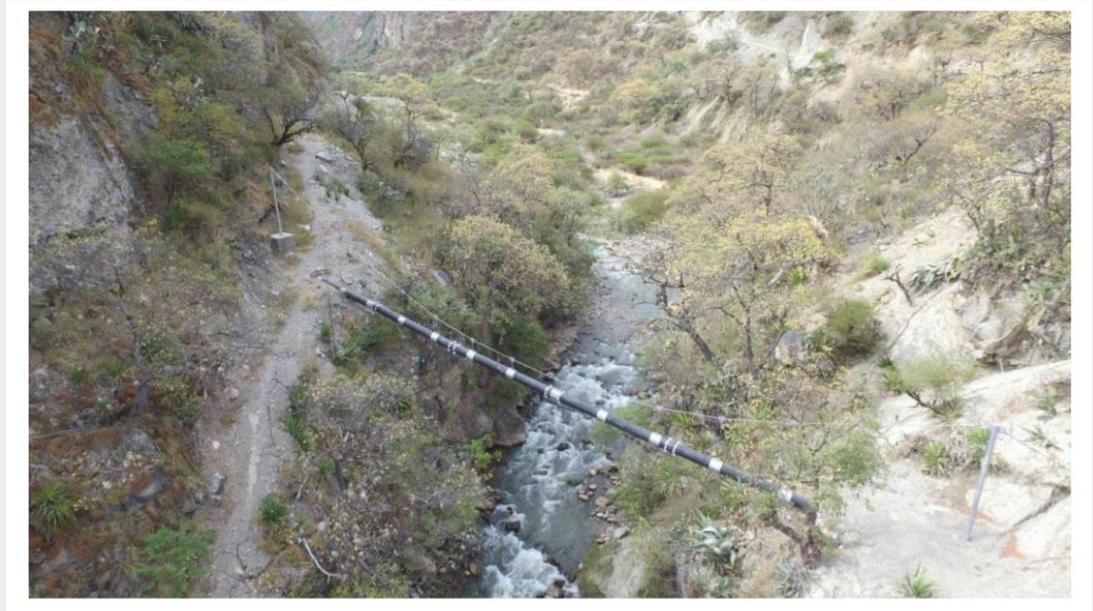


EJ. PASE AÉREO

Componentes de cambio y Gestión de Riesgos

Drenaje –vía canal




Planta de Tratamiento

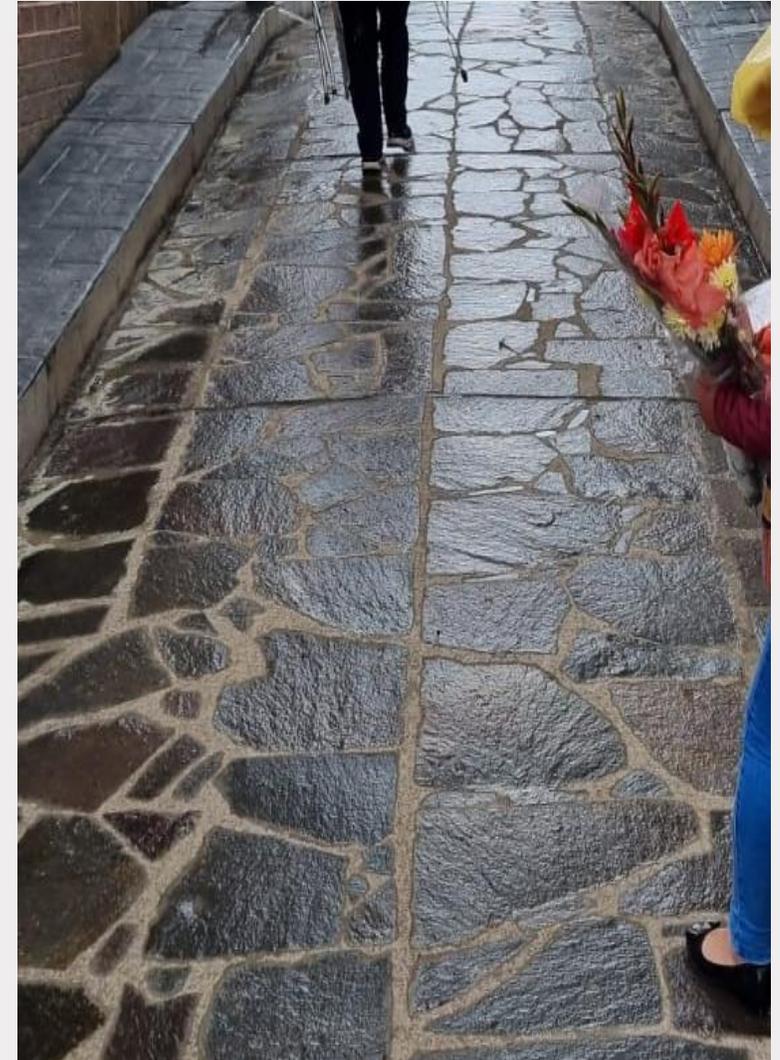

EVOLUCIÓN ANUAL DEL PIRCC - DISVCS

- A fin de cubrir a la necesidad de restablecer el servicio y/o reponer la infraestructura preexistente afectada por el fenómeno El Niño 2017, se elaboró el Plan Integral para la Reconstrucción con Cambios (PIRCC). La DISVCS es responsable de la evaluación de las solicitudes de financiamiento y el seguimiento de las intervenciones del componente Reconstrucción: sectores **pistas y veredas y saneamiento** del PIRCC, las que se contabilizan en **6,419** intervenciones (3,319 en saneamiento y 3,100 en pistas y veredas), lo que representa, aproximadamente, el 58% del total de intervenciones del Plan. A continuación se detalla el avance global en ambos sectores:

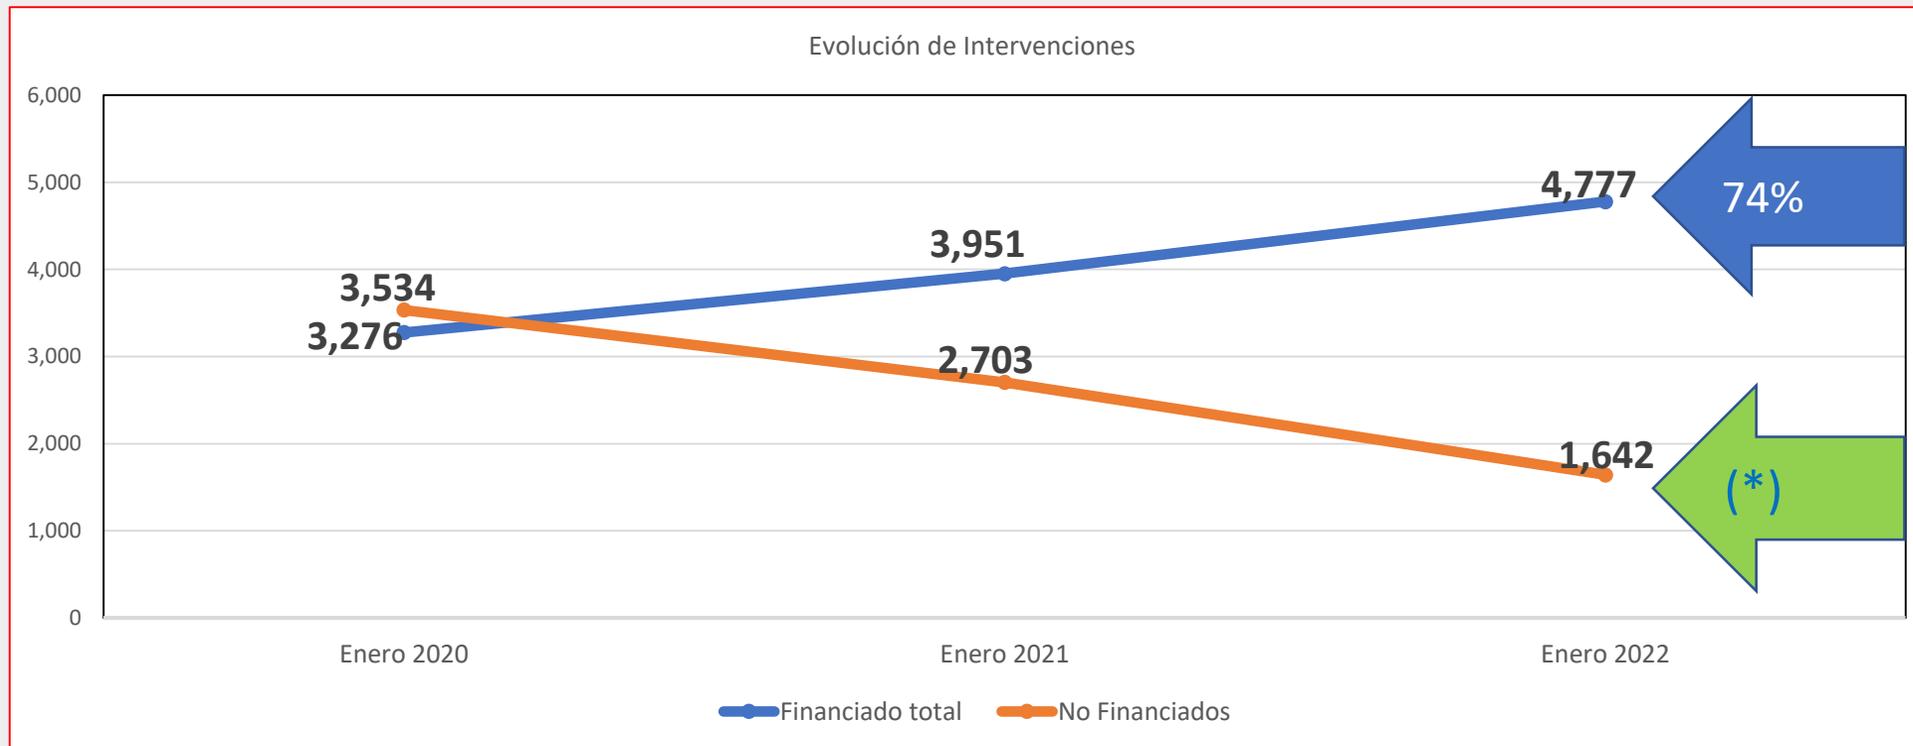

(*) Incluye 288 intervenciones cuyas solicitudes de financiamiento han sido aprobadas por la ARCC, pero están a la espera de recursos para su financiamiento.

Al 28 de febrero, la DISVCS cuenta con 6,419 intervenciones:

- Por sector:

SECTOR	TOTAL INTERVENCIONES	% PIRCC
PISTAS Y VEREDAS	3,100	48%
SANEAMIENTO	3,319	52%
Total	6,419	100%

- Por estado:

ESTADO	INTERVENCIONES PISTAS Y VEREDAS	% PIRCC PISTAS Y VEREDAS	INTERVENCIONES DE SANEAMIENTO	% PIRCC SANEAMIENTO
Financiado total	2,573	83%	2,204	66%
Pendiente de financiar	527	17%	1,115	34%
Total	3,100	100%	3,319	100%

(*) Con fecha de corte al 28/02/2022

DISTRIBUCIÓN DE INTERVENCIONES PIRCC DISVCS POR NIVEL DE GOBIERNO




- Financiadas:

Nivel de Gobierno	PISTAS Y VEREDAS	SANEAMIENTO	Financiado total	%
GOB. NACIONAL	20	675	695	15%
GOB. REGIONAL	21	2	23	0%
GOB. LOCAL	2,532	1,527	4,059	85%
TOTAL	2,573	2,204	4,777	100%

- Pendiente de Financiar:

Nivel de Gobierno	PISTAS Y VEREDAS	SANEAMIENTO	Pendiente de Financiar	%
GOB. NACIONAL		63	63	4%
GOB. REGIONAL	10	1	11	1%
GOB. LOCAL	517	1,051	1,568	95%
TOTAL	527	1,115	1,642	100%

DISTRIBUCIÓN DE INTERVENCIONES SEGÚN ESTADOS

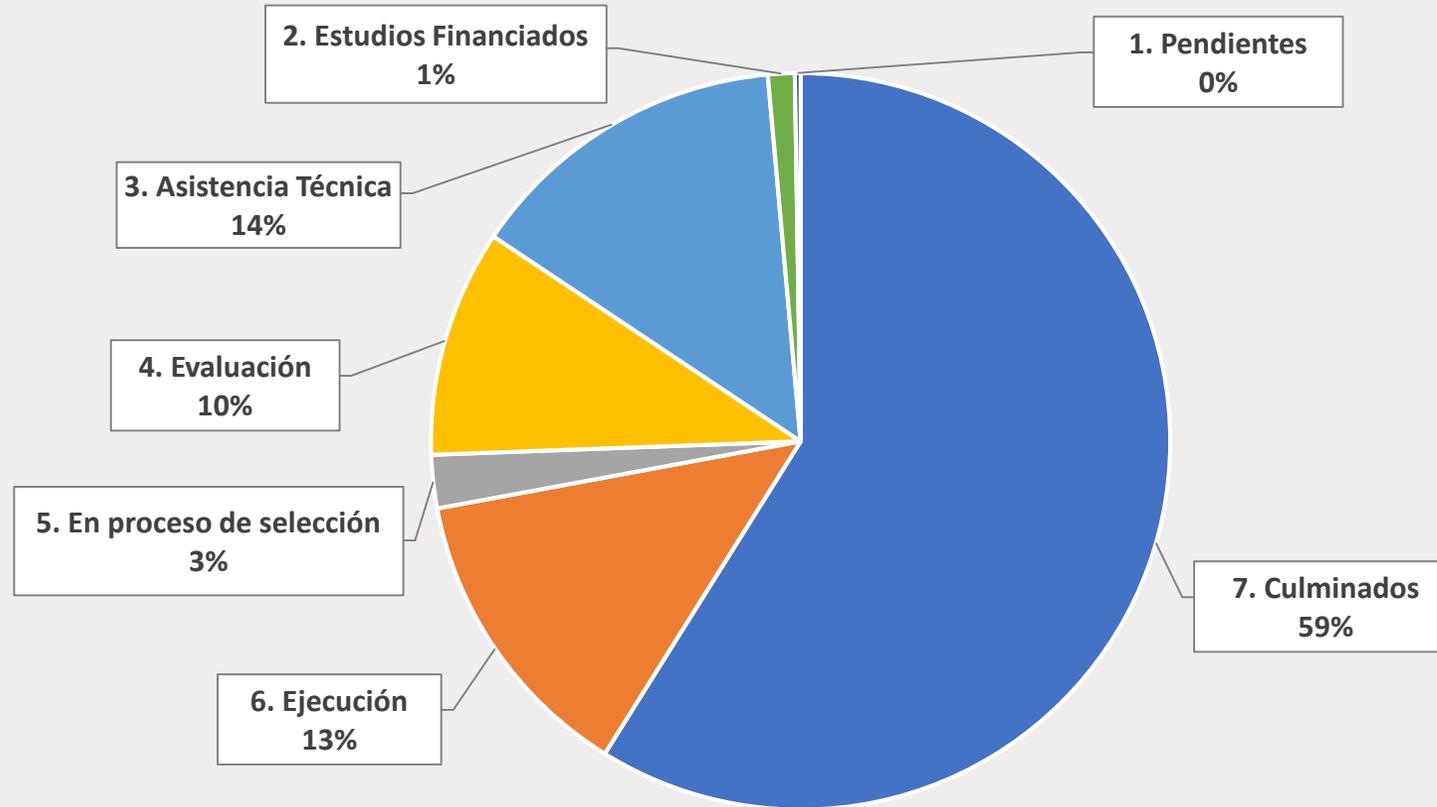

Sector	7. Culminados	6. Ejecución	5. En proceso de selección	4. Evaluación (*)	3. Asistencia Técnica	2. Estudios Financiados	1. Pendientes	TOTAL
PISTAS Y VEREDAS	2,016	501	56	184	343			3,100
SANEAMIENTO	1,764	346	94	456	568	75	16	3,319
TOTAL	3,780	847	150	640	911	75	16	6,419

Avance financiero 2021


DISVCS por Sector

SECTOR	MARCO PPTAL 2021	DEVENGADO 2021	% AVANCE 2021
SANEAMIENTO	265,048,410.00	172,893,117.56	65%
PISTAS Y VEREDAS	456,291,628.00	281,116,825.36	62%
PLANES	4,880,611.00	4,455,271.00	91%
Total	726,220,649.00	458,465,213.92	63%


DISVCS por Nivel de Gobierno

NIVEL DE GOBIERNO	MARCO PPTAL 2021	DEVENGADO 2021	% AVANCE 2021
1. GOB. NACIONAL	64,306,918.00	24,884,160.43	39%
2. GOB. REGIONAL	31,643,969.00	15,365,557.85	49%
3. GOB. LOCAL	630,269,762.00	418,215,495.64	66%
Total	726,220,649.00	458,465,213.92	63%

EJECUCIÓN 2021 POR SECTOR

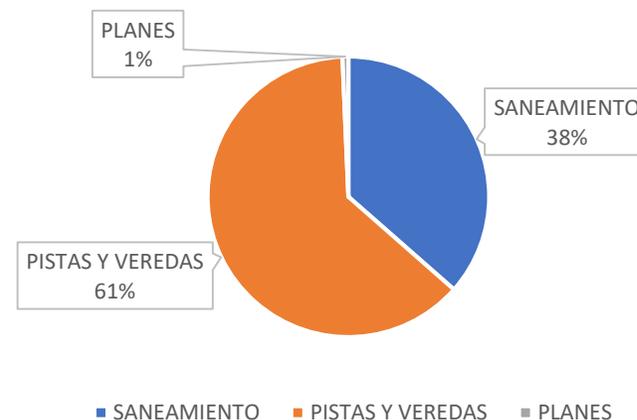

PIM Y DEVENGADO POR NIVEL DE GOBIERNO

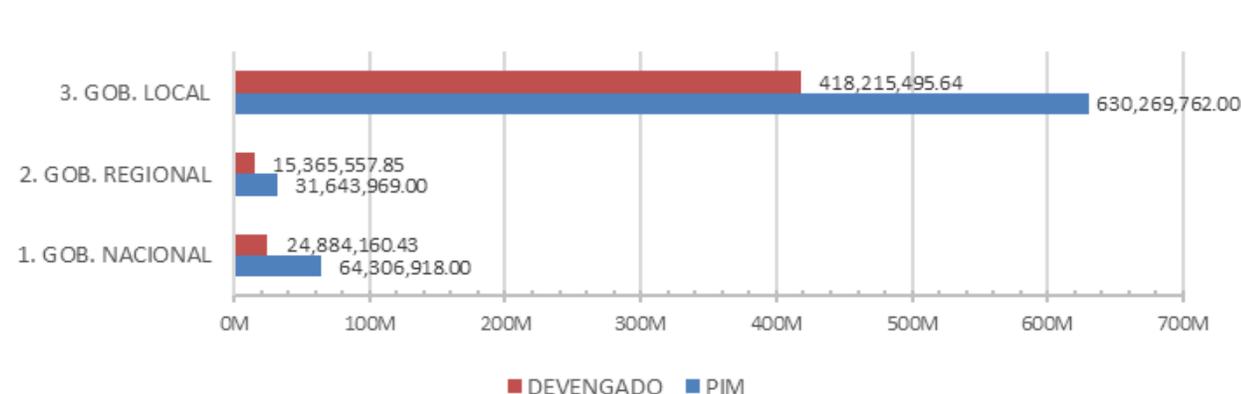

Avance financiero 2021

EJECUCIÓN por Regiones

NIVEL DE GOBIERNO	MARCO PPTAL 2021	DEVENGADO 2021	% AVANCE 2021
ANCASH	85,136,369.00	55,997,081.44	66%
AREQUIPA	31,061,185.00	14,682,975.45	47%
AYACUCHO	27,252,621.00	18,689,243.83	69%
CAJAMARCA	125,736,581.00	92,683,064.29	74%
HUANCAVELICA	27,217,725.00	18,663,174.76	69%
ICA	12,758,349.00	9,960,674.80	78%
LA LIBERTAD	39,520,066.00	32,289,409.48	82%
LAMBAYEQUE	83,146,861.00	43,642,638.55	52%
LIMA	110,268,401.00	71,206,082.59	65%
LORETO	3,319,648.00	1,622,182.80	49%
PIURA	149,745,821.00	81,176,323.42	54%
TUMBES	24,825,207.00	13,103,756.51	53%
MULTIDEP.	6,231,815.00	4,748,606.00	76%
Total	726,220,649.00	458,465,213.92	63%




Avance financiero a Febrero 2022

DISVCS por Sector

SECTOR	MARCO PPTAL 2022 (*)	DEVENGADO 2022	% AVANCE 2022
SANEAMIENTO	22,835,367.00	1,806,884.04	8%
PISTAS Y VEREDAS	46,331,065.00	2,876,893.99	6%
PLANES	0.00	0.00	-
Total	69,166,432.00	4,683,778.03	7%


EJECUCIÓN AVANCE FEBRERO 2022 POR SECTOR

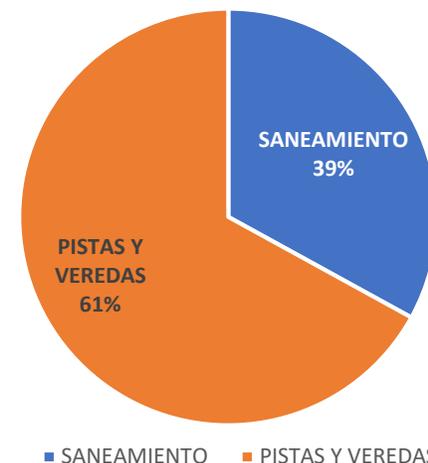

EJECUCIÓN por Nivel de Gobierno

NIVEL DE GOBIERNO	MARCO PPTAL 2022	DEVENGADO 2022	% AVANCE 2022
1. GOB. NACIONAL	16,718,542.00	248,444.00	1%
2. GOB. REGIONAL	8,874,675.00	11,493.90	1%
3. GOB. LOCAL	43,573,215.00	4,323,840.13	10%
Total	69,166,432.00	4,683,778.03	7%

PIM Y DEVENGADO POR NIVEL DE GOBIERNO

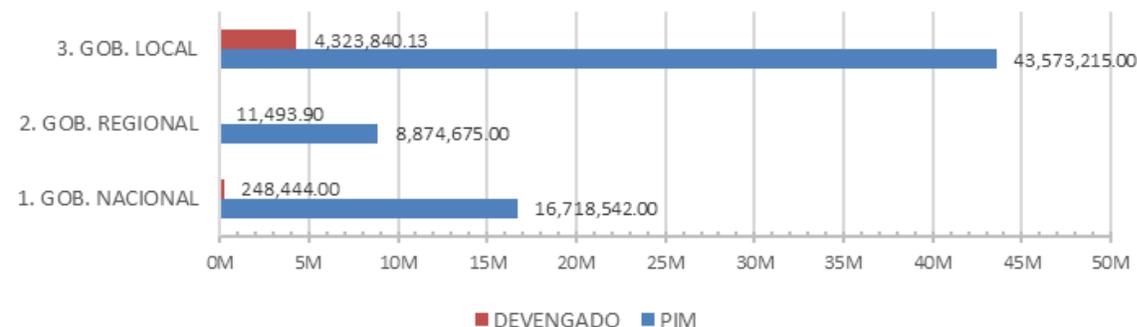


Intervenciones Financiadas – Avance año 2022:

AVANCE por REGIÓN

NIVEL DE GOBIERNO	MARCO PPTAL 2022	DEVENGADO 2022	% AVANCE 2022
ANCASH	4,457,680.00	754,430.14	17%
AREQUIPA	2,922,743.00	683,755.84	23%
AYACUCHO	214,255.00	0.00	0%
CAJAMARCA	3,774,907.00	726,656.38	19%
HUANCAVELICA	1,144,512.00	0.00	0%
ICA	968,864.00	0.00	0%
LA LIBERTAD	1,107,144.00	27,535.14	2%
LAMBAYEQUE	3,598,313.00	0.00	0%
LIMA	9,885,682.00	296,657.90	3%
LORETO	62,933.00	0.00	0%
PIURA	35,132,226.00	900,789.28	3%
TUMBES	5,897,173.00	1,293,953.35	22%
MULTIDEP.	0.00	0.00	0%
Total	69,166,432.00	4,683,778.03	7%


DEVENGADO FEB 2022 POR REGIÓN

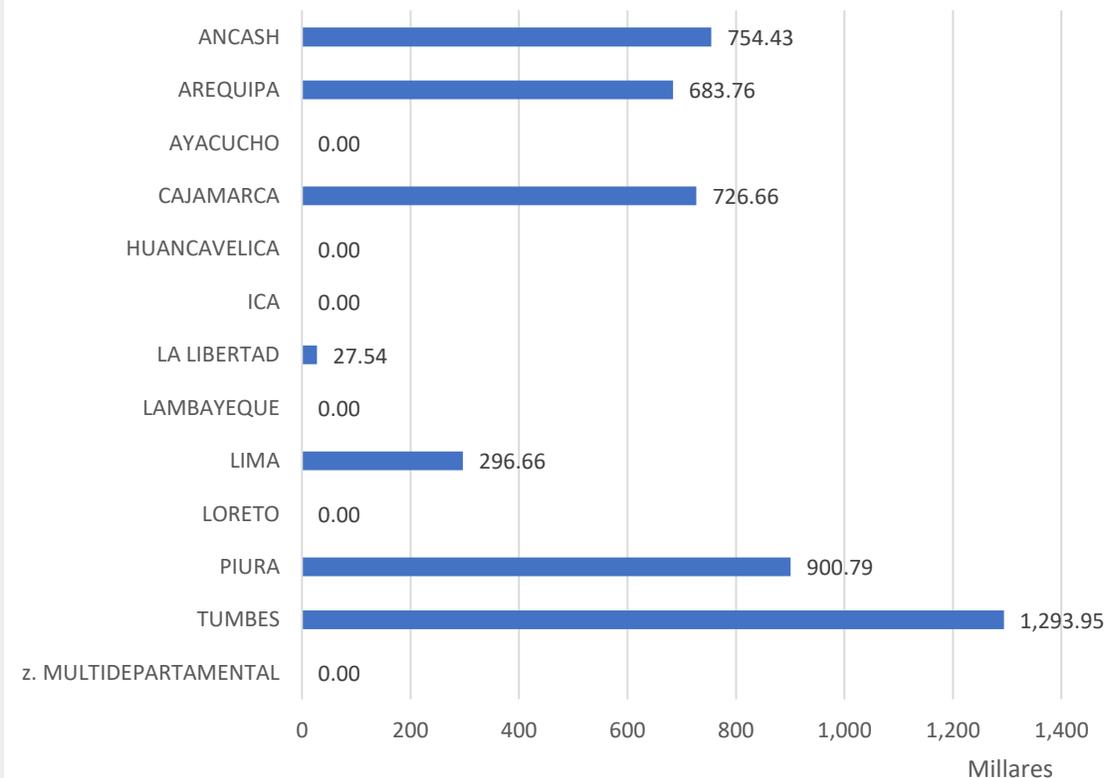

EVOLUCIÓN ANUAL DE INTERVENCIONES FINANCIADAS

ESTADO	SANEAMIENTO	%	PISTAS Y VEREDAS	%	TOTAL	%
9. Culminados	1,764	37%	2,016	42%	3,780	79%
8. Ejecución	346	7%	501	10%	847	18%
7. En proceso de selección	94	2%	56	1%	150	3%
Total	2,204	46%	2,573	54%	4,777	100%

INTERVENCIONES FINANCIADAS

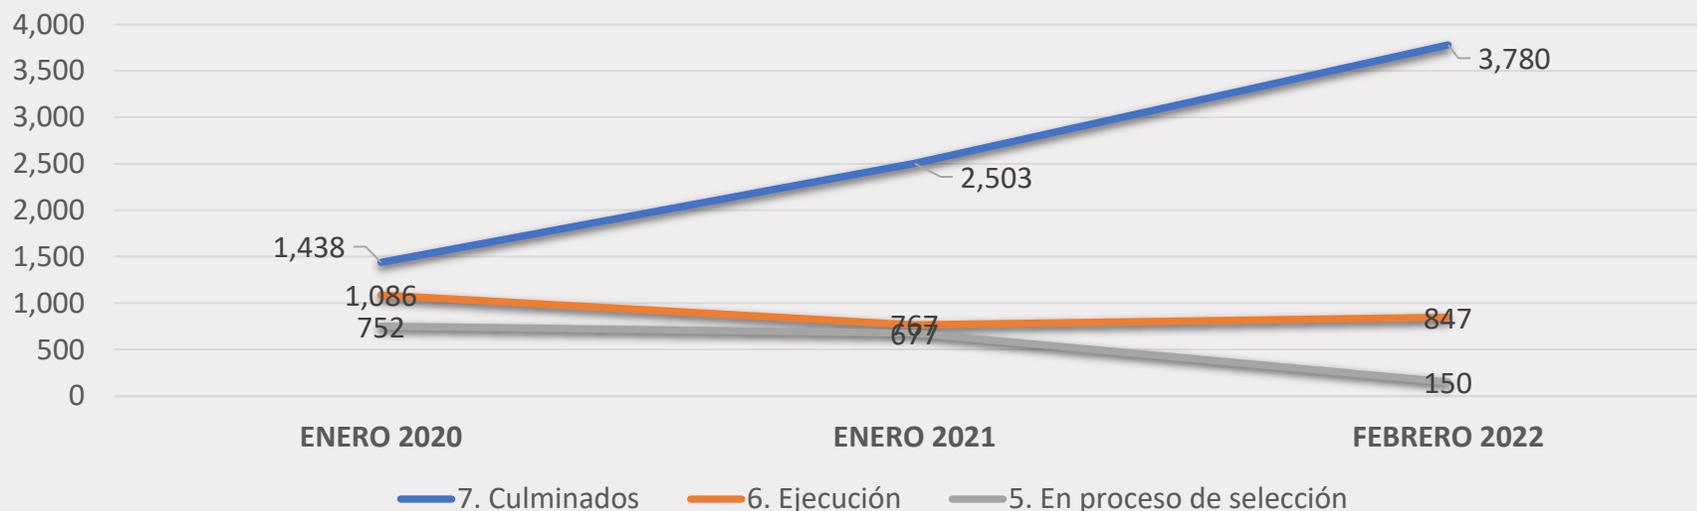

Intervenciones Financiadas:

Por Nivel de Gobierno

Niv. Gobierno	B.1 Sin Inicio de Proceso de Contratación	B.2 En PEC	B.3 Con Contrato Suscrito	B.4 En Ejecución de Obra	B.5 Obra suspendida/ controversia(*)	B.6 Obra Ejecutada	TOTAL
GOB. NACIONAL			84	18	76	517	695
GOB. REGIONAL				1	4	18	23
GOB. LOCAL	39	111	89	406	169	3,245	4,059
Total general	39	111	173	425	249	3,780	4,777

85%

79%

(*) Incluye 133 intervenciones suspendidas por razones no controversiales (suspensión por lluvias; gestión de adicionales; licencias por enfermedad).


ESTADO DE INTERVENCIONES NO FINANCIADAS

ESTADO	PISTAS Y VEREDAS	SANEAMIENTO	Total	%
1. Pendientes		16	16	1%
2. Estudios Financiados		75	75	5%
3. Asistencia Técnica	309	441	750	46%
4. Evaluación	91	261	352	21%
5. Opinión Favorable	93	195	288	18%
6. Por excluir del PIRCC (**)	34	127	161	10%
Total	527	1,115	1,642 (*)	100%

(*) Sin considerar las intervenciones que ya cuentan con opinión favorable, tenemos 1,354 Intervenciones pendientes del proceso de financiamiento.

(**) Se han identificado 161 intervenciones cuyas entidades ejecutoras han informado que no es necesaria su rehabilitación/reconstrucción al encontrarse en buen estado o por haber gestionado un proyecto de infraestructura integral.

GRÁFICO INTERVENCIONES NO FINANCIADAS

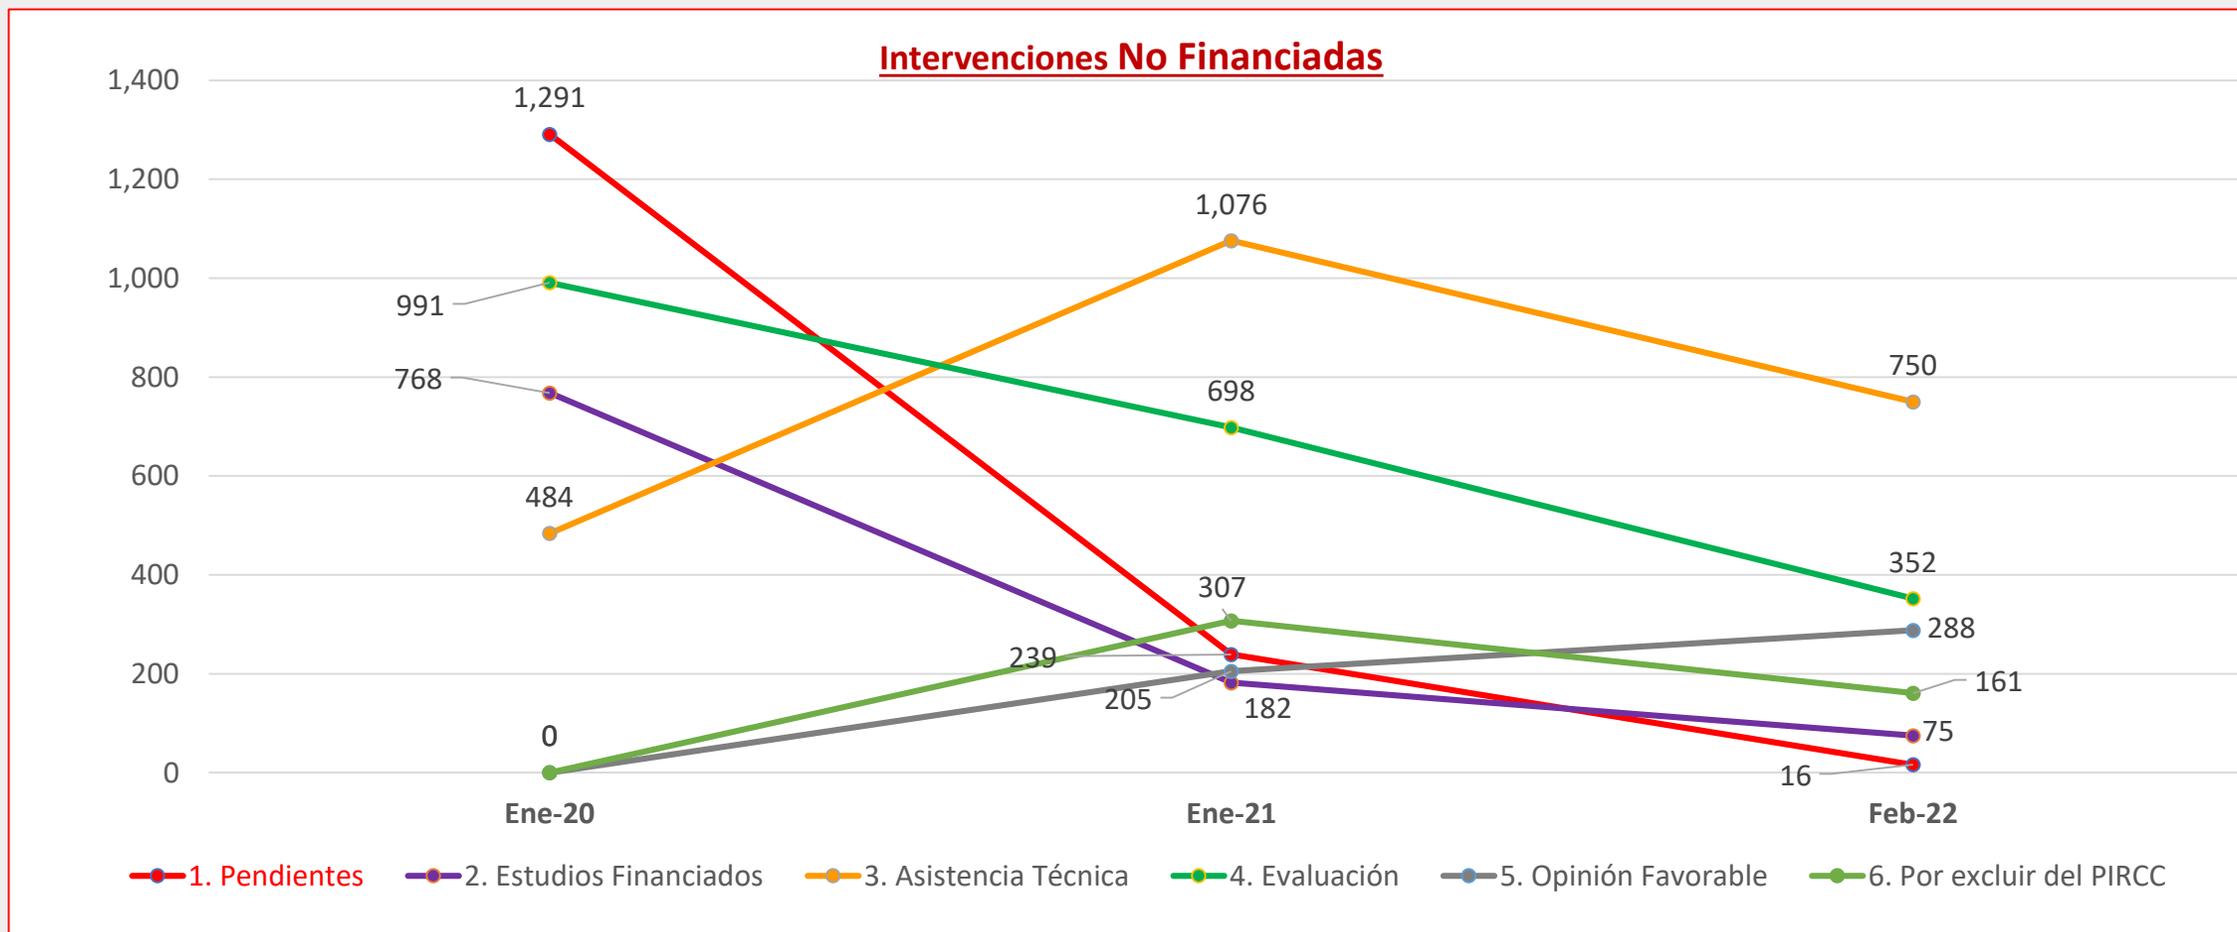

INTERVENCIONES NO FINANCIADAS Por Nivel de Gobierno

Nivel de gobierno	A.1. Pendientes	A.2. Por excluir del PIRCC	A.3. Gestión de cambios PIRCC	A.4. Estudios Financiados	A.5. Asistencia Técnica	A.6. En Evaluación de Solicitud	A.7. Solicitudes Observadas	A.8. Informe Técnico Favorable (*)	TOTAL
GOB. NACIONAL	3	1	5	41	1		3	9	63
GOB. REGIONAL		1	3		3	1		3	11
GOB. LOCAL	13	159	6	34	732	31	317	276	1,568
TOTAL	16	161	14	75	736	32	320	288	1,642

(*) Las solicitudes de financiamiento de estas 288 intervenciones han sido aprobadas por la ARCC, pero están a la espera de que el MEF asigne recursos a la ARCC a fin de continuar con el trámite de financiamiento.

¿Cuáles son los logros?

- La DISVCS logró contar con 4,777 intervenciones financiadas y 3,780 intervenciones culminadas, que representan el 74% y 59% (acumulado) del total de intervenciones del PIRCC de intervenciones de los Sectores Saneamiento y Pistas y Veredas (6,419 intervenciones).
- Se logró culminar 1,764 intervenciones de saneamiento, principalmente, en localidades rurales de nuestro país (más de 1,873 localidades que hoy cuentan con sistemas de saneamiento rehabilitados/reconstruidos), lo que ha contribuido en disminuir los índices de desnutrición crónica infantil y a prevenir los contagios por COVID-19 en la población beneficiaria.
- Se han culminado 2,016 intervenciones de pistas y veredas con lo que se ha logrado promover el desarrollo urbano, asegurar el tránsito facilitando el comercio, turismo y la economía local.

OBRAS EMBLEMATICAS - ANCASH

SANEAMIENTO

Nombre de la inversión: 2480828 - INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LOS CASERIOS DE HUICHAY, PIRAUYA, SAN ISIDRO, SANTA CRUZ, YAUYAN Y LAMPI, DISTRITO DE COCHAPETI - HUARMEY - ANCASH

Estado: B.4.1 En Ejecución de Obra

Beneficiarios: 1,276

Empleos Generados: 103

Ranking de pobreza: 649

Costo del Proyecto: S/ 3'547,007.27

Cambios a la población: Mediante la ejecución de la intervención, lo que se busca, principalmente, es instalar el servicio del sistema de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, debido a que su infraestructura de hoyos secos fue afectada por el FEN 2017.



OBRAS EMBLEMATICAS - ANCASH

SANEAMIENTO

Nombre de la inversión: 2501724 - REHABILITACION DE LA EBAR DE COISHCO ANTIGUO HACIA LA EBAR DEL SECTOR HUAMANACHACATE DISTRITO DE COISHCO, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH

Estado: B.6.1 Culminada

Beneficiarios: 1,107

Fecha de culminación: 22/12/2021

Empleos Generados: 56

Ranking de pobreza: 1,446

Costo del Proyecto: S/ 1'923,693.00

Cambios a la población: Mediante la ejecución de la intervención se tiene por objetivo, reponer la infraestructura afectada por el FEN 2017, correspondiente a las estaciones de bombeo de aguas residuales (EBAR) Coishco, cubrir la demanda existente del servicio de agua potable y mejorar la calidad de vida de la población beneficiaria.



OBRAS EMBLEMATICAS - AREQUIPA

SANEAMIENTO

Nombre de la inversión: 2441091 – MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO DE CHARCANA, DISTRITO DE CHARCANA - LA UNION – AREQUIPA

Estado: Recepcionado

Beneficiarios: 569

Fecha de culminación: 11/10/2021

Empleos Generados: 126

Ranking de pobreza: 746

Costo del Proyecto: S/4'361,622

Cambios a la población:

**Se rehabilitó el Sistema de Agua Potable:* Reposición de 03 Und. de captaciones, 01 cámara rompe presiones, pase aéreo de L=30mL, 175 Und. de conexiones domiciliarias de agua potable. Se renovó la línea de conducción L=1956.29 ml. Se reconstruyó el reservorio de 10m3, etc.

***Se rehabilitó el Sistema de alcantarillado – PTAR:* Reconstrucción de 159 buzones, renovación de 3,632.10m de red colectora de desagüe. Reposición del PTAR y de 31.92m de gaviones tipo reno.



OBRAS EMBLEMATICAS - AYACUCHO

SANEAMIENTO

Nombre de la inversión: 2455386 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DE HUANCHOS, DEL DISTRITO DE QUEROBAMBA, PROVINCIA DE SUCRE, REGIÓN AYACUCHO AFECTADA POR EL FENÓMENO DEL NIÑO COSTERO

Estado: B.6.1 Culminada **Beneficiarios:** 200 **Empleos Generados:** 7

Ranking de pobreza: 984 **Costo del Proyecto:** S/ 230,180.00

Cambios a la población: La recuperación de los sistemas de agua potable y saneamiento básico, contemplan además elementos estructurales que garanticen la resiliencia y la protección de la infraestructura proyectada. Se plantea la construcción de captación tipo ladera, línea de conducción, cámara rompe presión y reservorio, además de infraestructura para resguardar la inversión, como es el caso del cerco perimétrico de protección.



OBRAS EMBLEMATICAS - CAJAMARCA

SANEAMIENTO

Nombre de la inversión: 2437435 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE PEÑA BLANCA, LA UNIÓN Y PAMPAS DEL INCA, DISTRITO DE SAN JOSE DEL ALTO - JAEN - CAJAMARCA

Estado: B.6.1 Culminada

Fecha de culminación: 03/08/2021

Beneficiarios: 2,555

Ranking de pobreza: 406

Costo del Proyecto: S/ 7'944,495.62

Empleos Generados: 230

Cambios a la población: El mejoramiento y ampliación de los servicios de agua potable e instalación de alcantarillado, tiene proyectado captaciones tipo ladera y tipo barraje, línea de conducción (2,698.61 ml), 02 reservorios de 67 m³ y 01 de 12 m³, una línea de aducción (742.29ml), una red de distribución, válvulas de purga y de aire, cámaras rompe presión, instalaciones de conexiones domiciliarias, 03 pases aéreos, un sistema de alcantarilla por gravedad y módulos U.B.S de arrastre hidráulico.



OBRAS EMBLEMATICAS - CAJAMARCA

SANEAMIENTO

Nombre de la inversión: 2498673 - RECUPERACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE COLPA ALTA (SHOROICO), DEL DISTRITO DE ICHOCAN – PROVINCIA DE SAN MARCOS – DEPARTAMENTO CAJAMARCA

Estado: B.4.1 En Ejecución de Obra

Beneficiarios: 251

Empleos Generados: 75

Ranking de pobreza: 383

Costo del Proyecto: S/ 2'591,860.00

Cambios a la población: La recuperación de los sistemas de agua potable y saneamiento básico, contemplan muros reforzados de concreto en las captaciones tipo ladera. Esto busca darle mayor estabilidad, seguridad y protección a la captación frente al empuje de taludes que inciden sobre la estructura. Asimismo, se proyecta una cuneta de coronación con la finalidad de interceptar y conducir adecuadamente las aguas de lluvias, evitando así su paso a las captaciones. Finalmente, cercos perimétricos que buscan garantizar la seguridad de reservorio ya que limitará el acceso de personas o animales a los ambientes.



OBRAS EMBLEMATICAS - CAJAMARCA

SANEAMIENTO

Nombre de la inversión: 2460055 - RECUPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LAS LOCALIDADES DE PAMPA LA TUNA – CAUTIVAS – LA HIGUERA, DEL DISTRITO DE CHANCAY – PROVINCIA DE SAN MARCOS – DEPARTAMENTO CAJAMARCA.

Estado: B.5.2 Suspendida (por lluvias) **Costo del Proyecto:** S/ 24'370,272.80

Empleos Generados: 706 **Ranking de pobreza:** 75 **Beneficiarios:** 2,448

Cambios a la población: La recuperación de los sistemas de agua potable y saneamiento básico, contemplan además elementos estructurales que garanticen la resiliencia y la protección de la infraestructura proyectada. Se plantea la construcción de captaciones tipo ladera, las cuales contarán con muros reforzados para darle mayor estabilidad, seguridad, protección y resistencia; frente al empuje de taludes que inciden sobre la estructura. Asimismo, se proyecta una cuneta de coronación con la finalidad de interceptar y conducir adecuadamente las aguas de lluvias, evitando así su paso a las captaciones. Finalmente, los pases aéreos permitirán que las líneas de conducción, aducción y redes de distribución no se vean perjudicadas por los ríos y quebradas encontradas en el trazo.



OBRAS EMBLEMATICAS - HUANCAMELICA

SANEAMIENTO

Nombre de la inversión: 2425138 - REPARACIÓN DE DESAGÜE; EN EL(LA) SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO EN LA LOCALIDAD DE LARAMARCA DISTRITO DE LARAMARCA, PROVINCIA HUAYTARA, DEPARTAMENTO HUANCAMELICA

Estado: B.6.5 Liquidada

Fecha de culminación: 31/03/2021

Beneficiarios: 653

Empleos Generados: 45

Ranking de pobreza: 1,332

Costo del Proyecto: S/ 1'541,508.00

Cambios a la población: Mejoró la calidad de vida a través del consumo de agua potable mediante el tratamiento de la misma, mejorando la captación el almacenamiento, la distribución hasta pie de inmueble y el tratamiento de aguas servidas.



OBRAS EMBLEMATICAS - ICA

SANEAMIENTO

Nombre de la inversión: 2468783 - REHABILITACIÓN RED COLECTORA EN LA CALLE MOSCÚ, AV. PERÚ, AV. LA PAZ, CALLE LOS EUCALIPTOS, CALLE EL CAPULÍ, CALLE LOS FICUS, CALLE LAS CASUARINAS, CALLE LOS TUNOS, AV. PANAMÁ, CALLE LOS ROBLES, CALLE LOS CIPRÉS, CALLE LOS SAUCES, CALLE LOS PINOS, CALLE LOS PRÓCERES, CALLE JOSÉ DE SUCRE, Y CALLE JOSÉ OLIVA DEL DISTRITO DE LA TINGUIÑA , PROVINCIA DE ICA DEPARTAMENTO DE ICA

Estado: B.6.1 Culminada

Fecha de culminación: 30/10/2021

Beneficiarios: 3,440

Empleos Generados: 110

Ranking de pobreza: 1,844

Costo del Proyecto: S/ 3'809,299.00

Cambios a la población: El principal objetivo para la construcción de este proyecto es el de mejorar el servicio recolector de las aguas residuales que vienen de los diversos sectores del Distrito de La Tinguiña, con la finalidad de sanear gran parte del distrito.



OBRAS EMBLEMATICAS – LA LIBERTAD

SANEAMIENTO

Nombre de la inversión: 2410967 - REPARACIÓN DE COLECTOR PRIMARIO Y COLECTOR SECUNDARIO; EN EL(LA) SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD TRUJILLO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Estado: B.6.1 Culminada

Beneficiarios: 198,000

Ranking de pobreza: 1,810

Costo del Proyecto: S/ 3'622,808.94

Empleos Generados: 105

Fecha de culminación: 30/01/2022

Cambios a la población: Se mejoró la calidad de vida, a través de el cambio de colector primario y secundario de aguas servidas con el fin de prevenir riesgos que atenten contra la salud ambiental de la Ciudad de Trujillo.



OBRAS EMBLEMATICAS – LAMBAYEQUE

SANEAMIENTO

Nombre de la inversión: 2410994 - REPARACIÓN DE POZO Y ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES; EN EL(LA) SERVICIOS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD MOCHUMI, DISTRITO DE MOCHUMI, PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE

Estado: B.4.1 En Ejecución de Obra

Beneficiarios: 6,000

Empleos Generados: 117

Ranking de pobreza: 1,315 **Costo del Proyecto:** S/ 4'031,397.50

Cambios a la población: Se viene ejecutando la reparación del pozo y estación de aguas residuales del distrito de Mochumí ya que con las condiciones actuales que presenta estos activos no permiten el adecuado funcionamiento de los pozos, así como la Cámara de Bombeo de Desagüe, no permitiendo el adecuado servicio de agua potable y conducción de aguas residuales.

Al término de esta importante obra el distrito de Mochumí contará con un Sistema eficiente de Agua Potable y Alcantarillado, mejorando la salud de la población beneficiaria.



OBRAS EMBLEMATICAS – LIMA

SANEAMIENTO

Nombre de la inversión: 2472875 - OPTIMIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE CAPTACION "TORNAMEZA" DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE TORNAMEZA, DISTRITO DE SAN BARTOLOME, PROVINCIA DE HUAROCHIRI, DEPARTAMENTO DE LIMA

Estado: B.6.2 Recepcionada

Fecha de culminación: 26/01/2022

Beneficiarios: 500

Empleos Generados: 60

Ranking de pobreza: 1717 **Costo del Proyecto:** S/ 2´068,084.74

Cambios a la población: Proyecto seleccionado por su impacto en la salud de los pobladores del Centro Poblado de Tornamesa.

Se reconstruyó el sistema de agua potable existente que presentaba fisuras en la captación existente, la línea de conducción existente en pésimas condiciones presentando tubería en malas condiciones, el cruce aéreo presentaba socavación en su base y fisuras en su estructura. En el Sistema de Alcantarillado se reconstruyó el emisor colapsado por falta de pendiente, así como la PTAR colapsada por deficiencia de la estructura y terreno.



OBRAS EMBLEMATICAS – PIURA

SANEAMIENTO

Nombre de la inversión: 2410914 - REPARACIÓN DE LAGUNA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, ESTACIÓN DE BOMBEO Y COLECTOR SECUNDARIO; EN EL(LA) SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD PEDREGAL GRANDE, DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA

Estado: B.6.5 Liquidada

Fecha de culminación: 13/02/2021

Beneficiarios: 3,489

Costo del Proyecto: S/ 9'056,984.00

Ranking de pobreza: 1,015

Empleos Generados: 260

Cambios a la población: Proyecto de Saneamiento que se ha ejecutado en una zona que fue directamente afectada por la inundación del año 2017, habiendo quedado destruida la totalidad de las redes de saneamiento, siendo la intervención un proyecto emblemático y de gran trascendencia en el distrito de Catacaos de la Provincia de Piura.



OBRAS EMBLEMATICAS – TUMBES

SANEAMIENTO

Nombre de la inversión: 2434300 - REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LA CALLE BENAVIDES, ENTRE LA INTERSECCIÓN DE LA AV. TUMBES NORTE Y AV. TACNA, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, REGIÓN TUMBES

Estado: B.5.2 Suspendida (por lluvias) **Beneficiarios:** 76,327

Empleos Generados: 108

Costo del Proyecto: S/ 3,714,340.67 **Ranking de pobreza:** 1,751

Cambios a la población: El Sistema de Saneamiento presenta una antigüedad de 30 años, sumado a la inadecuado instalación de las tuberías existentes; estas condiciones hace que se genere inundaciones, mas aún en tiempo de lluvia, colapsa el sistema, por eso la importancia de intervenir.

En ese sentido se inicio la ejecución de obra a fin de Rehabilitar el Sistema de Alcantarillado, con la finalidad de que la población del Distrito de San Jacinto cuenta con un mejor sistema de saneamiento.



OBRAS EMBLEMATICAS - AREQUIPA

PISTAS Y VEREDAS

Nombre de la inversión: 2496314 - REHABILITACION DE LAS CALLES SAN PEDRO CUADRA 01,03,04,05; SIMON BOLIVAR CUADRA 04,05; JORGE CHAVEZ CUADRA 05,06,07,09; GRAU CUADRA 02,05 Y RECONSTRUCCION DE LAS CALLES SIMON BOLIVAR CUADRA 02,07; MARIANO MELGAR CUADRA 05,06,07; JORGE CHAVEZ CUADRA 08; PRESBITERO CUADRA 04,05,06,07; CALLE GRAU CUADRA 04 Y CALLE BOLOGNESI CUADRA 02, EN LA LOCALIDAD DE CABANA CONDE DEL DISTRITO DE CABANA CONDE - PROVINCIA DE CAYLLOMA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

Estado: 5.2. Suspendida (lluvias)

Beneficiarios: 2096

Empleos Generados: 85

Ranking de pobreza: 942

Costo del Proyecto: S/. 2'952,458.00

Cambios a la población: La población se encuentra conforme con la inversión de la reconstrucción de las calles, ejecutada con los siguientes componentes: Revestimiento de Piedra Laja de 4,059.41 m² y la rehabilitación con pavimento emboquillado de 2,965.43m²

Construcción de 1,314.86 m² de vereda

Intervención en 284.5 ml de Alcantarilla



OBRAS EMBLEMATICAS - AYACUCHO

Pistas y Veredas

Nombre de la inversión: 2457058 - CONSTRUCCIÓN DE VIAS VECINALES; EN EL(LA) DE TRAMO 2-811 – JIRON JORGE CHAVEZ DESDE 0+00 HASTA 0+480 / JR. HUAMANPOMA DESDE 0+000 HASTA 0+500 / JR. CENTENARIO DESDE 0+000 HASTA 0+800, DISTRITO DE CABANA - PROVINCIA DE LUCANAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

Estado: B.6.2 Recepcionada

Fecha de culminación: 25/08/2021

Beneficiarios: 437

Empleos Generados: 71

Ranking de pobreza: 615

Costo del Proyecto: S/ 2'438,621.00

Cambios a la población: Mediante el presente proyecto se logró mejorar la articulación vial y optimizar el tiempo de viaje (reducción de tráfico), reducir los costos de operación vehicular, reducir la contaminación y brindar protección en el tránsito peatonal.



OBRAS EMBLEMATICAS - HUANCAMELICA

PISTAS Y VEREDAS

Nombre de la inversión: 2500366 - REHABILITACION DE TRAMO 2-1209 - PUENTE TRANCA 1 DESDE AV. FERNANDO BELAUNDE TERRY HASTA CA. ASTOHUARACA

Estado: B.6.1 Culminada

Fecha de culminación: 18/10/2021

Beneficiarios: 1,157

Empleos Generados: 46

Ranking de pobreza: 1,640

Costo del Proyecto: S/ 1'580,014.00

Cambios a la población: Mejorar la transitabilidad vehicular y peatonal desde la capital de Provincia hacia la región Huancavelica afianzando el intercambio agrícola, artesanal y comercial



OBRAS EMBLEMATICAS – LA LIBERTAD

PISTAS Y VEREDAS

Nombre de la inversión: 2471674: RECONSTRUCCION DE LA AV. LOS PAUJILES TRAMO AV. JUAN PABLO II Y AV. VICTOR LARCO HERRERA, DISTRITO DE TRUJILLO - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

Estado: B.6.2 Recepcionada

Fecha de culminación: 01/01/2022

Beneficiarios: 196,000

Empleos Generados: 62

Ranking de pobreza: 90

Costo del Proyecto: S/ S/ 2,194,957.00

Cambios a la población: Se mejoró los estándares de transitabilidad de la Vía; lo que redundará en el desarrollo económico sustentable al ejecutar el mejoramiento de la Avenida Los Paujiles, ya que se podrán desarrollar planes de inversión pública y privada a fin de promover el crecimiento económico de la zona.



OBRAS EMBLEMATICAS – LAMBAYEQUE

PISTAS Y VEREDAS

Nombre de la inversión: 2429278 - AVANCES DEL PIP: MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CERCADO URBANO EN EL CERCADO Y UNIDADES DE LA CIUDAD DE FERREÑAFE, DISTRITO DE FERREÑAFE, PROVINCIA DE FERREÑAFE

Estado: B.6.5 Liquidada

Fecha de culminación: 10/01/2021

Beneficiarios: 35,936

Empleos Generados: 303

Ranking de pobreza: 1,572

Costo del Proyecto: S/ 10'440,552.97

Cambios a la población: Las calles del cercado de Ferreñafe se encontraban afectados por el FEN 2017, el cual dañó el pavimento, los accesos a las veredas y el sistema de drenaje pluvial, logrando que se Rehabiliten las calles sin pavimentar, mejorando la transitabilidad vehicular, el acceso peatonal de la ciudad, el sistema de drenaje pluvial del sistema vial, y el paisajismo urbanístico de ciudad; siendo los beneficiarios directos de este proyecto los habitantes y los transeúntes que visitan a diario la ciudad de Ferreñafe.



OBRAS EMBLEMATICAS – LIMA

PISTAS Y VEREDAS

Nombre de la inversión: 2396626 - MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AV. QUINTA AVENIDA, TRAMO: AV. LAURELES - AV. LAS TORRES - Y EN LA AV. LOS LAURELES, TRAMO: AUTOPISTA RAMIRO PRIALÉ – RIO HUAYCOLORO, DISTRITO DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA – LIMA

Estado: B.6.2 Recepcionada

Fecha de culminación: 30/12/2020

Beneficiarios: 335,330

Empleos Generados: 664

Ranking de pobreza: 1,507

Costo del Proyecto: S/ 22'904,306.00

Cambios a la población: Proyecto seleccionado por el monto de inversión, extensión de pavimento y veredas lo cual genera un impacto social - económico en el distrito de Lurigancho. El mejoramiento de las Av. Los Laureles y la Av. Quinta dieron como resultado la ejecución de Pistas (45,775.24 m²) y Veredas (15,557.20 m²) en cifras totales. La rehabilitación de dichas avenidas permitió la mejor transitabilidad de los vehículos hacia 2 puntos principales. la Av. La Quinta hacia la Av. Las Torres y la Av. Los Laureles que conecta con la Av. Ramiro Prialé, así como el cambio de imagen en dichas avenidas y zonas aledañas.



OBRAS EMBLEMATICAS – LIMA

PISTAS Y VEREDAS

Nombre de la inversión: 2498581 - RECONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AV. LAS TORRES TRAMO DESDE LA AV. CIRCUNVALACIÓN HASTA LA ALTURA DE LA QUINTA AV., L= 1.99 KM DISTRITO DE LURIGANCHO CHOSICA, LIMA – LIMA

Estado: En ejecución

Beneficiarios: 275,000

Empleos Generados: 391

Ranking de pobreza: 1,507

Costo del Proyecto: S/ 13'471,617

Cambios a la población: El mejoramiento urbano (principalmente con pavimento 20,854.39 m², vereda 12,496.26 m², canal y vertedero 2,432.54 m² y otros), mejoramiento del tránsito vehicular y peatonal en menor tiempo. Por un extremo conecta con el otro tramo de la Av. Las Torres (Primera etapa ejecutado por MML) y por el otro con la autopista Ramiro Prialé y la Carretera Central. Este proyecto en conjunto con otros proyectos financiados con el FONDES realizan un cambio estructural en las vías del distrito de Lurigancho Chosica afectados por el Fenómeno



OBRAS EMBLEMATICAS – PIURA

PISTAS Y VEREDAS

Nombre de la inversión: 2519417 - “REHABILITACIÓN DE CALLES JUNIN, CUZCO, AREQUIPA, TACNA, LIBERTAD, LIMA, MOQUEGUA, APURIMAC, AYACUCHO, HUANCVELICA, AV. MIGUEL GRAU, ICA, CALLAO Y HUANUCO DEL DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA- DEPARTAMENTO DE PIURA”

Estado: B.4.1 En Ejecución

Beneficiarios: 159,864

Empleos Generados: 221

Ranking de pobreza: 1,734

Costo del Proyecto: S/ 7,666,585.00

Cambios a la población: La intervención contempla el mejoramiento de las vías principales del centro histórico de la ciudad de Piura, las cuales se vieron afectadas por la inundación ocasionada por el desborde del río Piura. El proyecto contempla el mejoramiento de la infraestructura urbana del centro de la ciudad tales como pavimentos, veredas, rampas y señalización peatonal y vehicular.



OBRAS EMBLEMATICAS – TUMBES

PISTAS Y VEREDAS

Nombre de la inversión: 2496045 - REHABILITACIÓN DE LOS TRAMOS: 1-39, 1-40 AVENIDA GRAU; 1-41 CALLE HORACIO PATIÑO; 1-42 AVENIDA TUPAC AMARU, EN EL DISTRITO DE SAN JACINTO, PROVINCIA DE TUMBES, REGION TUMBES

Estado: B.6.1 En ejecución

Empleos Generados: 32

Ranking de pobreza: 1699

Costo del Proyecto: S/ 5,866,529.81

Cambios a la población: Las lluvias y otros fenómenos naturales han ocasionado daños a las diferentes calles y avenidas en sus diferentes tipos de pavimento, por ello el objetivo de la intervención es el Mejoramiento del Servicio de Infraestructura Pública Vial y/o Ornato Público



% DE INTERVENCIONES POR REGION DE LA DISVCS

REGIÓN	NO FINANCIADAS	FINANCIADAS	TOTAL	% FINANCIADAS	CULMINADAS	% CULMINADAS
ANCASH	220	529	749	70.63%	422	56.34%
AREQUIPA	159	198	357	55.46%	103	28.85%
AYACUCHO	61	353	414	85.27%	279	67.39%
CAJAMARCA	284	902	1,186	76.05%	792	66.78%
HUANCAVELICA	42	398	440	90.45%	360	81.82%
ICA	19	88	107	82.24%	79	73.83%
JUNIN	2		2	0.00%		0.00%
LA LIBERTAD	88	482	570	84.56%	436	76.49%
LAMBAYEQUE	205	452	657	68.80%	299	45.51%
LIMA	254	575	829	69.36%	455	54.89%
LORETO	3	26	29	89.66%	22	75.86%
PIURA	275	697	972	71.71%	480	49.38%
TUMBES	30	77	107	71.96%	53	49.53%
Total	1,642	4,777	6,419	74.42%	3,780	58.89%

¿Cuáles son los retos?

- Contar con tres mil novecientos dieciséis (3,916) intervenciones culminadas, lo que representa el 60% del total de intervenciones del Plan de la Reconstrucción con Cambios en los sectores de Saneamiento y Pistas y Veredas.
- Cerrar el financiamiento total de las intervenciones de las regiones de HUANCAVELICA, LORETO, AYACUCHO, LA LIBERTAD e ICA.
- Culminar la atención de las necesidades de saneamiento y pistas y veredas, en el marco del PIRCC, de las Entidades Ejecutoras de los cien (100) distritos más pobres del país, ubicados en las regiones de CAJAMARCA, AYACUCHO Y LA LIBERTAD.
- Superar la interrupción de los canales de comunicación físicos, reforzando las mesas técnicas para brindar una asistencia bien cercana a la entidad.



INTERVENCIONES CUYA EJECUCIÓN SE ENCUENTRAN A CARGO DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

COMPONENTE SOLUCIONES DE VIVIENDA

- La DISVCS realiza el seguimiento del componente Soluciones de Vivienda cuya ejecución se encuentra a cargo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
- El MVCS, al 28 de febrero de 2022, ha reportado un total de **33,711** viviendas **atendibles** de un total de **48,961** que forman parte del PIRCC, que engloba a las viviendas urbanas y rurales. A febrero 2022, el MVCS ha reportado un avance del **70%** de viviendas ejecutadas (23,732), respecto del número de viviendas atendibles.
- No obstante, la ARCC ha solicitado información desagregada de cada vivienda, encontrando inconsistencias las cuales han sido comunicadas al MVCS.

Región	N° viviendas PIRCC	N° viviendas atendibles (*)	Viviendas ejecutadas a Febrero 2022
ANCASH	3,137	1,580	1,156
AREQUIPA	2,175	413	183
AYACUCHO	78	16	1
CAJAMARCA	352	237	160
HUANCAVELICA	1,190	318	318
ICA	539	139	120
LA LIBERTAD	5,419	3,229	2,022
LAMBAYEQUE	17,264	13,864	10,439
LIMA	2,468	1,118	514
LORETO	150	90	0
PIURA	16,107	12,634	8,781
TUMBES	82	73	38
Total	48,961	33,711	23,732

(*) Las viviendas atendibles y no atendibles son variables según los procedimientos internos del MVCS

Viviendas Urbanas

El MVCS ha reportado un total de **27 809** viviendas urbanas atendibles de 41 741 viviendas urbanas de forman parte del PIRCC. A febrero 2022 se tiene un avance del **64%** de viviendas ejecutadas respecto del número de viviendas atendibles.

Región	Nº Viviendas PIRCC	Nº Viviendas atendibles	2018	2019	2020	2021	2022	Total
ANCASH	2,335	1,005	222	262	75	22	-	581
AREQUIPA	2,162	413	-	136	45	-	2	183
AYACUCHO	68	15	-	-	-	-	-	-
CAJAMARCA	260	145	-	65	-	3	-	68
HUANCAVELICA	701	12	-	-	-	12	-	12
ICA	425	66	-	49	1	-	-	50
LA LIBERTAD	4,816	2,715	700	527	136	146	-	1,509
LAMBAYEQUE	12,657	10,073	3,480	2,513	412	281	-	6,686
LIMA	2,392	1,076	222	239	-	12	-	473
LORETO	146	90	-	-	-	-	-	-
PIURA	15,699	12,126	4,747	2,473	504	461	88	8,273
TUMBES	80	73	-	25	2	11	-	38
Total	41,741	27,809	9,371	6,289	1,175	948	90	17,873

Se ejecutaron S/ 411.8 millones en las 12 regiones afectados por el FEN


Viviendas Rurales

El MVCS ha reportado un total de **5 902** viviendas rurales atendibles. A febrero 2022 se tiene un avance del **99%** respecto del número de viviendas atendibles.

Región	Nº Viviendas PIRCC	Nº Viviendas atendibles	2018	2019	2020	2021	Total
ANCASH	802	575	104	154	218	99	575
AREQUIPA	13	-	-	-	-	-	0
AYACUCHO	10	1	-	-	1	-	1
CAJAMARCA	92	92	18	1	73	-	92
HUANCAVELICA	489	306	69	-	177	60	306
ICA	114	73	-	65	-	5	70
LA LIBERTAD	603	514	19	233	224	37	513
LAMBAYEQUE	4,607	3,791	35	3,500	194	24	3,753
LIMA	76	42	-	-	26	15	41
LORETO	4	-	-	-	-	-	0
PIURA	408	508	105	47	356	-	508
TUMBES	2	-	-	-	-	-	0
Total	7,220	5,902	350	4,000	1,269	240	5,859

Se ejecutaron S/ 169.8 millones en las 12 regiones afectados por el FEN

Planes Urbanos

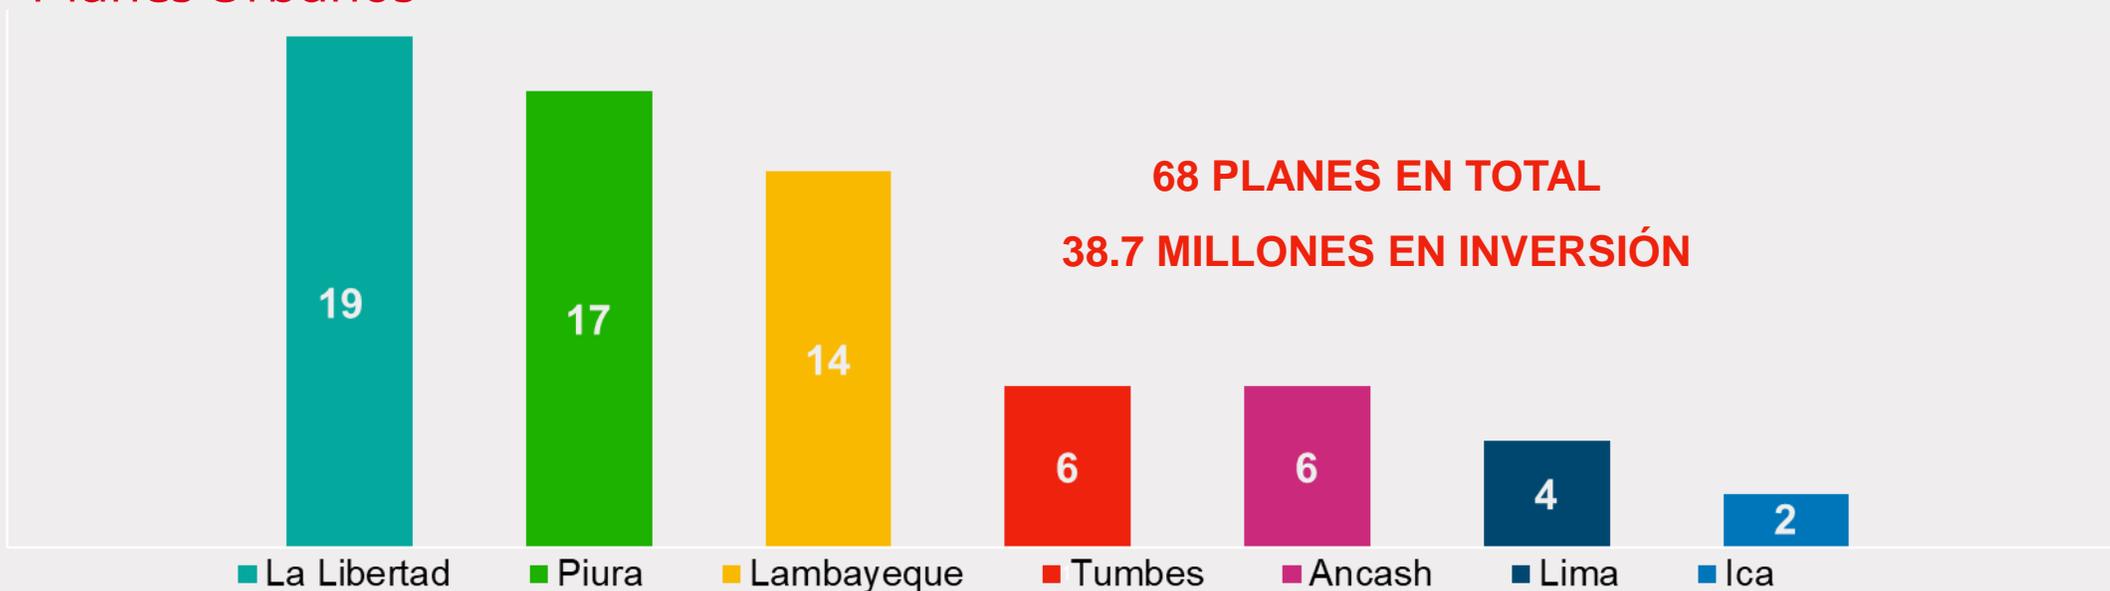

Región	PROGRAMADO				Beneficiarios	EJECUTADO				PENDIENTE				AVANCE
	PAT	PDM	PDU	TOTAL		PAT	PDM	PDU	TOTAL	PAT	PDM	PDU	TOTAL	
Piura	5	1	11	17	2,575,649	5	1	11	17	-	-	-	-	100%
Tumbes	2	-	4	6	315,821	2	-	4	6	-	-	-	-	100%
La Libertad	6	1	12	19	2,585,093	6	1	12	19	-	-	-	-	100%
Lambayeque	3	1	10	14	2,115,947	2	-	5	7	1	1	5	7	50%
Ancash	3	-	3	6	1,051,856	3	-	3	6	-	-	-	-	100%
Lima	2	-	2	4	404,136	2	-	2	4	-	-	-	-	100%
Ica	1	-	1	2	736,230	1	-	1	2	-	-	-	-	100%
TOTAL	22	3	43	68	9,784,732	21	2	38	61	1	1	5	7	90%

COMPONENTE RECONSTRUCCIÓN

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), en su calidad de entidad ejecutora, tiene a su cargo la implementación de 758 intervenciones del componente **Reconstrucción** correspondientes a los sectores de “saneamiento” y “pistas y veredas” las cuales se implementan a través del Programa Nacional de Saneamiento Urbano-PNSU, del Programa Nacional de Saneamiento Rural- PNSR y del Programa de Mejoramiento Integral de Barrios –PMIB, según el siguiente detalle:

Estado situacional	N° de Proyectos/Actividades	N° de Intervenciones
PMIB	4	20
PNSR	218	222
PNSU	443	516
Total general	665	758

Estado situacional - MVCS a Febrero 2022

Respecto del componente Reconstrucción, se informa que, 696 intervenciones cuentan con financiamiento y 62 intervenciones no se encuentran financiadas hasta el momento. Se precisa que nueve (9) de ellas ya cuentan con opinión técnica favorable de la DISVCS para su financiamiento y se encuentran a la espera de los recursos correspondientes.

Estado situacional	N° de Proyectos/Actividades	N° de Intervenciones
Pendiente de Financiar	20	62
<i>Sin financiamiento para ejecución</i>	<i>17</i>	<i>53</i>
Con Opinión favorable de la DISVCS	3	9
Financiadas	645	696
Elaboración de ET - Concurso Oferta	4	7
Actos Pre Operativa - NER	75	75
En ejecución de obra	15	16
Obra con contrato resuelto	11	32
Obra suspendida	40	43
Obra culminada	213	219
Obra recepcionada	126	129
Obra liquidada	161	175
Total	665	758

Estado situacional - MVCS a Febrero 2022

Para una mejor comprensión, se detalla el estado situacional de dichas intervenciones agrupados por cada uno de los programas del MVCS a cargo de los diversos proyectos:

Estado situacional	N° de Proyectos	N° de Intervenciones
PMIB	4	20
CONTRATO RESUELTO	3	19
RECEPCIONADA	1	1
PNSR	218	222
CONTRATO RESUELTO	3	3
SUSPENDIDO	1	1
CULMINADO	4	4
RECEPCIONADA	62	62
LIQUIDADO	148	152
PNSU	443	516
SIN SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO	17	53
CON OPINIÓN FAVORABLE DE LA ARCC	3	9
ELABORACIÓN DE ET CO/CONTRATADO	4	7
ETAPA PRE OPERATIVA - NER	75	75
EN EJECUCION DE OBRA	15	16
CONTRATO RESUELTO	5	10
SUSPENDIDO	39	42
CULMINADO	209	215
RECEPCIONADA	63	66
LIQUIDADO	13	23
Total general	665	758

Detalle de intervenciones por Regiones

REGIONES SEGÚN ESTADOS

ANCASH

Sector	1. Pendientes	2. Estudios Financiados	3. Asistencia Técnica	4. Evaluación	5. En proceso de selección	6. Ejecución	7. Culminados	TOTAL
PISTAS Y VEREDAS			40	21	3	69	194	327
SANEAMIENTO	2	4	79	74	8	27	228	422
TOTAL	2	4	119	95	11	96	422	749

Provincia	1. Pendientes	2. Estudios Financiados	3. Asistencia Técnica	4. Evaluación	5. En proceso de selección	6. Ejecución	7. Culminados	TOTAL
AIJA				3	3		21	27
ANTONIO RAYMONDI				5		9	12	26
ASUNCION			1			1	1	3
BOLOGNESI			3	8			24	35
CARHUAZ			1			2	31	34
CARLOS FERMIN FITZCARRALD				4		1	8	13
CASMA			16	11	2	4	18	51
CORONGO			3				8	11
HUARAZ			9	8	2	8	43	70
HUARI	1	1	11	1			20	34
HUARMEY			18	4		14	37	73
HUAYLAS			6	4		5	23	38
MARISCAL LUZURIAGA			10	8		15	22	55
OCROS	1		1	9		7	22	40
PALLASCA			10	1		1	18	30
POMABAMBA			3	6		13	18	40
RECUAY		1		3		3	21	28
SANTA		2	10	6	4	8	49	79
SIHUAS			5	7		4	23	39
YUNGAY			12	7		1	3	23
TOTAL	2	4	119	95	11	96	422	749

REGIONES SEGÚN ESTADOS

AREQUIPA

Sector	1. Pendientes	2. Estudios Financiados	3. Asistencia Técnica	4. Evaluación	5. En proceso de selección	6. Ejecución	7. Culminados	TOTAL
PISTAS Y VEREDAS			55	26	28	53	85	247
SANEAMIENTO		1	47	30		14	18	110
TOTAL		1	102	56	28	67	103	357

Provincia	1. Pendientes	2. Estudios Financiados	3. Asistencia Técnica	4. Evaluación	5. En proceso de selección	6. Ejecución	7. Culminados	TOTAL
AREQUIPA			22	23		10	31	86
CAMANA						1		1
CARAVELI			15	2			4	21
CASTILLA		1	20	14	28	1	40	104
CAYLLOMA			34	7		27	17	85
CONDESUYOS			2	4		19	3	28
ISLAY			2					2
LA UNION			7	6		9	8	30
Total	0	1	102	56	28	67	103	357

REGIONES SEGÚN ESTADOS

AYACUCHO

Sector	1. Pendientes	2. Estudios Financiados	3. Asistencia Técnica	4. Evaluación	5. En proceso de selección	6. Ejecución	7. Culminados	TOTAL
PISTAS Y VEREDAS			15	4	1	44	114	178
SANEAMIENTO			15	27	15	14	165	236
TOTAL	0	0	30	31	16	58	279	414

Provincia	1. Pendientes	2. Estudios Financiados	3. Asistencia Técnica	4. Evaluación	5. En proceso de selección	6. Ejecución	7. Culminados	TOTAL
CANGALLO				2			27	29
HUAMANGA			4			6	6	16
HUANCA SANCOS							8	8
HUANTA			3	3		1	26	33
LA MAR						2	31	33
LUCANAS			18	21	11	11	69	130
PARINACOCHAS				2		19	16	37
PAUCAR DEL SARA SARA			5	2	5	8	17	37
SUCRE						4	13	17
VICTOR FAJARDO				1		7	60	68
VILCAS HUAMAN							6	6
Total	0	0	30	31	16	58	279	414

REGIONES SEGÚN ESTADOS

CAJAMARCA

Sector	1. Pendientes	2. Estudios Financiados	3. Asistencia Técnica	4. Evaluación	5. En proceso de selección	6. Ejecución	7. Culminados	TOTAL
PISTAS Y VEREDAS			32	28	2	45	406	513
SANEAMIENTO	8	5	117	94	13	50	386	673
TOTAL	8	5	149	122	15	95	792	1186

Provincia	1. Pendientes	2. Estudios Financiados	3. Asistencia Técnica	4. Evaluación	5. En proceso de selección	6. Ejecución	7. Culminados	TOTAL
CAJABAMBA			7	2		6	48	63
CAJAMARCA			10	16	2	5	66	99
CELENDIN			18	22		28	45	113
CHOTA		1	17	5	4	20	148	195
CONTUMAZA			15	27	4	3	52	101
CUTERVO			15	11		3	156	185
HUALGAYOC			6	3	1		5	15
JAEN			12	7		7	75	101
SAN IGNACIO			1			2	33	36
SAN MARCOS			5	8		4	33	50
SAN MIGUEL	8		23	8	3	7	77	126
SAN PABLO			3			3	27	33
SANTA CRUZ		4	17	13	1	7	27	69
TOTAL	8	5	149	122	15	95	792	1186

REGIONES SEGÚN ESTADOS

HUANCAVELICA

Sector	1. Pendientes	2. Estudios Financiados	3. Asistencia Técnica	4. Evaluación	5. En proceso de selección	6. Ejecución	7. Culminados	TOTAL
PISTAS Y VEREDAS			2		1	8	126	137
SANEAMIENTO			19	21	4	25	234	303
TOTAL	0	0	21	21	5	33	360	440

Provincia	1. Pendientes	2. Estudios Financiados	3. Asistencia Técnica	4. Evaluación	5. En proceso de selección	6. Ejecución	7. Culminados	TOTAL
ACOBAMBA							24	24
ANGARAES			3	4	1	4	53	65
CASTROVIRREYNA			6	3		13	85	107
CHURCAMP			1	3			37	41
HUANCAVELICA			9	10	1	5	25	50
HUAYTARA			2	1	3	9	120	135
TAYACAJA						2	16	18
Total	0	0	21	21	5	33	360	440

REGIONES SEGÚN ESTADOS

ICA

Sector	1. Pendientes	2. Estudios Financiados	3. Asistencia Técnica	4. Evaluación	5. En proceso de selección	6. Ejecución	7. Culminados	TOTAL
PISTAS Y VEREDAS			1	2		1	12	16
SANEAMIENTO			10	6		8	67	91
TOTAL	0	0	11	8	0	9	79	107

Provincia	1. Pendientes	2. Estudios Financiados	3. Asistencia Técnica	4. Evaluación	5. En proceso de selección	6. Ejecución	7. Culminados	TOTAL
CHINCHA			4	4		2	11	21
ICA			4	1		1	49	55
NASCA			2				3	5
PALPA				3		6	12	21
PISCO			1				4	5
Total	0	0	11	8	0	9	79	107

REGIONES SEGÚN ESTADOS

JUNIN

Sector	1. Pendientes	2. Estudios Financiados	3. Asistencia Técnica	4. Evaluación	5. En proceso de selección	6. Ejecución	7. Culminados	TOTAL
SANEAMIENTO			2					2
PISTAS Y VEREDAS								0
TOTAL	0	0	2	0	0	0	0	2

Provincia	1. Pendientes	2. Estudios Financiados	3. Asistencia Técnica	4. Evaluación	5. En proceso de selección	6. Ejecución	7. Culminados	TOTAL
SATIPO			2					2
TOTAL	0	0	2	0	0	0	0	2

REGIONES SEGÚN ESTADOS

LA LIBERTAD

Sector	1. Pendientes	2. Estudios Financiados	3. Asistencia Técnica	4. Evaluación	5. En proceso de selección	6. Ejecución	7. Culminados	TOTAL
PISTAS Y VEREDAS			12	8		3	258	281
SANEAMIENTO	2		40	26	4	39	178	289
TOTAL	2	0	52	34	4	42	436	570

Provincia	1. Pendientes	2. Estudios Financiados	3. Asistencia Técnica	4. Evaluación	5. En proceso de selección	6. Ejecución	7. Culminados	TOTAL
ASCOPE			4	5	1	2	104	116
BOLIVAR			6	4			5	15
CHEPEN			11	8	1		29	49
GRAN CHIMU			6	3		20	17	46
JULCAN							4	4
OTUZCO			5	4	2	3	23	37
PACASMAYO			8				43	51
PATAZ			2	1		7	81	91
SANCHEZ CARRION				1		2	35	38
SANTIAGO DE CHUCO	2		1			4	41	48
TRUJILLO			6	5		2	48	61
VIRU			3	3		2	6	14
TOTAL	2	0	52	34	4	42	436	570

REGIONES SEGÚN ESTADOS

LAMBAYEQUE

Sector	1. Pendientes	2. Estudios Financiados	3. Asistencia Técnica	4. Evaluación	5. En proceso de selección	6. Ejecución	7. Culminados	TOTAL
PISTAS Y VEREDAS			38	41	14	79	231	403
SANEAMIENTO	2	25	62	37	27	33	68	254
TOTAL	2	25	100	78	41	112	299	657

Provincia	1. Pendientes	2. Estudios Financiados	3. Asistencia Técnica	4. Evaluación	5. En proceso de selección	6. Ejecución	7. Culminados	TOTAL
CHICLAYO		4	27	51	29	53	183	347
FERREÑAFE		2	18	7		26	57	110
LAMBAYEQUE	2	19	55	20	12	33	59	200
TOTAL	2	25	100	78	41	112	299	657

REGIONES SEGÚN ESTADOS

LIMA

Sector	1. Pendientes	2. Estudios Financiados	3. Asistencia Técnica	4. Evaluación	5. En proceso de selección	6. Ejecución	7. Culminados	TOTAL
PISTAS Y VEREDAS			91	20		80	299	490
SANEAMIENTO	2		84	57	2	38	156	339
TOTAL	2	0	175	77	2	118	455	829

Provincia	1. Pendientes	2. Estudios Financiados	3. Asistencia Técnica	4. Evaluación	5. En proceso de selección	6. Ejecución	7. Culminados	TOTAL
BARRANCA			18	1		1	10	30
CAJATAMBO			2	1			13	16
CANTA			6	6		7	40	59
CAÑETE			7	8		13	63	91
HUARAL			5	5		15	29	54
HUAROCHIRI	2		90	25	1	31	140	289
HUAURA			9	7		1	25	42
LIMA			23	9		16	37	85
OYON			2	5		2	20	29
YAUAYOS			13	10	1	32	78	134
TOTAL	2	0	175	77	2	118	455	829

REGIONES SEGÚN ESTADOS

LORETO

Sector	1. Pendientes	2. Estudios Financiados	3. Asistencia Técnica	4. Evaluación	5. En proceso de selección	6. Ejecución	7. Culminados	TOTAL
PISTAS Y VEREDAS			3		2	1	22	28
SANEAMIENTO						1		1
TOTAL	0	0	3	0	2	2	22	29

Provincia	1. Pendientes	2. Estudios Financiados	3. Asistencia Técnica	4. Evaluación	5. En proceso de selección	6. Ejecución	7. Culminados	TOTAL
ALTO AMAZONAS					2			2
REQUENA			3				13	16
UCAYALI						2	9	11
TOTAL	0	0	3	0	2	2	22	29

REGIONES SEGÚN ESTADOS

PIURA

Sector	1. Pendientes	2. Estudios Financiados	3. Asistencia Técnica	4. Evaluación	5. En proceso de selección	6. Ejecución	7. Culminados	TOTAL
PISTAS Y VEREDAS			50	31	3	99	225	408
SANEAMIENTO		39	83	72	21	94	255	564
TOTAL	0	39	133	103	24	193	480	972

Provincia	1. Pendientes	2. Estudios Financiados	3. Asistencia Técnica	4. Evaluación	5. En proceso de selección	6. Ejecución	7. Culminados	TOTAL
AYABACA			17	14	13	75	139	258
HUANCABAMBA			10	12	3	34	74	133
MORROPON		1	23	36	2	28	83	173
PAITA			14	8	1	16	28	67
PIURA		23	33	23		24	44	147
SECHURA		1	6	6	1	7	28	49
SULLANA			8	2		1	80	91
TALARA		14	22	2	4	8	4	54
TOTAL	0	39	133	103	24	193	480	972

REGIONES SEGÚN ESTADOS

TUMBES

Sector	1. Pendientes	2. Estudios Financiados	3. Asistencia Técnica	4. Evaluación	5. En proceso de selección	6. Ejecución	7. Culminados	TOTAL
PISTAS Y VEREDAS			4	3	2	19	44	72
SANEAMIENTO		1	10	12		3	9	35
TOTAL	0	1	14	15	2	22	53	107

Provincia	1. Pendientes	2. Estudios Financiados	3. Asistencia Técnica	4. Evaluación	5. En proceso de selección	6. Ejecución	7. Culminados	TOTAL
CONTRALMIRANTE VILLAR				4		1		5
TUMBES			11	9	2	21	27	70
ZARUMILLA		1	3	2			26	32
TOTAL	0	1	14	15	2	22	53	107



PERÚ

Autoridad para la
Reconstrucción con Cambios



Siempre
con el **pueblo**
