



PERÚ

Autoridad para la  
Reconstrucción con Cambios



Presentación para Comisión Reconstrucción del Congreso

# Reconstrucción con Cambios en La Libertad

---

Trujillo, Octubre 2022



# 1. Avance de las Soluciones Integrales en La Libertad - ARCC


Proyecto	N° interv.	Monto Viable (S/ millones)	Monto Contrato (Presupuesto estimado S/ millones)	Estado Actual
Defensas Ribereñas	4	358.0	530.4	<b>Río Chicama (2 PI):</b> Diseño y Ejecución de Obra (FC 06.21; hito proyectado 04.2025) Avance de diseño al 50% (mayo 2023) Inicio de obra: 12.2022
		322.0		<b>Río Virú (2 PI):</b> Diseño y Ejecución de Obra (FC 06.21; hito proyectado 04.2024) Avance de diseño al 50% Inicio de obra: 01. 2023
Quebradas	3	222.0	363.6	<b>Quebrada San Idelfonso:</b> Diseño y Ejecución de Obra (FC 04.21; hito proyectado 06.2024) Avance de diseño al 90% (noviembre 2022) En ejecución Obra (Diques transversales):avance10%
		230.0		<b>QuebradaSanCarlos:</b> Diseño y Ejecución de Obra (FC 04.21; hito proyectado 11.2023) Avance de diseño al 90% Inicio de Obra (Diques transversales): 10.2022
		547.0		<b>Quebrada El León:</b> Diseño y Ejecución de Obra(FC Hito 06.21; proyectado a 06.2024) Avance de diseño al 90% Inicio de Obra: 10.2022
Infraestructura Natural	1	52.0	7.1	<b>Río Chicama (NEC Opción A 2 etapas):</b> Etapa 1 Diseño: (FC 09.22; hito proyectado 04.2023) Etapa 2 ejecución: Hito : 06.2027; sujeta a cierre de etapa 1y evaluación de ARCC.
Drenaje Pluvial Trujillo	1	427.0	-	Etapa de Procura: Se estima adjudicar: <b>Diciembre2022</b> Inicio de <b>diseño:</b> Diciembre 2022 (18 meses)

<b>Total</b>	<b>2,158</b>	<b>1,374.4</b>
--------------	--------------	----------------

- Contratos de Ríos, Quebradas y Drenajes son Opción F (Reembolsable).
- Contrato de SAT e Infraestructura Natural son Opción A
- Avance financiero : 21% (incluye adelantos)

# Sistema de Alerta Temprana (SAT)

Proyecto	Ámbito	Monto Contrato S/	Estado Actual
<p><b>Primera Etapa (Grupo 1)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 03 estudios definitivos del Grupo 01 para la Región de la Libertad</li> <li>• Diseño Nacional (19 PI) - Estudios definitivos (11 ET) -&gt; 10 SAT</li> <li>• Plan de liberación de Áreas (Identificación)</li> <li>• Dos radares meteorológicos (Piura, Ica)</li> </ul>	Viru (2) San Idelfonso	<b>4,161,870.43 (*)</b>	<p>Avance de Diseño: 95%</p> <p>Aceptación de Diseño: Noviembre 2022</p>
<b>Total</b>		<b>4,161,870.43</b>	

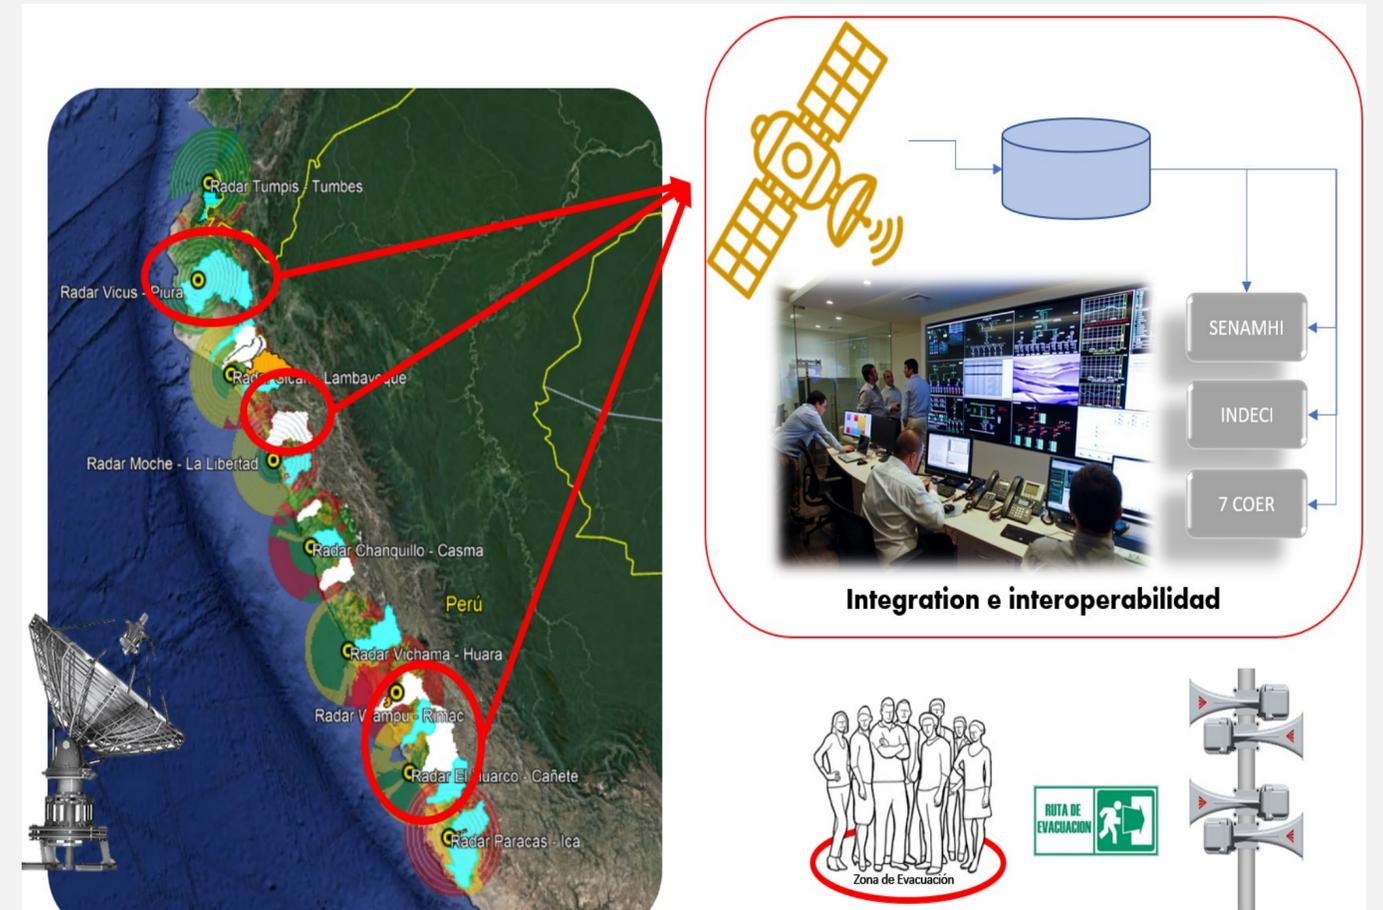

(\*) Se ha suscrito un contrato multiregional; el monto corresponde a una proporción de contrato (US\$ \$ 8,393,980.50) por TC s/ 4.103 x US\$.)

# San Idelfonso: Avance de obras




PERÚ

Autoridad para la  
Reconstrucción con Cambios

con el pueblo

# 1. Avance de las Soluciones Integrales en La Libertad – Otras Entidades Ejecutoras

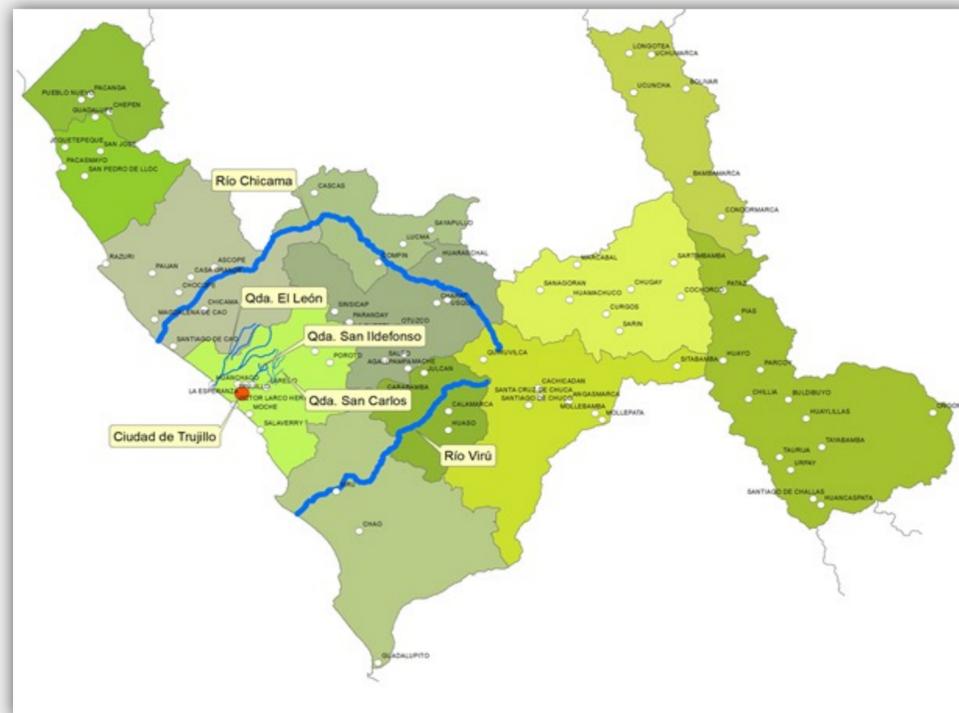

Soluciones Integrales Intervenciones	Entidad Ejecutora	Monto de Inversión del proyecto S/	Estado Actual - Comentarios
<b>14.Solución integral quebrada San Ildefonso</b>			
14.1 Delimitación y Monumentación de la faja marginal de la quebrada San Ildefonso	ANA	148,522.00	Actividad (Monumentación)
<b>15.Solución integral quebrada De León</b>			
15.1 Delimitación y Monumentación de la faja marginal de la quebrada De León	ANA	207,151.00	Actividad de delimitación y Monumentación de faja a cargo de ANA
<b>16.Solución integral quebrada San Carlos</b>			
16.1 Delimitación y Monumentación de la faja marginal de la quebrada San Carlos	ANA	78,995.00	Actividad de delimitación y Monumentación de faja a cargo de ANA
<b>17.Solución integral río Chicama</b>			
17.1. Creación del servicio de protección en riberas del río Chicama, vulnerable ante el peligro de inundación en el sector Galaxia – Pampa Hermosa, distrito de Chicama – provincia de Ascope – departamento de La Libertad.	Muni Provincial De Ascope	22,579,663.53	Culminado al 100% Meta: enrocado 4.6 km
17.2. Creación del servicio de protección en riberas del río Chicama, vulnerable ante el peligro de inundación en los sectores de Puente Victoria aguas abajo, Alayo y Paijan – Facala – Distrito de Chicama – Provincia de Ascope – Departamento de La Libertad.	Muni Provincial De Ascope	18,560,168.89	Culminado al 100% Meta: enrocado 5.4 km
17.3 Delimitación y Monumentación de la faja marginal del río Chicama	ANA		En ejecución al 60%
<b>18.Solución integral río Virú</b>			
18.1. Creación del servicio de protección en riberas del río Virú, vulnerable ante el peligro de inundación en los sectores Zaraqque, toma Santa Clara, toma Carmelo, María Laura, distrito de Virú – provincia de Virú – departamento de La Libertad.	GORE La Libertad	-	Gore La Libertad cuenta con ET, se coordina para incluir en el proyecto de solución integral. meta: 4.61 km enrocado por sectores
18.2 Delimitación y Monumentación de la faja marginal del río Virú	ANA	171,784.00	Actividad de delimitación y Monumentación de faja a cargo de ANA

## 8 Intervenciones

3

PIP(defensas ribereñas)

2 Proyectos culminados

1 para financiar o excluir

5

Activ. Fajas marginales

- 3 culminadas
- 2 en ejecución



PERÚ

Autoridad para la Reconstrucción con Cambios

Fuente: Dirección de Soluciones Integrales al 30.09.2022  
Elaboración: PMO ARCC




## 2. Estado situacional del PIRCC en La Libertad

- **PIRCC para La Libertad:** S/ 4,286 millones que corresponden a 1,239 obras de reconstrucción y 24 intervenciones de soluciones integrales.
- **Avance financiero:** se ha ejecutado el **77%** del monto financiado.

### Plan, financiamiento y Ejecución acumulada

(En millones de soles)

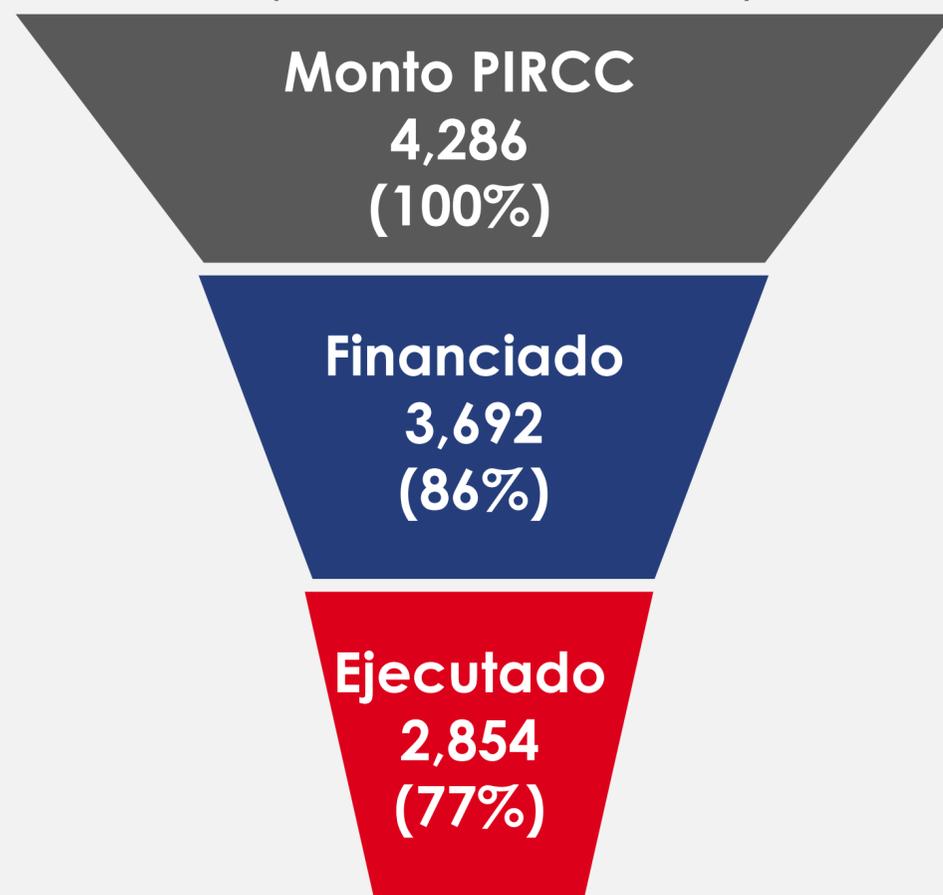

### Financiamiento y ejecución acumulada de los 3 Niveles de Gobierno y ARCC

(En millones de soles)

Nivel de Gobierno	Financiado	Ejecutado	Avance%
Nacional	624	440	71%
Regional	242	161	67%
Local	2,103	1,736	83%
ARCC	723	517	72%



PERÚ

Autoridad para la  
Reconstrucción con Cambios

Fuente: Monitor ARCC al 30.09.2022  
Elaboración: PMO ARCC



## 2. Avance físico al 2022 en La Libertad

### Estado de intervenciones a cargo de la ARCC (Número de intervenciones)

Sector	Educación	Salud	Soluciones Integrales	Total
<b>Culminado</b>	4	-	-	4
<b>En ejecución</b>	4	1	11	16
<b>En proceso de contratación</b>	-	-	1	1
<b>Con estudios financiados</b>	-	-	2	2
<b>Asistencia Técnica</b>	-	-	2	2
<b>Total</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>16</b>	<b>25</b>

### Estado de intervenciones a cargo de las Entidades Ejecutoras de los 3 niveles de Gobierno (Número de intervenciones)

Sector	Vivienda	Agricultura <sup>/1</sup>	Educación	Salud	Transportes <sup>/2</sup>	Total	Viviendas (Casas)
<b>Culminado</b>	465	103	200		119	<b>887</b>	2,212
<b>En ejecución</b>	16	28	38	1	34	<b>117</b>	1,017
<b>En proceso de contratación</b>	38	6	38	3	35	<b>120</b>	
<b>Por financiar</b>	37	30	7	17	17	<b>116</b>	
<b>Total</b>	<b>564</b>	<b>167</b>	<b>283</b>	<b>21</b>	<b>205</b>	<b>1,240</b>	<b>3,229</b>

Nota: El total de viviendas(casas)corresponden a las identificadas por el MVCS como atendibles del total identificado inicialmente en el PIRCC (5,419).

1/ Incluye 10 proyectos de soluciones integrales a cargo de los tres niveles de gobierno.

2/ Incluye una intervenciones del sector defensa

Fuente: Direcciones Sectoriales y Monitor ARCC al 30.09.2022

Elaboración : PMO - ARCC



PERÚ

Autoridad para la  
Reconstrucción con Cambios



## 2. Avance de ejecución del año 2022 por nivel de gobierno

- Para 2022, la región La Libertad tiene un **PIM de S/1,135 millones**, donde se **ejecutó el 45%** al 30.09.22

Nivel de Gobierno	PIM2022 (S/Millones)	Ejecución al 30.09 (S/Millones)	Avance%
<b>GOBIERNO NACIONAL</b>	<b>498</b>	<b>212</b>	<b>43%</b>
<b>ARCC</b>	<b>393</b>	<b>187</b>	<b>48%</b>
MTC	40	4	10%
MINEDU	31	4	13%
MINAGRI	27	17	63%
VIVIENDA	0.4	0.1	25%
SALUD	6	0	0%
MINDEF	0.8	0	0%
<b>GOBIERNO REGIONAL</b>	<b>83</b>	<b>32</b>	<b>39%</b>
<b>GOBIERNO LOCAL</b>	<b>554</b>	<b>264</b>	<b>48%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1,135</b>	<b>508</b>	<b>45%</b>



PERÚ

Autoridad para la  
Reconstrucción con Cambios

Fuente: Monitor ARCC y consulta FONDES al 30.09.2022  
Elaboración : PMO ARCC



### 3. Intervenciones con problemas en su ejecución en los tres niveles de gobierno

**160** obras paralizadas al 30.09.2022 a nivel ARCC, cuyo costo asciende a **S/1,363 millones**.

Cartera	30/04/2022		30/09/2022	
	Proy.	Inversión (S/ MM)	Proy.	Inversión (S/ MM)
G2G	-	-	6	S/ 168
NO G2G	357	S/ 3,452	154	S/ 1,195
<b>Total</b>	<b>357</b>	<b>S/ 3,452</b>	<b>160</b>	<b>S/ 1,363</b>

**26** obras paralizadas al 30.09.2022 en la región La Libertad.

Cartera	30/04/2022		30/09/2022	
	Proy.	Inversión (S/ MM)	Proy.	Inversión (S/ MM)
G2G	-	-	-	-
NO G2G	63	S/.525	26	S/.198
<b>Total</b>	<b>63</b>	<b>S/.525</b>	<b>26</b>	<b>S/.198</b>



### 3. Intervenciones con problemas en su ejecución en los tres niveles de gobierno

**26 obras paralizadas**, cuyo costo asciende a **S/198.1 millones**.

Sector	Nro. Intervenciones	Monto de inversión (S/ millones)
EDUCACIÓN	5	32.1
AGRICULTURA	12	45.0
TRANSPORTES	8	119.1
VIVIENDA	1	1.9
<b>Total</b>	<b>26</b>	<b>198.1</b>



PERÚ

Autoridad para la  
Reconstrucción con Cambios

Fuente: Direcciones Sectoriales al 30.09.2022  
Elaboración : PMO ARCC



## 4. Acciones de Propuesta o alternativas planteadas por la ARCC

Gestión de control de proyectos referidos a su alcance, costos, riesgos y seguridad para aquellos que se ejecutan bajo la modalidad G2G.

Mesas técnicas para el destrabe de obras paralizadas presidida por el director ejecutivo y su equipo sectorial, con diferentes unidades ejecutoras.

Fortalecimiento del Monitor ARCC.

Continuas visitas de campo del equipo técnico, para el acompañamiento durante la ejecución de la obras.

Proyecto de Ley 3236-2022-PE, que establece medidas necesarias para el cumplimiento de la implementación del PIRCC y dispone otras medidas.





PERÚ

Autoridad para la  
Reconstrucción con Cambios



**Siempre**  
con el pueblo
