



**GERENCIA REGIONAL
DE INFRAESTRUCTURA**



**GOBIERNO
REGIONAL
LA LIBERTAD**



AVANCES DE LA GESTION EN INVERESIONES INMERSAS DENTRO DEL PLAN DE RECONSTRUCCION CON CAMBIOS PERIODO: 2019, 2020, 2021 y 2022

Expositor: Ing. JORGE LUIS BRINGAS MALDONADO
Gerente Regional de Infraestructura

TRUJILLO, OCTUBRE DEL 2022




GERENCIA REGIONAL
DE INFRAESTRUCTURA



GOBIERNO
REGIONAL
LA LIBERTAD

MARCO PRESUPUESTAL TOTAL ASIGNADO PARA INTERVENCIONES EN EL PIRCC A FAVOR DEL GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD



MARCO PRESUPUESTAL MULTIANUAL ASIGNADO: 2019 - 2022

AÑO	DESCRIPCION	ASIGNADO
2019	ASIGNADO PARA INVERSIONES	27,815,624
	ASIGNADO PARA ESTUDIOS	10,838,097
TOTAL ASIGNADO AÑO 2019		38,653,721

AÑO	DESCRIPCION	ASIGNADO
2020	ASIGNADO PARA INVERSIONES	63,754,130
	ASIGNADO PARA ESTUDIOS	13,862,836
TOTAL ASIGNADO AÑO 2020		77,616,966

AÑO	DESCRIPCION	ASIGNADO
2021	ASIGNADO PARA INVERSIONES	137,617,916
	ASIGNADO PARA ESTUDIOS	1,638,964
TOTAL ASIGNADO AÑO 2021		139,256,880

AÑO	DESCRIPCION	ASIGNADO
2022	ASIGNADO PARA INVERSIONES	81,215,440
	ASIGNADO PARA ESTUDIOS	1,349,776
TOTAL ASIGNADO AÑO 2022		82,565,216

RESUMEN DE EJECUCION MULTIANUAL: 2017 - 2022

Sector Grupo	2017	2018	2019	2020	2021	Multianual Histórico	2022	Multianual Total
TRANSPORTES	S/ 0,00	S/ 502.500,00	S/ 1.294.275,36	S/ 18.215.676,97	S/ 38.279.308,73	S/ 58.291.761,06	S/ 16.441.825,62	S/ 74.733.586,68
EDUCACION	S/ 0,00	S/ 0,00	S/ 0,00	S/ 1.487.357,22	S/ 41.858.753,35	S/ 43.346.110,57	S/ 12.022.268,87	S/ 55.368.379,44
AGRICULTURA Y SOL INTEGRALES	S/ 0,00	S/ 41.898,19	S/ 1.540.477,51	S/ 6.314.357,50	S/ 443.867,14	S/ 8.340.600,34	S/ 100.667,85	S/ 8.441.268,19
VIVIENDA, CONST. Y SANEAMIENTO	S/ 0,00	S/ 97.439,21	S/ 6.393.958,43	S/ 11.150.809,60	S/ 2.886.746,05	S/ 20.528.953,29	S/ 11.720,24	S/ 20.540.673,53
SALUD	S/ 0,00	S/ 0,00	S/ 0,00	S/ 0,00	S/ 0,00	S/ 0,00	S/ 0,00	S/ 0,00
Total	S/ 0,00	S/ 641.837,40	S/ 9.228.711,30	S/ 37.168.201,29	S/ 83.468.675,27	S/ 130.507.425,26	S/ 28.576.482,58	S/ 159.083.907,84



GERENCIA REGIONAL
DE INFRAESTRUCTURA



GOBIERNO
REGIONAL
LA LIBERTAD

ESTUDIOS A NIVEL DE EXPEDIENTE TECNICO APROBADOS POR LA SUBGERENCIA DE ESTUDIOS DEFINITIVOS

TOTAL: 36
MONTO: S/ 761,329,801.19





ESTUDIOS A NIVEL DE EXPEDIENTE TECNICO APROBADOS POR LA SUBGERENCIA DE ESTUDIOS DEFINITIVOS

ITEM	NOMBRE DE PROYECTO	SECTOR	MONTO DE INVERSIÓN	ESTADO SITUACIONAL	
1	REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. N° 80010 RICARDO PALMA DE NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, REGION LA LIBERTAD	EDUCACIÓN	8,068,501.45	APROBADO CON RGR N°63-2021-GRLL-GRI	Proceso de recepcion de obra
2	RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA IE N° 80047 RAMIRO AURELIO ÑIQUE ESPIRITU DE NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA EN EL DISTRITO DE MOCHE, PROVINCIA DE TRUJILLO, REGION LA LIBERTAD (ACTUALIZACIÓN)	EDUCACIÓN	13,164,115.38	APROBADO CON RGR N°41-2021-GRLL-GRI	En ejecución
3	REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA IE N° 81007 MODELO DE NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, REGION LA LIBERTAD. (ACTUALIZACIÓN)	EDUCACIÓN	15,410,416.30	APROBADO CON RGR N°42-2021-GRLL-GRI	Proceso de recepcion de obra
4	REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA IE MARIA NEGRON UGARTE DE NIVEL SECUNDARIA, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, REGION LA LIBERTAD – SALDO DE OBRA	EDUCACIÓN	8,962,089.94	APROBADO CON RGR N°83-2021-GRLL-GRI	Proceso de convocatoria
5	REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 80414 RICARDO PALMA, CON CÓDIGO DE LOCAL 265811, DISTRITO SAN JOSÉ – PACASMAYO – LA LIBERTAD PLAN COVID	EDUCACIÓN	2,467,590.51	APROBADO CON RGR N°80-2020-GRLL-GRI	Ejecutado y Liquidado
6	RECUPERACION DEL PUESTO DE SALUD I 2 MOLLEPATA, DISTRITO DE MOLLEPATA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO, REGION LA LIBERTAD	SALUD		EN REVISIÓN DE PROFESIONALES PARA PERFECCIONAMIENTO DE CONTRATO AL SEGUNDO POSTOR DEBIDO A LA RESOLUCIÓN DE CONTRATO DEL SERVICIO ANTERIOR	Revisión de documentación para el perfeccionamiento del contrato
7	RECUPERACION DEL PUESTO DE SALUD I2 EL TROPICO, CENTRO POBLADO EL TROPICO, DISTRITO DE HUANCHACO, PROVINCIA DE TRUJILLO, REGION LA LIBERTAD	SALUD	18,753,178.26	APROBADO CON RGR N°60-2022-GRLL-GRI	Proceso de Otorgamiento del financiamiento por ARCC
8	REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL 16.10 KM HUARANCHAL - EL MANZANO - EL ALISO, DISTRITO DE HURANCHAL, PROVINCIA DE OTUZCO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	TRANSPORTES	14,026,647.50	APROBADO CON RGR N°22-2021-GRLL-GRI	Se Realizo el cambio de Unidad Ejecutora a favor de la municipalidad Distrital de Huaranchal / Oficio 1210-2021-GRLL-GOB. (28.06.21)
9	REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL - 21.291 KM EN CAMINO VECINAL EMP. LI 122 - COMPIN - MARMOT LI 717 - SUCCHABAMBA - CHUGUR, DISTRITO DE MARMOT, PROVINCIA DE GRAN CHIMÚ, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	TRANSPORTES	17,243,630.19	APROBADO CON RGR N°23-2021-GRLL-GRI	
10	RECONSTRUCCION DE LA AV. LOS PAUJILES TRAMO AV. JUAN PABLO II Y AV. VÍCTOR LARCO HERRERA, DISTRITO DE TRUJILLO - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	TRANSPORTES	2,194,956.99	APROBADO CON RGR N°51-2021-GRLL-GRI	Ejecutado y Liquidado



ESTUDIOS A NIVEL DE EXPEDIENTE TECNICO APROBADOS POR LA SUBGERENCIA DE ESTUDIOS DEFINITIVOS

ITEM	NOMBRE DE PROYECTO	SECTOR	MONTO DE INVERSIÓN	ESTADO SITUACIONAL	
11	REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL - 19.82 KM CHAPIHUAL - HUAYOBAMBA - EL LAJON - EL ALISO, DISTRITO DE HUARANCHAL, PROVINCIA DE OTUZCO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	TRANSPORTES	1,502,461.78	APROBADO CON RGR N°40-2021-GRLL-GRI	Se Realizo el cambio de Unidad Ejecutora a favor de la municipalidad Distrital de Huaranchal / Oficio 1210-2021-GRLL-GOB. (28.06.21)
12	REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL - 19.986 KM EN CAMINO VECINAL EMP. LI - 115 - COÑACHUGO - LA COLPA - SAN JOSÉ DE PORCÓN - LI - 937 EMP. PE 3N, DISTRITO DE QUIRUVILCA Y CACHICADAN, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	TRANSPORTES	14,662,108.73	APROBADO CON RGR N°49-2021-GRLL-GRI	
13	REHABILITACIÓN DE CAMINO DEPARTAMENTAL - 51.47 KM EN EMP. LI-106 (TAMBO) - HUANCAY - ZAPOTAL - CERRO BLANCO - EMP. LI-764, DISTRITOS DE CASCAS, MARMOT Y OTUZCO, PROVINCIAS DE GRAN CHIMÚ Y OTUZCO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	TRANSPORTES	31,036,220.71	APROBADO CON RGR N°67-2021-GRLL-GRI	En Proceso de Licitacion / Gerencia Regional de Contrataciones del GORE
14	REHABILITACIÓN DE CAMINO DEPARTAMENTAL - 25.7 KM EN EMP. PE-1N (EL CRUCE) - PTE. JOLLUCO - TAMBO - PTE PINCHADAY - EMP. PTE BAÑOS CHIMÚ, DISTRITO DE CASCAS, PROVINCIA DE GRAN CHIMÚ, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	TRANSPORTES	19,010,240.83	APROBADO CON RGR N°69-2021-GRLL-GRI	En Proceso de solicitud de financiamiento ARCC
15	REHABILITACION DE CAMINO DEPARTAMENTAL – 31.633 KM EN PAMPA EL CONDOR – PIJOBAMBA – PARASIBE – SITABAMBA ACTUALIZACIÓN	TRANSPORTES	18,145,244.34	APROBADO CON RGR N°102-2021-GRLL-GRI	Se encuentra en Ejecucion de obra
16	REHABILITACIÓN DE CAMINO DEPARTAMENTAL – 52.520 KM EN EMP. LI – 109 (DV. LONGOTEA) – CATAL – LONGOTEA – EMP. LI-107 (CIENEGA) REFORMULACIÓN	TRANSPORTES	34,217,389.63	APROBADO CON RGR N°123-2021-GRLL-GRI	Se realizo el cambio de Unidad Ejecutora a Favor de la Municipalidad Distrital de Longotea con Resolución de Dirección Ejecutiva N° 00090-2022-ARCC/DE, de fecha 27.06.22 La Autoridad de Reconstrucción con Cambios modifica el PLAN INTEGRAL PARA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS
17	REHABILITACIÓN DE CAMINO DEPARTAMENTAL - 40.91 KM EN UCHUMARCA - SAN VICENTE DE PAUL- L.D. AMAZONAS (HUANABAMBA, AM-107 A BALSAS)	TRANSPORTES	40,009,980.00	NO CUENTA CON RESOLUCION DE APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO	Se realizo Cambio de Unidad Ejecutora a favor de la Municipalidad Provincial de Bolivar con Resolución de Dirección Ejecutiva N° 0042-2022-Arcc/de de fecha 23.05.22
18	REHABILITACIÓN DE CAMINO DEPARTAMENTAL - 41 KM EN PARAISO - CONDORMARCA - EMP. LI-124 (DESV. CALEMAR)	TRANSPORTES	40,098,000.00	NO CUENTA CON RESOLUCION DE APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO	
19	REHABILITACIÓN DE CAMINO DEPARTAMENTAL - 42 KM EN EMP.LI-107 (LAPLAC)-UCUNCHA - EMP.LI -107 (SAN VICENTE DE PAUL)	TRANSPORTES	41,076,000.00	NO CUENTA CON RESOLUCION DE APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO	
20	REHABILITACIÓN DE CAMINO DEPARTAMENTAL - 23.72 KM: EMP. PE-3N (DV. LA YEGUADA) – LA YEGUADA – COCHAMARCA – OROCULLAY – EMP- LI-115 (PAMPA EL CONDOR)	TRANSPORTES	16,249,551.91	APROBADO CON RGR N°86-2020-GRLL-GRI	OBSERVADO (RECEPCION DE OBRA)

ESTUDIOS A NIVEL DE EXPEDIENTE TECNICO APROBADOS POR LA SUBGERENCIA DE ESTUDIOS DEFINITIVOS

ITEM	NOMBRE DE PROYECTO	SECTOR	MONTO DE INVERSIÓN	ESTADO SITUACIONAL	
21	REHABILITACIÓN DE CAMINO DEPARTAMENTAL – 62.421 KM EN EMP. LI-121 (BUENAVISTA) - EL PIE - EL QUINUAL - LAS DELICIAS - LA UNION - EMP. LI-121 (DV. UNINGAMBAL), PROVINCIAS DE VIRÚ, JULCÁN Y SANTIAGO DE CHUCO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	TRANSPORTES	39,204,645.63	APROBADO CON RGR N°147-2020-GRLL-GRI	se superpone con el CV N° 20 con el PROGRAMA PROREGION (Convenio).
22	REHABILITACION DEL CAMINO DEPARTAMENTAL – 29.554 KM. EN PATAZ – ZARUMILLA – PARAISO – PUNTA CARRETERA	TRANSPORTES	18,640,944.66	APROBADO CON RGR N°155-2020-GRLL-GRI	Se realizo el cambio de Unidad Ejecutora a Favor de la Municipalidad Distrital de Pataz con OFICIO N° 000247-2022-GRLL-GOB de fecha 18.03.22
23	REHABILITACION DE CAMINO DEPARTAMENTAL – 61.6 KM EN EMP. PE -3N (SAUSACOCOA) – CUYPAMPA – CURGOS – EL EDEN – MOYAN – SARIN – MUNMALCA – EMP. LI 115 (PAMPA EL CONDOR)	TRANSPORTES	35,930,332.44	APROBADO CON RGR N°153-2020-GRLL-GRI	Se encuentra en Ejecucion de obra
24	REHABILITACION DE CAMINO DEPARTAMENTAL – 31.633 KM EN PAMPA EL CONDOR – PIJOBAMBA – PARASIBE – SITABAMBA	TRANSPORTES	18,145,244.34	APROBADO CON RGR N°152-2020-GRLL-GRI	Se encuentra en Ejecucion de obra
25	REHABILITACION DE CAMINO DEPARTAMENTAL – 56.317 KM EN DESVIO EL HUAYO – BUENOS AIRES – CHILIA – BELLAVISTA – LLAMPAO - ARCAYPATA - EMP. PE – 10 C (HUAYLILLAS)	TRANSPORTES	37,737,094.69	APROBADO CON RGR N°154-2020-GRLL-GRI	No se intervendra por parte del Gobierno Regional La Libertad , toda vez que lo ejecutara el PROGRAMA PROREGION correspondiente al CVA N° 19
26	REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL – 12.67 KM EN CAMINO VECINAL EMP. PE – 1NF – CASA BLANCA – PAMPAS DE CHEPATE, DISTRITO DE CASCAS, PROVINCIA GRAN CHIMÚ – LA LIBERTAD	TRANSPORTES	11,499,937.27	APROBADO CON RGR N°156-2020-GRLL-GRI	Proyecto ejecutado / en liquidacion
27	REPARACIÓN DE CARRETERA TRONCAL; EN EL (LA) CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA N° LI-120, TRAMO AGALLPAMPA-CAMPO BELLO - JULCÁN DISTRITO DE JULCAN, PROVINCIA JULCAN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	TRANSPORTES	22,394,224.13	APROBADO CON RGR N°79-2019-GRLL-GRI	En ejecucion Saldo de Obra
28	2400100: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA AV. PROLONGACION CESAR VALLEJO TRAMO AV. FATIMA-AV. HUAMAN, DISTRITO DE VICTOR LARCO HERRERA - PROVINCIA DE TRUJILLO - REGION LA LIBERTAD	TRANSPORTES	2,989,492.65	APROBADO CON RGR N°107-2019-GRLL-GRI	Ejecutado y Liquidado
29	2400297: RECUPERACION ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. FEDERICO VILLARREAL TRAMO AV. MIRAFLORES-PROLONGACION SANTA CENTRO POBLADO DE TRUJILLO - DISTRITO DE TRUJILLO - PROVINCIA DE TRUJILLO - REGION LA LIBERTAD	TRANSPORTES	1,535,566.21	APROBADO CON RGR N°84-2019-GRLL-GRI	Ejecutado y Liquidado
30	2403584: RECUPERACION DE LA AV. MIRAFLORES TRAMO AV. 26 DE MARZO Y AV. ESPAÑA - DISTRITO DE TRUJILLO - PROVINCIA DE TRUJILLO - REGION LA LIBERTAD	TRANSPORTES	6,906,368.01	APROBADO CON RGR N°120-2019-GRLL-GRI	Ejecutado y Liquidado

ESTUDIOS A NIVEL DE EXPEDIENTE TECNICO APROBADOS POR LA SUBGERENCIA DE ESTUDIOS DEFINITIVOS

ITEM	NOMBRE DE PROYECTO	SECTOR	MONTO DE INVERSIÓN	ESTADO SITUACIONAL	
31	2402818: MEJORAMIENTO DE LA AV. CESAR VALLEJO TRAMO AV. JOSE MARIA EGUREN - AV. FEDERICO VILLARREAL, CENTRO POBLADO DE TRUJILLO - DISTRITO DE TRUJILLO - PROVINCIA DE TRUJILLO - REGION LA LIBERTAD	TRANSPORTES	6,380,900.05	APROBADO CON RGR N°128-2019-GRLL-GRI	Ejecutado y Liquidado
32	REHABILITACIÓN DE CAMINO DEPARTAMENTAL - 23.72 KM: EMP. PE-3N (DV. LA YEGUADA) – LA YEGUADA – COCHAMARCA – OROCULLAY – EMP- LI-115 (PAMPA EL CONDOR)	TRANSPORTES		APROBADO CON RGR N°168-2019-GRLL-GRI	Se Realizo el cambio de Unidad Ejecutora a favor de la municipalidad Distrital de Huaranchal / Oficio 1210-2021-GRLL-GOB. (28.06.21)
33	REHABILITACIÓN DE CAMINO DEPARTAMENTAL - 69 KM EN EMP. PE-3N (SANTIAGO DE CHUCO) - PICHUNCHUCO - CALIPUY - CRUZ DE PASCAS-LLACAMATE - CASABLANCA - SANTA RITA - EMP. LI-121	TRANSPORTES	67,482,000.00	NO CUENTA CON RESOLUCION DE APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO	Se superponen con parte del tramo CV N° 20 PROGRAMA PROREGION, así mismo con CARTA NOTARIAL 60-2022-GRLL-GGR-GRCO, de fecha 09.09.22, la Gerencia Regional de Contrataciones Notifica al consultor la Resolución del Contrato
34	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE RED DEPARTAMENTAL - 88.442 KM EN EMP. PE-1N (PTE. HILDEMEISTER) - SAN IDELFONSO - EL INGENIO - TOMABAL -JUYACUL - CARABAMBA - MULLAMANDAY - MACHE - EMP. LI-120 (CHINCHANGO)	TRANSPORTES	86,496,276.00	NO CUENTA CON RESOLUCION DE APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO	
35	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE RED DEPARTAMENTAL - 49.299 KM EN 'TRAYECTORIA: EMP. PE-1N (DV. TANGUCHE) - TANGUNCHE - PAMPA BLANCA - EMP. PE-12 (PTE. BAYLE).	TRANSPORTES	48,214,422.00	NO CUENTA CON RESOLUCION DE APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO	Con Resolución de Dirección Ejecutiva N° 00090-2022-ARCC/DE, de fecha 27.06.22 La Autoridad de Reconstrucción con Cambios modifica se corrobora el PLAN INTEGRAL PARA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS, así mismo en su ANEXO N° 02, se corrobora que se procedió a realizar el cambio de unidad ejecutora a favor de la Mnicipalidad Distrital de Chao. En proceso de resolucion de Contrato
36	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO, BOCATOMA LA BOCANA DEL SECTOR PARQUE INDUSTRIAL, DISTRITO DE MOCHE, PROVINCIA DE TRUJILLO, REGIÓN LA LIBERTAD	AGRICULTURA	1,474,028.66	APROBADO CON RGR N°66-2021-GRLL-GRI	En ejecucion
			761,329,801.19		

**RE
CONSTRUCCIÓN**
CON CAMBIOS



AVANCES DE LA GESTION: PERIODO 2019 – OBRAS CULMINADAS





**MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD DE LA AV. PROLONGACION
CESAR VALLEJO TRAMO AV. FATIMA-AV.
HUAMAN, DISTRITO DE VICTOR LARCO
HERRERA - PROVINCIA DE TRUJILLO - REGION
LA LIBERTAD**

Inversión:
S/.2,989,492.65

- Exp. Técnico: S/. 32,000.00
- Ejecución : S/. 2'921,108.53
- Supervisión : S/. 36,384.12

*Montos aprobados con RGR N° 083-
2019-GRLL-GGR/GRI*

- INICIO : 19/08/2019
- TERMINO : 01/11/2019
- CONTRATISTA : CONSORCIO LUAL
- SUPERVISION : RAUL VALDIEVIESO GRADOS



**RE
CONSTRUCCIÓN**
CON CAMBIOS



AVANCES DE LA GESTION: PERIODO 2020 – OBRAS CULMINADAS






OBRAS CULMINADAS



**GOBIERNO
REGIONAL
LA LIBERTAD**

RECUPERACION DE LA AV. MIRAFLORES TRAMO AV. 26 DE MARZO Y AV. ESPAÑA - DISTRITO DE TRUJILLO - PROVINCIA DE TRUJILLO - REGION LA LIBERTAD

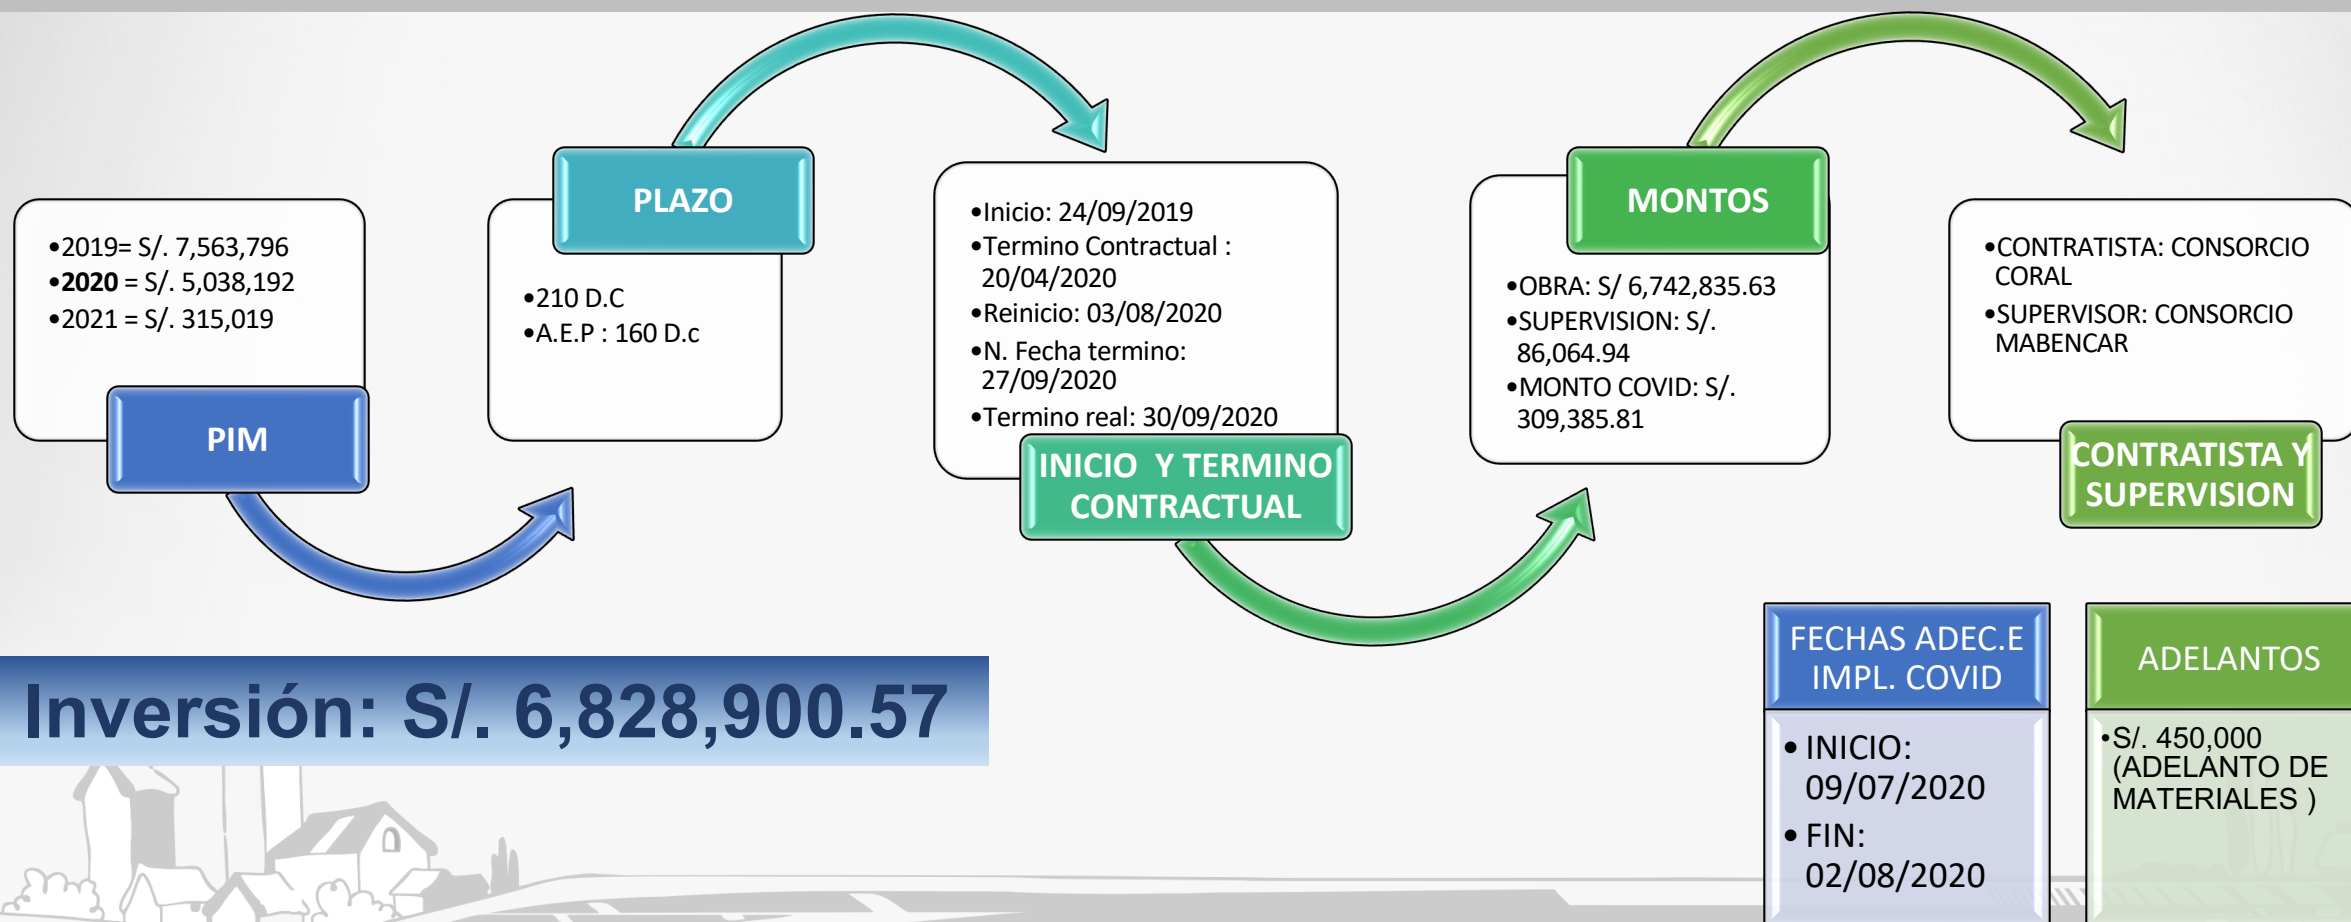



OBRAS CULMINADAS

RECUPERACION DE LA AV. MIRAFLORES TRAMO AV. 26 DE MARZO Y AV. ESPAÑA - DISTRITO DE TRUJILLO - PROVINCIA DE TRUJILLO - REGION LA LIBERTAD




METAS FISICAS

- 6,908 beneficiarios
- Construcción de 2,625.79 m² de veredas
- Construcción de 14257.22 ml de sardineles tipo "I"
- Construcción de 38,990.49 m² de pavimento flexible (asfalto en caliente)
- Construcción de 5,851.62 m² de pavimento rígido $f'c=210$ kg/cm² (concreto)





MEJORAMIENTO DE LA AV. CESAR VALLEJO TRAMO AV. JOSE MARIA EGUREN - AV. FEDERICO VILLARREAL, CENTRO POBLADO DE TRUJILLO - DISTRITO DE TRUJILLO - PROVINCIA DE TRUJILLO - REGION LA LIBERTAD

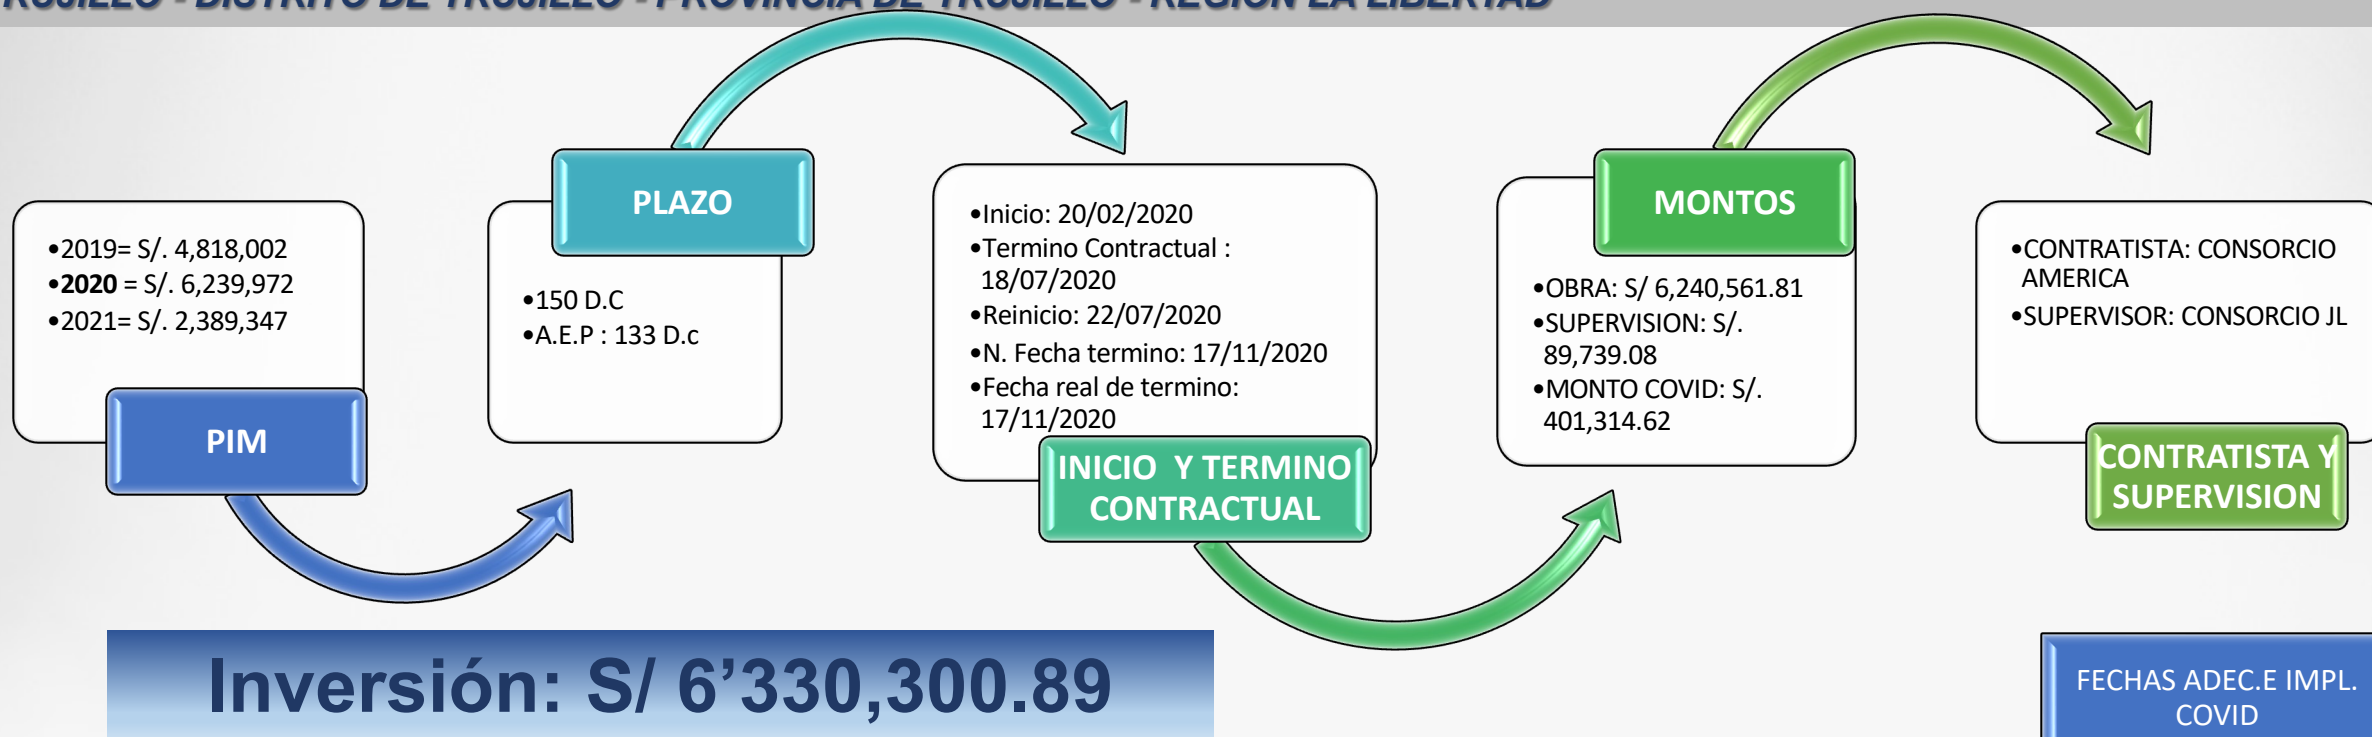

**FECHAS ADEC.E IMPL.
COVID**

- INICIO: 07/07/2020
- FIN: 21/07/2020



OBRAS CULMINADAS

METAS FISICAS

- 566,280 beneficiarios
- Rehabilitación de 1,920 km de pavimento
- Construcción de veredas con 5,660.92 m² de concreto
- Construcción de sardineles con 2,914.56 ml de concreto
- Construcción de estacionamientos con 2,478.05 m² de concreto.



**RE
CONSTRUCCIÓN**
CON CAMBIOS



AVANCES DE LA GESTION: PERIODO 2021 – OBRAS CULMINADAS





OBRAS CULMINADAS



**GOBIERNO
REGIONAL
LA LIBERTAD**

RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR N° 81510 VICTOR MARQUEZ ELORREAGA, CON CODIGO DE LOCAL 256213, DEL CENTRO POBLADO SAUSAL, DISTRITO DE CHICAMA, PROVINCIA DE ASCOPE- DEPARTAMENTO LA LIBERTAD



Monto de Inversión: S/ 7,417,360.00

**RE
CONSTRUCCIÓN**
CON CAMBIOS



AVANCES DE LA GESTION: PERIODO 2022 – OBRAS CULMINADAS





OBRAS CULMINADAS



**GOBIERNO
REGIONAL
LA LIBERTAD**

RECONSTRUCCION DE LA AV. LOS PAUJILES TRAMO AV. JUAN PABLO II Y AV. VICTOR LARCO HERRERA, DISTRITO DE TRUJILLO - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD



Monto de Inversión: S/ 2,375,539.00



OBRAS CULMINADAS



**GOBIERNO
REGIONAL
LA LIBERTAD**

REHABILITACION DE CAMINO DEPARTAMENTAL-23.72 KM: EMP. PE-3N (DV. LA YEGUADA) - LA YEGUADA - COCHAMARCA - OROCULLAY - EMP. LI-115 (PAMPA EL CONDOR)



Monto de Inversión: S/ 16,249,551.91





REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. N° 80010 RICARDO PALMA DE NIVEL, INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO



Monto de Inversión: S/8,068,501.96

- Avance Físico Acumulado : 94.70 %
- Avance Financiero (PIM) : 89.80 %
- Estado: Obra concluida.

EQUIPO TÉCNICO DE OBRA:

- **COORDINADOR:**
ING. CESAR SALIROSAS GOMEZ
- **RESIDENTE:**
ING. VIGO COTOS, EDGAR JAMES
- **JEFE DE SUPERVISIÓN:**
ING. SALCEDO CAMPOS, MANUEL FREDEGUNDO




REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. N° 80010 RICARDO PALMA DE NIVEL, INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA, DISTRITO DE TRUJILLO,
PROVINCIA DE TRUJILLO







REHABILITACION DE CAMINO VECINAL - 12.67 KM EN CAMINO VECINAL EMP. PE-1NF - CASA BLANCA - PAMPAS DE CHEPATE, DISTRITO DE CASCAS, PROVINCIA GRAN CHIMU - LA LIBERTAD

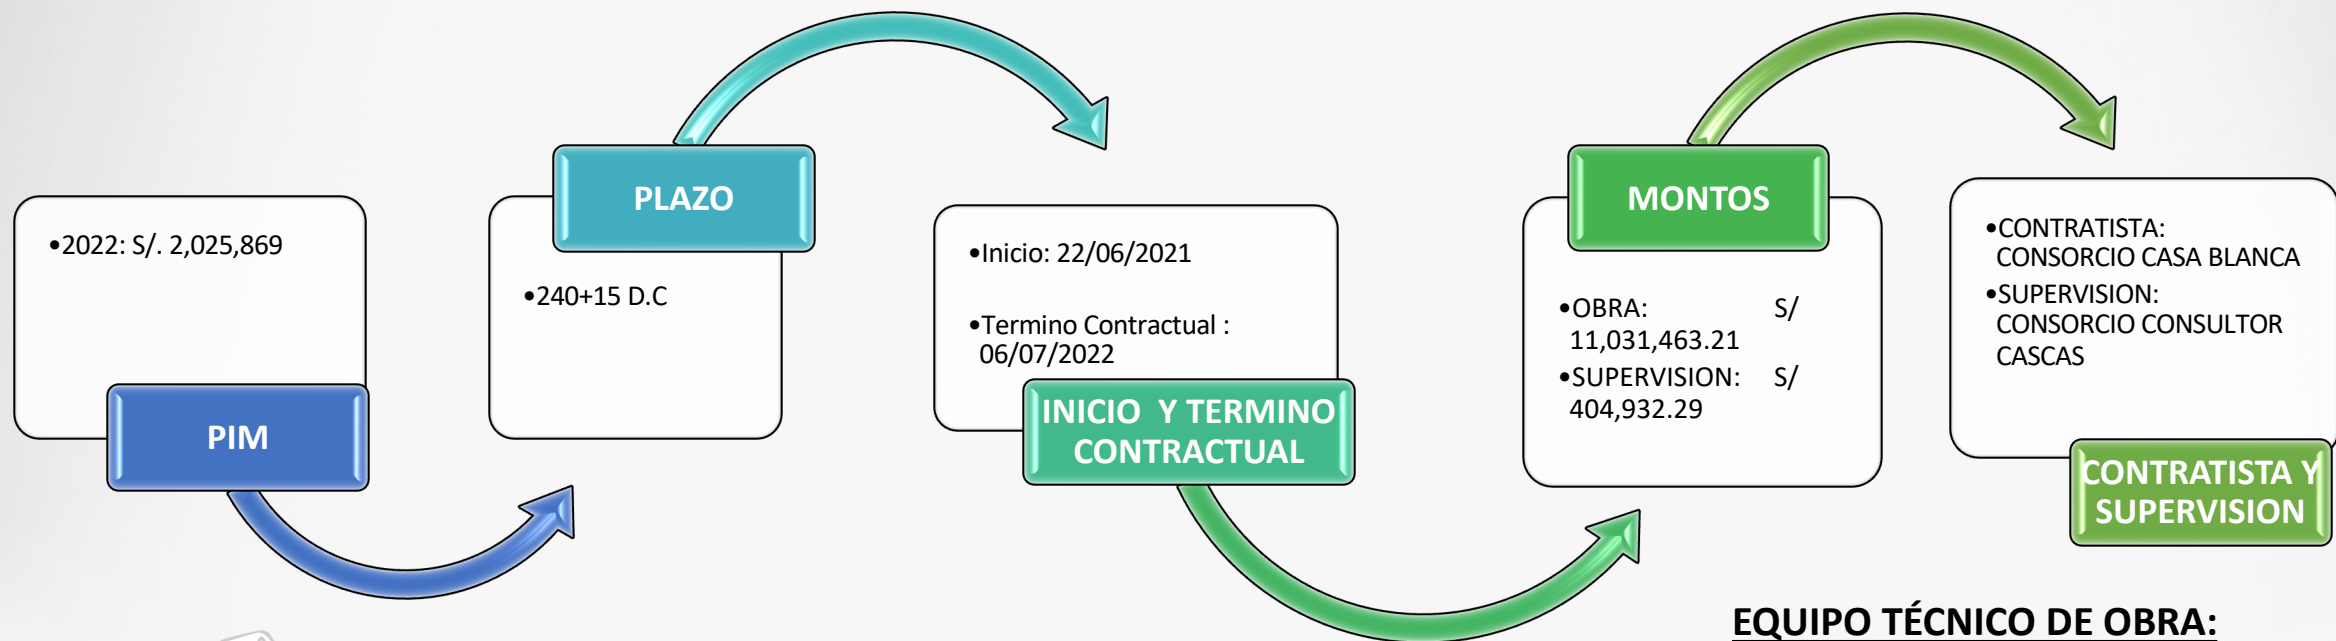

Monto de Inversión: S/11,455,201.07

- Avance Físico Acumulado : 89.80 %
- Avance Financiero : 99.60 %

- **Estado:** Reconfirmación de comité de recepción, y en tramite solicitud de presupuesto adicional ante la ARCC

EQUIPO TÉCNICO DE OBRA:

- **COORDINADOR:**
ING. JUNNIOR GALLOZA RODRIGUEZ
- **RESIDENTE:**
ING. PONCE CHUNGA, VICTOR TOMAS
- **JEFE DE SUPERVISIÓN:**
ING. VILLARREAL GONZALES, JAVIER JESUS



OBRAS CULMINADAS



**GOBIERNO
REGIONAL
LA LIBERTAD**

REHABILITACION DE CAMINO VECINAL - 12.67 KM EN CAMINO VECINAL EMP. PE-1NF - CASA BLANCA - PAMPAS DE CHEPATE, DISTRITO DE CASCAS, PROVINCIA GRAN CHIMU - LA LIBERTAD




REHABILITACION DE CAMINO VECINAL - 12.67 KM EN CAMINO VECINAL EMP. PE-1NF - CASA BLANCA - PAMPAS DE CHEPATE, DISTRITO DE CASCAS, PROVINCIA GRAN CHIMU - LA LIBERTAD

 **GOBIERNO**





REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E MARIA NEGRON UGARTE DE NIVEL SECUNDARIA, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, REGION LA LIBERTAD- SALDO DE OBRA, CUI: 2476481

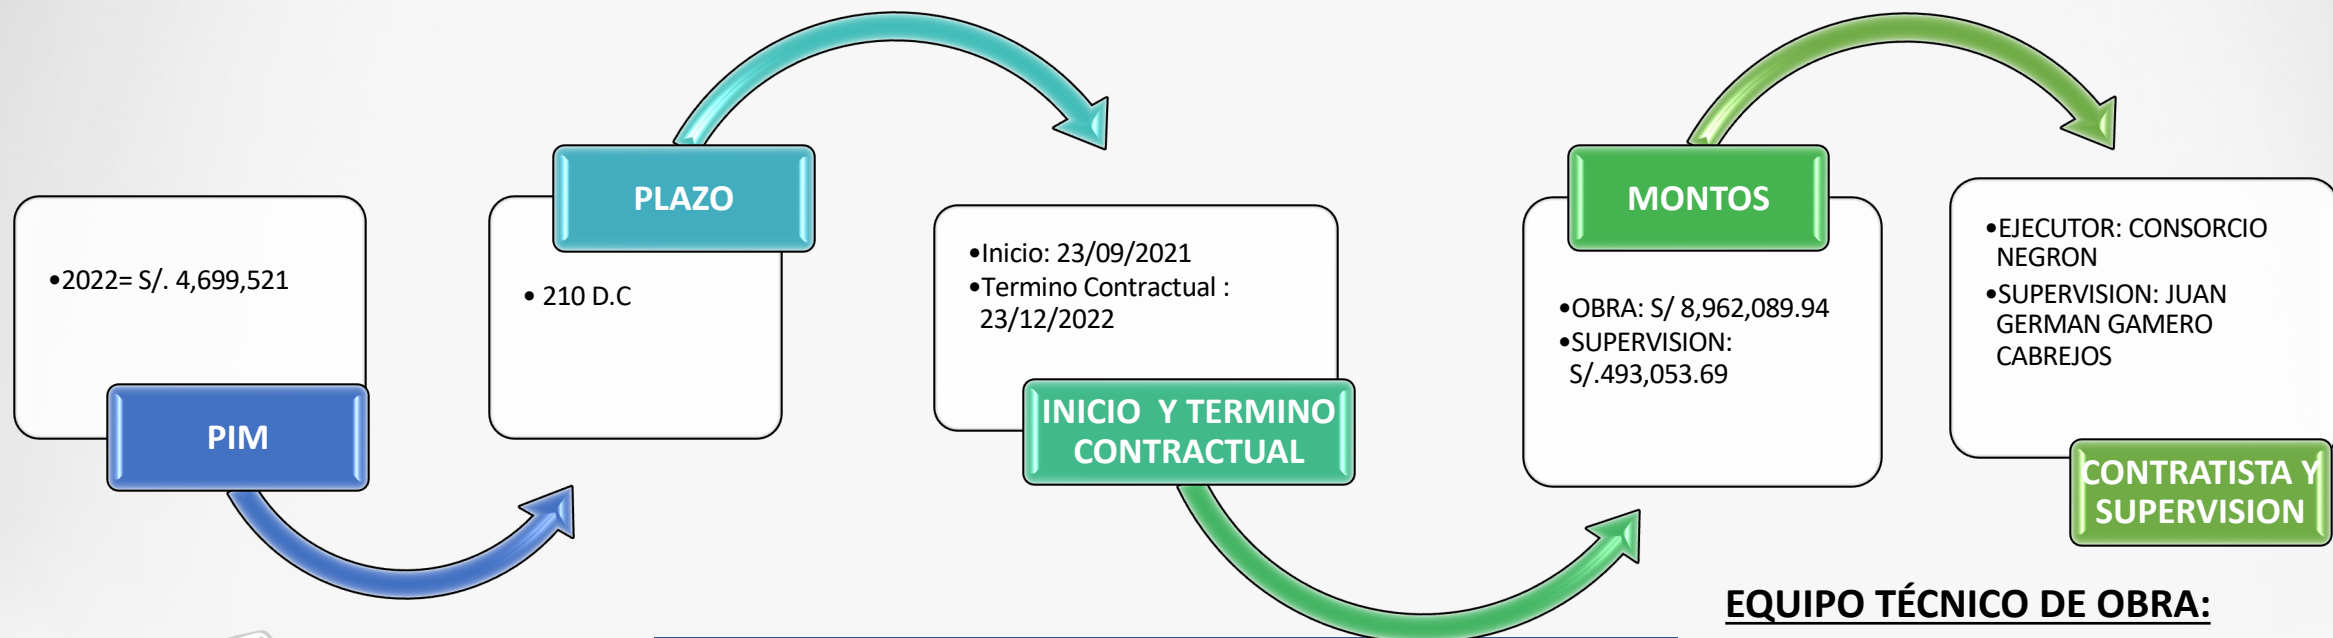

Monto de Inversión: S/8,962,089.94

- **Avance Físico Acumulado: 59.84%**

EQUIPO TÉCNICO DE OBRA:

- **COORDINADOR:**
ING. JULIO VALERIANO MURGA
- **RESIDENTE:**
ING. BETTETA GONZALES, EDGAR NATIVIDAD
- **INSPECTOR:**
ING. DANNY DEL PILAR ALVARADO AYLLON



REHABILITACION DE LA INFRAESTRUTURA DE LA I.E MARIA NEGRON UGARTE DE NIVEL SECUNDARIA, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, REGION LA LIBERTAD





REHABILITACION DEL LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E N° 81007 MODELO DE NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, REGION LA LIBERTAD



Monto de Inversión: S/15,410,416.30

- Avance Físico Acumulado : 98.40 %
- Avance Financiero (PIM) : 75.70 %

- **Estado:** Obra culminada 23/07/2022, en proceso de levantamiento de observaciones para recepción de obra.

EQUIPO TÉCNICO DE OBRA:

- **COORDINADOR:**
ING. JULIO VALERIANO MURGA
- **RESIDENTE:**
ING. BOYD LLANOS, JOSE ALINDOR
- **JEFE DE SUPERVISIÓN:**
ING. GUTIERREZ TRIGOSO, ANGEL ISMAEL



OBRAS CULMINADAS




**GOBIERNO
REGIONAL
LA LIBERTAD**

REHABILITACION DEL LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E N° 81007 MODELO DE NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, REGION LA LIBERTAD



REHABILITACION DEL LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E N° 81007 MODELO DE NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, REGION LA LIBERTAD

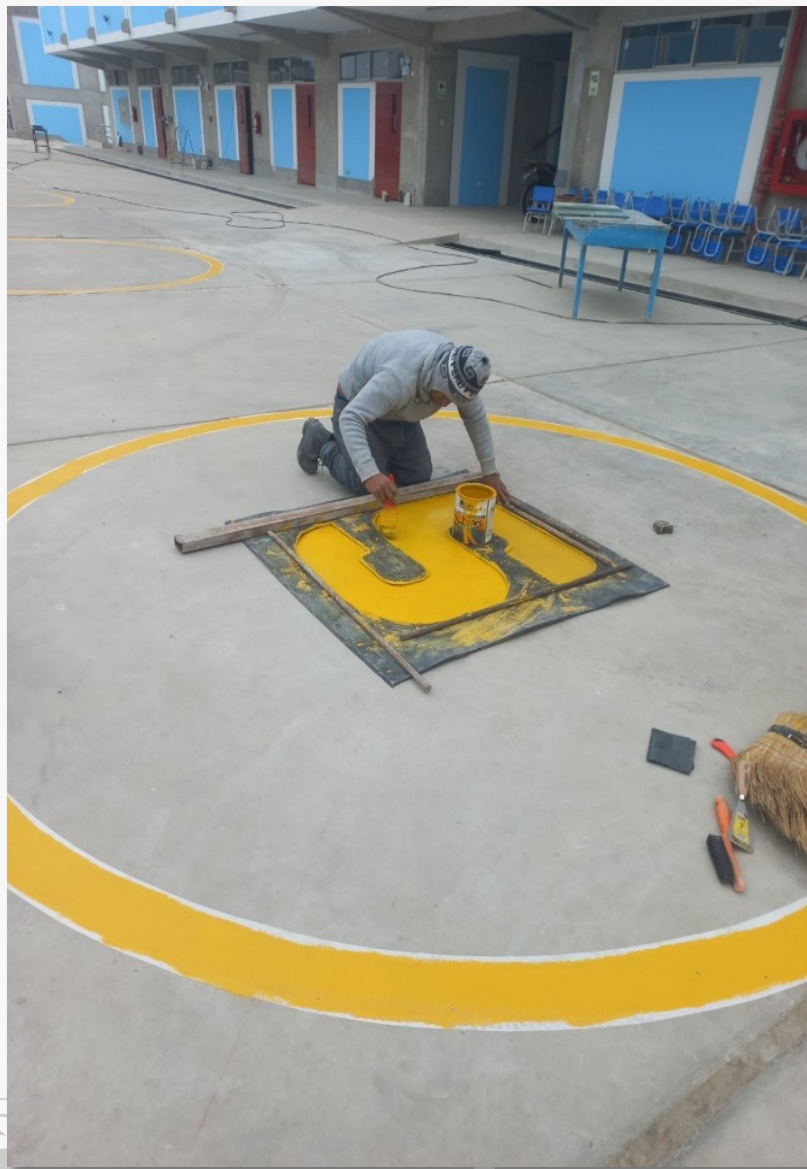


REHABILITACION DEL LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E N° 81007 MODELO DE NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, REGION LA LIBERTAD

 GOBIERNO



RE
CONSTRUCCIÓN
CON CAMBIOS




OBRAS POR RECONSTRUCCION CON CAMBIOS – OBRAS EN EJECUCION





RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA IE N° 80047 RAMIRO AURELIO ÑIQUE ESPIRITU DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA EN EL DISTRITO DE MOCHE, PROVINCIA DE TRUJILLO, REGION LA LIBERTAD, CUI: 2474048

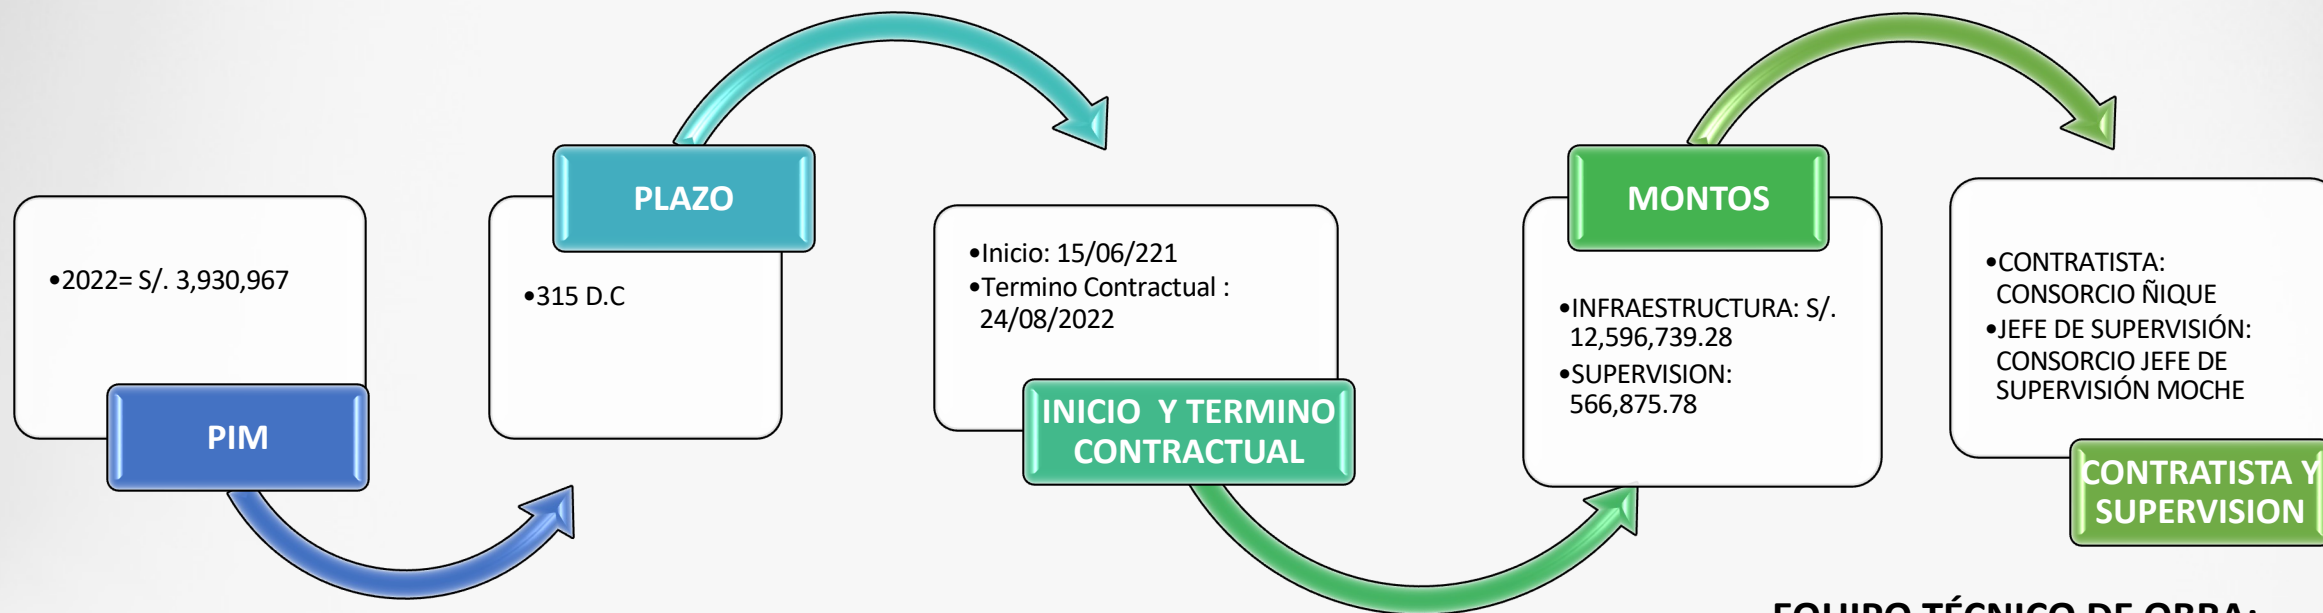

Monto de Inversión: S/13,164,115.38

- Avance Físico Acumulado : 94.90 %
- Avance Financiero (PIM) : 66.40 %
- Estado: Reinició el 22/08/2022; en tramite de ampliación de plazo.

EQUIPO TÉCNICO DE OBRA:

- **COORDINADOR:**
ING. JIMENA VALENCIA SAAVEDRA
- **RESIDENTE:**
ING. GARCIA CERNA, ALFREDO SEGUNDO
- **JEFE DE SUPERVISIÓN:**
ING. CRISTIAN ORBEGOSO

RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA IE N° 80047 RAMIRO AURELIO ÑIQUE ESPIRITU DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA EN EL DISTRITO DE
MOCHE, PROVINCIA DE TRUJILLO, REGION LA LIBERTAD, CUI: 2474048






RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA IE N° 80047 RAMIRO AURELIO ÑIQUE ESPIRITU DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA EN EL DISTRITO DE MOCHE, PROVINCIA DE TRUJILLO, REGION LA LIBERTAD, CUI: 2474048



"RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 80047 RAMIRO AURELIO ÑIQUE ESPIRITU DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA EN EL DISTRITO DE MOCHE, PROVINCIA DE TRUJILLO, REGION LA LIBERTAD"

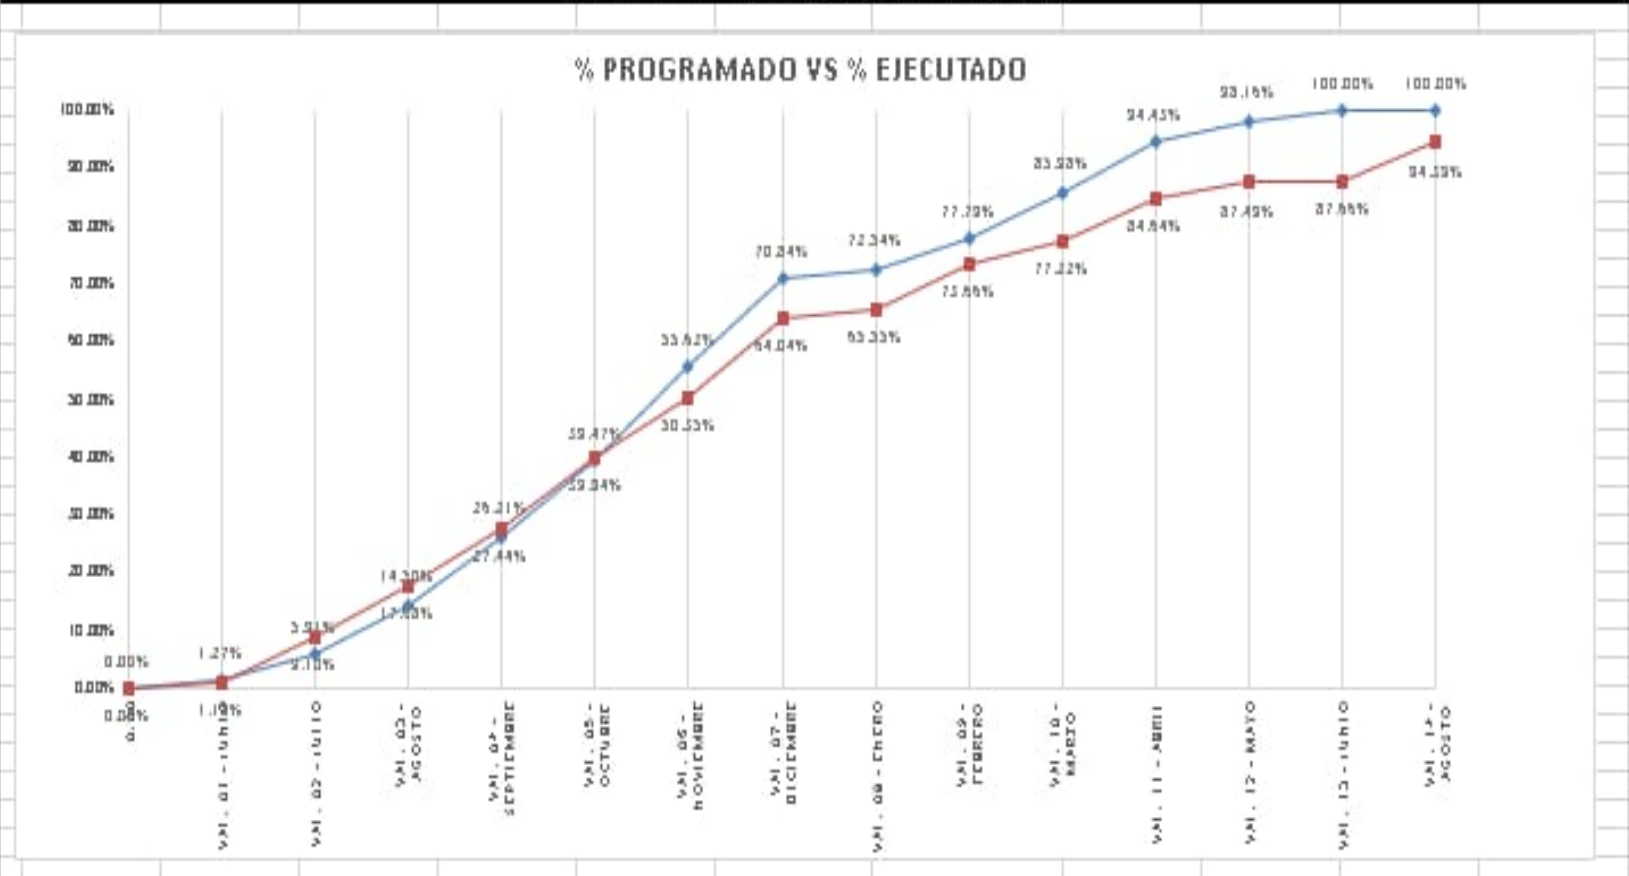

MONTOS VALORIZADOS EJECUTADOS				
MES	MONTOS (Incl.IGV)		PORCENTAJES	
	PARCIAL B/.	ACUMUL. B/.	PARCIAL %	ACUMUL. %
VAL. 01 - JUNIO	143,374.41	143,374.41	1.18%	1.18%
VAL. 02 - JULIO	960,734.59	1,104,109.00	7.92%	9.10%
VAL. 03 - AGOSTO	1,041,126.96	2,145,235.96	8.58%	17.68%
VAL. 04 - SEPTIEMBRE	1,183,843.50	3,329,079.46	9.76%	27.44%
VAL. 05 - OCTUBRE	1,516,487.84	4,845,567.30	12.50%	39.94%
VAL. 06 - NOVIEMBRE	1,263,312.38	6,108,879.68	10.41%	50.35%
VAL. 07 - DICIEMBRE	1,661,107.81	7,769,987.50	13.69%	64.04%
VAL. 08 - ENERO	183,092.76	7,953,080.26	1.51%	65.55%
VAL. 09 - FEBRERO	982,253.38	8,935,333.64	8.10%	73.65%
VAL. 10 - MARZO	431,233.61	9,366,567.25	3.56%	77.22%
VAL. 11 - ABRIL	900,171.23	10,266,738.48	7.42%	84.64%
VAL. 12 - MAYO	345,874.84	10,612,613.32	2.85%	87.49%
VAL. 13 - JUNIO	20,762.65	10,633,375.97	0.17%	87.66%
VAL. 14 - AGOSTO	816,497.28	11,449,873.25	6.72%	94.39%
TOTAL	10,412,613.32		94.59%	



REHABILITACION DE CAMINO DEPARTAMENTAL - 61.6 KM EN EMP. PE-3N (SAUSACOA) - CUYPAMPA - CURGOS - EL EDEN - MOYAN - SARIN - MUNMALCA - EMP. LI-115 (PAMPA EL CONDOR), CUI: 2505289



Monto de Inversión: S/35,930,332.44

- Avance Físico Acumulado : 32.00 %
- Avance Financiero : 26.10 %
- Estado: Obra en ejecución

EQUIPO TÉCNICO DE OBRA:

- **COORDINADOR:**
ING. JUNNIOR GALLOZA RODRIGUEZ
- **RESIDENTE:**
ING. ROJAS PEREZ, DAVID GUSTAVO
- **JEFE DE SUPERVISIÓN:**
ING. BRAVO HUGO CHAVEZ



OBRAS EN EJECUCION




**GOBIERNO
REGIONAL
LA LIBERTAD**

REHABILITACION DE CAMINO DEPARTAMENTAL - 61.6 KM EN EMP. PE-3N (SAUSACOCHA) - CUYPAMPA - CURGOS - EL EDEN - MOYAN - SARIN - MUNMALCA - EMP. LI-115 (PAMPA EL CONDOR)



REHABILITACION DE CAMINO DEPARTAMENTAL - 61.6 KM EN EMP. PE-3N (SAUSACOA) - CUYPAMPA - CURGOS - EL EDEN - MOYAN - SARIN - MUNMALCA - EMP. LI-115 (PAMPA EL CONDOR), CUI: 2505289


 **GOBIERNO**

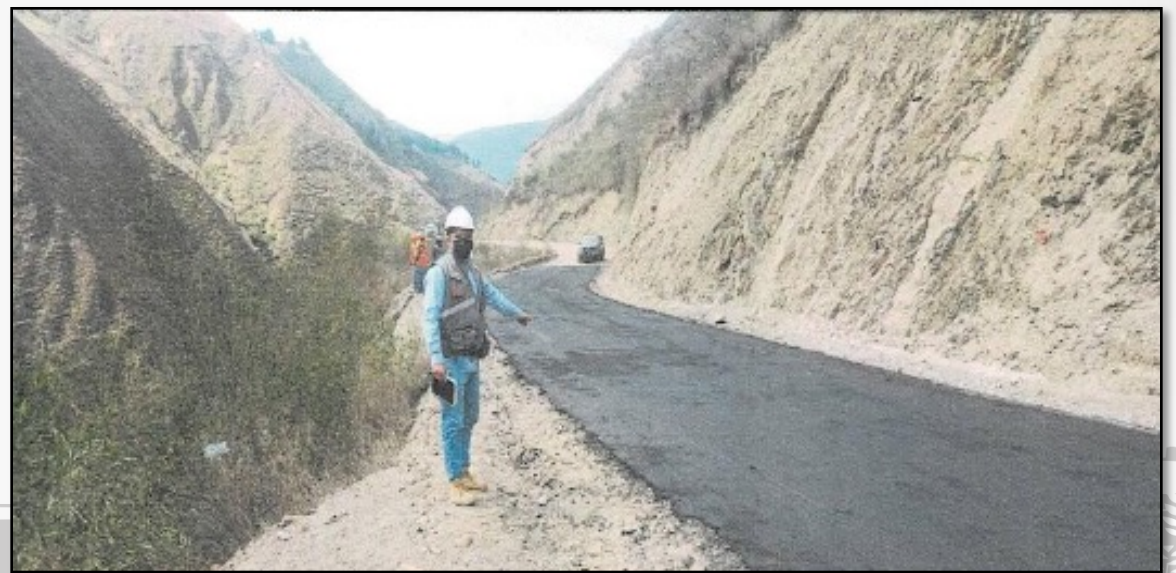


REHABILITACION DE CAMINO DEPARTAMENTAL - 61.6 KM EN EMP. PE-3N (SAUSACOA) - CUYPAMPA - CURGOS - EL EDEN - MOYAN - SARIN - MUNMALCA - EMP. LI-115 (PAMPA EL CONDOR), CUI: 2505289



REHABILITACION DE CAMINO DEPARTAMENTAL - 61.6 KM EN EMP. PE-3N (SAUSACOA) - CUYPAMPA - CURGOS - EL EDEN - MOYAN - SARIN - MUNMALCA - EMP. LI-115 (PAMPA EL CONDOR), CUI: 2505289

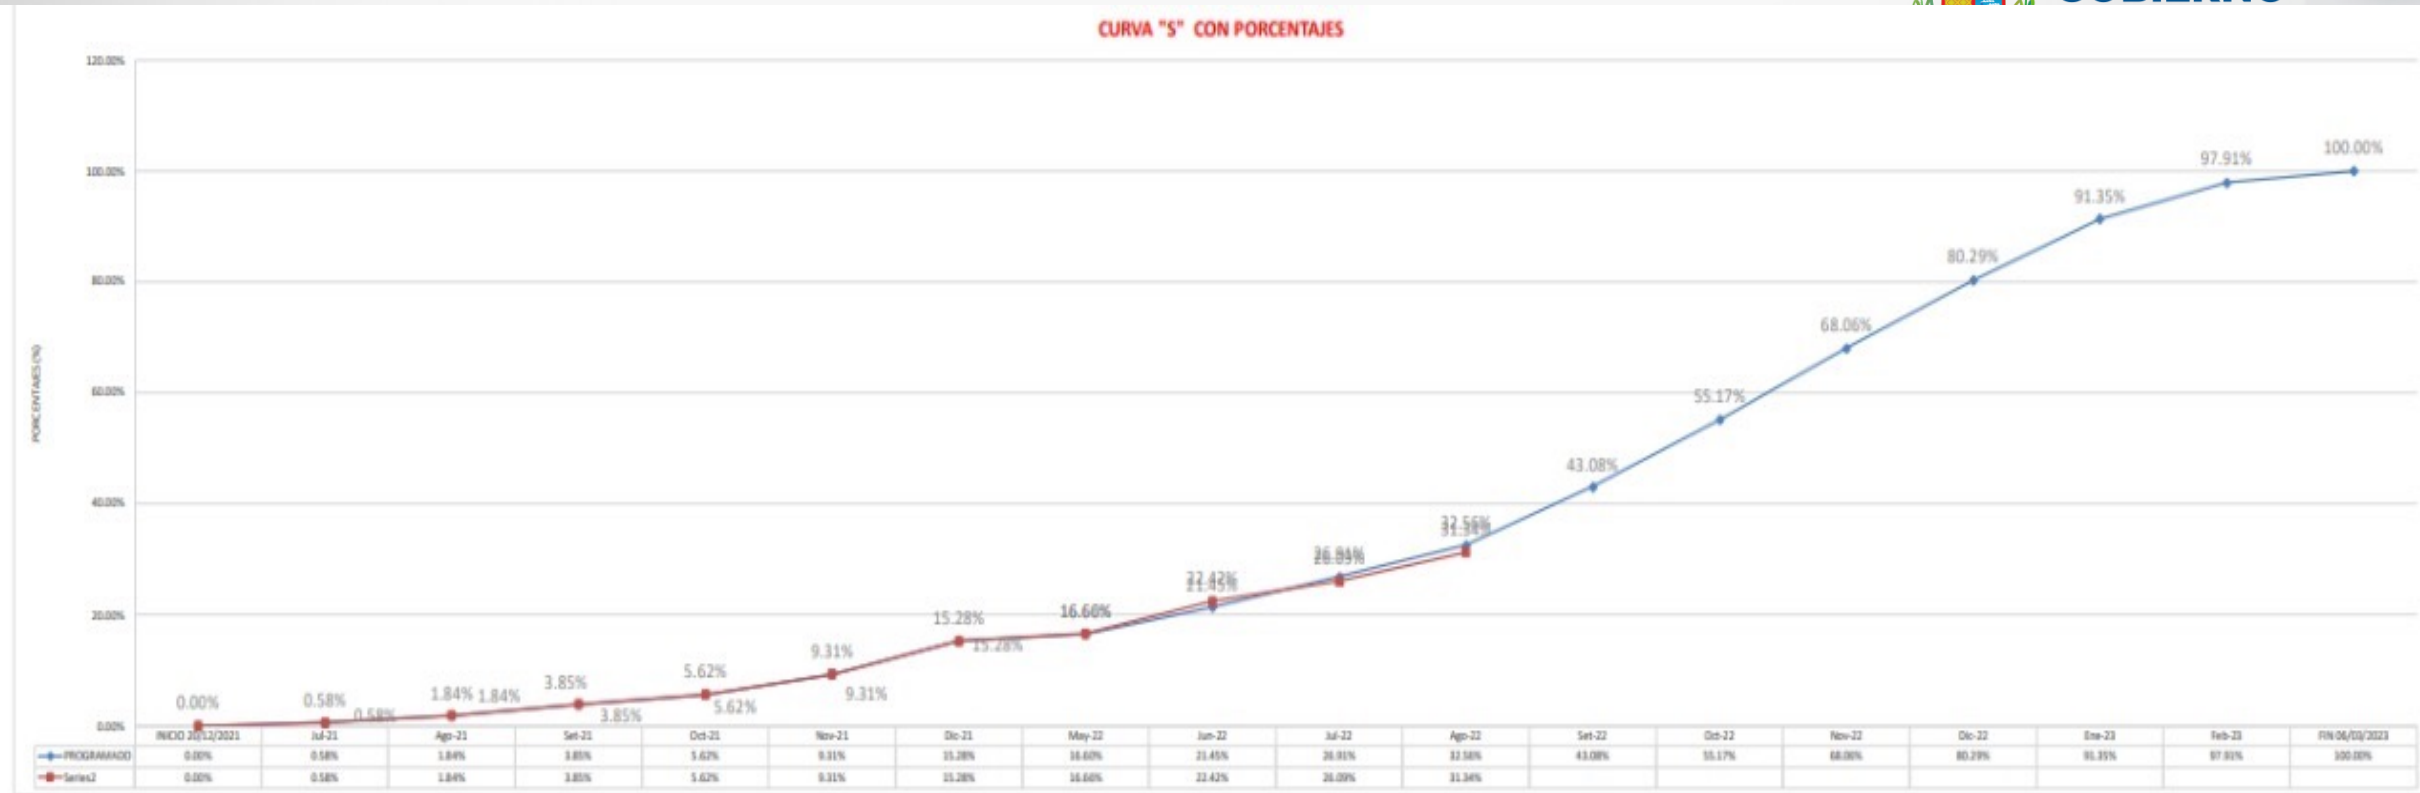


	Jul-21	Ago-21	Sep-21	Oct-21	Nov-21	Dic-21	May-22	Jun-22	Jul-22	Ago-22	Sep-22	Oct-22	Nov-22	Dic-22	Ene-23	Feb-23	Mar-23
AVANCE MENSUAL PROGR.	0.58%	1.26%	2.01%	1.77%	3.69%	5.97%	1.32%	4.85%	5.46%	5.65%	10.52%	12.09%	12.89%	12.23%	11.06%	6.56%	2.09%
AVANCE ACUMULADO PROGR.	0.58%	1.84%	3.78%	6.75%	13.47%	15.28%	16.60%	21.45%	26.91%	32.56%	43.08%	55.17%	68.06%	80.29%	91.35%	97.91%	100.00%
AVANCE MENSUAL EJE.	0.58%	1.26%	2.01%	1.77%	3.69%	5.97%	1.38%	5.76%	3.67%	5.25%							
AVANCE ACUMULADO EJE.	0.58%	1.84%	3.85%	5.62%	9.31%	15.28%	16.64%	22.42%	26.09%	31.34%							





REHABILITACIÓN DE CAMINO DEPARTAMENTAL - 31.633 KM EN PAMPA EL CÓNDOR - PIJOBAMBA - PARASIBE - SITABAMBA

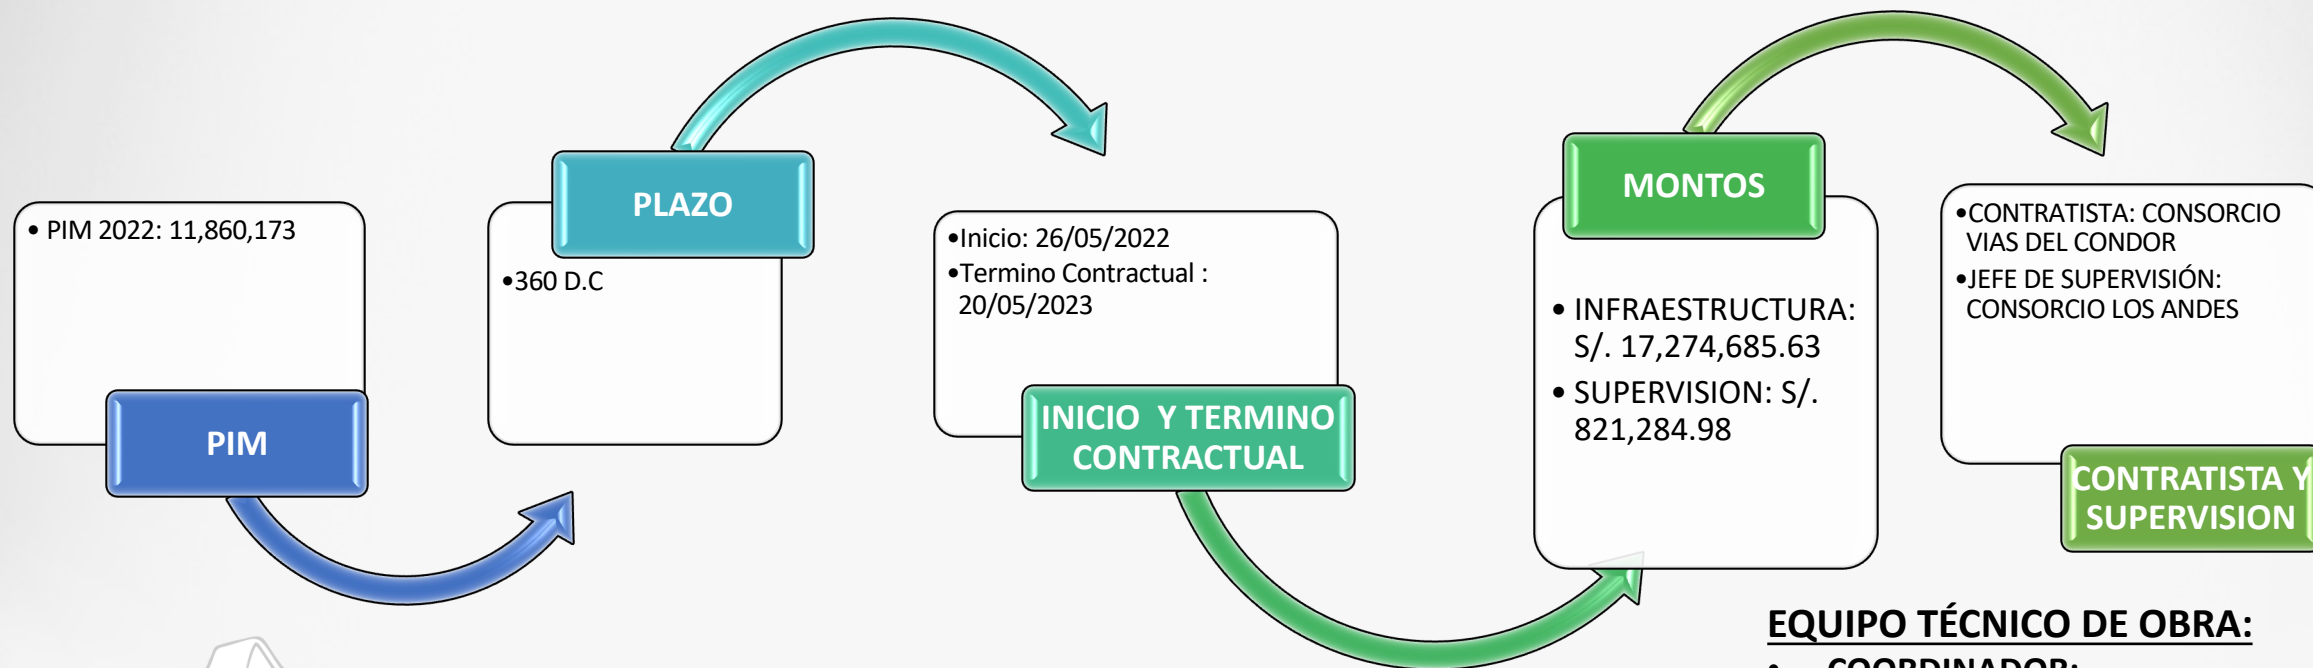

Monto de Inversión: S/ 18,145,244.34

- Avance Físico Acumulado : 17.02 %
- Avance Financiero : 56.70 %
- Estado: Obra en ejecución.

EQUIPO TÉCNICO DE OBRA:

- **COORDINADOR:**
ING. JULIO VALERIANO MURGA
- **RESIDENTE:**
ING. ALEJANDRO ORELLANO ALVAREZ
- **JEFE DE SUPERVISIÓN:**
ING. JUAN GERMAN CUBA SANCHEZ



REHABILITACIÓN DE CAMINO DEPARTAMENTAL - 31.633 KM EN PAMPA EL CÓNDOR - PIJOBAMBA - PARASIBE – SITABAMBA, CUI: 2507329





CURVA DE AVANCE DE OBRA

"REHABILITACION DE CAMINO DEPARTAMENTAL - 31.633 KM EN PAMPA EL CÓNDOR - PIJOBAMBA - PARASIBE - SITABAMBA"

DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022

LEYENDA

CURVA DE AVANCE
PROGRAMADO

CURVA DE AVANCE
REAL


SITUACION ACTUAL DE LA OBRA
OBRA ADELANTADA 5.15%



		Inicio	May-22	Jun-22	Jul-22	Ago-22	Set-22	Oct-22	Nov-22	Dic-22	Ene-23	Feb-23	Mar-23	Abr-23	May-23
VALORIZACION	PROGRAMADO	0.00%	1.10%	3.81%	7.69%	11.87%	16.88%	20.82%	25.02%	35.66%	47.16%	57.55%	69.06%	88.61%	100.00%
ACUMULADA(%)	REAL	0.00%	0.95%	5.21%	12.15%	17.02%									



REHABILITACION DEL SISTEMA DE RIEGO, BOCATOMA LA BOCANA DEL SECTOR PARQUE INDUSTRIAL, DISTRITO DE MOCHE, PROVINCIA DE TRUJILLO, REGION LA LIBERTAD, CUI: 2501969

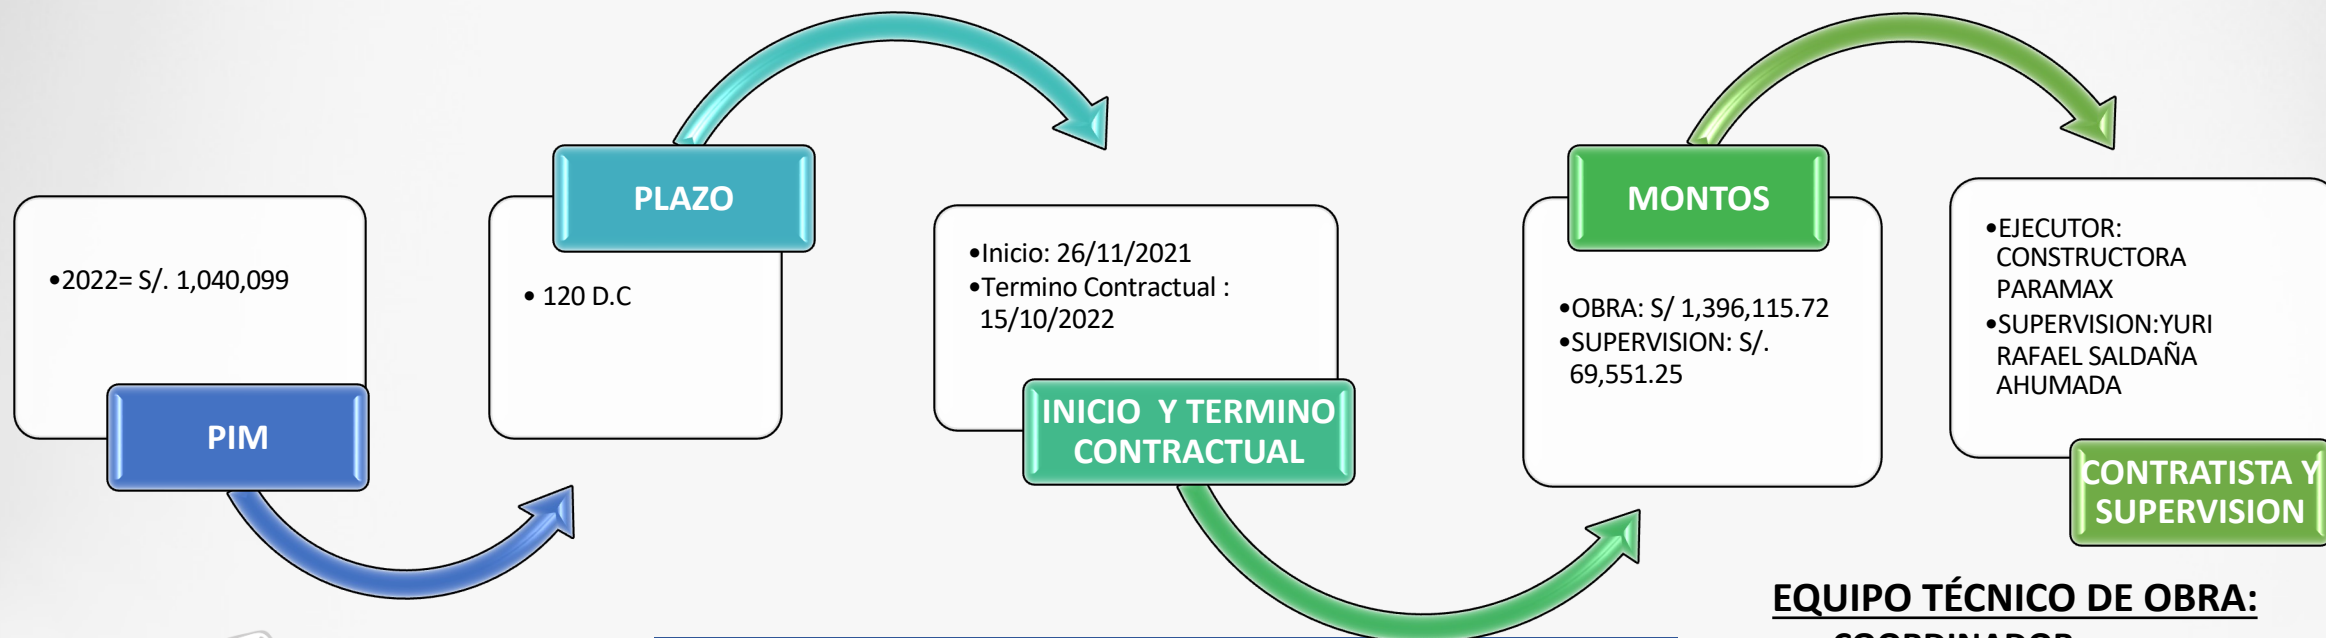

Monto de Inversión: S/ 1,474,028.66

- Avance Físico Acumulado : 56.03 %
- Avance Financiero : 54.60 %
- Estado: En ejecución.

EQUIPO TÉCNICO DE OBRA:

- **COORDINADOR:**
ING. JULIO VALERIANO MURGA
- **RESIDENTE:**
ING. HUAMAN PISCOYA, ARTURO MARTIN
- **JEFE DE SUPERVISIÓN:**
ING. ESCALANTE FACHIN, VICTOR EDWIN



REHABILITACION DEL SISTEMA DE RIEGO, BOCATOMA LA BOCANA DEL SECTOR PARQUE INDUSTRIAL, DISTRITO DE MOCHE, PROVINCIA DE TRUJILLO, REGION LA LIBERTAD, CUI: 2501969



REHABILITACION DEL SISTEMA DE RIEGO, BOCATOMA LA BOCANA DEL SECTOR PARQUE INDUSTRIAL, DISTRITO DE MOCHE, PROVINCIA DE TRUJILLO, REGION LA LIBERTAD, CUI: 2501969



REHABILITACION DEL SISTEMA DE RIEGO, BOCATOMA LA BOCANA DEL SECTOR PARQUE INDUSTRIAL, DISTRITO DE MOCHE, PROVINCIA DE TRUJILLO, REGION LA LIBERTAD, CUI: 2501969



GRAFICO DE AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO VS EJECUTADO ACUMULADO

PROYECTO: "REHABILITACION DEL SISTEMA DE RIEGO, BOCATOMA LA BOCANA DEL SECTOR PARQUE INDUSTRIAL, DISTRITO DE MOCHE, PROVINCIA DE TRUJILLO, REGION LA LIBERTAD"

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA PARAMAX SAC

AVANCE AL: 31 DEL AGOSTO DEL 2022

GOBIERNO
ONAL
BERTAD

VALORIZACION N° 04

CURVA FINANCIERA


VALORIZACION ACUMULADA

Programado	Ejecutado	Variación
S/. 544,385.08	S/. 782,253.61	S/. 237,868.53

143.69%

VALORIZACION MENSUAL

Programado	Ejecutado	Variación
S/. 418,819.06	S/. 667,456.68	S/. 248,637.62

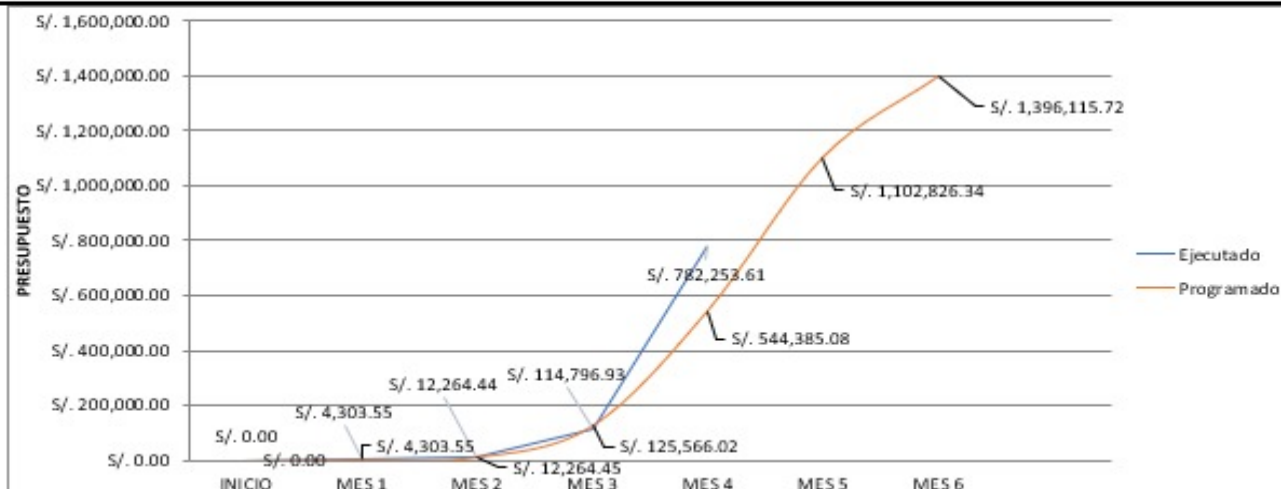

AVANCE FINANCIERO

DATE		INICIO	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6
			Del 26 al 30 de Noviembre 2021	Del 01 al 15 de Diciembre 2021	Del 08 al 31 de Julio 2021	Del 01 al 31 de Agosto 2022	Del 01 al 30 de Septiembre 2022	Del 01 al 16 de Octubre 2022
PROGRAMADO	ACUMUL.	S/. 0.00	S/. 4,303.55	S/. 12,264.45	S/. 125,566.02	S/. 544,385.08	S/. 1,102,826.34	S/. 1,396,115.72
	MES	S/. 0.00	S/. 4,303.55	S/. 7,960.90	S/. 113,301.57	S/. 418,819.06	S/. 558,441.26	S/. 293,289.38
EJECUTADO	ACUMUL.	S/. 0.00	S/. 4,303.55	S/. 12,264.44	S/. 114,796.93	S/. 782,253.61		
	MES	S/. 0.00	S/. 4,303.55	S/. 7,960.90	S/. 102,532.49	S/. 667,456.68		

*Juntos por la
Prosperidad*

 Gobierno Regional La Libertad
www.regionlalibertad.gob.pe

