

Control a la Reconstrucción con Cambios: Sector Vivienda y Saneamiento

Comisión Especial Multipartidaria de Seguimiento al Proceso de Reconstrucción en las zonas afectadas por el Fenómeno del Niño Costero

LUIS PORTUGAL LOZANO
SUBGERENTE DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN



LIMA, 28 DE MARZO DE
2022

Marco normativo



LEY N°30556 (28/04/2017)

Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del gobierno nacional frente a desastres y que dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios.

Artículo 7.4 "...el control gubernamental se realizará de manera simultánea y posterior y está a cargo de la Contraloría General de la República, el cual podrá desarrollarlo directamente o a través de empresas auditoras..."



DECRETO SUPREMO N° 091-2017- PCM (12/09/2017)

Aprueba el Plan de la Reconstrucción al que se refiere la Ley N° 30556, ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, y sus modificatorias.

Marco normativo



LEY N° 30556 25 de abr. 2017

El Control Gubernamental se realiza de manera simultánea y posterior y esta a cargo de la CGR directamente o a través de empresas auditoras.

Resolución de Contraloría N° 361-2017-CG(29/09/2017)

Objetivo: Determinar si las contrataciones de bienes y servicios, consultorías y obras, que se realicen en el marco de la Reconstrucción con Cambios, en las fases de actuaciones preparatorias, procedimientos de selección simplificada y ejecución contractual, cumplen con la normativa establecida.

- Alcance de tres (03) años
- Inversión de S/ 25,655 millones previstos en el PIRCC
- Distribuidas en obras de prevención y desarrollo urbano (S/ 5,446 millones), fortalecimiento de capacidades institucionales (S/ 450 millones) y obras de reconstrucción de infraestructura (S/ 19,759 millones)

Plan de acción de Control de la Reconstrucción con Cambios (2017 - 2020)

Resolución de Contraloría N° 009-2021-CG (14/06/2021)

Objetivo: Establecer la continuidad de la estrategia de control gubernamental que se efectuará a las intervenciones y disposiciones aprobadas del Plan Integral para la RCC.

Plan de Acción de Control de la Reconstrucción con Cambios (2021 – 2022)

- Alcance: 2 años (2021 – 2022)
- Control a las inversiones del PIRCC
- Control al GTG
- Incremento de alcance a través de operativos de control

Plan de la Reconstrucción con Cambios (RCC)

(Decreto Supremo N° 091-2017-PCM (12/09/2019) y Decreto Supremo N° 040-2019-PCM (27/02/2019))

► INVERSIÓN DEL PLAN INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS (PIRC)

En soles / miles de millones

COMPONENTES DE LA RCC CON MONTO DE INVERSIÓN SEGÚN EL PLAN



Total de Inversión **25 655 490**
(100%)



Avance de la ejecución del gasto RCC (Febrero 2022)

AVANCE ACUMULADO RESPECTO A LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS

PLAN PIRRC

Transferencia primaria



25 655 491




21 636 843 498

Devengado acumulado



15 062 399 455



69.6 %

Avance acumulado
2017 - Febrero 2022

AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO ACUMULADO

Por año respecto al total del plan

MONTOS EN SOLES

% AVANCE

Plan
PIRCC

25 655 490 785

100%

AÑO	DEVENGADO S/	DEVENGADO ACUMULADO S/	AVANCE
2017	374,660,974	374,660,974	1.5%
2018	1,785,388,494	2,160,049,468	8.4%
2019	3,334,338,992	5,494,388,460	21.4%
2020	3,491,648,708	8,986,037,168	35.0%
2021	5,576,950,388	14,562,987,556	56.8%
2022	499,411,899	15,062,399,455	58.7%

Ejecución presupuestal de la RCC (2017 - Febrero 2022): SECTOR VIV. Y SANEAMIENTO

► EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

En millones de soles

PLAN PIRCC SECTOR VIVIENDA Y SANEAMIENTO	TRANSFERENCIA PRIMARIA 2017 – 2022	DEVENGADO ACUMULADO	AVANCE ACUMULADO 2017 – 2022
4,668,481,722	3,424,346,221	2,792,285,529	81.5%

AÑO	DEVENGADO S/	DEVENGADO ACUMULADO s/
2017	79,200,495	79,200,495
2018	749,635,150	828,835,644
2019	1,025,265,936	1,854,101,580
2020	516,441,534	2,370,543,114
2021	417,808,777	2,788,351,892
2022	3,933,638	2,792,285,529

Estado situacional de actividades y proyectos por nivel de gobierno del Sector Vivienda y Saneamiento de la RCC

ESTADO	GOBIERNO NACIONAL	GOBIERNO REGIONAL	GOBIERNO LOCAL	TOTAL	%
1. ETAPA PREVIA	134	2	397	533	18.1%
2. CON BUENA PRO O CONTRATADO	1	0	76	77	2.6%
3. EN EJECUCIÓN	70	1	379	450	15.3%
4. PARALIZADA	38	2	51	91	3.1%
5. CONTRATO RESUELTO	6	0	2	8	0.3%
6. EN ETAPA DE RECEPCION	78	3	105	186	6.3%
7. CONCLUIDO	365	21	1217	1603	54.4%
TOTAL	692	29	2227	2948	100.0%


Act. y Proy. por nivel de gobierno del Sector Viv. y Saneamiento

DEPARTAMENTO	GOBIERNO NACIONAL	GOBIERNO REGIONAL	GOBIERNO LOCAL	TOTAL
ANCASH	93	0	309	402
AREQUIPA	13	1	31	45
AYACUCHO	21	0	209	230
CAJAMARCA	19	0	487	506
HUANCAVELICA	18	0	266	284
ICA	12	0	59	71
LA LIBERTAD	76	9	229	314
LAMBAYEQUE	78	0	103	181
LIMA	125	8	244	377
LORETO	0	0	8	8
PIURA	222	10	239	471
TUMBES	13	1	43	57
MULTIDEPARTAMENTAL	2	0	0	2
TOTAL	692	29	2227	2948

Estado situacional de act. y proyectos del Sector Vivienda y Saneamiento


NIVEL	PROYECTO MONTO Y AVANCE	1.ETAPA PREVIA	2.CON BUENA PRO O CONTRADO	3.EN EJECUCIÓN	4.PARALIZADO	5.CON CONTRATO RESUELTO	6.EN ETAPA DE RECEPCIÓN	7.CONCLUIDO	Total general
GOBIERNO NACIONAL	N° Proyectos y Actividades	134	1	70	38	6	78	365	692
	Transferencia primaria S/	57,213,350	97,830	1,097,371,270	25,316,671	15,845,863	21,929,107	158,365,936	1,376,140,027
	Devengado acumulado S/	2,622,413	0	946,917,173	14,776,669	0	18,332,091	133,596,067	1,116,244,412
	Avance	4.6%	0.0%	86.3%	58.4%	0.0%	83.6%	84.4%	81.1%
GOBIERNO REGIONAL	N° Proyectos y Actividades	2	0	1	2	0	3	21	29
	Transferencia primaria S/	189,000	0	9,291,865	15,384,227	0	46,221,126	91,319,445	162,405,663
	Devengado acumulado S/	18,740	0	2,437,221	6,589,517	0	40,041,948	75,469,863	124,557,290
	Avance	9.9%	0.0%	26.2%	42.8%	0.0%	86.6%	82.6%	76.7%
GOBIERNO LOCAL	N° Proyectos y Actividades	397	76	379	51	2	105	1217	2227
	Transferencia primaria S/	166,218,730	37,165,279	471,830,997	119,587,700	121,334	76,897,206	1,013,979,285	1,885,800,531
	Devengado acumulado S/	90,139,017	11,408,139	324,190,594	91,879,375	6,000	68,705,085	965,155,617	1,551,483,827
	Avance	54.2%	30.7%	68.7%	76.8%	4.9%	89.3%	95.2%	82.3%
TOTAL GENERAL	N° Proyectos y Actividades	533	77	450	91	8	186	1603	2948
	Transferencia primaria S/	223,621,080	37,263,109	1,578,494,132	160,288,598	15,967,197	145,047,439	1,263,664,666	3,424,346,221
	Devengado acumulado S/	92,780,170	11,408,139	1,273,544,988	113,245,561	6,000	127,079,123	1,174,221,548	2,792,285,529
	Avance	41.5%	30.6%	80.7%	70.7%	0.0%	87.6%	92.9%	81.5%

Análisis Presupuestal de las
Intervenciones del Sector
Vivienda (Pistas & Veredas,
Saneamiento y Soluciones de
Vivienda)



ANÁLISIS PRESUPUESTAL DEL PLAN INTEGRAL DE LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS

Distribución Presupuestal del PIRCC por Componente

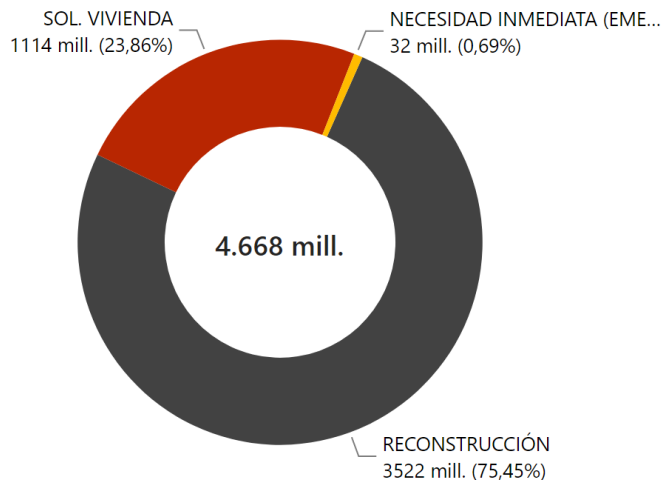

Componente	Nº Interv.	Costo PIRCC Inicial
NECESIDAD INMEDIATA (EMERGENCIA)	36	32 mill.
RECONSTRUCCIÓN	5.097	3.522 mill.
SOL. VIVIENDA		1.114 mill.
Total	5.133	4.668 mill.

Distribución Presupuestal del PIRCC por Nivel de Gobierno


Nivel de Gobierno	Nº Interv.	Costo PIRCC Inicial
1 GOBIERNO NACIONAL	2.813	3.696 mill.
2 GOBIERNO REGIONAL	841	583 mill.
3 GOBIERNO LOCAL	1.479	389 mill.
Total	5.133	4.668 mill.

Distribución Presupuestal del PIRCC por Componente y Sector

Componente / Sector	Nº Interv.	Costo PIRCC Inicial
<input checked="" type="checkbox"/> NECESIDAD INMEDIATA (EMERGENCIA)	36	32 mill.
PISTAS Y VEREDAS	33	29 mill.
SANEAMIENTO	2	0 mill.
VIVIENDAS	1	3 mill.
<input checked="" type="checkbox"/> RECONSTRUCCIÓN	5.097	3.522 mill.
PISTAS Y VEREDAS	3.346	1.481 mill.
SANEAMIENTO	1.751	2.041 mill.
<input checked="" type="checkbox"/> SOL. VIVIENDA		1.114 mill.
Total	5.133	4.668 mill.


ANÁLISIS DE LAS EJECUTORAS DEL PLAN INTEGRAL DE LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS

Número de Ejecutoras del PIRCC Inicial

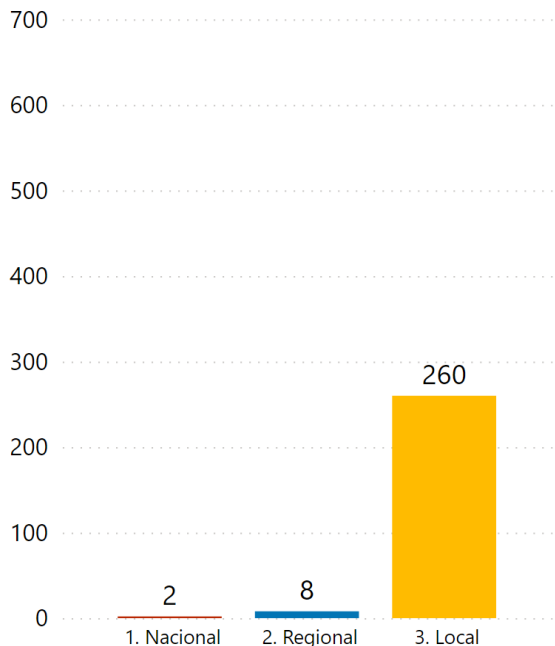

Nivel de Gobierno			Total
1. Nacional	2. Regional	3. Local	
2	8	260	270

Número de Ejecutoras del PIRCC Vigente

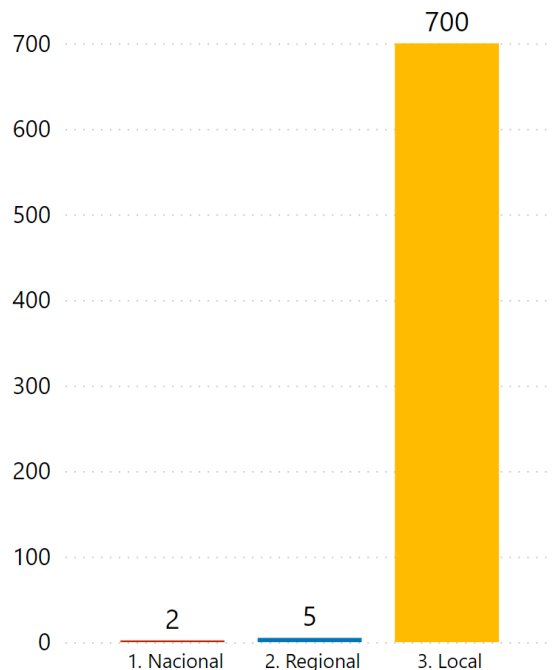

Nivel de Gobierno			Total
1. Nacional	2. Regional	3. Local	
2	5	700	707

NORMATIVAS DE CAMBIO DE E.E.

Año	Cant.
2018	3570
D.S. N° 010-2018-PCM	86
D.S. N° 016-2018-PCM	99
D.S. N° 020-2018-PCM	45
D.S. N° 027-2018-PCM	3124
D.S. N° 052-2018-PCM	178
RDE 054-2018-RCC/DE	22
RDE 055-2018-RCC/DE	13
RDE 061-2018-RCC/DE	2
RDE 065-2018-RCC/DE	1
2019	899
RDE 008-2019-RCC/DE	607
RDE 029-2019-RCC/DE	5
RDE 045-2019-RCC/DE	16
RDE 054-2019-RCC/DE	112
RDE 064-2019-RCC/DE	90
RDE 069-2019-RCC/DE	13
RDE 074-2019-RCC/DE	3
RDE 090-2019-RCC/DE	46
RDE 124-2019-RCC/DE	1
RDE 134-2019-RCC/DE	6
2020	281
R.D.E N° 037-2020	18
RDE 00128-2020-ARCC/DE	15
RDE 003-2020-RCC/DE	69
RDE 026-2020-RCC/DE	60
RDE 058-2020-ARCC/DE	75
RDE 082-2020-RCC/DE	6
RDE 098-2020-RCC/DE	1
RDE 161-2020-ARCC/DE	37
2021	21
RDE N° 00009-2021-ARCC/DE	5
RDE N° 00037-2021-ARCC/DE	3
RDE N° 00062-2021-ARCC/DE	4
RDE N° 00072-2021-ARCC/DE	7
RDE N° 00139-2021-ARCC/DE	2
2022	2
RDE N° 007-2022-ARCC/DE	2
Total	4773


Fuente: (1) PIRCC, (2) Normativas de inclusiones, exclusiones (3) normativas de transferencias pptal (4) Respuesta al Oficio General 2021 (5) Aplicativo Monitor ARCC al 28.02.2022

GESTIÓN DEL PIRCC - VARIACIÓN PRESUPUESTAL POR INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN DE INTERVENCIONES - COMPONENTE RECONSTRUCCIÓN


Normativas de inclusiones y exclusiones de intervenciones

Año	Inicial	Inclusiones	Exclusiones
2017	5.097	88	
D.S. N° 091-2017-PCM	5.097		
D.S. N° 116-2017-PCM		88	
2018		2036	164
D.S. N° 016-2018-PCM		2018	91
D.S. N° 052-2018-PCM		14	55
RDE 054-2018-RCC/DE		4	
RDE 055-2018-RCC/DE			12
RDE 065-2018-RCC/DE			2
RDE 086-2018-RCC/DE			4
2019		2	250
RDE 008-2019-RCC/DE			5
RDE 029-2019-RCC/DE			15
RDE 045-2019-RCC/DE			16
RDE 064-2019-RCC/DE		1	177
RDE 069-2019-RCC/DE			25
RDE 074-2019-RCC/DE		1	
RDE 090-2019-RCC/DE			1
RDE 124-2019-RCC/DE			7
RDE 125-2019-RCC/DE			4
2020		3	146
R.D.E N° 037-2020			2
RDE 00128-2020-ARCC/DE		1	3
RDE 00179-2020-ARCC/DE			72
RDE 026-2020-RCC/DE			8
RDE 058-2020-ARCC/DE			3
RDE 082-2020-RCC/DE		1	31
RDE 098-2020-RCC/DE			15
RDE 161-2020-ARCC/DE		1	12
2021		1	172
RDE N° 00009-2021-ARCC/DE			47
RDE N° 00016-2021-ARCC/DE			5
RDE N° 00024-2021-ARCC/DE			7
RDE N° 00037-2021-ARCC/DE			5
RDE N° 00062-2021-ARCC/DE		1	7
RDE N° 00072-2021-ARCC/DE			15
RDE N° 00087-2021-ARCC/DE			17
RDE N° 00124-2021-ARCC/DE			40
RDE N° 00139-2021-ARCC/DE			29
2022			65
RDE N° 007-2022-ARCC/DE			65
Total	5.097	2130	797

Numero de Inclusiones y exclusiones de Intervenciones Pistas Veredas

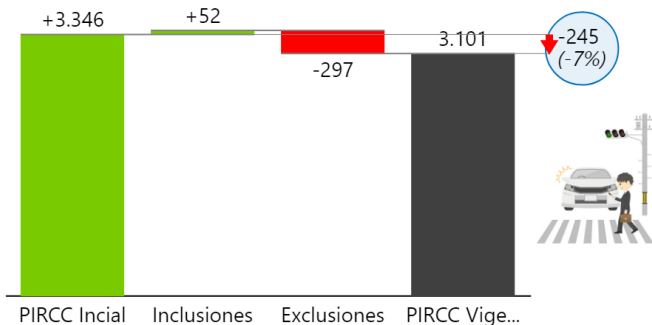


Variación presupuestal por inclusiones y exclusiones Pistas Veredas

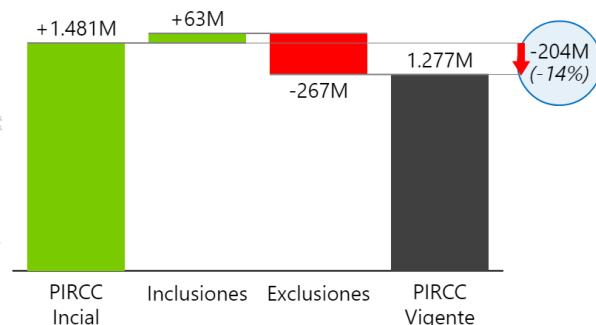


Existen intervenciones en el PIRCC cuyo costo estimado de implementación no están definidos.

Numero de Inclusiones y exclusiones de Intervenciones Saneamiento

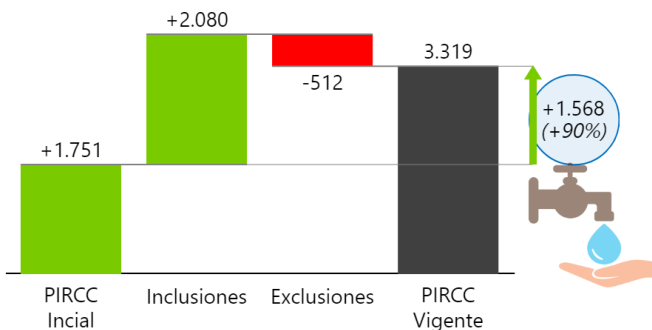

Variación presupuestal por inclusiones y exclusiones Saneamiento


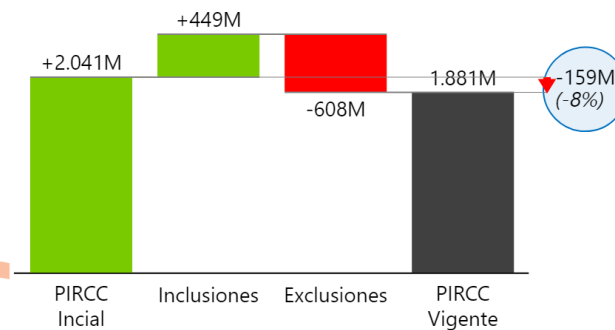


GESTIÓN DEL PIRCC - CAMBIO DE ENTIDADES EJECUTORAS - COMPONENTE RECONSTRUCCIÓN

Nro Intervenciones del PIRCC Inicial por Nivel de Gobierno - Pistas y Veredas

Nivel Gobierno	N° Intervenciones	%
1. Nacional	950	30%
2. Regional	790	25%
3. Local	1.394	44%
Total	3.134	100%


Nro. de Intervenciones



Intervenciones del PIRCC Vigente por Nivel de Gobierno - Pistas y Veredas

Nivel Gobierno	N° Intervenciones	%
1. Nacional	26	1%
2. Regional	30	1%
3. Local	3.078	98%
Total	3.134	100%



Nro. de Intervenciones

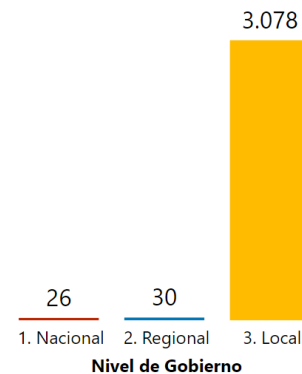

Nro Intervenciones del PIRCC Inicial por Nivel de Gobierno - Saneamiento

Nivel Gobierno	N° Intervenciones	%
1. Nacional	1.915	58%
2. Regional	3	0%
3. Local	1.403	42%
Total	3.321	100%


Nro. de Intervenciones

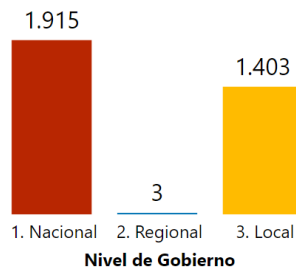

Intervenciones del PIRCC Vigente por Nivel de Gobierno - Saneamiento

Nivel Gobierno	N° Intervenciones	%
1. Nacional	742	22%
2. Regional	3	0%
3. Local	2.576	78%
Total	3.321	100%

Nro. de Intervenciones

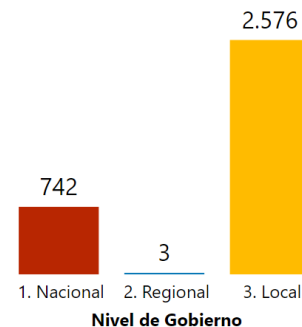


GESTIÓN DEL PIRCC - DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAMBIO DE ENTIDADES EJECUTORAS - COMPONENTE RECONSTRUCCIÓN

Costo del PIRCC Inicial por niveles de Gobierno - Pistas y Veredas

Nivel de Gobierno	Costo	%
2. Regional	S/. 508 mill.	39%
1. Nacional	S/. 422 mill.	32%
3. Local	S/. 376 mill.	29%
Total	S/. 1.306 mill.	100%


COSTO



Costo del PIRCC Vigente por niveles de Gobierno - Pistas y Veredas

Nivel de Gobierno	Costo	%
1. Nacional	S/. 18 mill.	1%
2. Regional	S/. 83 mill.	6%
3. Local	S/. 1.205 mill.	92%
Total	S/. 1.306 mill.	100%



COSTO

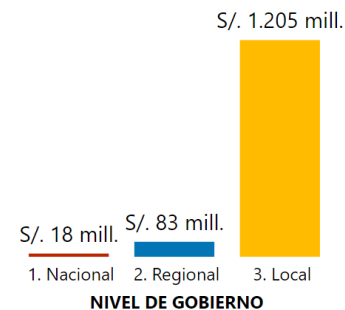

Costo del PIRCC Inicial por niveles de Gobierno - Saneamiento

Nivel de Gobierno	Costo	%
1. Nacional	S/. 1.642 mill.	87%
3. Local	S/. 234 mill.	12%
2. Regional	S/. 6 mill.	0%
Total	S/. 1.882 mill.	100%


COSTO

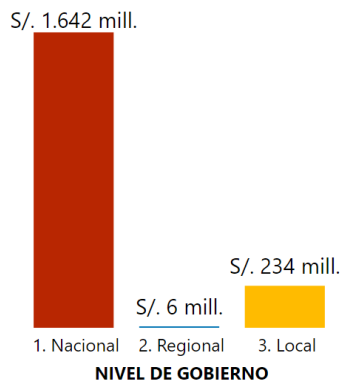

Costo del PIRCC Vigente por niveles de Gobierno - Saneamiento


Nivel de Gobierno	Costo	%
1. Nacional	S/. 853 mill.	45%
2. Regional	S/. 6 mill.	0%
3. Local	S/. 1.023 mill.	54%
Total	S/. 1.882 mill.	100%

COSTO

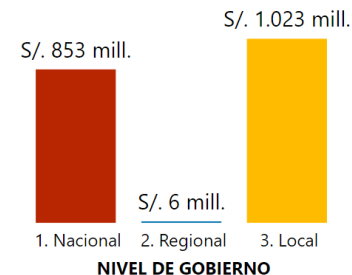


INTERVENCIONES FINANCIADAS DEL COMPONENTE RECONSTRUCCIÓN Y SU VARIACIÓN DE COSTOS - PISTAS Y VEREDAS

Numero de Intervenciones por estado de Financiamiento

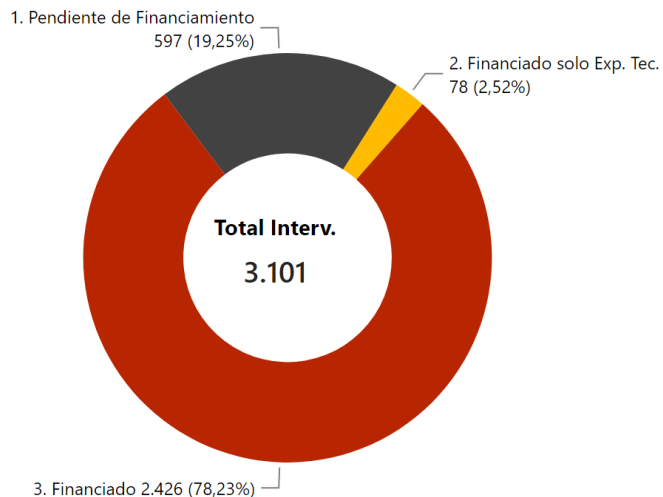

Estado	Nro. Interv.	Nº Proy.	Costo PIRCC Vigente	% de Interv. Financ.
1. Pendiente de Financiamiento	597	0	S/. 308 mill.	19%
2. Financiado solo Exp. Tec.	78	0	S/. 36 mill.	3%
3. Financiado	2.426	879	S/. 934 mill.	78%
Total	3.101	879	S/. 1.277 mill.	100%


Variación Presupuestal de las Intervenciones Financieras

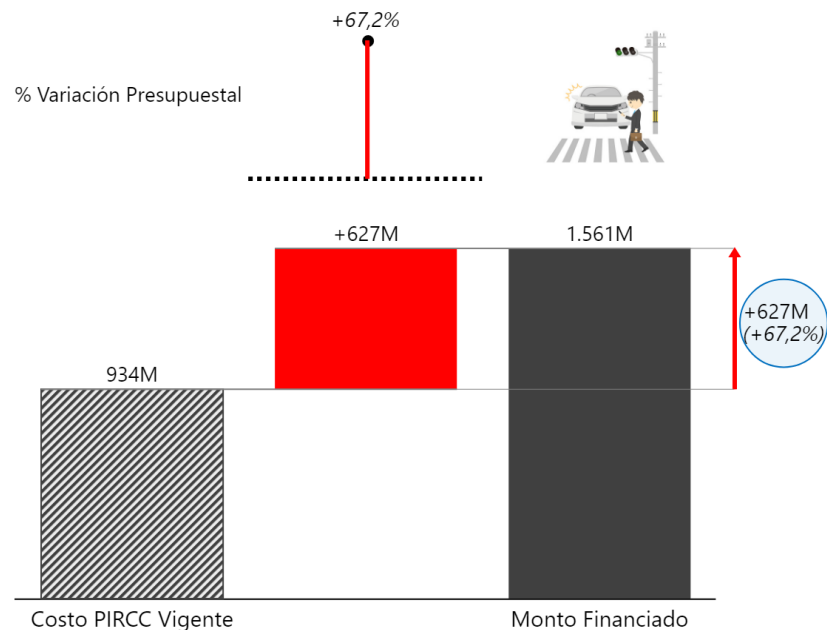

Estado	Nro. Interv.	Nº Proy.	Costo PIRCC Vigente	Monto Financiado	% Var. Fto.	Diferencia
3. Financiado	2.426	879	S/. 934 mill.	S/ 1.561 mill.	67,2 %	S/ 627 mill.
Total	2.426	879	S/. 934 mill.	S/ 1.561 mill.	67,2 %	S/ 627 mill.


INTERVENCIONES FINANCIADAS DEL COMPONENTE RECONSTRUCCIÓN Y SU VARIACIÓN DE COSTOS - SANEAMIENTO

Numero de Intervenciones por estado de Financiamiento

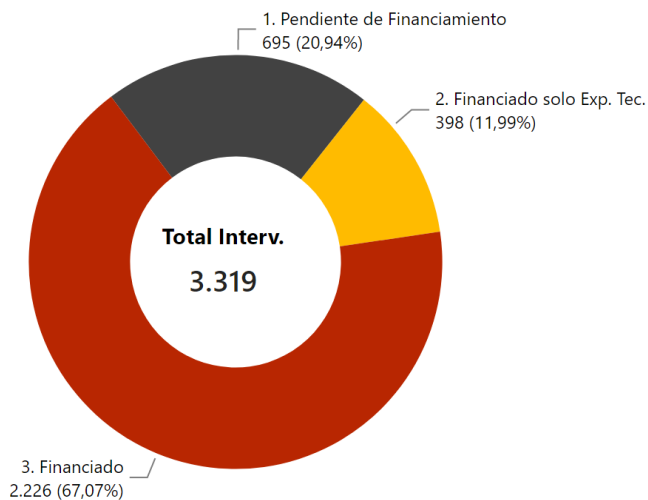

Estado	Nro. Interv.	Nº Proy.	Costo PIRCC Vigente	% de Interv. Financ.
1. Pendiente de Financiamiento	695	0	S/. 140 mill.	21%
2. Financiado solo Exp. Tec.	398	0	S/. 784 mill.	12%
3. Financiado	2.226	2.044	S/. 957 mill.	67%
Total	3.319	2.044	S/. 1.881 mill.	100%

Variación Presupuestal de las Intervenciones Financieras

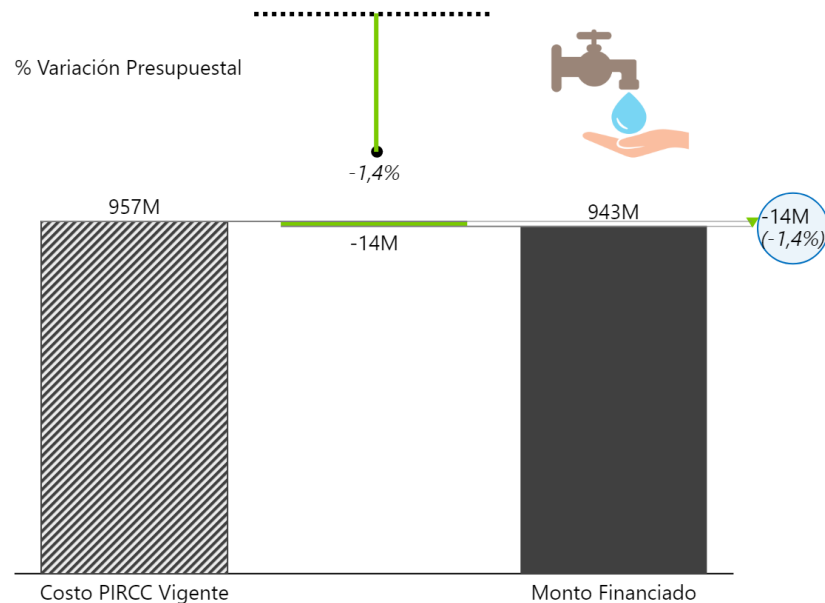


Estado	Nro. Interv.	Nº Proy.	Costo PIRCC Vigente	Monto Financiado	% Var. Fto.	Diferencia
3. Financiado	2.226	2.044	S/. 957 mill.	S/ 943 mill.	-1,4 %	-S/ 14 mill.
Total	2.226	2.044	S/. 957 mill.	S/ 943 mill.	-1,4 %	-S/ 14 mill.

ANÁLISIS DE VARIACIÓN DE COSTOS: INTERVENCIONES FINANCIADAS DEL COMPONENTE RECONSTRUCCIÓN POR NIVEL DE GOBIERNO


Variación de Costos por Nivel de Gobierno - Pistas Veredas

Financiamiento por Nivel de Gobierno	Nro. Interv.	Nº Proy.	Costo PIRCC Vigente	Monto Financiado	% Var. Fto.	Diferencia
3. Financiado	2.426	879	S/. 934 mill.	S/ 1.561 mill.	67,2 %	S/ 627 mill.
1 GOBIERNO NACIONAL	20	4	S/. 14 mill.	S/ 30 mill.	109,3 %	S/ 16 mill.
2 GOBIERNO REGIONAL	11	11	S/. 30 mill.	S/ 36 mill.	21,4 %	S/ 6 mill.
3 GOBIERNO LOCAL	2.395	864	S/. 890 mill.	S/ 1.495 mill.	68,0 %	S/ 605 mill.
Total	2.426	879	S/. 934 mill.	S/ 1.561 mill.	67,2 %	S/ 627 mill.

3. Local

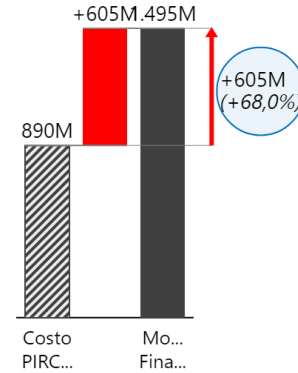

2. Regional




1. Nacional




Variación de Costos por Nivel de Gobierno - Saneamiento

Financiamiento por Nivel de Gobierno	Nro. Interv.	Nº Proy.	Costo PIRCC Vigente	Monto Financiado	% Var. Fto.	Diferencia
3. Financiado	2.226	2.044	S/. 957 mill.	S/ 943 mill.	-1,4 %	-S/ 14 mill.
1 GOBIERNO NACIONAL	677	635	S/. 388 mill.	S/ 338 mill.	-12,9 %	-S/ 50 mill.
2 GOBIERNO REGIONAL	2	2	S/. 5 mill.	S/ 5 mill.	0,0 %	S/ 0 mill.
3 GOBIERNO LOCAL	1.547	1.407	S/. 564 mill.	S/ 600 mill.	6,5 %	S/ 37 mill.
Total	2.226	2.044	S/. 957 mill.	S/ 943 mill.	-1,4 %	-S/ 14 mill.


3. Local

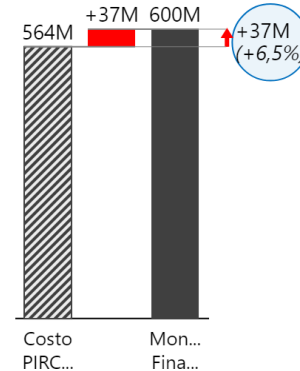

1. Nacional

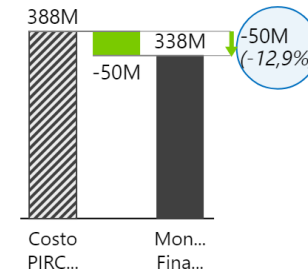

2. Regional




ANÁLISIS DE VARIACIÓN DE COSTOS DE LAS INTERVENCIONES FINANCIADAS POR REGIÓN - PISTAS Y VEREDAS




Estado / Región	Nro. Interv.	Nº Proy.	Costo PIRCC Vigente	Monto Financiado	% Var. Fto.	Diferencia
3. Financiado	2.426	879	S/. 934 mill.	S/ 1.561 mill.	67,2 %	S/ 627 mill.
PIURA	310	123	S/. 180 mill.	S/ 359 mill.	99,4 %	S/ 179 mill.
CAJAMARCA	446	130	S/. 156 mill.	S/ 226 mill.	45,4 %	S/ 71 mill.
LA LIBERTAD	240	113	S/. 110 mill.	S/ 151 mill.	37,7 %	S/ 42 mill.
LAMBAYEQUE	313	68	S/. 87 mill.	S/ 148 mill.	70,3 %	S/ 61 mill.
LIMA	53	25	S/. 53 mill.	S/ 147 mill.	180,9 %	S/ 95 mill.
ANCASH	255	133	S/. 92 mill.	S/ 145 mill.	57,7 %	S/ 53 mill.
LIMA PROVINCIAS	284	110	S/. 97 mill.	S/ 140 mill.	43,3 %	S/ 42 mill.
AYACUCHO	128	51	S/. 64 mill.	S/ 87 mill.	36,4 %	S/ 23 mill.
TUMBES	65	44	S/. 33 mill.	S/ 58 mill.	74,1 %	S/ 24 mill.
HUANCAVELICA	133	43	S/. 27 mill.	S/ 39 mill.	45,1 %	S/ 12 mill.
AREQUIPA	162	19	S/. 14 mill.	S/ 37 mill.	152,2 %	S/ 22 mill.
LORETO	24	7	S/. 3 mill.	S/ 15 mill.	328,8 %	S/ 11 mill.
ICA	13	13	S/. 18 mill.	S/ 10 mill.	-45,4 %	-S/ 8 mill.
Total	2.426	879	S/. 934 mill.	S/ 1.561 mill.	67,2 %	S/ 627 mill.


PIURA




LA LIBERTAD




LAMBAYEQUE




ANCASH




LIMA PROVINCIAS




TUMBES




CAJAMARCA




LIMA




AYACUCHO




HUANCAVELICA



AREQUIPA



ICA















LORETO



ANÁLISIS DE VARIACIÓN DE COSTOS DE LAS INTERVENCIONES FINANCIADAS POR REGIÓN - SANEAMIENTO




Estado / Región	Nro. Interv.	Nº Proy.	Costo PIRCC Vigente	Monto Financiado	% Var. Fto.	Diferencia
3. Financiado	2.226	2.044	S/. 957 mill.	S/ 943 mill.	-1,4 %	-S/ 14 mill.
PIURA	371	331	S/. 252 mill.	S/ 273 mill.	8,2 %	S/ 21 mill.
CAJAMARCA	443	422	S/. 89 mill.	S/ 149 mill.	67,3 %	S/ 60 mill.
LAMBAYEQUE	139	106	S/. 112 mill.	S/ 107 mill.	-4,0 %	-S/ 4 mill.
LIMA PROVINCIAS	217	212	S/. 99 mill.	S/ 99 mill.	-0,1 %	-S/ 0 mill.
LA LIBERTAD	227	194	S/. 80 mill.	S/ 97 mill.	22,1 %	S/ 18 mill.
ANCASH	274	262	S/. 171 mill.	S/ 64 mill.	-62,6 %	-S/ 107 mill.
HUANCAVELICA	260	241	S/. 44 mill.	S/ 48 mill.	8,3 %	S/ 4 mill.
AYACUCHO	189	181	S/. 29 mill.	S/ 43 mill.	45,9 %	S/ 13 mill.
ICA	59	57	S/. 37 mill.	S/ 38 mill.	1,8 %	S/ 1 mill.
AREQUIPA	31	25	S/. 24 mill.	S/ 16 mill.	-34,1 %	-S/ 8 mill.
TUMBES	15	12	S/. 19 mill.	S/ 9 mill.	-53,7 %	-S/ 10 mill.
LORETO	1	1	S/. 0 mill.	S/ 1 mill.	96,0 %	S/ 0 mill.
Total	2.226	2.044	S/. 957 mill.	S/ 943 mill.	-1,4 %	-S/ 14 mill.

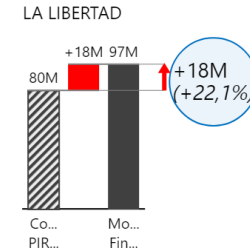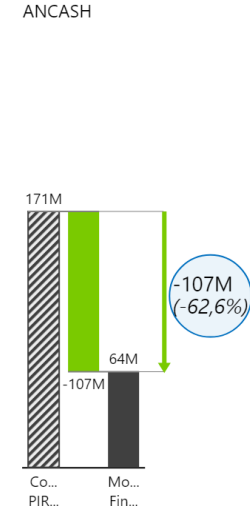

ANÁLISIS DEL REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN AL 100% DE LAS INTERVENCIONES


COMPONENTE RECONSTRUCCIÓN - PISTAS Y VEREDAS

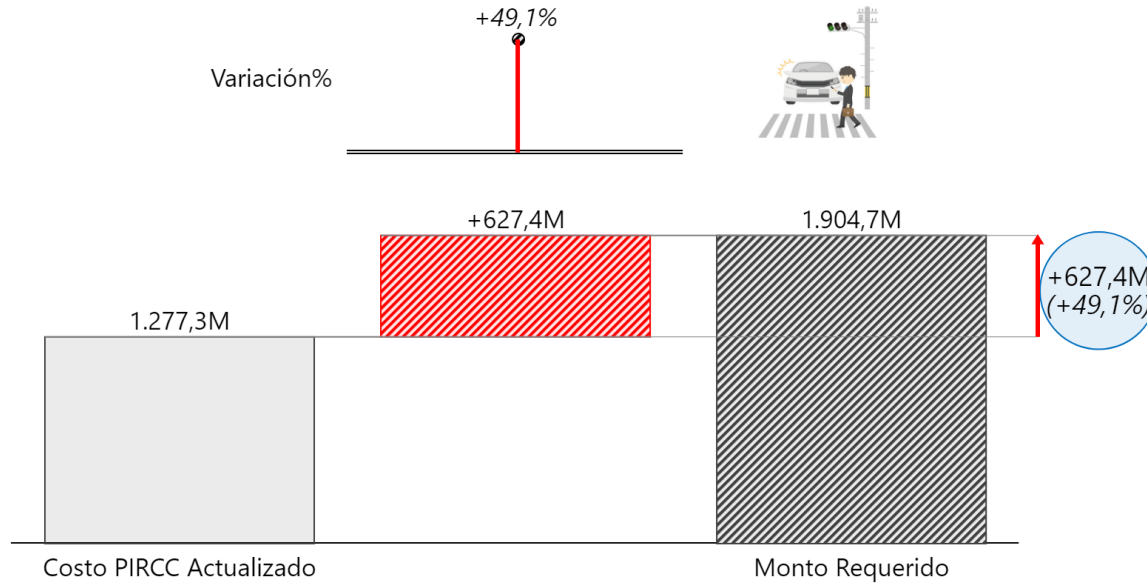

Estado Intervención	Nro. Interv. Inicial	Costo PIRCC Inicial	Nro. Interv. Vigente	Nº Proy.	Costo PIRCC Vigente	Monto Financiado (S/)	Monto Requerido (S/)
1. Pendiente de Financiamiento	846	S/ 537 mill.	597	0	S/ 308 mill.		S/ 308 mill.
2. Financiado solo Exp. Tec.	117	S/ 43 mill.	78	0	S/ 36 mill.		S/ 36 mill.
3. Financiado	2.383	S/ 901 mill.	2.426	879	S/ 934 mill.	S/ 1.561 mill.	S/ 1.561 mill.
Total	3.346	S/ 1.481 mill.	3.101	879	S/ 1.277 mill.	S/ 1.561 mill.	S/ 1.905 mill.

ANÁLISIS DEL REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN AL 100% DE LAS INTERVENCIONES


COMPONENTE RECONSTRUCCIÓN - SANEAMIENTO

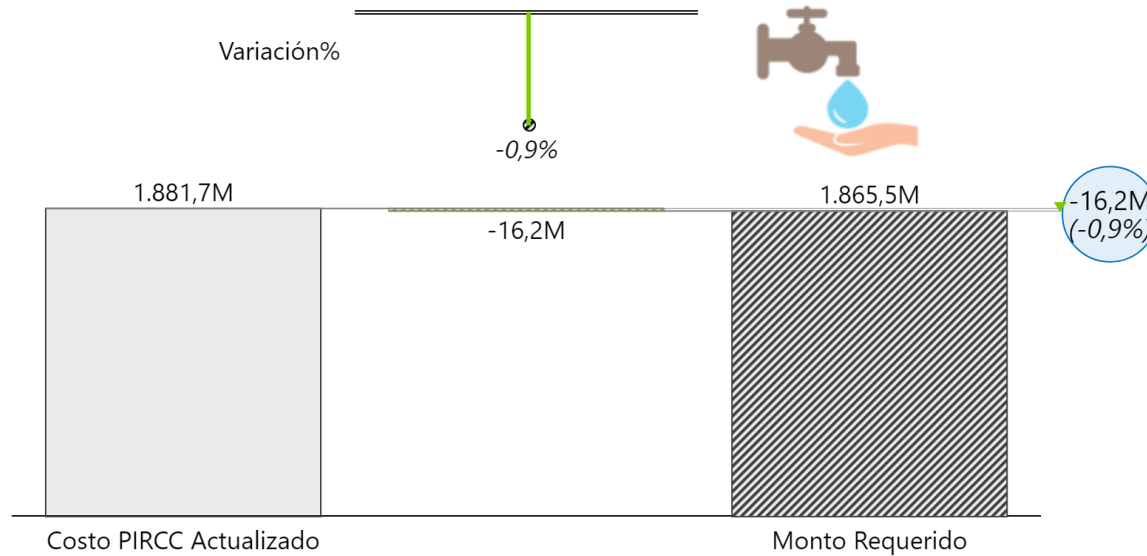

Estado Intervención	Nro. Interv. Inicial	Costo PIRCC Inicial	Nro. Interv. Vigente	Nº Proy.	Costo PIRCC Vigente	Monto Financiado (S/)	Monto Requerido (S/)
1. Pendiente de Financiamiento	228	S/ 74 mill.	695	0	S/ 140 mill.		S/ 140 mill.
2. Financiado solo Exp. Tec.	315	S/ 767 mill.	398	0	S/ 784 mill.		S/ 784 mill.
3. Financiado	898	S/ 655 mill.	2.228	2.040	S/ 957 mill.	S/ 941 mill.	S/ 941 mill.
Total	1.441	S/ 1.495 mill.	3.321	2.040	S/ 1.882 mill.	S/ 941 mill.	S/ 1.865 mill.

ANÁLISIS DE LAS INTERVENCIONES DEL COMPONENTE SOLUCIONES DE VIVIENDA


Distribución Presupuestal del PIRCC por Componente

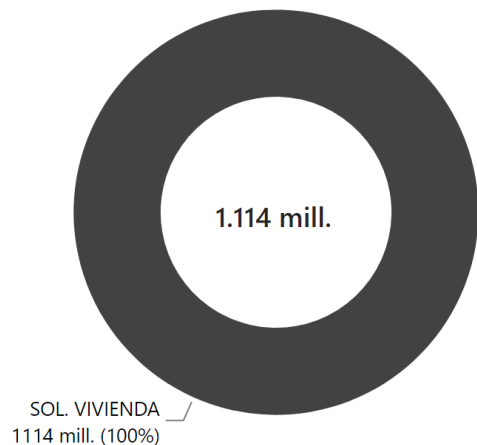

Componente	Nº Viviendas	Costo PIRCC Inicial
SOL. VIVIENDA	48.961	1.114 mill.
Total	48.961	1.114 mill.

No existe medios de información que permita consultar a la fecha, el número de real de viviendas habilitadas ni el número familias beneficiarios de los Bonos Familiares Habitacionales la información corresponde al año 2017.

Variación Presupuestal de las Intervenciones Financiadas

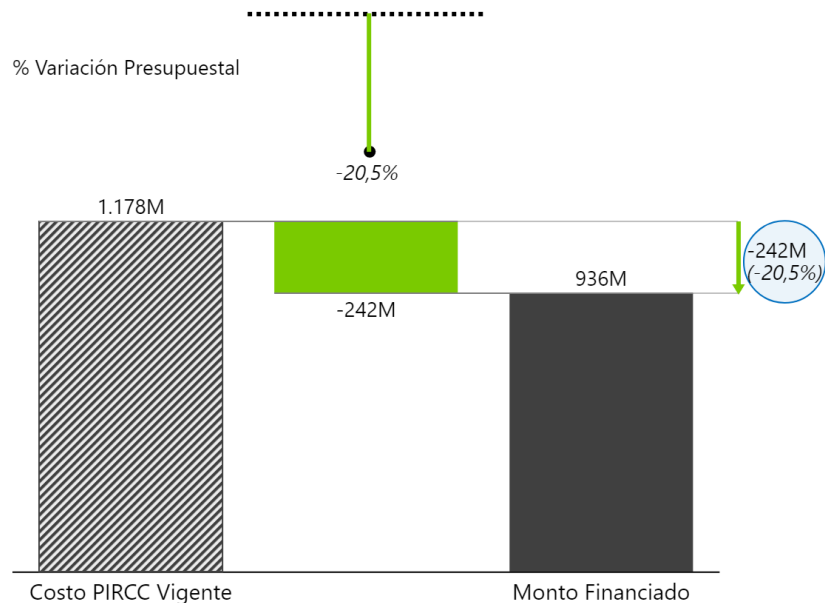

Estado	Nº Proy.	Costo PIRCC Vigente	Monto Financiado	% Ava. Trans	Saldo
3. Financiado	5	S/. 1.178 mill.	S/ 936 mill.	79,5 %	S/ 242 mill.
Total	5	S/. 1.178 mill.	S/ 936 mill.	79,5 %	S/ 242 mill.

Control a la reconstrucción con cambios

**SECTOR VIVIENDA Y
SANEAMIENTO**

Estrategia de Control a la Reconstrucción con Cambios

1

PREVENCIÓN

OBJETIVO PRINCIPAL

Contribuir a la implementación eficiente de la Infraestructura Preventiva.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Verificar la ejecución de las soluciones integrales para el control de inundaciones
- Supervisar la implementación de infraestructura preventiva complementaria.

2

RESTABLECIMIENTO

OBJETIVO PRINCIPAL

Coadyuvar a la ejecución de inversiones de reconstrucción de infraestructura afectada.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Supervisar la ejecución de inversiones de reconstrucción de infraestructura vial.
- Verificar la ejecución de la reconstrucción de infraestructura para la prestación de servicios de saneamiento, así como de reconstrucción viviendas.
- Controlar la ejecución de inversiones para la reconstrucción de infraestructura educativa afectada.
- Supervisar la ejecución de inversiones para la reconstrucción de infraestructura de salud afectada.

3

CONTINUIDAD

OBJETIVO PRINCIPAL

Vigilar la operación de los servicios implementados y repuestos



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Verificar las contrataciones y distribución de bienes en el marco de la vigilancia epidemiológica e investigación de casos COVID-19.
- Supervisar las medidas de distanciamiento, aislamiento e inmovilización social.

Resumen de servicios de control 2017 - Febrero 2022

INFORMES

MODALIDAD DE CONTROL	2017	2018	2019	2020	2021	2022	TOTAL	%
CONTROL POSTERIOR	0	1	6	23	21	1	52	4.0%
ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR	0	0	0	0	1	0	1	1.9%
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO	0	1	3	2	1	0	7	13.5%
CONTROL ESPECÍFICO	0	0	3	21	19	1	44	84.6%
CONTROL SIMULTANEO	13	113	359	424	322	13	1244	96.0%
CONTROL CONCURRENTE	13	104	270	321	301	13	1022	82.2%
ORIENTACIÓN DE OFICIO	0	0	75	39	17	0	131	10.5%
VISITA DE CONTROL	0	9	14	64	4	0	91	7.3%
Total general	13	114	365	447	343	14	1296	100.0%

SITUACIONES ADVERSAS

ETAPA	2017	2018	2019	2020	2021	2022	TOTAL	%
EJECUCIÓN CONTRACTUAL	3	132	726	820	751	26	2458	80.5%
PROCESO DE SELECCIÓN	28	132	137	191	105	3	596	19.5%
TOTAL	31	264	863	1011	856	29	3054	100.0%

ESTADO SITUACIONES ADVERSAS

ESTADO	SITUACIONES ADVERSAS	%
CORREGIDO	783	25.6%
DESESTIMADO	131	4.3%
EN PROCESO	209	6.8%
NO CORREGIDO	504	16.5%
SIN ACCIONES	1427	46.7%
TOTAL	3054	100.0%

Resumen de servicios de control 2017 - Febrero 2022

PERJUICIO ECONÓMICO

ENTIDAD	PERJUICIO ECONÓMICO S/
GOBIERNO REGIONAL PIURA	2,525,984
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYARA	1,968,436
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA	1,956,928
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UCAYALI	1,438,190
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INAHUAYA	1,146,626
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS	1,022,685
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA DE QUIVES	871,794
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ONGON	679,075
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LUCMA-MARISCAL LUZURIAGA	590,171
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONCHAN	454,327
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANDRES DE TUPICOCHA	275,449
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARAS	268,063
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARHUAZ	265,378
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARANGO	195,142
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PULAN	189,348
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ICHOCAN	182,177
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINTAY PUNCU-TAYACAJA	163,306
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JANGAS	154,291
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONDEBAMBA - CAJABAMBA	135,856
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDABAMBA-SANTA CRUZ	133,379
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHANCAY BAÑOS	84,238
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA-CHICLAYO	72,071
MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	72,023
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCABAMBA	50,750
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA	38,576
GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD	30,000
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCA	23,209
TOTAL	14,987,472

Resumen de servicios de control 2017 - Febrero 2022

FUNCIONARIOS

ENTIDAD AUDITADA	FUNCIONARIOS
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UCAYALI	13
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIMENTEL	10
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA	9
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CELENDIN	8
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHANCAY BAÑOS	8
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA	7
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO	7
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONDEBAMBA - CAJABAMBA	7
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARAS	7
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYARA	6
FONDO MIVIVIENDA S.A.	6
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LUCMA-MARISCAL LUZURIAGA	6
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANDRES DE TUPICOCHA	6
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE	5
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINTAY PUNCU-TAYACAJA	5
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARANGO	5
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ONGON	5
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA	5
GOBIERNO REGIONAL PIURA	5
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCABAMBA	5
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PULAN	5
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INAHUAYA	4
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZAÑA	3
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARHUAZ	3
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANTA	3
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCUCAJE	3
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JANGAS	3
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA DE QUIVES	3
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCANO	2
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA-CHICLAYO	2
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCA	2
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ICHOCAN	2
MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	2
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONCHAN	2
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS	2
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICSÍ	2
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO	1
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ASCOPE	1
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAUYOS	1
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDABAMBA-SANTA CRUZ	1
GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD	1
TOTAL	183

Resumen de servicios de control 2017 - Febrero 2022

TIPO DE RESPONSABILIDAD

ENTIDAD AUDITADA	ADMINISTRATIVA	CIVIL	PENAL	TOTAL
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CELENDIN	23	0	10	33
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LUCMA-MARISCAL LUZURIAGA	15	0	16	31
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UCAYALI	13	0	9	22
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA	8	0	10	18
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCUCAJE	8	0	8	16
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHANCAY BAÑOS	9	0	7	16
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PULAN	7	7	0	14
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANDRES DE TUPICOCHA	7	0	6	13
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA	6	3	4	13
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYARA	6	0	6	12
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIMENTEL	11	0	1	12
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARAS	5	0	7	12
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA	5	5	0	10
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO	7	0	3	10
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONDEBAMBA – CAJABAMBA	4	0	6	10
GOBIERNO REGIONAL PIURA	5	4	0	9
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARHUAZ	5	3	1	9
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINTAY PUNCU-TAYACAJA	3	5	0	8
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCABAMBA	5	0	3	8
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INAHUAYA	2	0	6	8
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ONGON	3	0	5	8
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE	5	0	1	6
FONDO MIVIVIENDA S.A.	6	0	0	6
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARANGO	5	0	1	6
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCANO	2	0	4	6
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JANGAS	2	0	3	5
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZAÑA	3	0	2	5
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA DE QUIVES	3	0	2	5
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONCHAN	2	0	2	4
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA-CHICLAYO	2	2	0	4
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCA	2	2	0	4
MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	2	2	0	4
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANTA	3	0	1	4
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ICHOCAN	1	2	0	3
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICSÍ	1	0	2	3
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDABAMBA-SANTA CRUZ	0	2	0	2
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO	1	0	1	2
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAUYOS	1	1	0	2
GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD	1	0	1	2
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS	0	0	2	2
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ASCOPE	1	0	0	1
TOTAL	200	38	130	368

- Realizar el **sinceramiento del Plan de Reconstrucción a nivel de metas físicas (proyectos pendientes y su tiempo de ejecución), metas financieras (financiamiento) y ejecutoras** que se trabajarán para implementar al 100% las intervenciones de los cuatro componentes (Reconstrucción, Construcción, Fortalecimiento de Capacidades y Soluciones de Vivienda), incluyendo la ejecución del Convenio Gobierno a Gobierno.
- Asignar recursos al componente **Fortalecimiento de Capacidades**; por lo que, se recomienda a la ARCC elaborar un plan de fortalecimiento a nivel regional y local principalmente y estimar los costos necesarios para su implementación.
- Que el **proceso de asistencia técnica permanente y obligatorio** para todas las Entidades Ejecutoras que tiene a su cargo intervenciones que aún no hayan culminado su proceso de implementación.
Es necesario que exista un acompañamiento técnico que garantice que las intervenciones puedan implementarse dentro de los plazos establecidos por el marco normativo.

- Que la **ARCC financie la elaboración de los estudios definitivos** (expedientes técnicos o estudios básicos de ingeniería) a las Entidades Ejecutoras de los tres niveles de gobierno, para garantizar que el Plan de Reconstrucción se implemente en los plazos programados. Actualmente, el 100% de las Ejecutoras de los Gobiernos Regionales y Locales tienen como requisito solicitar el financiamiento de las intervenciones mediante la presentación de los **estudios definitivos, los cuales son elaborados con recursos que pertenecen a fuentes de financiamiento que no son FONDES**; por lo tanto, su elaboración depende mucho de las disponibilidades presupuestales que tuvieran en otras fuentes de financiamiento.
- Corregir oportunamente las situaciones adversas comunicadas por la Contraloría General para evitar perjuicio al estado y la identificación responsabilidades.

GRACIAS
