

# ESTADO ACTUAL DEL PLAN INTEGRAL DE RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS

Equipo Especial de Reconstrucción

## INTERVENCIONES DE CONSTRUCCIÓN

Referidos a proyectos de prevención, defensas ribereñas, presas de laminación, infraestructura natural, SAT (***planes integrales para el control inundaciones***). Tienen por finalidad prevenir los daños como lo ocurrido durante el FEN 2017.



## INTERVENCIONES DE RECONSTRUCCIÓN

Contempla la rehabilitación de la infraestructura agrícola (canales, bocatomas, drenes) dañada por el FEN 2017. La rehabilitación incluye mejorar su estado anterior (xxx intervenciones y 2 UE).



# Plan Integral para el control de inundaciones



PERÚ

Ministerio  
de Desarrollo Agrario  
y Riego

**A**

Defensas ribereñas; diques transversales; barreras dinámicas; mejoramiento de drenes





**B**

Tratamiento de cárcavas; forestación - reforestación; SAT; reubicación de poblaciones; sensibilización a poblaciones; terrazas; andenes, faja marginal



**C**

Estructuras de almacenamientos, regulación y laminación; represamiento

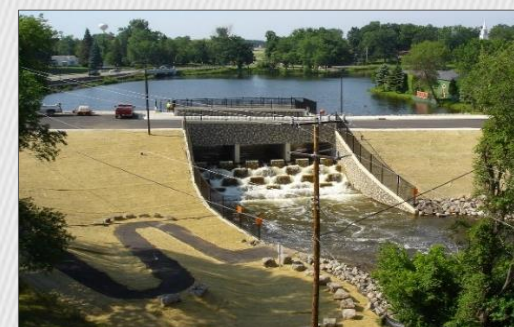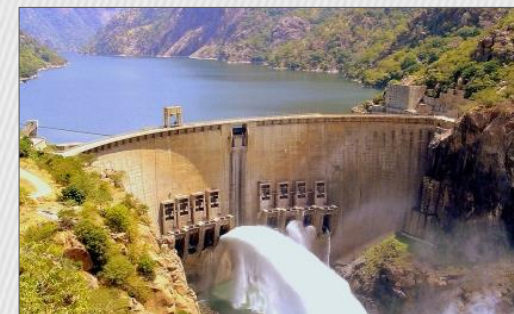



# Plan Integral para el control de inundaciones



PERÚ

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego

N°	Plan Integral	Componente A	Componente B	Componente C	Monto viable S/
		Defensas ribereñas	Infra. Natural	Presas de Laminación	
01	Río Tumbes	3	1	2	S/ 944,988,836
02	Olmos	1	2	1	S/ 603,686,105
03	La Leche	1	1	1	S/ 1,340,850,974
04	Motupe	1	1	1	S/ 1,298,988,334
05	Zaña	1	1	1	S/ 228,434,107
06	Chicama	2	1	1	S/ 627,218,099
07	Virú	2	Resolución decontrato (1)	Resolución decontrato (1)	S/ 299,797,715
08	Lacramarca	1	1	1	S/ 794,958,888
09	Casma	1	1	1	S/ 451,957,956
10	Huarmey	4	2	1	S/ 773,678,267
11	Huaura	1	1	1	S/ 190,852,046
12	Rímac	Se puso a disposición a la ARCC			
13	Mala	2	1	1	S/ 413,298,400
14	Cañete	2	1	2	S/ 471,336,524
15	Matagente	4	1	No viable	380847315.1
	<b>Total S/</b>	<b>26</b>	<b>15</b>	<b>14</b>	<b>S/ 8,820,893,565</b>



55 proyectos viables transferidos a la ARCC para su ejecución mediante Convenio G2G

## Monumentación de hitos de fajas marginales



PERÚ

Ministerio  
de Desarrollo Agrario  
y Riego

- Se ha logrado la delimitación y monumentación de la faja marginal de 14 ríos y 5 quebradas, un total de 2,754 hitos

- Mediante DS N° 036-2022-EF del 13 de marzo 2022, se transfirió S/ **1,956,695** recursos para monumentar hitos de la faja marginal de los ríos Chancay Lambayeque, Rímac, Matagente y Río Chico; un total de 1,682 hitos



- Abril proceso de convocatoria y mayo inicio de la ejecución

# PROYECTOS DE DEFENSAS RIBEREÑAS-PEBPT



PERÚ

Ministerio  
de Desarrollo Agrario  
y Riego

## 1. Tramo I río Zarumilla

- ✓ **Ejecución física culminada (100%)**
- ✓ Costo S/ 83.8 millones
- ✓ Meta: 11 Km
- ✓ Beneficio para 5,863 familias y protección de 691 ha

## 2. Tramo II río Zarumilla

- ✓ Costo inicial S/ 95.8 millones, costo actualizado S/ 105.2 millones
- ✓ Meta: 11 Km,
- ✓ Beneficiarios: 2,682 familias, protección de 620.15 ha
  
- ✓ Con DS N° 012-2022—EF (31ene2022) se transfirió S/ 42'662,083 y Previsión 2023: S/ 53,156,657.93.



# NIVEL DE EJECUCIÓN-PEBPT



PERÚ

Ministerio  
de Desarrollo Agrario  
y Riego

Unidad Ejecutora	Asignación	Marco Presupuestal	Certificación	Compromiso Anual	Devengado	Avance %
PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL PUYANGO - TUMBES	0	42,662,083	21,927,021	21,915,521	15,532,085	36.4

LA OSCE observó el proceso por disponibilidad del terreno, indicando que no se han cancelado los predios.

Para el lunes 21 de marzo, el PEBPT estará remitiendo la solicitud de financiamiento del adicional por un monto de S/ 35.9 millones

Inicio de obra junio 2022

# INTERVENCIONES DE RECONSTRUCCIÓN




PERÚ

Ministerio  
de Desarrollo Agrario  
y Riego

## 309 intervenciones a cargo del MIDAGRI

Según el PIRCC, el MIDAGRI tiene a su cargo 309 intervenciones, de las cuales 40 están asignadas a la unidad ejecutora de Agro Rural y 269 a cargo de la unidad ejecutora del PSI.

# de intervenciones

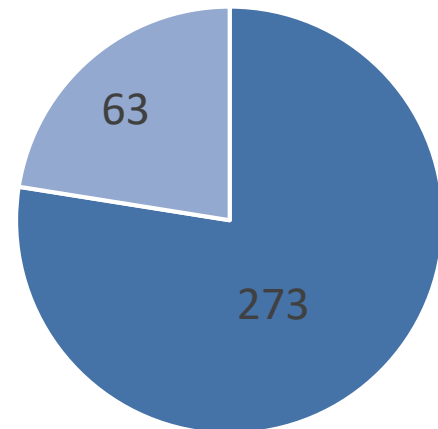

■ PSI ■ AgroRural

Se refiere a la rehabilitación de intervenciones incluidas en el Plan Integral para la Reconstrucción con Cambios (PIRCC). Una intervención es una obra de infraestructura hidráulica agrícola afectados por el Fenómeno El Niño Costero 2017, que requiere su reconstrucción o rehabilitación



# ESTADO ACTUAL DE LAS INTERVENCIONES PSI



PERÚ

Ministerio  
de Desarrollo Agrario  
y Riego

Estados	# intervenciones	Monto obra S/
CULMINADAS LIQUIDADAS	49	69,446,347
CULMINADAS FISICAMENTE/ PROCESO DE LIQUIDACION	125	235,936,327
CULMINADAS NO OPERATIVAS	2	4,281,425
EJECUCIÓN (*)	3	1,627,085
PROCESO DE CONTRATACIÓN OBRA (Quiroz-Culqui)	2	14,966,698
OBRA PARALIZADA /SUSPENDIDA (se ha solicitado programación)	28	62,893,131
EN ELABORACION DE E.T.	27	56,525,154
CON ET APROBADO	2	584,514
EN PROCESO DE CONTRATACIÓN ET	14	8,300,029
SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO PARA OBRA EN LA ARCC	4	121,913,145
PARA CAMBIO DE UE	11	25,993,231
POR EXCLUIR	2	1,968,322
Total	269	604,435,408

(\*) BOCATOMA MOLINO 1, CANAL PUQUIO GRANDE y CANAL HUAYURI

## NIVEL DE EJECUCIÓN - PSI



PERÚ

Ministerio  
de Desarrollo Agrario  
y Riego

Con DS 029-2022 se transfirió recursos al PSI para 14 inversiones por un monto de S/ 13.48 millones y con el DS 036-202 se transfirió S/ 2.59 millones para 7 inversiones).

Sin embargo, 3 intervenciones, equivalentes a S/ 2,446,361, contemplan clasificadores errados, pues la ARCC asignó modalidad de ejecución COF, a pesar que oportunamente PSI informó el cambio a NER (Oficio 164-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-PSI).

Unidad Ejecutora	Asignación	Marco Presupuestal	Certificación	Compromiso Anual	Devengado	Avance %
PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACION - PSI	0	79,271,950	19,449,367	1,266,500	1,231,933	1.6



PERÚ

Ministerio  
de Desarrollo Agrario  
y Riego



## ESTADO SITUACIONAL DE LAS INTERVENCIONES - AGRORURAL

Estado Situacional	# Proyectos	Monto Inversión
CULMINADA Y LIQUIDADADA (a)	1	575,928
CULMINADA FISICAMENTE (b)	2	1,092,733
EJECUCIÓN (c)	2	2,858,528
SUSPENDIDA (d)	2	10,438,411.41
INICIO DE OBRA Postergado 1° Abril POR CAMPAÑA AGRICOLA (e)	1	919,457
PROCESO DE CONVOCATORIA PARA OBRA (f)	5	8,585,411.00
CON CONTRATO PARA E.T. INICIARÁ PASANDO TEMPORADA DE LLUVIAS (g)	1	436,182
EN TRAMITE ADENDA DE CONTRATO PARA E.T. (h)	1	118,767
PARA CAMBIO DE UE (i)	20	24,034,715
<b>TOTAL</b>	<b>35</b>	<b>49 060,132.10</b>

# ESTADO SITUACIONAL INTERVENCIONES AGRORURAL



PERÚ

Ministerio  
de Desarrollo Agrario  
y Riego

- (a) Bocatoma Huambo - Arequipa
- (b) Canal San Andrés – Alto del Peligro y Canal San Jacinto, en Piura
- (c) Dren Lavandero y Dren Progreso, en Ancash
- (d) Canal Romero – Tumbes y Canal Pampas de Jaguey, en La Libertad
- (e) Bocatoma y Canal Oyotun, en Lambayeque
- (f) Dren Cascajal Alto, Dren La Mora, Dren Cascajal Bajo, Dren Ancash y Canal Tarma Auco (Lima)
- (g) REHABILITACION DEL CANAL DE RIEGO EN EL SECTOR CANCHAPILCA BAJA, RUMOJ.
- (h) REHABILITACIÓN DE LA REPRESA LLONGOTE, DISTRITO DE YAUYOS,



## NIVEL DE EJECUCIÓN - AGRORURAL



PERÚ

Ministerio  
de Desarrollo Agrario  
y Riego

PRESUPUESTO 2022	PIA 2022	PIM 2022	DEVENGADO	SALDO	% EJECUCION
RCC	830,952.00	7,241,875.00	7,152.00	7,234,723.00	0.10%
TOTAL	830,952.00	7,241,875.00	7,152.00	7,234,723.00	

# Avance del cambio de unidad ejecutora

## AGRORURAL



PERÚ

Ministerio  
de Desarrollo Agrario  
y Riego

ESTADO SITUACIONAL DE LAS SOLICITUDES DE CAMBIO DE ENTIDAD EJECUTORA	CON EXPEDIENTE TECNICO	SIN EXPEDIENTE TECNICO	TOTAL
CON RDE DE CAMBIO DE ENTIDAD EJECUTORA	16	69	85
TRAMITADO CON OPINION FAVORABLE	20		20
<b>TOTAL</b>	<b>36</b>	<b>69</b>	<b>105</b>

**105** intervenciones solicitadas por los gobiernos locales y regionales.

Se ha concretado **85** Cambios de Unidad Ejecutora (CEE)

Se ha elaborado **36** expedientes técnicos de reconstrucción.

## PSI

N°	Estado	# intervenciones	Monto de obra referencial (S/)	Ley PP 2022
1	Cambio de UE aprobado (N° 0007-2022-ARCC/DE y RDE N° 00019-2022-ARCC/DE)	5	6,551,559	
2	Con opinión favorable de PSI y remitido a la ARCC	6	26,370,245	15,397,485
4	Con opinión favorable, pero falta culminar ET para efectuar el cambio de UE	1	861,500	
6	En reevaluación (primer opinión no viable)	3	2,875,044	
7	Con opinión negativa de PSI	3	2,734,823	
8	PSI solicitará exclusión	2	364,206	2,549
<b>Total</b>		<b>20</b>	<b>39,757,377</b>	<b>15,400,034</b>



PERÚ

Ministerio  
de Desarrollo Agrario  
y Riego



## PROPUESTAS Y ALTERNATIVAS

- 1- Socialización con los usuarios directos y juntas de Riego.
- 2- Plan de Seguimiento, participativo con los entes involucrados del proyecto.
- 3- Coordinaciones permanentes con las entidades ejecutoras, para evitar duplicidad de intervenciones.
- 4- Consideración de las programaciones de los turnos de riego, en los cronogramas de ejecución de obra.
- 5- Implementación de los planes de contingencia en los expedientes técnicos de proyectos.
- 6- Considerar en su presupuesto el financiamiento de Gastos operativos.
- 7- Considerar en la normatividad, la priorización presupuestal de aquellos proyectos que ameriten continuidad.



CANAL SAN JACINTO



CANAL SAN JACINTO



CANAL SAN ANDRES

2022-2-24 15:53



CANAL SAN ANDRES

2022-2-24 15:57



## VIDEOS – IMÁGENES OBRAS EJECUTADAS Y CULMINADAS

<https://cloud.agrorural.gob.pe/index.php/s/T8gzCW5ZiozQsjd>

<https://cloud.agrorural.gob.pe/index.php/s/79oSYmkpJMCqmg3>

<https://cloud.agrorural.gob.pe/index.php/s/ddqG8FEMEPbrMB4>

<https://cloud.agrorural.gob.pe/index.php/s/RpAMkrF3QRsLZLe>
