



PERÚ

Ministerio de Educación



Gobierno del Perú

# SECTOR EDUCACIÓN

Presentación ante la Comisión Especial Multipartidaria de Seguimiento al Proceso de Reconstrucción en las Zonas afectadas por el Fenómeno de El Niño Costero - CEMRCFC.

CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Magnet Márquez Ramírez  
*Ministra de Educación*

12 de mayo de 2023



IE 2271 EL MILAGRO II  
REGIÓN LA LIBERTAD



IE 2271 EL MILAGRO II  
REGIÓN LA LIBERTAD



IE LA UNIÓN 755  
REGIÓN PIURA

## 1

**MARCO NORMATIVO****CREACIÓN DE LA AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ESPECIAL****LEY 30556**

Fecha: 29/04/2017

Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del gobierno nacional frente a los desastres naturales y que dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios.

IE 14888  
REGIÓN PIURAIE 86432 HUANTAR  
REGIÓN ANCASH

## 1

## MARCO NORMATIVO

## PLAN INTEGRAL DE RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS - PIRCC

DS. N° 091-2017-PCM

12/09/2017

¿Cuántas Intervenciones  
tienen a su cargo ?

MINEDU

396



ARCC

103

Gobiernos  
subnacionales

1000

Universidad  
Nacional de  
Piura

01

Total

1500

El Ministerio de Educación a través de la UGRD-PRONIED tiene a su cargo la ejecución de 396 intervenciones.

## 1

**MARCO NORMATIVO**  
**FUNCIONES DE LA UGRD****RM N° 341-2017-MINEDU****Fecha: 14/06/2017**

La Unidad Gerencial de Reconstrucción frente a Desastres - UGRD es responsable de la ejecución de proyectos de inversión y de las intervenciones, como:

Atender la reconstrucción de la infraestructura educativa afectada por desastres, previa suscripción de convenios de encargo de gestión - gobiernos regionales y/o locales.

**IE 86161 HUACLLÁN  
REGIÓN ANCASH****IE 20073 LA CAMPIÑA  
REGIÓN PIURA**

2023.03.17

## 1

## MARCO NORMATIVO

## INTERVENCIONES DE RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES

RM N° 499-2018-MINEDU

11/09/2018

El PRONIED a través de la Unidad Gerencial de Reconstrucción Frente a Desastres – UGRD, es responsable de la ejecución de las **Intervenciones de Reconstrucción mediante Inversiones (IRI)** con fines de Recuperación en el marco del PIRCC, las cuales están delimitadas por el **Módulo Básico de Reconstrucción – MBR y el Módulo Educativo – ME.**




IE 88005 CORAZÓN DE JESUS, REGIÓN ANCASH



IE 20590 SANTA MARÍA, REGIÓN LIMA

**2****INTERVENCIONES DEL PLAN INTEGRAL DE RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS****Total de intervenciones a cargo de la UGRD-PRONIED****590,873,147**  
Monto Inversión**396**  
Locales educativos**15,103**  
Estudiantes beneficiados**86**  
Ejecución de obra  
MBR**310**  
Instalación de ME¿Qué componentes  
tienen los módulos  
Educativos?

- Aula
- Pararrayo
- Baños
- Mobiliario
- Cerco perimétrico
- Edificación (Obras complementarias)

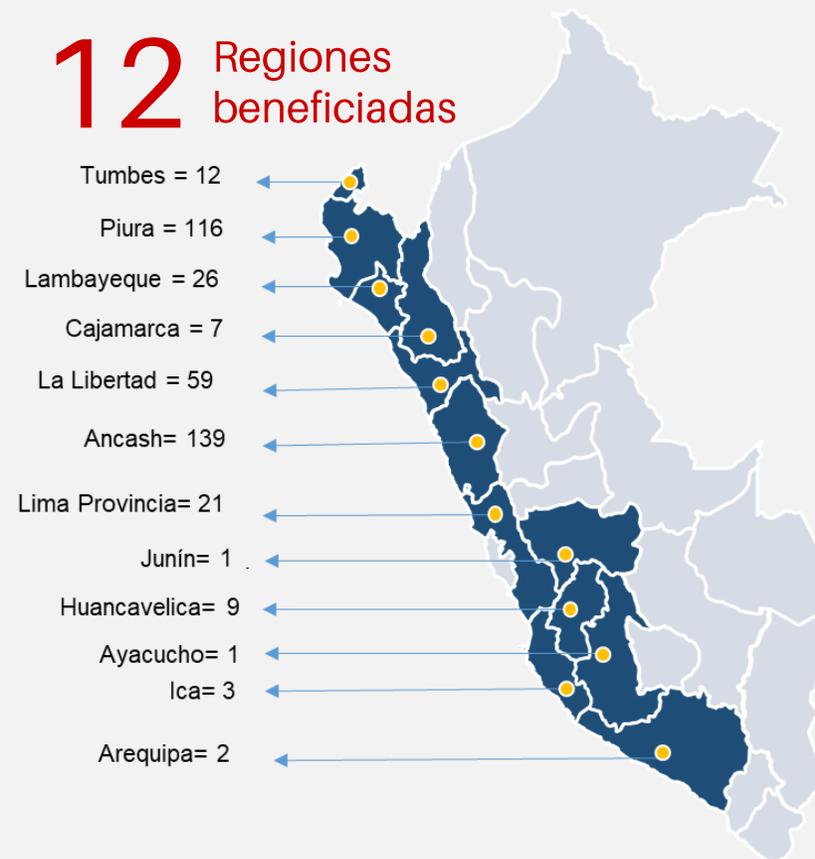**12** Regiones beneficiadas

**MBR** : Módulo Básico de Reconstrucción  
**ME** : Módulo Educativo

## 2

## INTERVENCIONES DEL PLAN INTEGRAL DE RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS

### DISEÑO DE LOS MÓDULOS BÁSICOS DE RECONSTRUCCIÓN - MBR

#### Los Módulos Básicos de Reconstrucción - MBR:

- Permiten construir locales educativos funcionales de manera rápida y eficiente.
- Capacidad para más de 25 alumnos.
- Elementos: unidades, complementos y extensiones estandarizados y prediseñados.
- Combinaciones modulares preestablecidas en el catálogo de planos.



2

## INTERVENCIONES DEL PLAN INTEGRAL DE RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS

### DISEÑO DE LOS MÓDULOS BÁSICOS DE RECONSTRUCCIÓN - MBR

MODALIDAD DE EJECUCIÓN DE OBRA: **FAST TRACK.**



Anteproyecto MBR de 1 piso



Anteproyecto MBR de 2 pisos



Anteproyecto MBR de 3 pisos

## 2

## INTERVENCIONES DEL PLAN INTEGRAL DE RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS

### DISEÑO DE LOS MÓDULOS EDUCATIVOS - ME

#### Los Módulos Educativos – ME:


- Aulas metálicas de sistema modular que comprenden: baño, cerco perimétrico, pararrayo, losa de recreación, mobiliario y obras complementarias.
- Diseñados e implementados sobre la base de criterios de eficiencia y seguridad.
- Infraestructura de uso educativo con capacidad hasta 25 alumnos.
- Materiales que se adaptan a la condiciones climáticas de la zona.



Componente Aula



Componente Baño

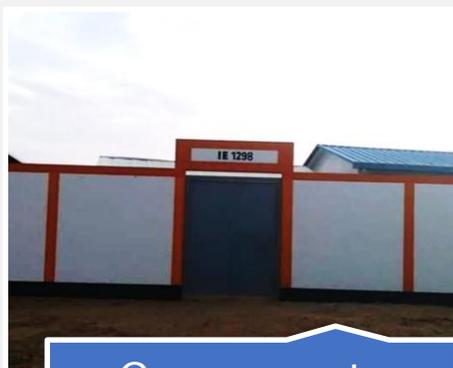Componente  
Cerco PerimétricoComponente  
Pararrayo

## 2

**INTERVENCIONES DEL PLAN INTEGRAL DE RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS  
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR AÑO A CARGO DE LA UGRD – PRONIED - MINEDU**

(S/)

AÑO	PRESUPUESTO (S/)	EJECUCIÓN (S/)	% EJECUCIÓN
2023 - 04/05	300,854,186.00	22,953,281.30	7.63%
2022	151,729,985.00	91,717,664.09	60.45%
2021	117,530,719.00	51,100,737.19	43.48%
2020	649,577,373.00	10,629,377.77	1.64%
2019	87,725,091.00	60,161,099.54	68.58%
2018	32,306,610.00	18,815,106.00	58.24%

## 2

## INTERVENCIONES DEL PLAN INTEGRAL DE RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS

## MARCO PRESUPUESTAL 2023 A CARGO DE LA UGRD - PRONIED - MINEDU

DISPOSITIVOS LEGALES POR TIPO	Fecha	N° Intervenciones	Módulo Básico de Reconstrucción – MBR (S/)	Módulo Educativo – ME (S/)	Total general (S/)
LEY 31638 - 2023	06/12/2022	143	133,749,424.00	45,930,550.00	179,679,974.00
D.S N° 034-2023-EF	10/03/2023	61	22,175,375.00	12,829,154.00	35,004,529.00
D.S N° 062-2023-EF	15/04/2023	94	29,632,893.00	56,536,790.00	86,169,683.00
Total general		298	185,557,692.00	115,296,494.00	300,854,186.00

\* D.S N°005-2023-EF, Autorizar una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023 a favor del ARCC, por el importe de S/ 63,172,171.00.

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LA UGRD – AL 12/05/2023

MES	PIM		
	PROGRAMACIÓN	DEVENGADO	Avance %
<b>300,833,489.00</b>			
ENERO	2,480,192.66	1,804,689.73	0.60%
FEBRERO	4,797,579.84	5,040,596.49	1.68%
MARZO	7,606,392.09	9,536,997.46	3.17%
ABRIL	5,091,135.99	6,287,583.17	2.09%
<b>MAYO</b>	<b>10,650,053.33</b>	<b>1,233,475.78</b>	<b>0.41%</b>

## 2

**INTERVENCIONES DEL PLAN INTEGRAL DE RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS  
POR TIPO DE MÓDULO****Módulo Básico de Reconstrucción (MBR)**

Estado Situacional	Locales Educativos	Cant. Alumnos	Monto Inversión (S/)	Ejecución de inversión (S/)	Saldo de inversión (S/)
Obra Culminada	20	2,286	86,176,627	72,549,087	13,627,540
En Ejecución De Obra	47	5,970	203,865,848	77,867,780	125,998,068
Expediente Técnico Culminado	1	104	8,414,435	329,857	8,084,578
En Elaboración Del Expediente Técnico	12	1,663	63,065,781	927,670	62,138,110
En Proceso De Contratación Pública	6	482	28,575,880	-	28,575,880
<b>Total general</b>	<b>86</b>	<b>10,505</b>	<b>390,098,572</b>	<b>151,674,395</b>	<b>238,424,177</b>

**Módulo Educativo (ME)**

Estado Situacional	Locales Educativos	Cant. Alumnos	Monto Inversión (S/)	Ejecución de inversión (S/)	Saldo de inversión (S/)
Atendido	12	362	1,353,167	1,196,336	156,831
En ejecución con presupuesto 2023	152	2,137	144,491,643	17,612,199	126,879,444
En ejecución sin presupuesto 2023	5	66	3,359,674	732,397	2,627,276
En evaluación solicitud de Financiamiento	16	245	15,140,545	2,829,115	12,311,430
En elaboración solicitud de Financiamiento	125	1,788	36,429,545	12,821,118	23,608,427
<b>Total general</b>	<b>310</b>	<b>4,598</b>	<b>200,774,575</b>	<b>35,191,166</b>	<b>165,583,409</b>

# 3

## INTERVENCIONES DEL PLAN INTEGRAL DE RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS CON DIFICULTADES EN SU EJECUCIÓN

### Intervenciones con retraso suspendidas



REGIÓN	CANTIDAD	ALUMNOS	MONTO DE INVERSIÓN (S/)
ANCASH	4	140	18,040,422
PIURA	6	363	24,292,926

### Intervenciones con retraso paralizadas



REGIÓN	CANTIDAD	ALUMNOS	MONTO DE INVERSIÓN (S/)
ANCASH	04	183	12,592,884
PIURA	06	893	24,229,179
LA LIBERTAD	01	109	4,256,559

### Intervenciones paralizadas – resolución de contrato de obra



REGIÓN	CANTIDAD	ALUMNOS	MONTO DE INVERSIÓN (S/)
PIURA	04	759	19,374,256
ANCASH	01	1,166	1,290,439
LA LIBERTAD	01	32	1,875,407
LAMBAYEQUE	01	55	2,741,839

## 3

## INTERVENCIONES DEL PLAN INTEGRAL DE RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS CON DIFICULTADES EN SU EJECUCIÓN


INTERVENCIONES	Regiones	Nro. de Intervenciones	Nro. de alumnos beneficiados	Monto de Inversión (S/)	Motivo	Acciones
<b>SUSPENDIDAS</b>	Ancash	4	140	18,040,422	Afectación por lluvias	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Constatación de los planes de contingencia si han sido afectados para su corrección.</li> <li>- Reinicio de obra a partir del 15/05/2023</li> </ul>
	Piura	6	363	24,292,926		
	<b>Totales</b>	<b>10</b>	<b>503</b>	<b>42,333,348</b>		
<b>PARALIZADAS</b>	Ancash	4	183	12,592,884	Falta de continuidad de recursos	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Se canceló las valorizaciones pendientes de obra.</li> <li>- Reinicio de obra a partir del 15/05/2023</li> </ul>
	La Libertad	1	109	4,256,559		
	Piura	6	893	24,229,179		
	<b>Totales</b>	<b>11</b>	<b>1,185</b>	<b>41,078,622</b>		
<b>RESOLUCIÓN DE CONTRATO</b>	Ancash	1	1,166	1,290,439	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Incumplimiento del contratista.</li> <li>- Resolución de contrato de obra</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Resolución de contrato</li> <li>- Inicio de elaboración de expediente de saldo de obra</li> <li>- Coordinación con la ARCC para asignación de recursos pendientes (saldo de obra)</li> </ul>
	Lambayeque	1	55	2,741,839		
	La Libertad	1	32	1,875,407		
	Piura	4	759	19,374,257		
	<b>Totales</b>	<b>7</b>	<b>2,012</b>	<b>25,281,942</b>		

## 4

## INTERVENCIONES DEL PLAN INTEGRAL DE RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS QUE HAN SIDO MATERIA DE ACCIONES DE CONTROL

PERÍODO	Estado Situacional		Total general	%Avance
	ATENDIDA	EN PROCESO		
2019	28		28	100%
2020	7		7	100%
2021	12		12	100%
2022	63	5	68	92%
2023		8	8	---
Total general	110	9	123	89%

### ESTADO SITUACIONAL - ACCIONES DE CONTROL CGP

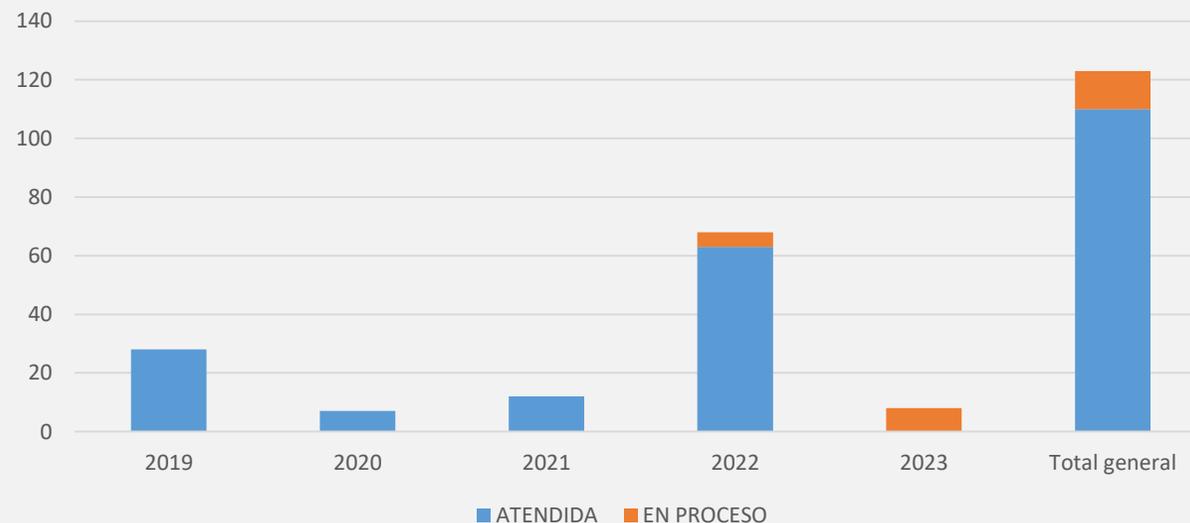

Nota: La Unidad Gerencial de Reconstrucción frente a Desastres, informa que en los años 2017 y 2018 no hubo acciones de control por parte de la Contraloría General de la República.

## 4

**INTERVENCIONES DEL PLAN INTEGRAL DE RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS QUE HAN SIDO MATERIA DE ACCIONES DE CONTROL**

DETALLE DE SITUACIÓN ADVERSA (HALLAZGOS)	REPORTE DE COMPROMISO -ACCION ES A EJECUTAR
•La ejecución de obra se encuentra atrasada con respecto al calendario acelerado de obra.	1) solicitud de apercibimiento al contratista. 2) Solicitar al contratista calendario acelerado de obra. 3) Emitir el documento que apruebe el retraso justificado de corresponder.
•Ausencia de personal clave propuesto por el contratista y la supervisión de obra.	1) Aplicar penalidades al contratista y supervisor de obra por incumplimientos de las ofertas técnicas.
•Falta de implementación de medidas de seguridad, orden y limpieza.	1) Solicitar al supervisor de obra el informe de la corrección de la situación adversa. 2) Aplicación de penalidades para el contratista y el supervisor de obra.
•Deficiencias en el almacenamiento y seguridad de los materiales de construcción.	1) Solicitar al supervisor de obra el informe de la corrección de la situación adversa. 2) Aplicación de penalidades para el contratista y supervisor de obra.
•Conexiones eléctricas provisionales instaladas de forma deficiente.	1) Solicitar al supervisor el informe de la corrección de la situación adversa. 2) Aplicación de penalidades para el contratista y supervisor de obra.
•Uso inadecuado e inexistencia de los equipos de seguridad personal.	1) Solicitar al supervisor el informe de la corrección de la situación adversa. 2) Aplicación de penalidades para el contratista y supervisor de obra.

## 5

**IMPACTO DE LOS EVENTOS CLIMATOLÓGICOS SOBRE LAS INTERVENCIONES DEL PLAN INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS****ESTADO DE LAS INTERVENCIONES EN EL MARCO DEL CICLÓN YAKU**

Algunos proyectos fueron perjudicados por las lluvias e inundaciones causadas por el ciclón Yaku, lo que generó que se ejecuten acciones para mitigar los impactos como: la suspensión temporal del plazo de obras en 18 intervenciones en las regiones La Libertad, Lima Provincia, Lambayeque, Piura y Áncash.

N°	Código FUR N°	Institución Educativa	Región	Alumnos Beneficiarios	Fecha de Suspensión de Obra	Fecha de Reinicio de Obra	% FÍSICO ACUM. REAL	Monto de Inversión
1	2428544	2311	La Libertad	83	11/03/2023	20/03/2023	100.00%	S/ 2,440,334.97
2	2460289	CRFA EL Carmelo	La Libertad	109	14/03/2023	1/04/2023	5.21%	S/ 4,256,559.00
3	2428738	10024 Nuestra Señora De Fátima	Lambayeque	822	10/03/2023	22/03/2023	53.97%	S/ 6,387,962.88
4	2428742	20176	Lima Provincia	400	16/03/2023	20/03/2023	12.44%	S/ 7,626,875.58
5	2428748	20590 Santa María	Lima Provincia	51	17/03/2023	17/04/2023	3.71%	S/ 7,142,240.28
6	2428644	86153	Áncash	38	14/03/2023	8/05/2023	12.14%	S/ 5,748,792.25
7	2428655	84129 LOS ALISOS	Áncash	25	23/12/2022	22/05/2023	14.38%	S/ 4,758,702.79
8	2428662	86653	Áncash	49	11/03/2023	30/05/2023	45.40%	S/ 3,979,376.25
9	2462818	86161	Áncash	73	10/03/2023	30/03/2023	18.85%	S/ 6,908,709.00
10	2428666	86651	Áncash	28	11/03/2023	15/05/2023	37.20%	S/ 3,553,551.00
11	2465279	765	Piura	55	13/03/2023	15/05/2023	79.51%	S/ 2,018,186.00
12	2428770	15250	Piura	61	22/02/2023	15/05/2023	63.59%	S/ 6,291,070.79
13	2428610	109	Piura	32	10/03/2023	24/04/2023	27.37%	S/ 2,790,376.72
14	2459910	20225	Piura	31	27/02/2023	30/05/2023	42.26%	S/ 3,077,569.00
15	2428680	14687	Piura	19	11/03/2023	30/05/2023	7.03%	S/ 4,965,515.44
16	2462800	14888	Piura	115	10/03/2023	15/05/2023	6.50%	S/ 5,002,815.00
17	2428639	1437	Piura	31	17/03/2023	20/04/2023	25.26%	S/ 3,044,115.86
18	2458532	912	Piura	82	1/03/2023	21/05/2023	88.65%	S/ 2,937,770.00
<b>TOTAL</b>				<b>2,104</b>				<b>S/ 82,930,523</b>

**6****LOGROS INTERVENCIONES - ME****MÓDULOS EDUCATIVOS DE SOLUCIÓN DEFINITIVA (2019)****Total Módulos de Aula: 269****Total Pararrayos : 84**

Monto Invertido: S/ 40,359,220.00

Colegios Beneficiados : 234

Regiones: Ancash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima Provincias, Piura y Tumbes.

Alumnos Beneficiados: 3,197

**MÓDULOS EDUCATIVOS DE CONTINGENCIA (2019)****Total Módulos de Aula: 271****Total Pararrayos : 36**

Monto Invertido: S/ 39,780,907.00

Colegios Beneficiados : 110

Regiones: Ancash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima Provincias, Piura y Tumbes.

Alumnos Beneficiados: 19,136

**CERCOS PERIMÉTRICOS (2020-2021-2022)****Año 2020 → 03 → S/ 483,018 → 87 Alumnos****Año 2021 → 67 → S/ 18,652,310 → 1,131 Alumnos****Año 2022 → 03 → S/ 1,741,491 → 52 Alumnos****Total Cercos Perimétricos : 73**

Monto Invertido: S/ 20,876,819

Regiones: Ancash, Cajamarca, Huancavelica, Ica, La Libertad, Lambayeque, Piura y Lima Provincia

Alumnos Beneficiados: 1,270

**ADQUISICIÓN, TRANSPORTE Y ENTREGA DE MOBILIARIO (2019)****Total Bienes de Mobiliario: 8,740**

Monto Invertido: S/ 2,954,643.

Colegios Beneficiados : 238

Regiones: Ancash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima Provincias, Piura y Tumbes.

Alumnos Beneficiados: 3,251

**MÓDULOS DE SSHH DE RED CON BIODIGESTOR (2020)****Total Servicios Higiénicos: 44**

Monto Invertido: S/ 7,717,000

Colegios Beneficiados : 44

Regiones: Ancash, Cajamarca, Huancavelica, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima Provincias, Piura y Tumbes.

Alumnos Beneficiados: 525

**OBRAS DE SSHH (2022)****Total Baños: 45**

Monto Invertido: S/ 10,243,907

Regiones: Ancash, Cajamarca, Ica, La Libertad, Lambayeque, Piura y Lima Provincia

Alumnos Beneficiados: 771



## 6

## LOGROS

## INTERVENCIONES CULMINADAS Y/O RECEPCIONADAS - MBR

A la fecha se culminaron 20 intervenciones con una inversión de S/ 86,2 millones en beneficio de 2,286 alumnos.




20

instituciones  
educativas

AÑO	REGIÓN	CANTIDAD	ALUMNOS	MONTO DE INVERSIÓN (S/)	% AVANC.
2021	Ancash y Piura	02	673	13,167,816	10%
2022	Ancash, Piura y La Libertad	09	713	36,979,187	45%
2023 (A la fecha)	Lambayeque, Piura y La Libertad	09	900	36,029,625	45%
TOTAL		20	2,286	86,176,627	-

## De las 20 intervenciones culminadas:

- Se ha puesto en uso 12 instituciones educativas ubicadas en las regiones Piura, Lambayeque, Áncash y La Libertad, con una inversión de **S/ 52,8 millones** que benefician a 1,497 alumnos.
- Se proyecta la recepción de obra de 08 intervenciones entre los meses de mayo y junio 2023, ubicadas en las regiones de La Libertad, Lambayeque y Piura; que demandan una inversión de **S/ 33,4 millones** que benefician a 789 alumnos.

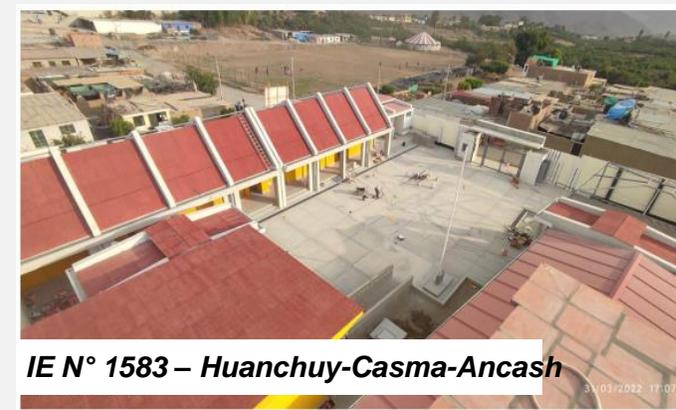

## 7

## PROYECCIÓN DE INTERVENCIONES A CULMINAR EN EL 2023

### INTERVENCIONES TIPO MBR

En el presente año se proyecta la culminación de 37 intervenciones tipo MBR en las regiones de Piura, Ancash, Lima, La Libertad y Lambayeque, con una inversión de 160 millones en beneficio de 2,890 alumnos.

#### Primer Trimestre



09

Intervenciones



En las regiones Piura, Lambayeque y La Libertad, con la inversión de 36 millones en beneficio de 900 alumnos.

#### Segundo Trimestre



07

Intervenciones



En las regiones Piura y Ancash, con la inversión de 26 millones en beneficio de 430 alumnos.

#### Tercer Trimestre



13

Intervenciones



En las regiones Piura, Ancash y Lambayeque, con la inversión de 59 millones en beneficio de 741 alumnos.

#### Cuarto Trimestre



08

Intervenciones



En las regiones Piura, Ancash, Lima, La Libertad y Lambayeque, con la inversión de 39 millones en beneficio de 819 alumnos.

## 7

## PROYECCIÓN DE INTERVENCIONES A CULMINAR EN EL 2023

### INTERVENCIONES TIPO MÓDULO EDUCATIVO - ME

El 2023 se proyecta la culminación de **78 intervenciones tipo ME** en las regiones de Piura, Ancash, La Libertad, Huancavelica, Lima, Cajamarca y Lambayeque, con una inversión de 39 millones de soles.



**45** Baños

De los 48 locales escolares, se atenderán:



**3** Cercos Perimétricos

45 locales con Baño  
3 Cerco perimétrico

En el 2023 se atenderán 48 LLEE, con una inversión de 12 millones de soles.



**30** Locales escolares

De los 30 locales escolares se atenderán con los siguientes componentes:

- 02 Locales con Baño
- 01 Cerco perimétrico
- 30 Locales con Edificación (Obras complementarias)
- 08 Locales con Mobiliario
- 02 Locales con Pararrayos.

En el 2023 se atenderán 30 LLEE de forma integral, con una inversión de 27 millones de soles.



PERÚ

Ministerio  
de Educación



Gobierno del Perú



BICENTENARIO  
DEL PERÚ  
2021 - 2024



GRACIAS

# 3

## INTERVENCIONES DEL PLAN INTEGRAL DE RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS CON DIFICULTADES EN SU EJECUCIÓN

### INTERVENCIONES CON RETRASO SUSPENDIDAS A CARGO DE LA UGRD

N°	Código FUR y/o CUI	Código Local	Institución Educativa	Región	Provincia	Distrito	Alumnos beneficiados	Monto de Inversión	Inicio de Obra	% Físico Acum. Real	Fecha de suspensión	Motivo	Acciones
1	2428644	17883	86153	Ancash	Aija	Coris	38	5,748,792	9/02/2023	12.14%	14/03/2023	Afectadas por las lluvias	- Constatación de los planes de contingencia si han sido afectados para su corrección - Se definió con el contratista y supervisión el reinicio de obra para el día 15/05/2023
2	2428655	28626	84129 Los Alisos	Ancash	Mariscal Luzuriaga	Casca	25	4,758,703	28/10/2022	14.38%	23/12/2022	Afectadas por las lluvias	- Constatación de los planes de contingencia si han sido afectados para su corrección - Se definió con el contratista y supervisión el reinicio de obra para el día 22/05/2023
3	2428666	529812	86651	Ancash	Yungay	Yungay	28	3,553,551	23/11/2022	37.20%	11/03/2023	Afectadas por las lluvias	- Constatación de los planes de contingencia si han sido afectados para su corrección - Se definió con el contratista y supervisión el reinicio de obra para el día 15/05/2023
4	2459910	432297	20225	Piura	Morropón	Salitral	31	3,077,569	2/11/2022	42.26%	27/02/2023	Afectadas por las lluvias	- Constatación de los planes de contingencia si han sido afectados para su corrección - Se definió con el contratista y supervisión el reinicio de obra para el día 30/05/2023
5	2428680	433490	14687	Piura	Morropón	Yamango	19	4,965,515	9/02/2023	7.03%	11/03/2023	Afectadas por las lluvias	- Constatación de los planes de contingencia si han sido afectados para su corrección - Se definió con el contratista y supervisión el reinicio de obra para el día 30/05/2023
6	2458532	609451	912	Piura	Piura	Tambo Grande	82	2,937,770	23/07/2022	88.65%	1/03/2023	Afectadas por las lluvias	- Constatación de los planes de contingencia si han sido afectados para su corrección - Se definió con el contratista y supervisión el reinicio de obra para el día 21/05/2023
7	2428662	41430	86653	Ancash	Yungay	Yungay	49	3,979,376	8/10/2022	45.40%	11/03/2023	Problemas en la cimentación	- Constatación de los planes de contingencia si han sido afectados para su corrección - Se definió con el contratista y supervisión el reinicio de obra para el día 15/05/2023
8	2465279	647660	765	Piura	Piura	Catacaos	55	2,018,186	9/08/2022	79.51%	13/03/2023	Afectadas por las lluvias	- Constatación de los planes de contingencia si han sido afectados para su corrección - Se definió con el contratista y supervisión el reinicio de obra para el día 15/05/2023
9	2428770	437266	15250	Piura	Sullana	Lancones	61	6,291,071	23/07/2022	63.59%	22/02/2023	Afectadas por las lluvias	- Constatación de los planes de contingencia si han sido afectados para su corrección - Se definió con el contratista y supervisión el reinicio de obra para el día 15/05/2023
10	2462800	415194	14888	Piura	Piura	Las Lomas	115	5,002,815	27/10/2022	6.50%	10/03/2023	Afectadas por las lluvias	- Constatación de los planes de contingencia si han sido afectados para su corrección - Se definió con el contratista y supervisión el reinicio de obra para el día 15/05/2023
<b>TOTAL</b>							<b>503</b>	<b>42,333,349</b>					

3

**INTERVENCIONES DEL PLAN INTEGRAL DE RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS CON DIFICULTADES EN SU EJECUCIÓN**  
**INTERVENCIONES CON RETRASO PARALIZADAS**

N°	Código FUR y/o CUI	Código Local	Institución Educativa	Región	Provincia	Distrito	Alumnos beneficiados	Monto de Inversión	Inicio de Obra	% Físico Acum. Real	Fecha de suspensión	Motivo	Acciones
1	2460289	819246	Crfa El Carmelo	La Libertad	Viru	Viru	109	4,256,559	8/11/2022	5.21%	1/04/2023	Falta De Continuidad Recursos	✓ Se cancelo las valorizaciones pendientes de obra ✓ Se definió con el contratista y supervisión el reinicio de obra para el día 15/05/2023
2	2428684	27599	86825	Ancash	Huaylas	Pamparomas	69	3,615,569	19/12/2022	0.66%	23/01/2023	Falta De Continuidad Recursos	✓ Se cancelo las valorizaciones pendientes de obra ✓ Se definió con el contratista y supervisión el reinicio de obra para el día 15/05/2023
3	2465796	41821	1550	Ancash	Yungay	Yanama	44	2,370,805	28/07/2022	82.80%	28/01/2023	Falta De Continuidad Recursos	✓ Se cancelo las valorizaciones pendientes de obra ✓ Se definió con el contratista y supervisión el reinicio de obra para el día 30/05/2023
4	2462783	413388	14041	Piura	Piura	Catacaos	244	3,705,677	9/08/2022	19.07%	25/01/2023	Falta De Continuidad Recursos	✓ Se cancelo las valorizaciones pendientes de obra ✓ Se definió con el contratista y supervisión el reinicio de obra para el día 15/05/2023
5	2428715	410587	20137	Piura	Piura	Piura	88	5,386,600	13/08/2022	89.19%	24/03/2023	Falta De Continuidad Recursos	✓ Se cancelo las valorizaciones pendientes de obra ✓ Se definió con el contratista y supervisión el reinicio de obra para el día 15/05/2023
6	2458525	796565	1396	Piura	Piura	Piura	48	2,806,538	8/07/2022	61.22%	14/04/2023	Falta De Continuidad Recursos	✓ Se cancelo las valorizaciones pendientes de obra ✓ Se definió con el contratista y supervisión el reinicio de obra para el día 15/05/2023
7	2465277	413500	20073	Piura	Piura	Catacaos	199	4,216,446	10/09/2022	44.43%	17/01/2023	Falta De Continuidad Recursos	✓ Se cancelo las valorizaciones pendientes de obra ✓ Se definió con el contratista y supervisión el reinicio de obra para el día 15/05/2023
8	2428546	531160	88398	Ancash	Santa	Nuevo Chimbote	41	3,595,451	27/08/2022	60.93%	3/01/2023	Falta De Continuidad Recursos	✓ Se cancelo las valorizaciones pendientes de obra ✓ Se definió con el contratista y supervisión el reinicio de obra para el día 15/05/2023
9	2428682	24124	637/86416	Ancash	Huari	Huacachi	29	3,011,059	11/09/2022	52.75%	1/03/2023	Falta De Continuidad Recursos	✓ Se cancelo las valorizaciones pendientes de obra ✓ Se definió con el contratista y supervisión el reinicio de obra para el día 15/05/2023
10	2460525	414774	14989	Piura	Piura	La Union	131	3,697,973	23/08/2022	42.22%	15/02/2023	Falta De Continuidad Recursos	✓ Se cancelo las valorizaciones pendientes de obra ✓ Se definió con el contratista y supervisión el reinicio de obra para el día 30/05/2023
11	2462781	410078	032 Aprendizaje	Piura	Piura	Veintiseis De Octubre	183	4,415,945	28/11/2022	16.53%	11/03/2023	Falta De Continuidad Recursos	✓ Se cancelo las valorizaciones pendientes de obra ✓ Se definió con el contratista y supervisión el reinicio de obra para el día 15/05/2023
<b>TOTAL</b>							<b>1,185</b>	<b>41,078,622</b>					

# 3

## INTERVENCIONES DEL PLAN INTEGRAL DE RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS CON DIFICULTADES EN SU EJECUCIÓN INTERVENCIONES PARALIZADAS RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE OBRA

N°	Código FUR y/o CUI	Código Local	Institución Educativa	Región	Provincia	Distrito	Alumnos beneficiados	Monto de Inversión	Inicio de Obra	% Físico Acum. Real	Fecha de paralización	Motivo	Acciones
1	2472489	34217	88005 Corazon De Jesus	Ancash	Santa	Chimbote	1,166	1,290,439	27/10/2022	32.70%	27/02/2023	Incumplimiento por parte del contratista	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Resolución del contrato al Contratista para el mes de mayo</li> <li>✓ Se realizará el mes de junio la constatación física de la obra a resolver</li> <li>✓ Se ha dispuesto el inicio de la elaboración del expediente de saldo de obra para el mes de julio</li> </ul>
2	2465289	413411	14057	Piura	Piura	Catacaos	99	4,414,157	1/08/2022	57.83%	9/02/2023	Incumplimiento por parte del contratista	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Resolución del contrato al Contratista para el mes de mayo</li> <li>✓ Se realizará el mes de junio la constatación física de la obra a resolver</li> <li>✓ Se ha dispuesto el inicio de la elaboración del expediente de saldo de obra para el mes de julio</li> </ul>
3	2460279	279587	10036 Maria Auxiliadora	Lambayeque	Chiclayo	Monsefu	55	2,741,839	23/09/2022	17.33%	23/01/2023	Incumplimiento por parte del contratista	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Resolución del contrato al Contratista para el mes de mayo</li> <li>✓ Se realizará el mes de junio la constatación física de la obra a resolver</li> <li>✓ Se ha dispuesto el inicio de la elaboración del expediente de saldo de obra para el mes de julio</li> </ul>
4	2428619	796829	1422	Piura	Piura	Tambo Grande	26	2,070,731	8/07/2022	45.87%	20/12/2022	Resolución contrato de obra	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Constatación física el 18 y 19 de mayo 2023</li> <li>✓ Se ha dispuesto la elaboración del expediente de saldo de obra</li> </ul>
5	2460479	413331	Jose Carlos Mariategui Lachira	Piura	Piura	Catacaos	567	8,130,237	02/06/2021	35.27%	5/10/2021	Resolución contrato de obra	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Coordinaciones con la ARCC, con respecto a la asignación de recursos pendientes a efectos de realizar la convocatoria del saldo de obra</li> </ul>
6	2471097	666922	1912	La Libertad	Pacasmayo	Guadalupe	32	1,875,407	8/09/2022	11.91%	8/11/2022	Resolución contrato de obra	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Se ha dispuesto el inicio de la elaboración del expediente de saldo de obra para el mes de junio</li> </ul>
7	2428683	779580	20863	Piura	Huancabamba	Huarmaca	67	4,759,132	21/06/2021	90.89%	30/09/2022	Resolución contrato de obra	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Se ha dispuesto el inicio de la elaboración del expediente de saldo de obra para el mes de mayo</li> </ul>
<b>TOTAL</b>							<b>2,012</b>	<b>25,281,941</b>					
