

Avances de las intervenciones de Soluciones Integrales

Autoridad para la Reconstrucción con Cambios

Dirección de Soluciones Integrales



PERÚ

Autoridad para la
Reconstrucción con Cambios

2022

Cartera de Proyectos de Inversión de Soluciones Integrales

Región	19 Ríos	5 Quebradas	7 Drenajes
Tumbes	<ul style="list-style-type: none"> Tumbes Zarumilla 		<ul style="list-style-type: none"> Tumbes
Piura	<ul style="list-style-type: none"> Piura 		<ul style="list-style-type: none"> Talara Sullana Piura Paíta
Lambayeque	<ul style="list-style-type: none"> La Leche Motupe Zaña Olmos Chancay - Lambayeque 		<ul style="list-style-type: none"> Chiclayo
La Libertad	<ul style="list-style-type: none"> Chicama Virú 	<ul style="list-style-type: none"> San Idelfonso El León San Carlos 	<ul style="list-style-type: none"> Trujillo
Áncash	<ul style="list-style-type: none"> Lacramarca Casma Huarmey 		
Lima	<ul style="list-style-type: none"> Huaura Cañete Rímac Mala 	<ul style="list-style-type: none"> Huaycoloro 	
Ica	<ul style="list-style-type: none"> Matagente Ica 	<ul style="list-style-type: none"> Cansas 	



PERÚ

Autoridad para la
Reconstrucción con Cambios

Contratos G2G y ejecución financiera (oct. 2022)

REGION	PAQUETE	PROYECTO	MONTO DE CONTRATO (PRESUPUESTO ESTIMADO s/.)	EJECUCIÓN CONTRACTUAL (Set. 2022)	%
PIURA	PQ D05	DRENAJE SULLANA	425,057,259	23,761,960	6%
	PQ D06	DRENAJE TALARA	176,601,909	8,929,282	5%
	Sub total		601,659,168	32,691,242	5%

Adicionalmente:

- Drenaje Pluvial de Paita en proceso de procura (licitación)
- Sistema SAT en proceso de diseño
- Plan Maestro del río Piura y drenaje pluvial de Piura en entrega e implementación.



PERÚ

Autoridad para la
Reconstrucción con Cambios



REGIÓN PIURA

Proyecto	N°	Monto Viable S/ (Millones)	Monto Contrato S/	Estado Actual
Defensas Ribereñas		Plan Integral	(*)	Rio Piura: El plan integral del Rio culmina en octubre 2022 Paralelamente se viene implementando 12 proyectos de avanzada. Priorizando el Plan: Salida al mar y presas.
SAT	1	48	9.9	Inicio 10.21 a 03.25 (Con otros SAT de cuencas) Avance de diseño al 95 % Inicio previsto de obra : Febrero de 2023
Drenaje Pluvial ciudad de Piura		Plan Integral	(**)	Rio Piura: El plan integral del Rio se prevé culminar en octubre 2022 Paralelamente se viene implementando medidas para la ejecución de proyectos de avanzada en drenaje.
Drenaje Pluvial Talara	1	203	176	Diseño y ejecución de Obras (07.22 al 04.27) Diseño : Avance 2% Inicio de obras: Junio 2023
Drenaje Pluvial Sullana	1	482	425	Diseño y ejecución de Obras (06.22 al 01.27) Diseño: Avance de 2% Inicio de obras: Junio 2023
Drenaje Pluvial Paita	1	188		Etapas de Procura: Se estima adjudicar: Diciembre 2022 Inicio de diseño: Diciembre 2022 (15 meses)
Total	4	921.0	610.9	

Beneficiarios: 833 mil personas



(*) Plan Integral del Río Comprende:

- 9 presas
- 93 intervenciones defensas, espigones otros.
- Salida al Mar.
- Presupuesto estimado 4,376 mil millones.

(**) Plan Integral del Drenaje:

- Sistema de Drenaje para los distritos de Veintiséis de Octubre, Castilla y Piura.
- Se estima un presupuesto de 2,900 mil millones.

Paralelamente se viene realizando acciones para la pronta ejecución de proyectos priorizados (Presas y Salida al Mar).

MONTO TOTAL: S/ 7'276 mil millones




PERÚ

Autoridad para la
Reconstrucción con Cambios



Sistema de Alerta Temprana (SAT)

Proyecto	Ámbito	Monto Contrato S/	Estado Actual
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE ALERTA TEMPRANA ANTE INUNDACIONES Y MOVIMIENTOS DE MASA EN LA CUENCA DEL RIO PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA	Piura	9,919,294.13 (*)	<p>Avance de Diseño: 95%</p> <p>Aceptación de Diseño: Noviembre 2022</p> <p>Un radar meteorológico, estará arribando al Perú en febrero del 2023, con lo cual se iniciará su instalación y pruebas, poniéndolo al servicio de la sociedad civil y entidades técnico científicas para el siguiente periodo de lluvias.</p>
Total		9,919,294.13	

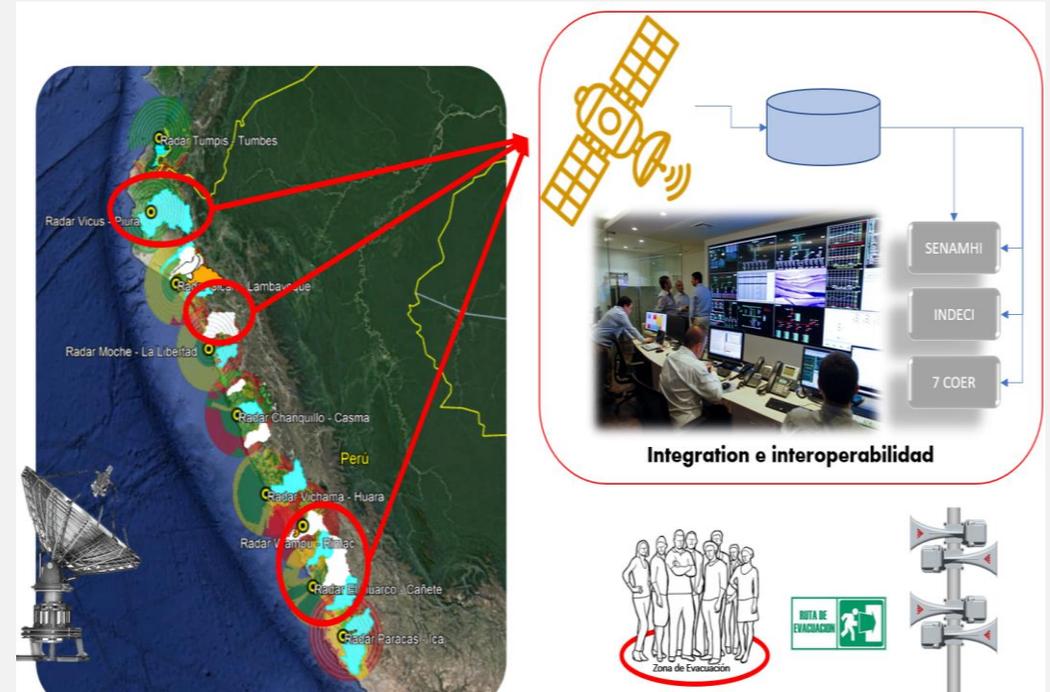

(*) El contrato suscrito en dólares (US\$ \$ 8,393,980.50) por TC s/ 4.103 x US\$.



PERÚ

Autoridad para la Reconstrucción con Cambios

AVANCE DE PUNTOS CRITICOS (Adelanto de inversiones)



PERÚ

Autoridad para la
Reconstrucción con Cambios



REGIÓN PIURA



03: PIP culminados

02: Ejecución

04: Elab. ET

01: Excluir

11 Intervenciones

10 PIP (defensas ribereñas)

1 Activ. Fajas marginales

01: En ejecución

Inversión S/

410,37 millones

Región	Soluciones Integrales Intervenciones	Entidad Ejecutora	Monto de Inversión del proyecto /estudio S/	Estado Actual - Comentarios
Piura	4. Solución integral río Piura			
	4.1 Mejoramiento y ampliación de los servicios de protección frente a inundaciones ambas márgenes del río Piura desde la progresiva 216+800 hasta 224+300 en 6 localidades del distrito de Buenos Aires - Provincia de Morropón - departamento de Piura.	Gobierno Regional de Piura	-	EE viene elaborando expediente técnico
	4.2 Creación del servicios de protección frente a inundaciones en los caseríos de: Chanro y Piedra azul, margen izquierda del río Pusmalca progresivas 5+900 a 8+400 del distrito de San Miguel de El Faique-Provincia de Huancabamba - departamento de Piura.	Gobierno Regional de Piura	-	EE viene elaborando expediente técnico
	4.3 Creación del servicio de protección frente a inundaciones en el sector Simbila Viduque, margen izquierda del río Piura, Distrito de Catacaos - Provincia de Piura - Departamento de Piura.	Municipalidad Provincial de Piura	-	Proyecto para reformular/excluir por duplicidad
	4.4 Creación del servicio de protección en riberas del río Piura vulnerable ante el peligro en los sectores San Vicente - San Rafael y Olivares - Parales, Distrito de Piura - Provincia de Piura - Departamento de Piura	Gobierno Regional de Piura	-	EE viene elaborando expediente técnico
	4.5 Creación del servicio de protección en ribera del río Piura, vulnerable ante el peligro en el caserío de Vicus, Distrito de Chulucanas - Provincia de Morropon - Departamento de Piura.	Gobierno Regional de Piura	-	EE viene elaborando expediente tecnico
	4.6 Creación del servicio de protección en riberas del río Piura ante el peligro de desbordes e inundaciones en el sector La Cordillera, Distrito de Bernal - Provincia de Sechura - Departamento de Piura.	Municipalidad Distrital de Bernal	15,887,443.15	PIP Culminado 100% Meta de 5.0 km enrocado margen derecha
	4.7 Mejoramiento del Servicio de Protección Contra Inundaciones de las Ciudades de Piura y Castilla, margen Derecha e Izquierda del Río Piura en el Tramo: Represa Los Ejidos al Puente Cáceres, distritos de Piura y Castilla, de la provincia y departamento de Piura.	Gobierno Regional de Piura	136,692,476.09	Proyecto de inversión en ejecución, con avance físico de 98.30 %
	4.8 "Mejoramiento y ampliación del servicio de protección contra inundaciones de la Ciudad de Piura y Castilla entre el Puente Cáceres y el futuro Puente Integración de la Margen Derecha Prog. 2+665 hasta Prog. 5+432 y la Margen Izquierda Prog 2+540 hasta Prog 5+370, Distritos de Piura y Castilla, Provincia y Departamento de Piura"	Gobierno Regional de Piura	98,919,902.64	Proyecto de inversión en ejecución, con avance físico de 75.7 %
	4.9 Creación del servicio; conformación, espigonado y encimado de dique con material propio, con geobolsas para protección de la ribera de la margen izquierda, sobre el dique izquierdo del río Piura frente a inundaciones en el tramo Mariátegui- Jr Zepita, tramo rinconada, tramo Narihualá, tramo Pedregal Chico, tramo Pedregal Grande,, distrito de Cura Mori, provincia de Piura, departamento de Piura.	Municipalidad Provincial de Piura	47,268,115.93	Proyecto culminado al 100 % Meta: Sector 1(Cura Mori - Pte Idependencia): enrocado 11.4 km Sector 2(Pte Idependencia - Viduque): enrocado 9.1 km
4.10 Delimitación y Monumentación de la faja marginal del río Piura	Autoridad Nacional del Agua		Actividad	
5. Ampliación Presa Poechos (río Chira)	Gobierno Regional de Piura	111,604,040.00	Gore Piura culmino ejecución al 100 %	



PERÚ

Autoridad para la Reconstrucción con Cambios

- En junio del 2022, se transfirió s/ 717 799 (MPM: s/ 575,992 y MDM: s/141 807) para 4 estudios de preinversión
- La MP de Piura y la MD La Matanza vienen formulando 5 estudios de preinversión para su ejecución por COF
- Estrategia de ejecución del Plan: Salida al mar y presas.



REGIÓN PIURA



Región	Soluciones Integrales Intervenciones	Entidad Ejecutora	Monto de Inversión del proyecto /estudio S/	Estado Actual - Comentarios
Piura	6. Drenaje pluvial ciudad de Piura			
	6.1 "Construcción del Sistema de Evacuación de Aguas Pluviales por Gravedad de la Franja Central de la Ciudad de Piura" – SNIP 30240	ARCC		Inmerso en el plan de drenaje ciudad de Piura
	6.2 Proyecto: "Mejoramiento del Sistema de Evacuación de Aguas Pluviales del Drenes: Petroperú y Japón-Turquía, distrito Veintiséis de Octubre, Provincia de Piura-Departamento de Piura"	Municipalidad Distrital Veintiséis de Octubre	917,318.00	ET en revisión (MEF y MVCS)
	6.3 Proyecto: "Creación del sistema de evacuación de aguas pluviales, canales vía y drenajes desde la zona urbana del sector Nor Oeste hacia la quebrada Las Monjas, distrito Veintiséis de Octubre, Piura-Piura, centro poblado de Puente Las Monjas - distrito de Veintiséis de Octubre - provincia de Piura - región Piura"	Municipalidad Distrital Veintiséis de Octubre	779,335.00	Estudio para ser reformulado
	6.4 "Creación Vía Canal tramo ubicado entre el A.H. Paredes Maceda y A.H. Ciudad Del Sol, desde la Av. Grau hasta el Dren Maldonado, centro poblado de San Martín - Distrito de Veintiséis de Octubre-Provincia de Piura-Región Piura"	Municipalidad Distrital Veintiséis de Octubre	15,356,299.00	Proyecto de inversión en ejecución, avance físico 87.1 %
	6.5. Mejoramiento del Sistema de Evaluación de aguas pluviales del Dren Maldonado Zona Urbana del Sector Sur Oeste, Distrito de 26 de Octubre-Provincia de Piura-Región de Piura	Municipalidad Distrital Veintiséis de Octubre	858,918.00	ET en revisión (MEF y MVCS)
	6.6 "Reparación de canal de drenaje en el (la) Sullana entre intersección Prolong. Av. Sullana con Calle 5 y Calle f y Carretera Panamericana en la localidad Piura, Distrito de Piura, Provincia Piura, Departamento Piura"	Municipalidad Provincial de Piura	14,740,933.00	Culminada 100% , en etapa de Liquidación
	6.7 Rehabilitación del servicio de evacuación pluvial del A.H. Campo Polo, Urbanización San Bernardo, A.H. Chiclayito, A.H. Juan Pablo Segundo y el A.H. Gonzales Prada del Distrito de Castilla - Piura – Piura.	Municipalidad Provincial de Castilla	4,925,987.00	Culminada
	6.8 Rehabilitación del servicio de evacuación pluvial del dren de la Avenida Guillermo Irazola del Distrito de Castilla, Piura- Piura.	Municipalidad Provincial de Castilla	609,175.00	Culminada
	6.9 Ampliación marginal del servicio de evacuación pluvial del cercado de Castilla, entre la Av. Ramon Castilla hasta la Av. Arequipa, Distrito de Castilla-Piura-Piura.	Municipalidad Provincial de Castilla	476,348.00	Culminada
	6.10 Reparación del canal de drenaje en la Av. Aviación del A.H Campo Polo sector II del Distrito de Castilla-Provincia de Piura– Piura.	Municipalidad Provincial de Castilla	489,749.00	Culminada
	6.11 Reparación de drenaje en la cuenca de las urbanizaciones Los Rosales, Las Gardenias, Santa María del Pinar en la localidad de Piura, Distrito de Piura, Provincia de Piura, Departamento de Piura.	Municipalidad Provincial de Piura	758,875.00	Culminada
6.12 Reparación de canal de drenaje en el cercado de la ciudad en la localidad de Piura, Distrito de Piura, Provincia de Piura, Departamento de Piura.	Municipalidad Provincial de Piura	476,348.00	Culminada al 100% , en liquidación	

12 Intervenciones

07: Culminados

01: en ejecución de obra

03: Elab. ET

01: Excluir

Inversión S/

40.38 millones

- Dren Japón Turquía (octubre) y Dren Maldonado (mar. 2023) en elaboración de ET (MEF y MVCS)
- Dren cinco Esquinas para reformulación

GRACIAS
