

Estado actual de obras paralizadas en Arequipa

Comisión Especial Multipartidaria ProInversión
CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Valery Fabio Niño de Guzmán Paredes
Gerente Regional de Control de Arequipa



1

¿Qué es una obra paralizada?



Definición de obra paralizada (*)



1. Se entiende por obra pública paralizada aquella contratada bajo la aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado, que cuente con un avance físico igual o mayor al 40% y que, a la fecha del registro del inventario al que se refiere el artículo 3 de la ley, cumple con alguno de los siguientes supuestos:

- El contrato se encuentra vigente, pero sin reportar ejecución física por un período igual o mayor a 6 (seis) meses.
- Provenga de un contrato resuelto o declarado nulo.

2. Se considera obra pública paralizada iniciada bajo la modalidad de administración directa aquella que cuente con un avance físico igual o mayor al 50% y que no reporte ejecución física por un período mayor a 6 (seis) meses o más a la fecha del registro del inventario a que se refiere el artículo 3 de la ley.

(*)Artículo 2 de la Ley N° 31589

2

Reporte de obras paralizadas

Fuente: Gerencia de Modernización y Planeamiento CGR

Obras paralizadas por nivel de gobierno

Nivel de gobierno	Costo actualizado de la inversión		Obras paralizadas		Saldo de inversión por ejecutar*	
	S/	%	N°	%	S/	%
Gobierno Nacional	26 254 557 262	62.7	435	18.3	21 757 759 264	78
Gobierno Regional	9 083 777 300	21.7	243	10.8	4 611 161 777	16
Gobierno Local	6 528 819 377	15.6	1624	70.9	1 674 426 911	6
Total	41 867 153 939	100%	2302	100%	28 043 347 952	100%

*El cálculo del estimado de saldo de inversión por ejecutar se toma de referencia los devengados efectuados a la inversión.

FUENTE: Sistema Nacional de Obras Públicas - Infobras

ELABORACIÓN: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control (SESNC). / FECHA: 30/09/2022

Obras paralizadas por sector de gobierno

Sector	Nivel de gobierno						
	Nacional	Regional	Local	Total general		Costo actualizado	
	Cantidad	Cantidad	Cantidad	Cantidad	%	S/	%
Transportes y Comunicaciones	62	65	464	591	25.7	25 675 693 523	61.3
Vivienda, Construcción y Saneamiento	105	30	399	534	23.2	4 192 061 145	10.0
Salud	37	32	28	97	4.2	2 800 054 961	6.7
Agricultura	76	43	143	262	11.4	2 247 228 192	5.4
Educación	55	42	123	220	9.6	1 447 906 368	3.5
Cultura	9	5	158	172	7.5	575 909 985	1.4
Otros sectores	91	26	309	426	18.4	4 928 299 766	11.7
Total	435	243	1624	2302	100%	41 867 153 939	100%

FUENTE: Sistema Nacional de Obras Públicas -Infobras

ELABORACIÓN: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control (SESNC). / FECHA: 30/09/2022

Obras paralizadas según su causal u origen de paralización

Causales de paralización declarada por la entidad	N° obras paralizadas	Porcentaje %	Costo actualizado		Saldo de inversión	
			S/	%	S/	%
Falta de recursos financieros y liquidez	515	24.2	1 662 494 353	4.0	515 557 562	1.8
Incumplimiento de contrato	299	12.5	9 658 611 720	23.1	4 237 154 414	15.1
Eventos climáticos	84	5.1	346 040 613	0.8	61 522 060	0.2
Discrepancias, controversias y arbitraje	150	6.1	5 856 421 767	14.0	3 788 821 935	13.5
Conflictos sociales	64	3.5	186 269 565	0.4	34 487 860	0.1
Falta de permisos, licencias y autorizaciones	25	1.3	17 464 411 967	41.7	17 170 679 787	61.2
Deficiencia en el Expediente Técnico	18	1.0	122 969 855	0.3	19 063 982	0.1
Disponibilidad de terreno	23	1.1	592 466 255	1.4	348 581 521	1.2
Interferencias	18	0.9	160 809 523	0.4	6 553 440	0.0
Pandemia Covid-19	10	0.5	17 467 903	0.0	4 594 619	0.0
Abandono de obra	3	0.1	10 559 176	0.0	2 823 689	0.0
Otros (*)	1093	43.7	5,788 631 244	13.8	1 853 507 083	6.6
Total	2302	100.0%	41 867 153 939	100.0%	28 043 347 952	100.0%

(*) Comprende causas no previstas, transferencia de gestión, no atribuibles a ambas partes, entre otros.

FUENTE: Portal Invierte.pe del Ministerio Economía y Finanzas e Infobras de la CGR.

Obras paralizadas según modalidad de ejecución



Modalidad de ejecución	Gobierno Nacional		Gobierno Regional		Gobierno Local		Total			
	N°	Costo actualizado S/	N°	Costo actualizado S/	N°	Costo actualizado S/	N°	%	Costo actualizado S/	%
Administración directa	38	187 065 403	72	857 622 130	1098	1 884 860 425	1208	54.6	2 929 547 958	7.7
Por contrata	316	25 774 626 829	168	4 905 660 321	522	4 609 719 003	1006	45.4	35 290 006 153	92.3
Total	354	25 961 692 233	240	5 763 282 451	1620	6 494 579 428	2214	100%	38 219 554 111	100%

FUENTE: Sistema Nacional de Obras Públicas -Infobras

ELABORACIÓN: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control (SESNC). / FECHA: 30/09/2022

Análisis comparativo de las obras paralizadas junio – setiembre 2022

Nivel de gobierno	N° obras				Costo actualizado en S/			
	Se reactivaron	Permanecen desde junio	Se paralizaron a setiembre	Total a setiembre	Se reactivaron	Permanecen desde junio	Se paralizaron a setiembre	Total a setiembre
G. Nacional	89	279	156	435	2 876 499 826	6 914 314 128	19 340 243 134	26 254 557 262
G. Regional	114	160	83	243	5 862 213 188	7 522 474 156	1 561 303 144	9 083 777 300
G. Local	476	1228	396	1624	1 996 453 180	5 017 757 971	1 511 061 407	6 528 819 377
Total general	679	1667	635	2302	10 735 166 194	19 454 546 255	22 412 607 684	41 867 153 939

FUENTE: Base de datos de Invierte.PE del Ministerio Economía y Finanzas e Infobras de la CGR.

Resumen de estado de las obras paralizadas por región junio – setiembre



Ubicación	N° obras				Costo actualizado en S/			
	Se reactivaron	Permanecen desde junio	Se paralizaron en setiembre	Total a setiembre	Se reactivaron	Permanecen desde junio	Se paralizaron en setiembre	Total a setiembre
Cusco	115	297	72	369	1 868 235 631	909 210 722	395 568 173	1 304 778 895
Piura	54	84	57	141	755 360 598	1 931 222 451	1 238 627 192	3 169 849 643
Lima	51	106	55	161	320 987 162	2 436 845 900	17 308 000 225	19 744 846 125
Puno	49	217	46	263	275 083 096	1 141 977 366	222 245 441	1 364 222 807
Áncash	36	99	42	141	451 607 963	969 500 531	388 044 840	1 357 545 371
Huancavelica	22	70	40	110	118 865 923	270 079 701	157 799 748	427 879 449
Cajamarca	39	105	36	141	154 294 103	1 819 473 488	159 238 855	1 978 712 344
Arequipa	27	67	35	102	2 610 867 545	506 203 269	537 661 588	1 043 864 857
Ayacucho	34	90	23	113	186 183 635	520 266 505	153 985 663	674 252 168
Junín	18	56	23	79	254 976 061	776 587 635	263 742 023	1 040 329 658
Tacna	6	27	22	49	625 130 711	634 686 601	44 169 933	678 856 535
Lambayeque	14	40	20	60	44 604 227	276 117 223	159 939 714	436 056 937
Amazonas	16	30	15	45	140 996 686	309 778 701	131 017 425	440 796 126
Huánuco	37	55	15	70	367 759 526	903 581 478	85 225 226	988 806 704
Loreto	23	42	14	56	579 421 857	373 417 240	255 320 963	628 738 203
Ica	6	25	13	38	96 023 440	152 395 587	244 671 245	397 066 832
Pasco	11	24	12	36	238 819 328	93 737 582	50 386 666	144 124 248
San Martín	14	31	9	40	52 342 814	136 544 527	38 833 692	175 378 219
Madre de Dios	5	11	7	18	49 292 477	69 064 740	42 531 558	111 596 298
Moquegua	16	36	6	42	49 846 479	212 325 800	13 617 416	225 943 216
Ucayali	6	15	6	21	20 351 765	678 440 868	167 798 944	846 239 812
P. C. del Callao	3	4	5	9	59 830 193	20 538 679	29 515 656	50 054 335
Tumbes	6	11	2	13	28 753 893	128 733 309	778 849	129 512 158
Total general	679	1667	635	2302	10 735 166 194	19 454 546 255	22 412 607 684	41 867 153 939

Principales obras reactivadas en Arequipa a setiembre 2022

CUI	Proyecto	Entidad	Costo actualizado (según Invierte S/)	Nivel de gobierno	Nivel de gobierno	Nivel de gobierno
2088142	Majes Sigvas – II etapa	Autoridad Autónoma de Majes	2 019 045 786	Arequipa	Caylloma	Caylloma
2331873	Mejoramiento del servicio de transitabilidad del eje de integración vial norte entre la intersección de la Av. Las Torres – Vía PE - 34A, hasta la intersección con la Av. Italia - Av. Aviación, Distritos de Yura y Cerro Colorado, Provincia de Arequipa, Región Arequipa	Gobierno Regional Arequipa	289 502 926	Arequipa	Arequipa	Cerro Colorado

Ubicación de obras públicas paralizadas y costos de inversión



Departamento	Costo Actualizado S/	% (costo actualizado)	N° obras paralizadas	% (obras)	Saldo de Inversión por ejecutar S/
LIMA	19,744,846,125	47.2%	161	7.8%	18,656,342,143
LA LIBERTAD	3,862,241,900	9.2%	77	3.7%	2,999,122,575
PIURA	3,169,849,643	7.6%	141	7.3%	1,198,078,204
CAJAMARCA	1,978,712,344	4.7%	141	5.9%	965,552,463
PUNO	1,364,222,807	3.3%	263	12.2%	216,628,205
ANCASH	1,357,545,371	3.2%	141	6.9%	600,405,561
CUSCO	1,304,778,895	3.1%	369	13.6%	185,926,255
AREQUIPA	1,043,864,857	2.5%	102	5.1%	453,132,912
JUNIN	1,040,329,658	2.5%	79	3.5%	345,999,563
HUANUCO	988,806,704	2.4%	70	2.5%	521,193,590
UCAYALI	846,239,812	2.0%	21	0.9%	225,062,306
TACNA	678,856,535	1.6%	49	2.2%	324,377,653
AYACUCHO	674,252,168	1.6%	113	4.9%	236,408,925
APURIMAC	645,461,100	1.5%	108	4.7%	162,861,659
LORETO	628,738,203	1.5%	56	2.3%	179,527,744
AMAZONAS	440,796,126	1.1%	45	1.7%	93,570,854
LAMBAYEQUE	436,056,937	1.0%	60	2.4%	98,065,585
HUANCAVELICA	427,879,449	1.0%	110	4.5%	85,538,622
ICA	397,066,832	0.9%	38	1.3%	243,762,024
MOQUEGUA	225,943,216	0.5%	42	1.4%	106,733,996
SAN MARTIN	175,378,219	0.4%	40	1.5%	17,329,461
PASCO	144,124,248	0.3%	36	1.6%	12,886,149
TUMBES	129,512,158	0.3%	13	0.7%	58,856,839
MADRE DE DIOS	111,596,298	0.3%	18	0.8%	40,750,833
P. C. DEL CALLAO	50,054,335	0.1%	9	0.6%	15,233,830
Total general	41,867,153,939	100%	2302	100%	28,043,347,952

- A setiembre de 2022 se tiene un total de 2302 obras paralizadas a nivel nacional, con un importe de inversión ascendente a S/ 41 mil 867 millones.
- El número de obras paralizadas que se ejecuta bajo el marco normativo de la Reconstrucción con Cambios asciende a 190 obras, por un monto de inversión de S/ 2848 millones.
- Las obras paralizadas correspondientes al marco normativo del D.U. N° 008-2019 y D.L. N° 1486, suman 239 obras paralizadas, por un monto de inversión de S/ 2592 millones, a la fecha de emisión del presente informe.
- Se ejecutaron 1578 servicios de control a nivel nacional a las 2302 obras paralizadas, de los cuales el 91.8% (1448) corresponde a servicios de control simultáneo, el 7% (111) a control posterior y el 1.2% (19) a control previo.

3

Principales obras paralizadas Arequipa




Nivel de gobierno con más obras paralizadas en Arequipa



102 obras paralizadas en la región Arequipa por nivel de gobierno

N° DE OBRAS PARALIZADAS

■ G. Nacional ■ G. Regional ■ G. Local

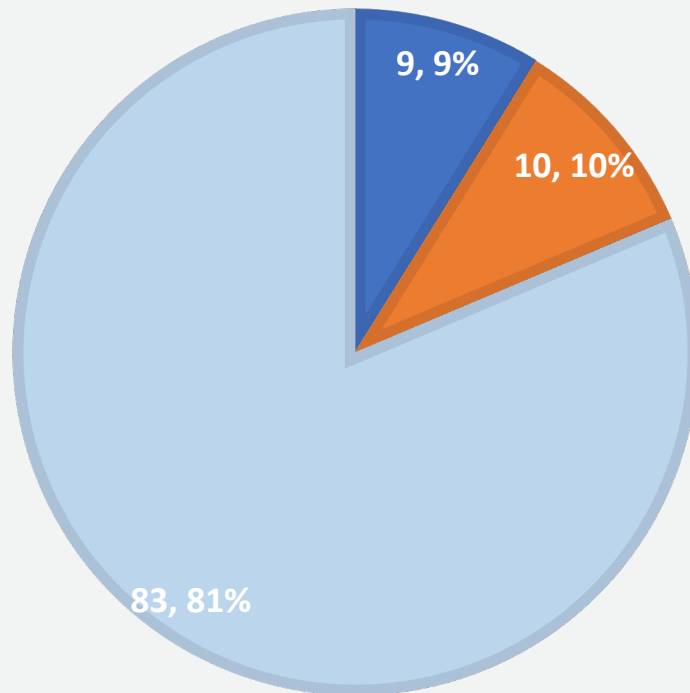


Nivel de Gobierno	N° de obras paralizadas
G. Nacional	9
G. Regional	10
G. Local	83
Total general	102

Sectores de gobierno con más obras paralizadas en Arequipa



OBRAS PARALIZADAS

- Vivienda, construcción y saneamiento
- Culturas
- Educación
- Orden público / Defensa
- Otras infraestructuras
- Transportes y Comunicaciones
- Agricultura
- Salud
- Ambiental

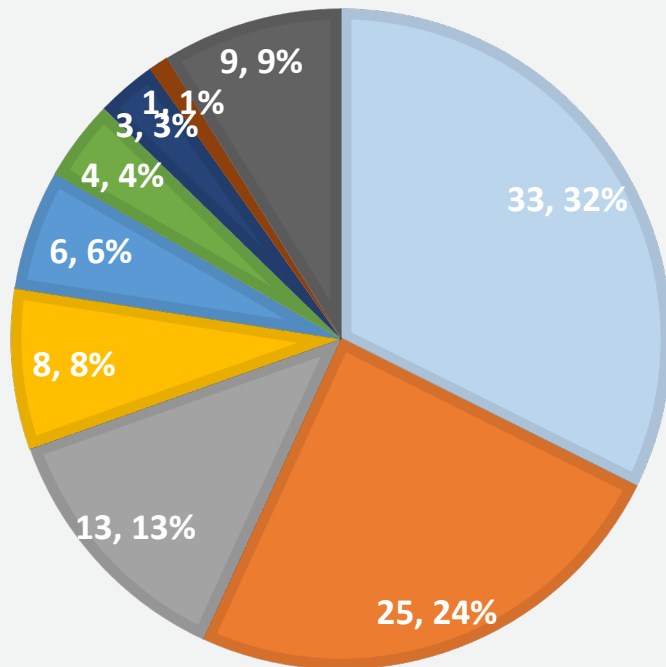

Sector	Obras paralizadas
Vivienda, construcción y saneamiento	33
Transportes y Comunicaciones	25
Cultura	13
Agricultura	8
Educación	6
Salud	4
Orden público / Defensa	3
Ambiental	1
Otras infraestructuras	9

Principales obras que se paralizaron a setiembre 2022 en Arequipa



CUI	Proyecto	Entidad	Costo actualizado (según Invierte S/)	Departamento	Provincia	Distrito
2426979	Servicio de mejoramiento y rehabilitación de la infraestructura vial paquete 7R: tramo 1: emp. AR - 639 – Acopallpa – Paccrapicha – Dv. Cuyanca –Huasicac (L=15.06 Km), Tramo 2: Emp. AR-100 - Bella Unión (L=16.70 Km), Tramo 3: Emp. AR-105 (Chuquibamba) – Pachana (L=38.19 Km) Y Tramo 4: Emp. Ar-105 – Emp. AR - 588 – Huasca (Dv. Salamanca) - Salamanca (l=49.14 km)	Ministerio de Transportes y Comunicaciones	125 765 342	Arequipa	Castilla	Machaguay
2132733	Instalación de los sistemas de agua potable y desagüe en Ciudad Majes, módulos a, b, c, d, e, f y g y Villa Industrial, Distrito de Majes - Caylloma – Arequipa	Municipalidad Distrital de Majes	125 511 365	Arequipa	Caylloma	Majes
2331093	Creación de los sistemas de agua potable dependientes del reservorio N - 39 y alcantarillado sanitario del Distrito de Cerro Colorado, provincia, departamento y región de Arequipa	Programa Nacional de Saneamiento Urbano	99 697 430	Arequipa	Arequipa	Cerro Colorado

Principales obras paralizadas en el departamento de Arequipa



CÓDIGO INFOBRAS	CUI	DESCRIPCIÓN OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO S/	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
42076	2283964	OBRA N° 06: PUENTE FREYRE – VALLE DE TAMBO, PROVINCIA DE ISLAY (EN GRUPO DE 06 PUENTES)	PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL - PROVÍAS NACIONAL	S/ 171,917,708	G. Nacional	Discrepancias, controversias y arbitraje	Por Contrata
91046	2426979	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PAQUETE 7R AREQUIPA TRAMO 1: EMP. AR 639 ACOPALLPA PACCRAPICHA DV. CUYANCA HUASICAC; TRAMO 2: EMP. AR 100 BELLA UNIÓN; TRAMO 3: EMP. AR 105 (CHUQUIBAMBA) PACHANA; TRAMO 4: EMP. AR 105 EMP. AR 588 HUASCA (DV. SALAMANCA) - SALAMANCA	MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	S/ 125,765,342	G. Nacional	Incumplimiento de contrato	Por Contrata
130434	2331093	CREACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE DEPENDIENTES DEL RESERVORIO N-39 Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA, DEPARTAMENTO Y REGIÓN DE AREQUIPA	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	S/ 99,697,430	G. Nacional	Incumplimiento de contrato	Por Contrata
68967	2195475	EJECUCIÓN DE LA OBRA PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALERTA ANTE EL RIESGO VOLCÁNICO EN EL PERÚ	INSTITUTO GEOFÍSICO DEL PERÚ	S/ 23,588,806	G. Nacional	Otros	Por Contrata
101774	2436560	REHABILITACIÓN DE PUENTE BETANCURT Y ACCESOS (REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 5 HUANCAVELICA – AYACUCHO - AREQUIPA	MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	S/ 20,079,489	G. Nacional	Incumplimiento de contrato	Por Contrata
42907	2279439	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD COTAHUASI, DISTRITO COTAHUASI, PROVINCIA LA UNIÓN, REGION AREQUIPA	GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA	S/ 73,766,927	G. Regional	Incumplimiento de contrato	Por Contrata
91734	2407684	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ALTO MOLINO - LA BARRERA, PROG. 0 000 20 100, DISTRITO DE RÍO GRANDE - PROVINCIA DE CONDESUYOS - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA	S/ 26,277,025	G. Regional	Incumplimiento de contrato	Por Contrata
86540	2407520	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LA VÍA DEPARTAMENTAL AR-107 KM 0.000 HASTA KM 17.859 PAMPACOLCA DV. TAGRE TIPAN DISTRITO PAMPACOLCA - PROVINCIA CASTILLA - DEPARTAMENTO AREQUIPA	GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA	S/ 14,660,915	G. Regional	Incumplimiento de contrato	Por Contrata

Principales obras paralizadas en el Departamento de Arequipa



CÓDIGO INFOBRAS	CUI	DESCRIPCIÓN OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO S/	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
127987	2149540	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA NUEVA ALBORADA, DISTRITO DE PAUCARPATA - AREQUIPA - AREQUIPA	GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA	S/ 12,638,845	G. Regional	Otros	Por Contrata
86300	2406518	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR AR-828 KM. 0.000 HASTA KM. 4.340 EMP. PE 1SD EL FRISCO - PE 1SD DISTRITOTO DEÁN VALDIVIA - PROVINCIA ISLAY - REGIÓN AREQUIPA	GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA	S/ 7,202,177	G. Regional	Discrepancias, controversias y arbitraje	Por Contrata
139111	2132733	INSTALACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE EN CIUDAD MAJES MODULOS A, B, C, D, E, F Y G Y VILLA INDUSTRIAL, DISTRITO DE MAJES - CAYLLOMA - AREQUIPA II ETAPA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES	S/ 125,511,365	G. Local	Incumplimiento de contrato	Por Contrata
84665	2166795	AMPLIACIÓN Y RENOVACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO DE CHIVAY PROVINCIA DE CAYLLOMA AREQUIPA COMPONENTES REDES DE AGUA Y DESAGUE III ETAPA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA	S/ 26,007,156	G. Local	Otros	Por Contrata
62683	2309952	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS LOCALIDADES DE OCOÑA Y LOS ANEXOS DE PUMACOTO, EL PUENTE Y CHULI DEL DISTRITO DE OCOÑA, PROVINCIA DE CAMANA AREQUIPA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCOÑA	S/ 22,473,053	G. Local	Falta de recursos financieros y liquidez	Por Contrata
26280	2148923	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE JOSÉ MARÍA QUIMPER Y LOS ANEXOS DE HUACAPUY Y EL PUENTE DISTRITO DE JOSE MARIA QUIMPER – CAMANÁ	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSÉ MARÍA QUIMPER	S/ 17,766,313	G. Local	Incumplimiento de contrato	Por Contrata
89389	2425828	CREACIÓN DEL MERCADO DE ABASTOS (CULMINACIÓN) DEL DISTRITO DE MAJES - PROVINCIA DE CAYLLOMA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES	S/ 12,432,906	G. Local	Otros	Adm. Directa

4

Servicios de control a obras paralizadas



Servicios de control a obras paralizadas por nivel de gobierno a nivel nacional

Tipo de servicio de control	GOBIERNO LOCAL		GOBIERNO REGIONAL		GOBIERNO NACIONAL		Total Cantidad	Total %
	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%		
CONTROL PREVIO	1	0.1%	16	1.0%	2	0.1%	19	1.2%
CONTROL SIMULTÁNEO	763	48.4%	262	16.6%	423	26.8%	1448	91.8%
CONTROL POSTERIOR	58	3.7%	38	2.4%	15	1.0%	111	7.0%
Total general	822	52.1%	316	20.0%	440	27.9%	1578	100.0%

Servicios de control a obras paralizadas por departamento



Tipo de servicio de control	CONTROL POSTERIOR	CONTROL PREVIO	CONTROL SIMULTÁNEO	Total de servicios
AMAZONAS	1		19	20
ANCASH	7	1	114	122
APURIMAC	4		46	50
AREQUIPA	4		123	127
AYACUCHO	5		61	66
CAJAMARCA	5		77	82
CUSCO	5		123	128
HUANCAVELICA	11		74	85
HUANUCO	5	1	37	43
ICA	15	1	39	55
JUNIN	5		43	48
LA LIBERTAD	3	1	110	114

Tipo de servicio de control	CONTROL POSTERIOR	CONTROL PREVIO	CONTROL SIMULTÁNEO	Total de servicios
LAMBAYEQUE	5		38	43
LIMA	7		129	136
LORETO			17	17
MADRE DE DIOS	1		17	18
MOQUEGUA	3		14	17
P. C. DEL CALLAO	2		13	15
PASCO	1		17	18
PIURA	8		119	127
PUNO	5		110	115
SAN MARTIN	1		9	10
TACNA	4		27	31
TUMBES			30	30
UCAYALI	4	15	42	61
Total de servicios	111	19	1448	1578

En Arequipa se realizaron servicios de control a 47 obras

Servicios de control posterior a obras paralizadas en Arequipa



DESCRIPCIÓN OBRA	ENTIDAD	PROVINCIA	TIPO DE SERVICIO	HECHO OBSERVADO	PERJUICIO ECONÓMICO
Mejoramiento de los servicios de salud del establecimiento de Salud Cotahuasi, distrito Cotahuasi, provincia La Unión, región Arequipa	Gobierno Regional de Arequipa	LA UNIÓN	Auditoría de cumplimiento	<ul style="list-style-type: none"> Aprobación de expediente técnico elaborado inobservando el perfil viable, la normativa del SNIP, la normativa técnica de salud y las bases del proceso de selección y sin la supervisión correspondiente, generó la modificación de la meta del proyecto y un perjuicio a la Entidad de S/ 6 193 037,57. Contratación de servicios de consultoría para la elaboración y evaluación de expediente técnico de saldo de obra: Mejoramiento del Establecimiento de Salud de Cotahuasi, distrito de Cotahuasi, provincia de La Unión, departamento de Arequipa con perjuicio de S/ 213 500.00 	S/ 6 406 537.57
Creación de la Piscina Municipal en el pueblo joven UPIS El Carmen de Congata, distrito de Uchumayo - Arequipa - Arequipa	Municipalidad Distrital de Uchumayo	AREQUIPA	Auditoría de cumplimiento	<ul style="list-style-type: none"> La Entidad aprobó valorizaciones con mayores metrados, con partidas que no contaban con presupuesto y que no se ejecutaron; asimismo, aprobó el adicional de obra N° 2 y las ampliaciones de plazo Nos 2 y3, para la ejecución de la red de alcantarillado y conexiones de la red de alcantarillado y conexiones domiciliarias, que no correspondía, y omitió el cobro de penalidades; ocasionando el perjuicio económico de S/ 3 279 870,33 y que la infraestructura construida no cumplía la finalidad que motivó su ejecución. 	S/ 3 279 870.33
Mejoramiento de obras complementarias de agua potable Sedapar localidad La Punta, distrito de Samuel Pastor, provincia de Camaná, departamento y región de Arequipa	Sedapar	CAMANÁ	Servicio de Control Específico	<ul style="list-style-type: none"> Conformidad de valorizaciones de la obra "Mejoramiento de obras complementarias de agua potable Sedapar, localidad La Punta, distrito de Samuel Pastor, provincia de Camaná" conteniendo trabajos no efectuados, y suspensión indebida de su ejecución que ocasionó que las partidas en proceso se deterioren y no se cumpla con la finalidad del proyecto, contravinieron los principios de eficacia y eficiencia e imparcialidad que regulan las contrataciones públicas, generando un perjuicio económico de S/ 104 276.08. Omisión de observar demora en la elaboración de expediente técnico y en el levantamiento de observaciones benefició a consultor al no determinarle la penalidad correspondiente, ni disponer la anulación de la orden de servicios con la consecuente resolución de contrato, contraviniendo los principios de eficacia y eficiencia e imparcialidad que regulan las contrataciones públicas, y ocasionando un perjuicio económico de S/ 2 426.61. 	S/ 106 702.69
Instalación de nuevas conexiones domiciliarias para la ciudad de Arequipa 2017	Sedapar	AREQUIPA	Auditoría de cumplimiento	<ul style="list-style-type: none"> Variabilidad de características en las conexiones domiciliarias ejecutadas durante el período 2016 - 2017, conllevó a que los metrados de las sub partidas de la ejecución contractual y adicionales aprobados, generaran el reconocimiento de precios unitarios mayores a los ofertados por la empresa contratista, afectando los intereses de Sedapar S.A. y ocasionando un perjuicio económico de S/ 50 720,56. 	S/ 50 720.56

Principales servicios de control simultáneo a obras paralizadas en Arequipa



DESCRIPCIÓN OBRA	EVENTO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	PROVINCIA	DISTRITO	ESTADO ACTUAL
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ALTO MOLINO - LA BARRERA, PROG. 0 000 20 100, DISTRITO DE RÍO GRANDE - PROVINCIA DE CONDESUYOS	Reconstrucción con Cambios	Por Contrata	CONDESUYOS	RÍO GRANDE	Paralizada. Se emitió 6 informes de hito de control hasta el 2021
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LA VIA DEPARTAMENTAL AR-107 KM 0.000 HASTA KM 17.859 PAMPACOLCA DV. TAGRE TIPAN DISTRITO PAMPACOLCA - PROVINCIA CASTILLA	Reconstrucción con Cambios	Por Contrata	CASTILLA	PAMPACOLCA	Paralizada, por resolución de contrato, en proceso de ejecución de expediente de saldo. Se emitió 11 informes de hito de control
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR AR-828 KM. 0.000 HASTA KM. 4.340 EMP. PE 1SD EL FRISCO - PE 1SD DISTRITO DE DEÁN VALDIVIA - PROVINCIA ISLAY	Reconstrucción con Cambios	Por Contrata	ISLAY	DEÁN VALDIVIA	Paralizada, por resolución de contrato, en proceso de solicitud de financiamiento a ARCC, del expediente de saldo. Se emitió 5 informes de hito de control
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL PRINCIPAL EN EL ANEXO LOCRAHUANCA, DISTRITO DE TOME PAMPA, PROVINCIA LA UNIÓN	Proceso Normal	Adm. Directa	LA UNIÓN	TOME PAMPA	Paralizada. Se emitió informe de hito de control, por un adicional aprobado de manera incorrecta
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD COTAHUASI, DISTRITO COTAHUASI, PROVINCIA LA UNIÓN	Reactivación Económica	Por Contrata	LA UNIÓN	COTAHUASI	Paralizada. Se emitió informe de SCE al expediente de saldo
AMPLIACION Y RENOVACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO DE CHIVAY PROVINCIA DE CAYLLOMA - COMPONENTES REDES DE AGUA Y DESAGUE III ETAPA	Reactivación Económica	Por Contrata	CAYLLOMA	CHIVAY	Paralizada. Se emitió 3 informes de hito de control. Con resolución de contrato
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS EN EL CIRCUITO DEL CENTRO HISTORICO RECORRIDO FUNDO FIERRO, PLAZA DE ARMAS Y RECOLETA, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGION AREQUIPA	Reactivación Económica	Adm. Directa	AREQUIPA	AREQUIPA	Paralizada. Se emitió un informe de visita de control

Gracias

