



PERÚ

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego



Gobierno del Perú



Ing. Harry Parra Castañeda
Director Ejecutivo

03/07/2024



PERÚ

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego



NUEVO AMBITO DE INFLUENCIA - PROYECTO ESPECIAL ALTO HUALLAGA

Organización

AMBITO DE INFLUENCIA:

Región Huánuco – 7


Provincias: Huánuco (12 Distritos), Ambo (8 distritos), Marañón (5 distritos) Huacaybamba (4 distritos), Leoncio Prado (10 distritos), Huamalíes (9 distritos), Provincia de Puerto Inca (3 distritos)

Región San Martín – 2

Provincias: Mariscal Cáceres (5 distritos), Tocache (5 distritos)

Región Ucayali – 2

Provincias: Coronel Portillo (5 distritos), Padre Abad (5 distritos).

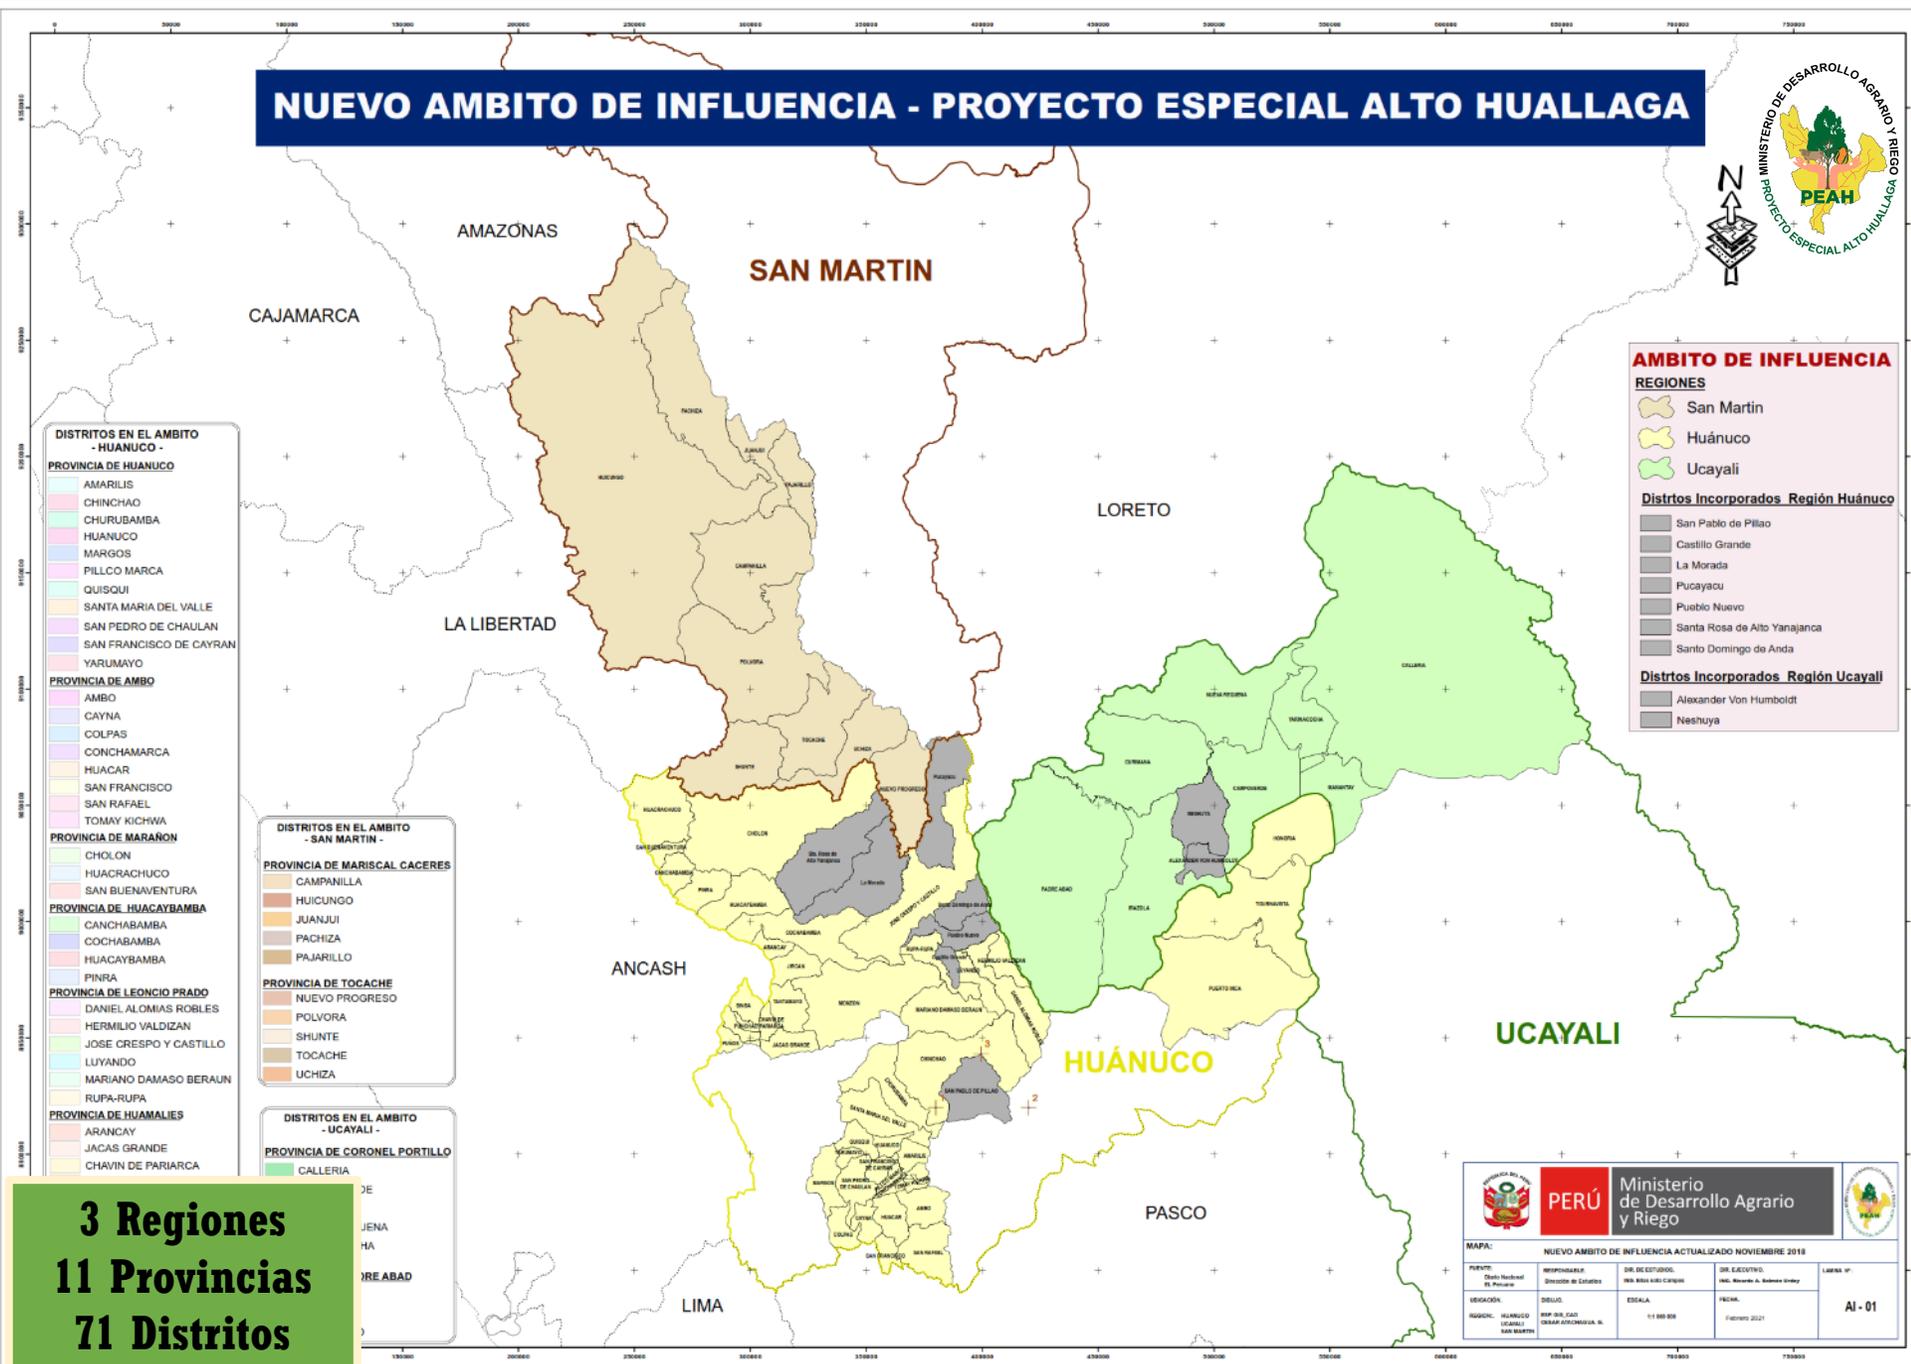

3 Regiones
11 Provincias
71 Distritos

| | | | |
|--|---|--|-------------------------------|
| | | PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego | |
| MAPA: NUEVO AMBITO DE INFLUENCIA ACTUALIZADO NOVIEMBRE 2019 | | | |
| PIUNTO: Dpto. Huánuco D. Peruvia | RESPONSABLE: ING. ROSA LUIS CANGINI | DIR. DE ESTUDIOS: ING. ROBERTO A. BARRERA VILLALBA | LABORA. Y P.: |
| UBICACION: HUANUCO CORONEL PORTILLO SAN MARTIN | DESGO: REP. PER. CAD. DISEÑO ARCHITECTONICA S.A. | ESCALA: 1:1 000 000 | FECHA: Febrero 2021 |
| | | | AI - 01 |




PERÚ

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego



BICENTENARIO DEL PERÚ 2021 - 2024



PROYECTOS EN EL 2024



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego

PROGRAMACION FINANCIERA



| Nº | CUI | PROYECTOS | PLAZO DE EJECUCION | | PRESUPUESTO INICIAL 2024 |
|----|---------|--|--------------------|------------|--------------------------|
| | | | INICIO | TERMINO | |
| 1 | 2000270 | GESTION DE PROYECTOS | | | S/ 4,034,423 |
| 2 | 2001621 | ESTUDIO DE PRE INVERSION | | | S/ 210,000 |
| 3 | 2113097 | CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO LAS MERCEDES-LA VICTORIA-07 DE OCTUBRE | 01/02/2024 | 31/12/2024 | S/ 13,869,330 |
| 4 | 2303476 | RECUPERACION DE SUELOS DEGRADADOS MEDIANTE LA INSTALACION DE ESPECIES FORESTALES, EN EL DISTRITO DE POLVORA, PROVINCIA DE TOCACHE - SAN MARTIN | 01/02/2024 | 31/12/2024 | S/ 5,098,743 |
| 5 | 2308816 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LAS COMUNIDADES DE QUEROPATA Y CHUQUIBAMBA, DISTRITO DE CHAVIN DE PARIARCA - HUAMALIES - HUANUCO | 01/03/2024 | 19/09/2024 | S/ 1,929,623 |
| 6 | 2320394 | INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE CAMOTE, DISTRITO MONZON, PROVINCIA DE HUAMALIES-HUANUCO | 01/03/2024 | 31/10/2024 | S/ 1,909,237 |
| 7 | 2429343 | INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO ALTO UCHIZA - PORONGO, DISTRITOS DE UCHIZA Y NUEVO PROGRESO, PROVINCIA DE TOCACHE - SAN MARTIN | | | S/ 893,084 |
| | | TOTAL | | | S/ 27,944,440 |

26.2 %



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego

PROGRAMACIÓN FÍSICA



| Nº | CUI | PROYECTOS | INDICADOR | Unidad de Medida | TOTAL |
|----|---------|--|---|------------------|--------------|
| 1 | 2113097 | CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO LAS MERCEDES-LA VICTORIA-07 DE OCTUBRE | Construcción de la Bocatoma | UND | 1 |
| | | | Construcción de Túnel | ML | 600 |
| 2 | 2303476 | RECUPERACION DE SUELOS DEGRADADOS MEDIANTE LA INSTALACION DE ESPECIES FORESTALES, EN EL DISTRITO DE POLVORA, PROVINCIA DE TOCACHE - SAN MARTIN | Manejo de plantaciones reforestadas | HA | 3500 |
| 3 | 2308816 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LAS COMUNIDADES DE QUEROPATA Y CHUQUIBAMBA, DISTRITO DE CHAVIN DE PARIARCA - HUAMALIES - HUANUCO | Línea de conducción para riego agrícola | KM | 3.47 |
| 4 | 2320394 | INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE CAMOTE, DISTRITO MONZON, PROVINCIA DE HUAMALIES-HUANUCO | Línea de conducción para riego agrícola | KM | 4.663 |



PERÚ

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego



“Construcción Canal de riego Las Mercedes – La Victoria – 07 de octubre”. CUI 2113097

PIM 2024 S/. 13'869,330



| UBICACIÓN | ÁREAS BENEF. (has) | Beneficiarios Directos | COSTO DE INVERSIÓN TOTAL DEL PI (S/.) | COMENTARIO |
|---|--------------------|------------------------|---------------------------------------|--|
| REGIÓN: Huánuco PROVINCIA: Leoncio Prado DISTRITO: José Crespo y Castillo | 4,239 | 2,257 | 67,984,222.7 | <ul style="list-style-type: none"> Reinicio de Ejecución Febrero-2024. Construcción de la bocatoma y el Túnel. |

| U.M | MAY. ACUM | JUN. | JUL. | AGO. | SET. | OCT. | NOV. | DIC | Total Anual |
|-----------------|-----------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|
| S/. | 1,525,119 | 450,000 | 505,973 | 1,015,000 | 2,708,000 | 3,550,850 | 2,050,000 | 2,500,000 | 13'869,330 |
| % avance | 0 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 100% |

Unidad de construcción de la Bocatoma - Túnel



PERÚ

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego

“Mejoramiento del servicio de agua del sistema de riego en las comunidades de Queropata y Chuquibamba, distrito de Chavín de Pariarca, Huamalíes – Huánuco”. CUI 2308816



PIM 2024 S/. 1'929,623

| UBICACIÓN | ÁREAS BENEF. (has) | Beneficiarios Directos | COSTO DE INVERSIÓN TOTAL DEL PI (S/.) | COMENTARIO |
|---|--------------------|------------------------|---------------------------------------|---|
| <u>REGIÓN:</u> Huánuco <u>PROVINCIA:</u> Huamalíes <u>DISTRITO:</u> Chavín de Pariarca | 156 | 985 | 10'702,344.16 | <ul style="list-style-type: none"> Reinicio de Ejecución Febrero-2024. Culminación de Obra Setiembre 2024 . |

| U.M | MAY. ACUM | JUN. | JUL. | AGO. | SET. | OCT. | NOV. | DIC | Total Anual |
|-----|-----------|---------|---------|---------|------|------|------|-----|-------------|
| S/. | 1,044,887 | 395,116 | 327,156 | 162,464 | 0 | | | | 1'929,623 |
| % | 80.72 | 93.21 | 97.85 | 99.71 | 100 | | | | 100% |

KM de línea de conducción para riego agrícola



PERÚ

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego



“Instalación del sistema de riego en la localidad de Camote, distrito Monzón, provincia de Huamalíes – Huánuco”. CUI 2320394

PIM 2024 S/. 1'909,237



| UBICACIÓN | ÁREAS BENEF. (has) | Beneficiarios Directos | COSTO DE INVERSIÓN TOTAL DEL PI (S/.) | COMENTARIO |
|---|--------------------|------------------------|---------------------------------------|---|
| <u>REGIÓN:</u> Huánuco <u>PROVINCIA:</u> Huamalíes <u>DISTRITO:</u> Monzón | 189 | 548 | 7,002,960.82 | <ul style="list-style-type: none"> Reinicio de Ejecución Febrero-2024. Culminación de Obra Octubre 2024 |

| U.M | MAY. ACUM | JUN. | JUL. | AGO. | SET. | OCT. | NOV. | DIC | Total Anual |
|-----|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|------|-----|------------------|
| S/. | 668,706 | 226,122 | 310,000 | 304,173 | 200,236 | 200,000 | | | 1'909,237 |
| % | 53.46 | 8% | 11.84% | 8.84% | 9.39 % | 8.47% | | | 100% |

KM de línea de conducción para riego agrícola



PERÚ

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego



“Recuperación de suelos degradados mediante la Instalación de especies forestales, en el distrito de Pólvora, provincia de Tocache - San Martín”.

CUI 2303476

PIM 2024 S/. 5'098,743.00



| UBICACIÓN | ÁREAS BENEF. (has) | Beneficiarios Directos | COSTO DE INVERSIÓN TOTAL DEL PI (S/.) | COMENTARIO |
|---|-------------------------------|------------------------|---------------------------------------|--|
| REGIÓN: Huánuco PROVINCIA: Huamalíes DISTRITO: Monzón | 3,500 Has. Reforestadas | 9,434 | 16,836,396.05 | <ul style="list-style-type: none"> Reinicio de Ejecución Febrero-2024. Culminación del Proyecto Diciembre 2024 |

| U.M | MAY. ACUM | JUN. | JUL. | AGO. | SET. | OCT. | NOV. | DIC | Total Anual |
|-----|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------|
| S/. | 1,388,407 | 436,776 | 425,000 | 405,000 | 420,000 | 800,000 | 773,561 | 450,000 | 5'098,744 |
| % | 23.8 % | 31.20 | 43.20 | 58.13 | 72.98 | 82.09 | 91.20 | 100 | 3,500 |

% Manejo 3500 hectáreas de plantaciones reforestadas

OBRAS PARALIZADAS



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego

OBRAS PARALIZADAS



| Nº | CUI | PROYECTOS | ESTADO |
|----|---------|--|--|
| 1 | 2250972 | MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE RIEGO EN LA SUB CUENCA DEL RIO HUALLAGA, DISTRITOS DE AMBO, PILLCOMARCA, TOMAYKICHUA Y HUANUCO, PROVINCIAS DE AMBO Y HUANUCO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO. | CUANTA CON EXPEDIENTE DE SALDO DE OBRA |
| 2 | 2062526 | CONSTRUCCION MICROPRESA PUTAGA | CUENTA CON EXPEDIENTE DE SALDO DE OBRA |

ESTADO SITUACIONAL OBRAS PARALIZADAS

CUI 2250972

1. MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE RIEGO EN LA SUB CUENCA DEL RIO HUALLAGA, DISTRITOS DE AMBO, PILLCOMARCA, TOMAYKICHUA Y HUANUCO, PROVINCIAS DE AMBO Y HUANUCO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO.

| | | |
|-------------------------------|---|--------------|
| 1. Avance financiero | : | 6'607,883.29 |
| 2. Ejecución física acumulada | : | 4'194,786.14 |

3. Obra ejecutada al 63.45% de ejecución física, paralizada por incompatibilidades de ejecución con respecto al expediente técnico y se encuentra dentro de las obras publicas paralizadas basada en el marco de la Ley N°31589.
4. Cuenta con un expediente de saldo de 1 238,356.81 para el cierre del proyecto.

ESTADO SITUACIONAL OBRAS PARALIZADAS

CUI 2062526

1. CONSTRUCCION MICROPRESA PUTAGA

| | | |
|--|---|--------------|
| 1. Avance financiero | : | 3'167,539.47 |
| 2. Ejecución física acumulada | : | 2'917,986.37 |
| 3. Adicional de Expediente Saldo de Obra | : | 6'430,184.26 |

OBSERVACIONES EN LA OBRA.

Obra ejecutada al 100%, no recepcionada en su entrega de obra por observaciones de filtraciones en la presa, la obra se encuentra dentro de las obras publicas paralizadas basada en el marco de la Ley N°31589

ESTADO ACTUAL

Cuenta con un expediente de saldo, APROBADO con resolución para incorporación y ejecución en el 2024 y 2025 con un presupuesto de 6 430,184.26 millones con proyección a ejecución de 1 713,289.44 en el presente año fiscal 2024.

PROYECTOS CON FALTA DE FINANCIAMIENTO 2025



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO



CUI 2233821

1. INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE CAÑUTILLO, DISTRITO DE PÓLVORA, PROVINCIA DE TOCACHE SAN MARTIN

CUI 2202525

2. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL DE HUAYLLABAMBA - HUANCACHUPA - PITUMAMA - YANAG - ROSAVERO - ANDABAMBA - DISTRITO DE PILLCO MARCA, PROVINCIA DE HUÁNUCO – HUÁNUCO

CUI 2418117

3. AMPLIACIÓN DE CANAL DE RIEGO EN LOS CASERÍOS TUNUYA, NUEVO JORDÁN, SAN JOSE DE TUNUYA, DISTRITO DE CAMPOVERDE-PROVINCIA DE CORONEL DE PORTILLO-DEPARTAMENTO DE UCAYALI

CUI 1444

4. PROYECTO DE IRRIGACIÓN, CAPTACIÓN Y CANAL ALTO CUÑUMBUZA, DISTRITO DE CAMPANILLA, PROVINCIA DE MARISCAL CÁCERES - SAN MARTIN

CUI 2521750

5. CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS CASERÍOS DE HUAMUCO Y MOLOPE (ZONA BAJA) DEL DISTRITO DE LA MORADA, PROVINCIA DE MARAÑÓN – HUÁNUCO

CUI 2475587

1. MEJORAMIENTO EN CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA DEL CULTIVO DE CACAO EN POS COSECHA, FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y ARTICULACIÓN COMERCIAL EN ZONAS PRODUCTORAS DE PUERTO INCA, EN LOS DISTRITOS DE HONORIA, PUERTO INCA Y TOURNAVISTA DE LA PROVINCIA DE PUERTO INCA - DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO

CUI 2495439

2. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE PLANTACIONES FORESTALES EN LA ZONA ESTE DE TINGO MARÍA DEL DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO – HUÁNUCO



LIMITACIONES Y PROPUESTAS DE MEJORA



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego

LIMITACIONES



- Instrumentos de Gestión desactualizados.
 - Plaza orgánicas de personal no cubiertas.
 - Escala remunerativa del personal desactualizada.
- Insuficiente asignación de recursos para la formulación de estudios de pre - inversión y expediente técnicos.
- Inadecuada planificación de los proyectos de inversión.
 - Expedientes incompatibles.
 - En el periodo 2023 no se elaboró el Analítico de Costos para el 2024.

PROPUESTAS DE MEJORAS

- Actualización y aprobación de los documentos de Gestión.
- Demanda adicional de asignación de recursos.
- Fortalecimiento de capacidades en planificación, gestión de proyectos de inversión, programación en inversiones y elaboración del cuadro de necesidades.

GRACIAS



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego



Gobierno del Perú
