



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones



SÉPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA SAN MARTIN

COMISIÓN DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Enero 2025

PUENTE TARATA

- ❖ **San Martín (Mariscal Cáceres)**
- ❖ **Unidad Ejecutora:** Provias Descentralizado
- ❖ **CUI:** 2239036
- ❖ **Costo de Inversión:** S/ 382.5 millones
- ❖ **PIM 2025:** S/ 66.5 Millones
- ❖ **Monto Devengado:** S/ 102 Millones
- ❖ **Longitud:** 510 m luz puente, accesos 1,463 m
- ❖ **Alcance:** Puente continuo de tres tramos de tipo segmental con vigas cajón de concreto post-tensado. El puente Tarata y accesos se construirá sobre el río Huallaga, entre los distritos de Juanjuí y Pajarillo (Puerto Cangrejo y Puerto Tarata).
- ❖ **OBRA EN EJECUCIÓN**
 - Fecha de Inicio: 01.06.24 (Plazo de ejecución 03 años)
 - Avance ejecutado acumulado a diciembre 2024: **14.09 % (Avance programado 12.49%, Adelantada)**






PERÚ


Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones



AVANCES DE LA OBRA DEL PUENTE TARATA MARGEN IZQUIERDA

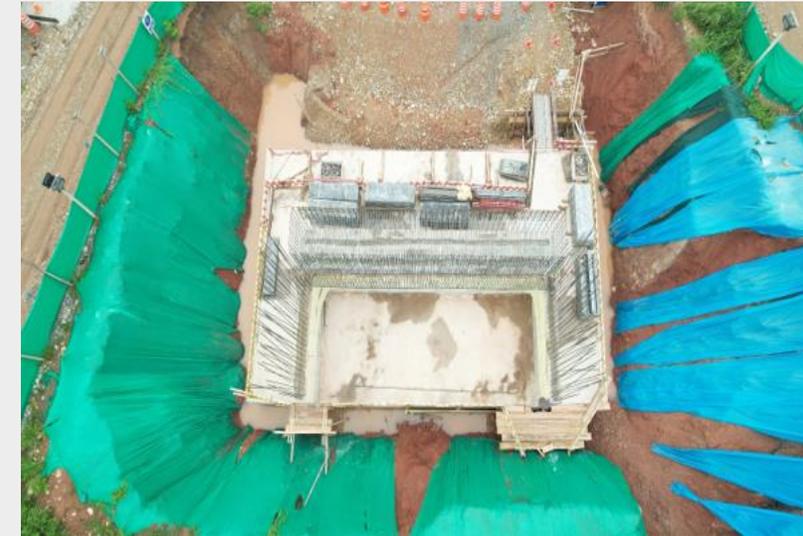

MARGEN DERECHA

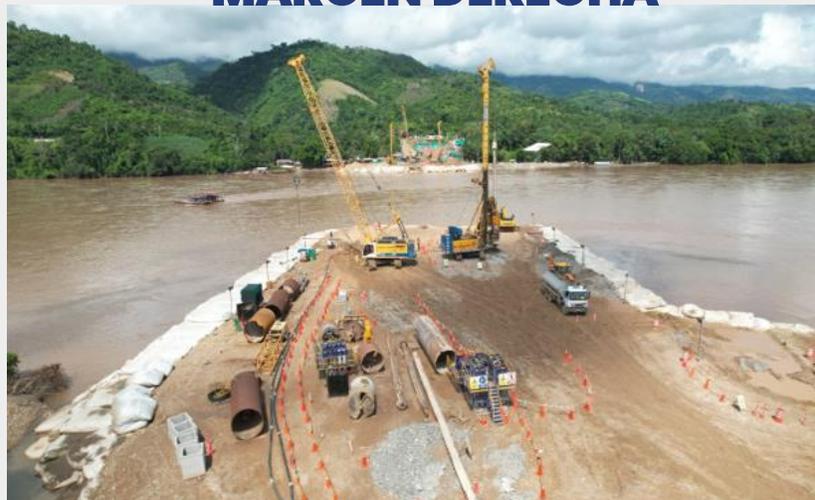

RENOVACIÓN DEL PUENTE PICOTA

- ❖ **San Martín (Picota)**
- ❖ **Unidad Ejecutora:** Provias Descentralizado
- ❖ **CUI:** 2530505
- ❖ **Beneficiarios:** 25,570 habitantes
- ❖ **Costo de Inversión:** S/ 124.7 millones
- ❖ **Longitud:** Puente 263 metros, accesos 1.6 km.
- ❖ **Plazo de ejecución:** 18 meses
- ❖ El puente Picota se rehabilitará sobre el río Huallaga, en el distrito de Picota, provincia de Picota, región de San Martín
- ❖ **OBRA EN PERFECCIONAMIENTO DE CONTRATO**
 - Buena pro consentida el **15.01.2025** al CONSORCIO EJECUTOR 2B.
 - **En proceso para la suscripción del contrato** (8 días hábiles para presentación de documentos, 27.01.2025 último día para presentar documentos)
 - Inicio de obra estimada: **Feb-25.**



RENOVACIÓN DEL PUENTE PICOTA

COMPONENTES DEL PROYECTO

EN LA SUPERESTRUCTURA

- ❖ Reemplazo total del tablero por una losa de concreto de 0.20 m de espesor, veredas y vigas entre pilares.
- ❖ Rehabilitación de elementos de la estructura metálica, reemplazo de los cables principales, péndolas y dispositivos de anclaje.

EN LA SUBESTRUCTURA

- ❖ Reparación de los elementos de concreto de los estribos y muros.

EN LOS ACCESOS (Longitud: 1.6 km)

- ❖ Se contará con una sección de 8m de ancho y estructura de pavimento de sub-base de 0.20m, base de 0.20m y carpeta asfáltica de 5 cm de espesor.





CARRETERA DV.TINGO MARÍA – AUCAYACU – NUEVO PROGRESO – TOCACHE – JUANJUI – PICOTA – TARAPOTO


- ❖ San Martín (Huallaga, Mariscal Cáceres, Picota, san Martín, Tocache); Huánuco (Leoncio Prado, Bellavista)
- ❖ Unidad Ejecutora: Provias Nacional
- ❖ Costo: S/ 282 millones
- ❖ Longitud: 459 km
- ❖ Alcance:
 - M. Rutinario y Emergencias (459 Km)
 - M. Periódico (50 Km)
 - Plazo de contratación: 05 años

CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO EN PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

- Proceso de selección CP-SM-26-2024-MTC-20-1 convocado el 27.12.25.
- Actualmente en absolución de consultas y observaciones por parte del comité.
- Buena pro programada para **Febrero 2025**.

SITUACIÓN ACTUAL DEL CORREDOR VIAL

- Actualmente la Unidad Zonal San Martín y Huánuco intervienen en el corredor vial por administración directa.

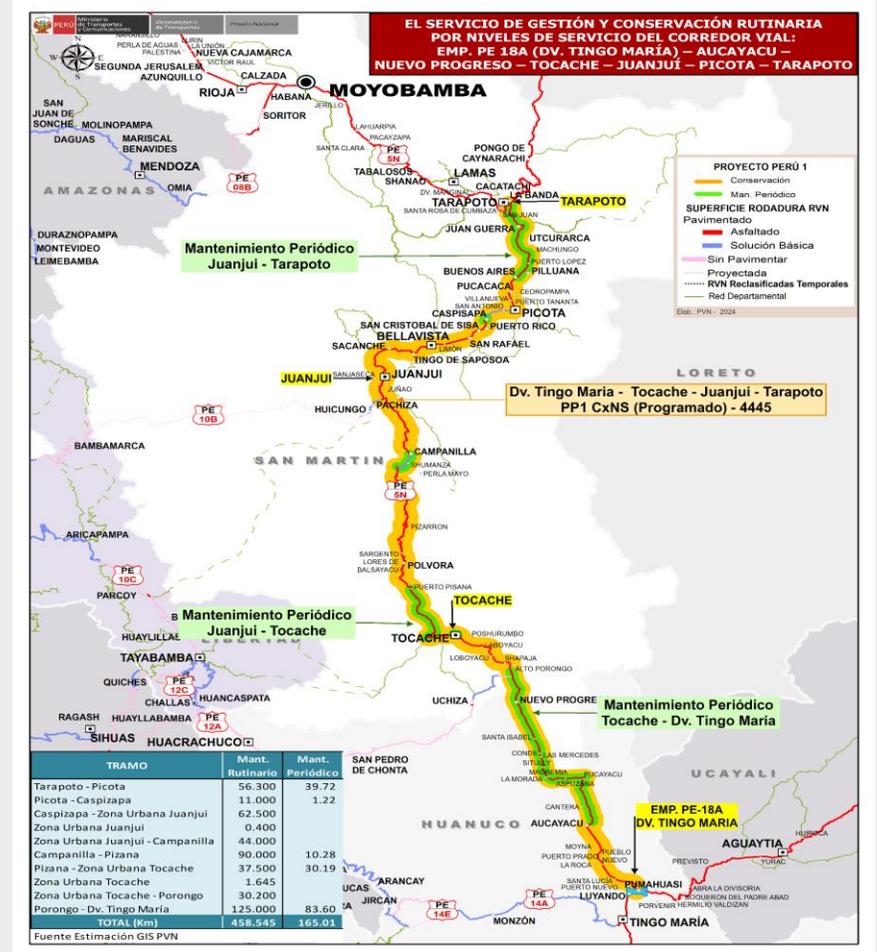

SOLICITUD DE INSTALACIÓN DE UN PUENTE MODULAR EN EL SECTOR VILLANUEVA REUBICADA

- ❖ **San Martín** (Provincia: Picota), Ruta PE-5N (Tingo Maria – Tarapoto)

SITUACIÓN ACTUAL

- Actualmente existe una alcantarilla tipo marco 1.0 m x 1.0 m a la altura del centro poblado Villanueva
- En noviembre 2024 hubo una venida extraordinaria que sobrepaso la capacidad hidráulica de la alcantarilla inundando sector de Villanueva Reubicada

PRÓXIMAS ACCIONES

- Se realizaron trabajos preliminares (topografía) a cargo de una Unidad Zonal de San Martín.
- **Entre el 28 al 30 de enero se realizara inspección técnica a cargo de la Dirección Puentes**, a fin de evaluar y plantear una alternativa de solución.



13 dic 2024 10:40:19 a. m.
18M 351277 9240409
Vía Sin Nombre
Pucacaca
Picota
San Martín

PROGRAMA DE APOYO AL TRANSPORTE SUBNACIONAL (PATS)

❖ A través de Provias Descentralizado, se gestiona el PATS que interviene en la red vial vecinal, en la región San Martín se tienen **16 intervenciones con una inversión aproximada de S/ 350.1 millones**. A continuación se detalla el estado situacional:

ESTADO	N° PI	INVERSIÓN	PIM 2025	COMENTARIO
EN EJECUCIÓN	1	45,293,656	14,374,575	Fecha de inicio: 01/11/2024
				Fecha de termino: 29/07/2025
OBRA EN PROCESO DE SELECCIÓN	1	9,876,272	91,998	convocado el 30.10.2024
				Valor Referencial S/. 7,445,385.29
				Buena pro: 30.01.2025
OBRA ACTOS PREPARATORIOS	1	19,040,620	0	Se realizará modificación para disponibilidad presupuestal
EXPEDIENTE APROBADO EN PACRI	4	65,748,558 *	0	Servicio de consultoría en proceso de selección (buena pro fines de enero 2025)
EXPEDIENTE EN ELABORACIÓN	5	42,669,547	889,542	Fecha de termino entre el mes de febrero y julio 2025
EXPEDIENTE TRANSFERIDO	4	116,815,996	19,752,353 *	Municipalidad Distrital de San Hilarión
				Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres (03)
TOTAL	16	350,512,087	35,108,468	

* Se realizarán las modificaciones presupuestales y se gestionarán recursos adicionales mediante el crédito suplementario 2025, a fin de convocar los procesos de selección para la ejecución de obra.

PROGRAMA DE APOYO AL TRANSPORTE SUBNACIONAL (PATS)

N°	CUI	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DEL PROYECTO	UNIDAD EJECUTORA	FASE	DETALLE ESTADO ACTUAL	LONG KM	MONTO DE INVERSIÓN
1	2464729	BELLAVISTA, PICOTA	SAN PABLO - PUCACACA	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. SM-102 (SAN PABLO) - SAN ANDRES - SAN IGNACIO - DOS DE MAYO - NUEVO FLORES - YACUSISA - SAN JUAN DE MIRAFLORES - SEDA SISA	PVD	EN EJECUCIÓN	<ul style="list-style-type: none"> Obra en ejecución Fecha de inicio: 01/11/2024. - Plazo de ejecución: 270 d.c Fecha estimada de culminación: 29/07/2025 	18.17	45,293,656
2	2389468	TOCACHE	TOCACHE	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-5N (BAMBAMARCA) - SANTA ROSA DE TANANTA Y Balsa PROBANA	PVD	OBRA EN PROCESO DE SELECCIÓN	<ul style="list-style-type: none"> LP-SM-15-2024-MTC/21-1, convocado el 30.10.2024 Valor Referencial S/. 7,445,385.29 Buena pro: 30.01.2025 	7.46	9,876,272
3	2440774	RIOJA	PARDO MIGUEL	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP 5N (NARANJOS) - EL DIAMANTE - SAN AGUSTÍN - ORIENTE NUEVO	PVD	ACTOS PREPARATORIOS	<ul style="list-style-type: none"> Obra: se realizará modificación para disponibilidad presupuestal PACRI: Segunda Liberación mayo 2025) 	8.78	19,040,620
4	2456535	TOCACHE	NUEVO PROGRESO	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP 5N (SANTA CRUZ) - TOCACHE - ALTO SANTA CRUZ	PVD	EXPEDIENTE APROBADO. EN PACRI	<ul style="list-style-type: none"> Estudio Definitivo aprobado PACRI: en proceso de selección (Buena pro 30.01.2025) 	5.07	8,375,524
5	2389427	RIOJA	AWAJUN - NUEVA CAJAMARCA	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP 5N (ANGAIZA) - VISTA ALEGRE - RICARDO PALMA - BUENOS AIRES	PVD		<ul style="list-style-type: none"> Estudio definitivo aprobado PACRI: Por convocar servicio de consultoría 	8.05	17,726,872
6	2389451	RIOJA	RIOJA - ELIAS SOPLIN VARGAS	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP 5N (EL PORVENIR) - RAMIRO PRIALE - NUEVA ESPERANZA	PVD		<ul style="list-style-type: none"> Estudio definitivo aprobado. PACRI: en proceso de selección (Buena pro 25.01.2025) 	6.6	15,032,949
7	2466010	SAN MARTIN	SHAPAJA	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. SM-106 (NUEVO LAMAS) - MORONA - SANTA ELENA	PVD	EXPEDIENTE EN ELABORACIÓN	<ul style="list-style-type: none"> Estudio definitivo aprobado. PACRI: en proceso de selección (Buena pro 25.01.2025) 	13.26	24,613,213
8	2455799	MOYOBAMBA	MOYOBAMBA	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. SM-113 (YANTALO) - DV. LOS ÁNGELES - LOS ÁNGELES - PLAYA HERMOSA - DV. QUILLOALLPA - CORDILLERA ANDINA	PVD		<ul style="list-style-type: none"> Expediente en elaboración Se estima aprobación del expediente técnico en febrero 2025. 	28.1	19,263,646
9	2412462	TOCACHE	POLVORA	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. 5N (PUERTO PIZANA) - VILLA LOS ANGELES - LA FLORIDA	PVD		<ul style="list-style-type: none"> Expediente en elaboración Se estima aprobación del expediente técnico en febrero 2025. 	11.71	6,469,409
10	2478624	MOYOBAMBA	YANTALO	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. SM-113 (YANTALO) - PUERTO LOS ÁNGELES (RÍO MAYO)	PVD	EXPEDIENTE EN ELABORACIÓN	<ul style="list-style-type: none"> Expediente en elaboración Componente Ambiental: Se enviará el FITSA al GORE SANMARTIN, a fines de marzo del 2025. 	3.6	1,553,573
11	2478204	RIOJA	RIOJA	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-5N – EMP. SM-610 (PTE. ZARANDAJO); RIOJA - PTE. ZARANDAJO; EMP. PE-5N - SECTOR WINBA	PVD		<ul style="list-style-type: none"> Expediente en elaboración Componente Ambiental: Se enviará el FITSA al GORE SANMARTIN, a fines de marzo del 2025. 	8.6	4,316,507
12	2481780	LAMAS, SAN MARTÍN	RUMISAPA, LAMAS CACATACHI	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. SM-682 (CACATACHI) - VENTANILLA - SANANGO - PACCHILA - CHIRAPA - NARANJAL – (CHIRAPA); EMP. SM-687 - LAMAS; DV. SHUKSHUYAKU – SHUKSHUYAKU	PVD		<ul style="list-style-type: none"> Expediente en elaboración Componente de Ingeniería: en elaboración Componente Ambiental: Se enviará el FITSA al GORE SAN MARTIN, a fines de julio 2025 	22.11	11,066,412



PROGRAMA DE APOYO AL TRANSPORTE SUBNACIONAL (PATS)

N°	CUI	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DEL PROYECTO	UNIDAD EJECUTORA	FASE	DETALLE ESTADO ACTUAL	LONG KM	MONTO DE INVERSIÓN
13	2412482	PICOTA	SAN HILARION	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-5N - NUEVA ESPERANZA - MORROPON - NUEVO CHIMBOTE; EMP. PE-5N - NUEVO EGIPTO - EMP. SM-785; EMP. SM-784 - EMP. SM - 785	M.D.SAN HILARION	EXPEDIENTE TRANSFERIDO	<ul style="list-style-type: none"> Expediente técnico culminado. Proyecto transferido a favor de la Municipalidad Distrital de San Hilarión 	24.65	25,931,303
14	2450872	MARISCAL CÁCERES - HUALLAGA	JUANJUI - TINGO DE SAPOSOA	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-5N (VICTORIA) - SAN MARTÍN - ZANJA SECA - TINGO DE SAPOSOA - EMP. PE-5N - SAN MARTIN Y ZANJA SECA	M.P. MARISCAL CACERES	EXPEDIENTE TRANSFERIDO	<ul style="list-style-type: none"> Expediente técnico culminado. Proyecto transferido a favor de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres PACRI : En proceso de selección. (Buena pro 30.01.2025) 	15.92	24,104,483
15	2389393	MARISCAL CÁCERES	JUANJUI - PACHIZA	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-5N - SANTA LUCÍA - GERVACIO - SAN RAMÓN - BAGAZAN	M.P. MARISCAL CACERES	EXPEDIENTE TRANSFERIDO	<ul style="list-style-type: none"> Expediente técnico culminado. Proyecto transferido a favor de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres PACRI : En proceso de selección. (Buena pro 30.01.2025) 	21.61	47,172,375
16	2412735	MARISCAL CÁCERES	JUANJUI	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-5N (EL TRIUNFO) - BALDOMIRO-MIRAFLORES-SHEPTE Y TRIUNFO	M.P. MARISCAL CACERES	EXPEDIENTE TRANSFERIDO	<ul style="list-style-type: none"> Expediente técnico culminado. Proyecto transferido a favor de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres PACRI: Se está realizando con personal de planta de PVD (04 regularizaciones de los documentos que sustente su propiedad) 	11.08	19,607,835

PUENTES DE MENORES LUCES (2024 – 2025)

Mediante **Crédito Suplementario 2024**, se gestiono el financiamiento de **26 puentes** en 09 provincias, con un inversión total de **S/ 28.9 millones**

PROVINCIA	PLIEGO HABILITADO	PUENTES	MONTO DE INVERSION
EL DORADO	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO	1	1,202,331
HUALLAGA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SAPOSOA	1	545,949
	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALLAGA - SAPOSOA	2	1,568,753
LAMAS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO	1	974,691
	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZAPATERO	1	1,253,369
	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMAS	1	1,927,773
MARISCAL CACERES	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAMPANILLA	1	1,440,629
	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUICUNGO	1	618,830
MOYOBAMBA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA	1	1,874,859
PICOTA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCACACA	1	1,123,060
	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHAMBOYACU	1	2,621,104
RIOJA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARDO MIGUEL	1	2,689,000
	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN FERNANDO	2	1,324,880
	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YORONGOS	1	1,191,647
SAN MARTIN	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL PORVENIR	3	1,901,642
	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO	2	1,784,095
	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAUCE	1	1,212,289
TOCACHE	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO PROGRESO	1	1,113,743
	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA LUCIA	1	878,824
	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHUNTE	1	1,300,147
	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHIZA	1	421,251
TOTAL DE PUENTES (2024)		26	28,968,866



26 PUENTES (2024)



28.9 millones

Mediante la **Ley de Presupuesto 2025**, se transfirió recursos a diversos gobiernos locales para el financiamiento **16 puentes** en 06 provincias con un inversión total de **S/ 13 millones**.

PROVINCIA	PLIEGO HABILITADO	PUENTES	MONTO DE INVERSION
DORADO	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO	1	931,762
LAMAS	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMAS	2	2,481,200
MARTIN	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL PORVENIR	1	1,316,694
MOYOBAMBA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JEPELACIO	2	1,324,054
RIOJA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARDO MIGUEL	2	2,410,659
TOCACHE	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TOCACHE	2	1,154,325
	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO PROGRESO	1	484,204
	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POLVORA	2	1,267,091
	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHUNTE	2	1,167,228
	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA LUCIA	1	469,592
TOTAL DE PUENTES (2025)		16	13,006,809



16 PUENTES (2025)



13 millones

PUENTES MODULARES – CONCESIÓN IIRSA NORTE

OBRA ACCESORIA PUENTES NARANJILLO Y AGUAS CLARAS

OBRAS DE DESVÍO

- **Costo Directo aprobado:** USD 3'785,296.23

DESVÍO PUENTE NARANJILLO

- **Objeto:** Habilitar un acceso de 535 m de un solo carril con asfaltado de ancho 4.50m e instalación de un puente modular de longitud de 51m.
- **Adquisición de predios,** 12 predios afectados. 11 predios adquiridos y liberados; el predio restante se encuentra liberado con acta de entrega, pero en proceso de adquisición (expropiación).

Fecha estimada de liberación de predios: marzo 2025

- **Liberación de interferencias,** 02 interferencias identificadas (tipo eléctrica y redes de agua y alcantarillado).

01 Interferencia liberada (tipo eléctrica); se encargará la liberación de la interferencia restante al concesionario, se tiene prevista la firma del acta para encargo en la primera quincena de febrero.

Fecha estimada del inicio de liberación de interferencias: mayo 2025 (posterior al periodo de lluvias)

- **Avance físico:** 95%
- **Culminación estimada:** IV Trimestre 2025. (Paso a los usuarios: noviembre 2025)

DESVÍO PROVISIONAL DEL PUENTE NARANJILLO



PUENTES MODULARES – CONCESIÓN IIRSA NORTE

OBRA ACCESORIA PUENTES NARANJILLO Y AGUAS CLARAS

DESVÍO PUENTE AGUAS CLARAS

- **Objeto:** Habilitar un acceso de 180 m de un solo carril con asfaltado de ancho 4.50m e instalación de un puente modular de longitud de 60 m.
- **Adquisición de predios,** se identificó un total de nueve (09) predios afectados y liberados al 100%.
- **Liberación de interferencias,** 02 interferencias identificadas (tipo eléctrica y redes de agua y alcantarillado).
01 Interferencia liberada (tipo eléctrica); la red de alcantarillado fue reubicada de forma provisional por la concesionaria mediante acuerdo suscrito con el titular de la interferencia (JASS Aguas Claras). Esta pendiente la liberación definitiva.
Fecha estimada de liberación de interferencias: mayo 2025
- **Avance físico:** 95%
- **Paso a los usuarios:** primera semana de **marzo 2025** (previa opinión del regulador).
- **Culminación estimada:** Junio 2025.

DESVÍO PROVISIONAL DEL PUENTE AGUAS CLARAS



CONCESIÓN IIRSA NORTE

PUENTES NARANJILLO Y AGUAS CLARAS

PROYECTO DEFINITIVO


PUENTE NARANJILLO SITUACIÓN ACTUAL:

- El 22.01.2025, el concesionario remitió el levantamiento de observaciones respecto a la tipología y cimentación.
- Fecha estimada de revisión de tipología: fines de enero 2025.
- Fecha estimada de conformidad al expediente técnico: setiembre 2025
- Emisión de RD y acta de ejecución: octubre. 2025
- Inicio de Obra: octubre 2025.


PUENTE AGUAS CLARAS SITUACIÓN ACTUAL:

- El Expediente se encuentra en levantamiento de observaciones a la ingeniería, a cargo del Concesionario. Se tiene prevista su presentación para la primera quincena de febrero 2025.
- Fecha estimada de revisión de la ingeniería: Marzo 2025.
- Fecha estimada de conformidad al expediente técnico: Junio 2025
- Emisión de RD y acta de ejecución: Julio 2025
- Inicio de Obra: julio 2025.

ALTERNATIVAS DE TIPOLOGÍA PUENTE NARANJILLO

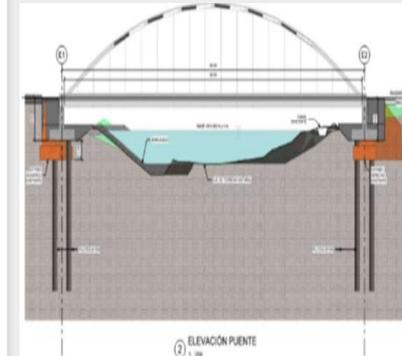


Arco Atirantado L=94m

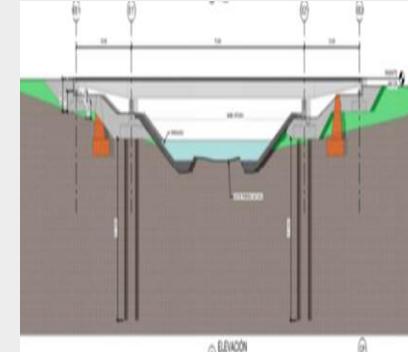

Vigas Metálicas "I" 3 tramos
L=23+72+23m

PUENTE AGUAS CLARAS

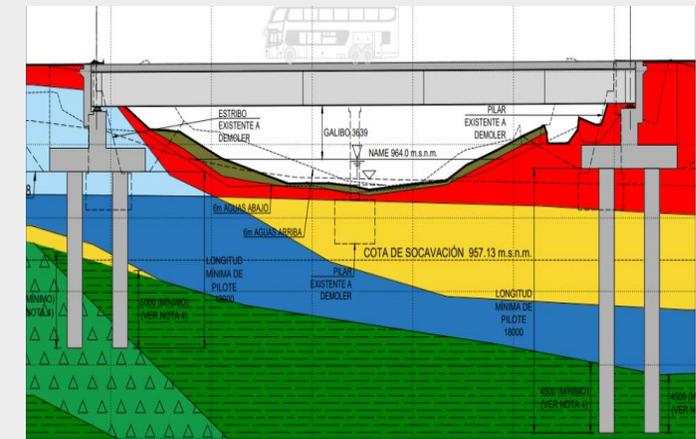

Perfil referencial

AEROPUERTO GUILLERMO DEL CASTILLO PAREDES

- ❖ **Concesionario:** Aeropuertos del Perú S.A.
- ❖ **Modalidad:** Cofinanciada

PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL LADO AIRE Y LA AMPLIACIÓN MARGINAL DEL CERCO PERIMÉTRICO

- ❖ **Alcance:** Se rehabilitará la totalidad del pavimento de la pista de aterrizaje y su calle de rodaje C. El cerco perimétrico se completará con bloques de concretos confinados con columnas, vigas y cerco tipo malla olímpica.
- ❖ **Monto de inversión de Obra:** USD 57.3 millones
- ❖ **SITUACIÓN ACTUAL**
 - En elaboración del expediente técnico, con un avance global del 33%.
- ❖ **PRÓXIMAS ACCIONES**
 - Revisión y aprobación del Expediente Técnico: Dic-25
 - Convocatoria estimada: Mar-26
 - Inicio estimada de obra: **Jun-26.** (Plazo estimado de ejecución 18 meses)



AEROPUERTO GUILLERMO DEL CASTILLO PAREDES

- ❖ **Concesionario:** Aeropuertos del Perú S.A.
- ❖ **Modalidad:** Cofinanciada
- ❖ **MEJORAMIENTO DEL SERVICIO AEROPORTUARIO MEDIANTE LA MODERNIZACIÓN DEL AEROPUERTO DE TARAPOTO**
- ❖ **Alcance:** Ampliación de la pista de aterrizaje, construcción de una calle de rodaje paralela, plataforma de estacionamiento, terminal de pasajeros, terminal de carga e infraestructuras conexas.
- ❖ **Monto de inversión:** USD 402.4 MM
- ❖ **SITUACIÓN ACTUAL**
 - El 23.02.2024, se firmó el contrato con el Consorcio UG21-IQPT, para la elaboración de estudios técnicos a nivel de perfil (Iquitos – Pucallpa – Tarapoto). A la fecha lleva un 2% de avance global.
 - Culminación del estudio de perfil estimado: **Setp-26**.



AERÓDROMO DE RIOJA

- ❖ **San Martín** (Provincia: Rioja)
- ❖ **Administrado:** CORPAC
- ❖ **Proyecto:** Mejoramiento del Aeródromo de Rioja
- ❖ **Costo de Inversión:** S/ 500 millones
- ❖ **Alcance:** Implica el mejoramiento de la pista de aterrizaje, plataforma de aeronaves, optimización del terminal de pasajeros y cerco perimétrico del aeródromo de Rioja, entre otros.
- ❖ **SITUACIÓN ACTUAL**
 - Con fecha 24.05.2023 se firmó el contrato con el Consorcio San Martín para la elaboración del estudio de Preinversión a nivel de Perfil del mejoramiento del aeropuerto de Rioja.
 - Dicho estudio de Perfil cuenta con un total de 05 entregables.
 - Con fecha 26.09.2024, la DGAC aprobó el Informe de Avance N°03 del estudio de perfil, a la fecha, el Consultor viene elaborando el Informe de Avance N°04.
 - Se estima culminación del estudio de perfil: **Mar-25**



AERÓDROMO DE JUANJUÍ

- ❖ **San Martín** (Provincia: Mariscal Cáceres)
- ❖ **Administrado:** CORPAC
- ❖ **CUI:** 2391540
- ❖ **Costo de Inversión:** S/ 186.2 millones
- ❖ **PIM 2025:** S/ 92.7 millones
- ❖ **Alcance:** Consiste principalmente en la rehabilitación de pista de aterrizaje, sistema de drenaje, nuevo cerco perimétrico, nuevo terminal de pasajeros, nueva torre de control y nueva infraestructura para el servicio de salvamento y extinción de incendios (SEI).
- ❖ **SITUACIÓN ACTUAL**
 - Con fecha 03.07.2023 se firmó el Contrato N°072-2023-MTC/10.02 con la empresa Consultores de Ingeniería UG21 Sociedad Limitada (EL CONSULTOR) para la actualización e implementación BIM del Expediente Técnico.
 - Con fecha 30.12.2024 la DGAC aprobó el Expediente Técnico de obra.
 - Licitación Pública para la ejecución de la obra estimada: **feb-25**.



AERÓDROMO DE TOCACHE

❖ **San Martín** (Provincia: Tocache)

❖ **Administrado:** CORPAC

❖ **Estado:** Operativo

❖ **SITUACIÓN ACTUAL**

- El **GORE San Martín** mediante Oficio N°0225-2024-GRSM-GTAH-TMRAH-T/G de fecha 22.05.2024, comunicó al MTC, que **viene formulando** el proyecto de inversión: **“Mejoramiento y ampliación del servicio aeroportuario de pasajeros y carga en el aeródromo de la ciudad de Tocache, el cual actualmente, se encuentra a nivel de idea (Código de idea N°292358).**
- Con fecha 27.05.2024, se llevó a cabo una reunión virtual, entre los funcionarios del GORE San Martín, CORPAC S.A y la DGAC-MTC, en donde el GORE San Martín expuso las gestiones que viene realizando para la implementación del citado proyecto de inversión.





PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones



GRACIAS



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones



INTERVENCIONES


EN LA RED VIAL NACIONAL

CARRETERA SELVA ALEGRE – LA CALZADA

- ❖ San Martín (Provincias: Moyobamba)
- ❖ CUI: 2155808
- ❖ Costo: S/ 193 millones
- ❖ Longitud: 9 km
- ❖ Beneficiarios: 29,091 personas

SALDO DE OBRA EN EJECUCIÓN

- Contratista: China Civil Engineering Construction. Contrato N°031-2022-MTC/20.2 (23-Ago-22) por **S/ 45 millones**.
- Reinicio de ejecución de Obra (22-Abr-24) con Oficio N°904-2024-MTC/20.9 (23-Abr-24).
- Avance físico: 82.28%
- Fin estimado de la obra: **Mar-25**

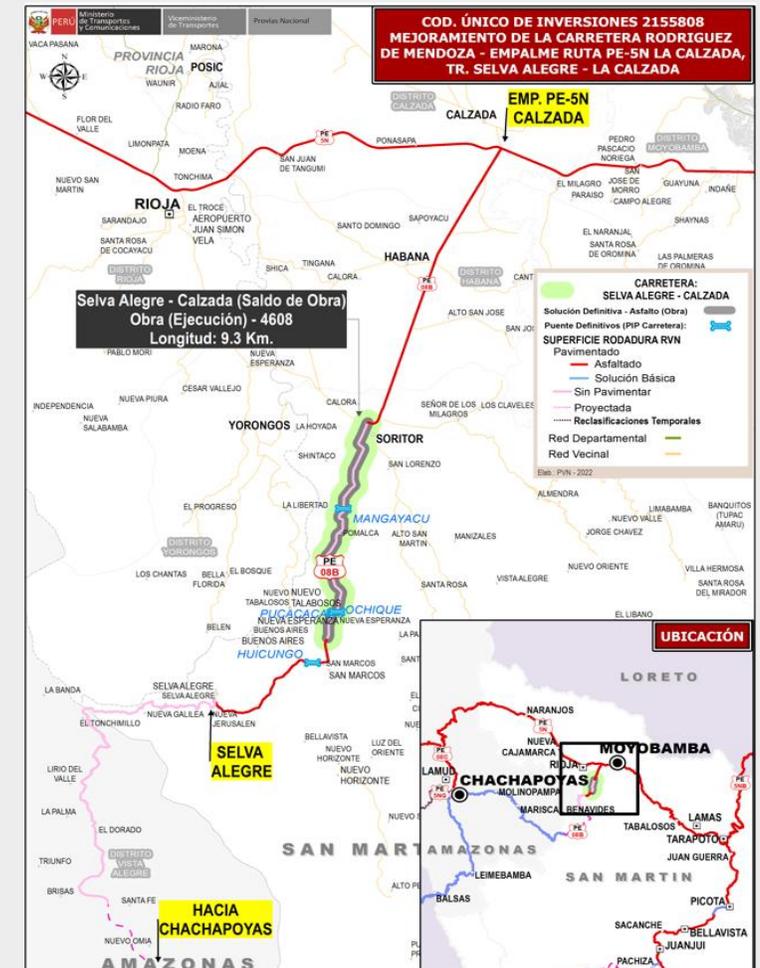


EVITAMIENTO CIUDAD DE JUANJUI

- ❖ **San Martín** (Provincias: Mariscal Cáceres)
- ❖ **CUI:** 2327694
- ❖ **Costo:** S/ 120 millones
- ❖ **Longitud:** 11 km
- ❖ **Beneficiarios:** 341,332 personas

ESTUDIO DEFINITIVO EN ELABORACIÓN

- o Consultor: Consorcio Rupa Rupa (Azize Ingenieros SAC y Dohwa Engineering Co. Ltd. Sucursal del Perú) por S/ 3 millones, Contrato N°100-2021-MTC/20.2 (06-Oct-21)
- Componente de Ingeniería: Informes N°01, 02 y 03 conformes, Informe N°04 en proceso de subsanación de observaciones. (Sujeto a la aprobación del EIA)
- Fecha estimada de culminación: **Jul-25**

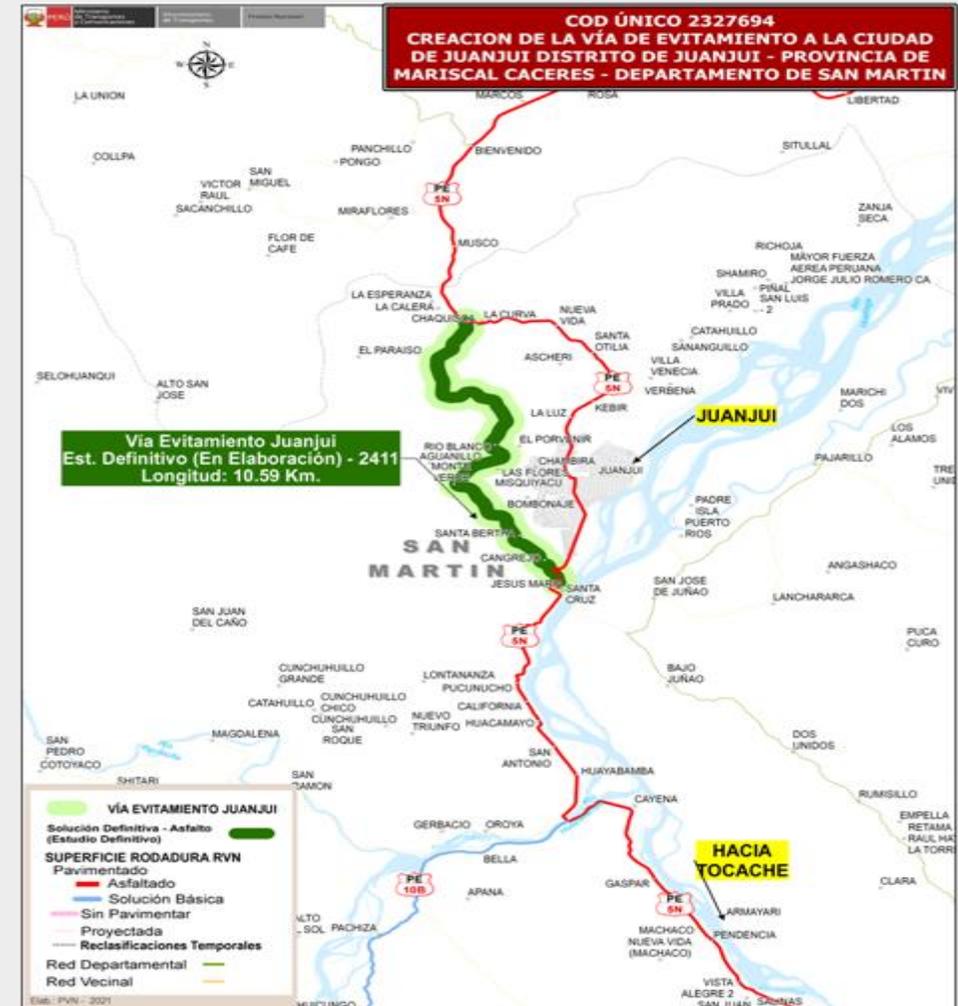


CARRETERA AJENJO – UCHIZA – DV. TOCACHE

- ❖ **San Martín** (Provincias: Tocache), **Huánuco** (Marañón)
- ❖ **CUI: 2233958**
- ❖ **Costo: S/ 393 millones**
- ❖ **Longitud: 87 km**
- ❖ **Beneficiarios: 599,032 personas**

ESTUDIO DEFINITIVO EN ELABORACIÓN

- **Contratista:** Consorcio Tres Cruces (Hualca Ingenieros SAC y HOB Consultores). Contrato N°093-2022-MTC/20.2 (15-Dic-22) con un costo de S/ 6 millones.
- **Componente de Ingeniería:** Informes N°01 conforme, Informe N°02 en proceso de subsanación de observaciones. Actualmente en levantamiento de observaciones por parte del consultor)
- **Fecha estimada de culminación: Nov-25**

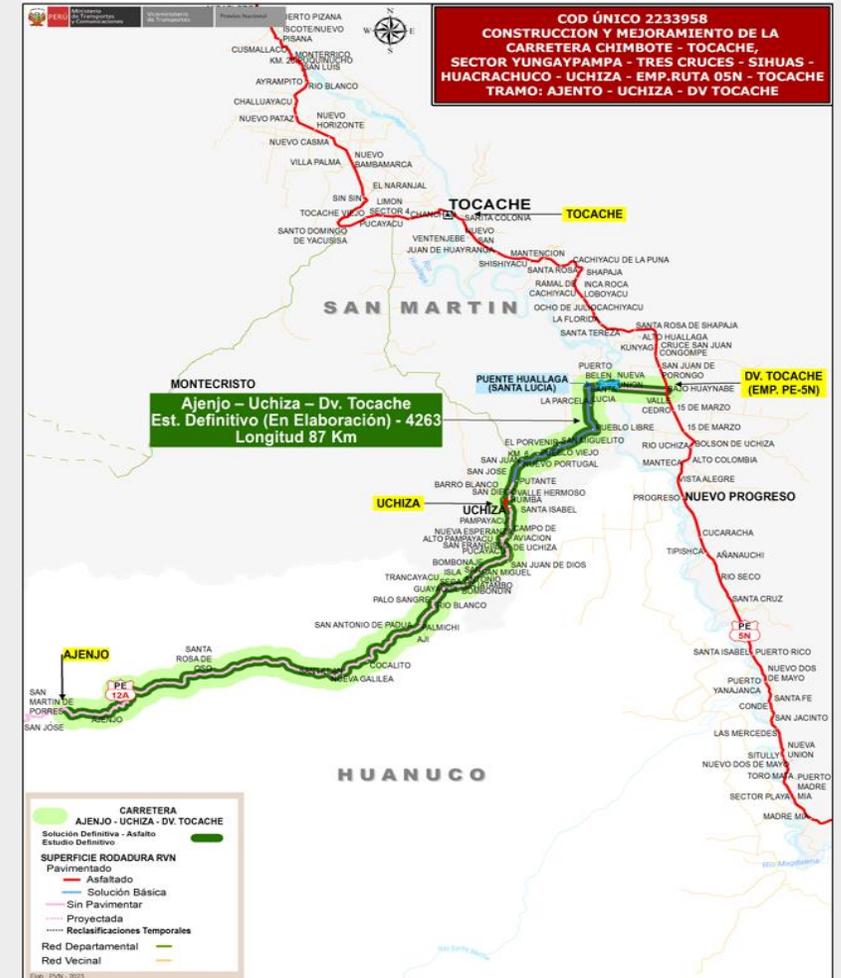


EVITAMIENTO DE TOCACHE

- ❖ San Martín (Provincia: Tocache)
- ❖ IDEA: 273688
- ❖ Costo: S/ 127 millones
- ❖ Longitud: 8 km

ESTUDIO DE PERFIL PROGRAMADO

- Se ha participado en la Mesa Técnica de Tocache el 07.08.2024 donde se informó que a la fecha, se siguen realizando las gestiones con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ante la OGPP para la obtención de recursos para el desarrollo del Estudio de Preinversión de la Vía de Evitamiento Tocache.
- A la fecha, se vienen realizando las gestiones con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto - OPP para la obtención de la Certificación Presupuestal a fin de proseguir con los actos preparatorios del proceso de selección.
- Proyecto no se encuentra contemplado en la Ley de Presupuesto N°32185, por lo cual está sujeto a modificaciones presupuestarias para la habilitación de recursos en el periodo 2025.

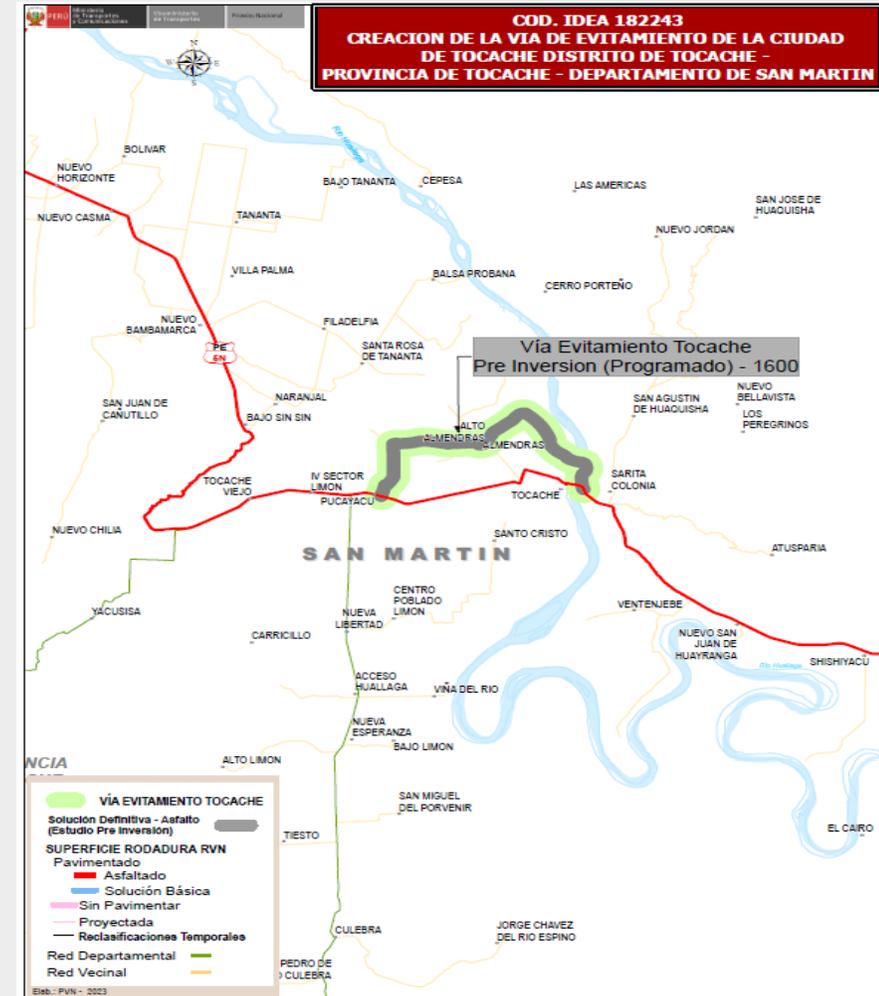


CARRETERA CHACHAPOYAS – MOLINOPAMPA – R. DE MENDOZA – ABRALAJAS / CALZADA – SORITOR – EL DORADO

- ❖ Amazonas (Provincias: Chachapoyas, Rodríguez de Mendoza); San Martín (Mariscal Cáceres)
- ❖ Costo: S/ 68 millones
- ❖ Longitud: 177 km
- ❖ Alcance:
 - M. Rutinario y Emergencias (177 Km)
 - M. Periódico (5 Km)
 - Plazo de contratación: 03 años

CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO EN PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

- Actualmente en absolución de consultas y observaciones por parte del comité.
- Se estima buena pro: **Feb-24.**

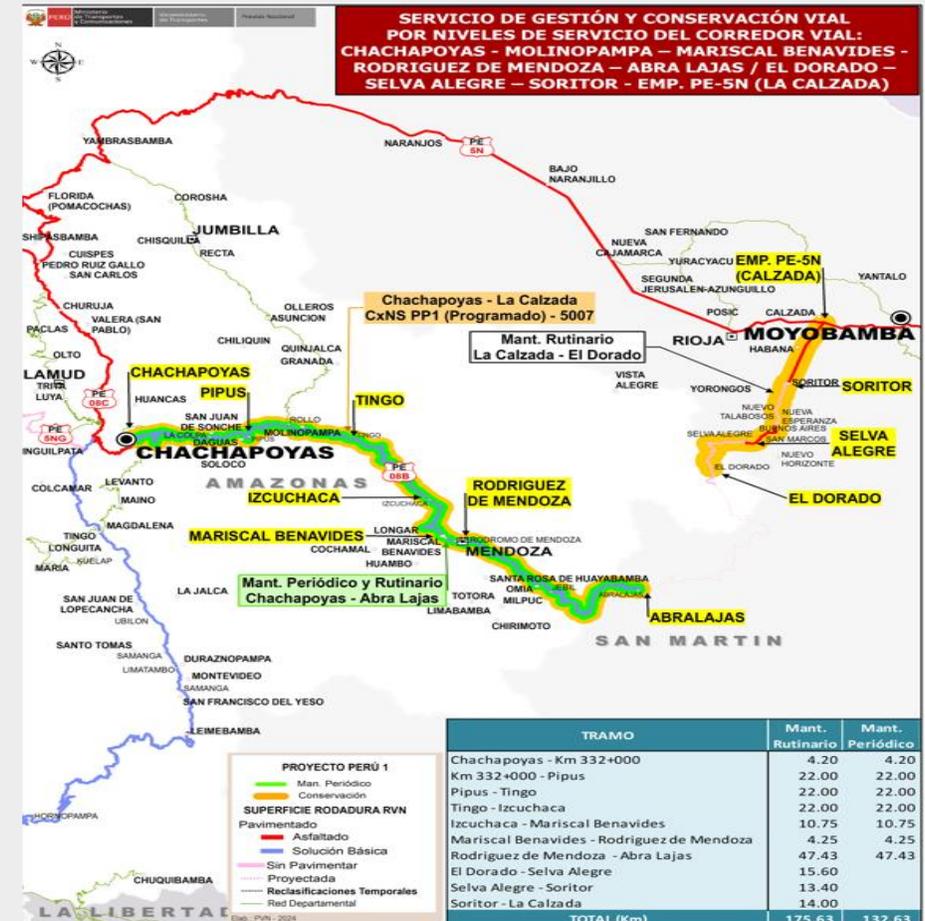



CARRETERA DV. POMABAMBA – SIHUAS – HUACRACHUCO – SAN PEDRO DE CHONTA – UCHIZA – EMP. PE-5N (PE – 12A)

- ❖ **Ancash** (Provincias: Pomabamba, Sihuas), **Huánuco** (Marañón), **La Libertad** (Pataz), **San Martín** (Tocache)
- ❖ **Longitud:** 267 km
- ❖ **Beneficiarios:** 34,512 personas

ESTADO SITUACIONAL

- Con fecha 31.07.2024, se suscribió el Convenio Específico N° 001-2024-MTC//20.13, entre Provias Nacional y el Ejército del Perú.
- Se ha suscrito la Adenda N°01 al Convenio Específico N°001-2024-MTC/20.13, el día 11.11.2024. Oficina de Presupuesto de PVN remite certificación de S/ 4.6 MM.
- Inicio de actividades del convenio segunda semana de **dic-24**.
- Con fecha 14.01.2025, se realizó la reunión de coordinación con el Ejército para indicarles que presenten el Plan de trabajo para el año 2025, el mismo que está pendiente de presentación.
- Se viene elaborando el nuevo TDR para el **servicio de Gestión, Mejoramiento y Conservación por niveles de servicio** del corredor vial: Dv. Pomabamba-Sihuas- Uchiza, convocatoria prevista para **febrero 2025**.

