

INFORME N°.- 001- ALZ-2010

DE : Antonio León Zapata
Congresista de la República

PARA : Luis Alva castro
Presidente del Congreso de la República

ASUNTO : Viaje del mes de Enero 2010

FECHA : 15 de Febrero 2010



Cumpliendo con lo señalado en el artículo 23 del Reglamento del Congreso, se inició labor de fiscalización, a la ejecución de diferentes obras en el departamento de Apurímac. Nos constituimos en la circunscripción electoral que representamos, para visitar las diferentes obras que se vienen realizando en el departamento de Apurímac, es por ello que nos apersonamos a las oficinas del Consorcio Vial Kishuará en la provincia de Andahuaylas Apurímac.

En ese sentido, cumpliendo con nuestra labor, procedemos a informar lo siguiente:

01. SEGUIMIENTO DE PROYECTO

1. PERIODO DE SEGUIMIENTO

Del lunes 25 al miércoles 27 de Enero del 2010.

2. NOMBRE DEL PROYECTO


ASFALTADO "CARRETERA AYACUCHO - CHINCHEROS - ANDAHUAYLAS - ABANCAY 372 Km.".

TRAMO Andahuaylas - Dv. Kishuara (53,2 Km.)

3. UBICACIÓN

TRAMO Andahuaylas - Dv. Kishuara (53,2 Km.)

- Provincia : Andahuaylas.
- Región : Apurímac.

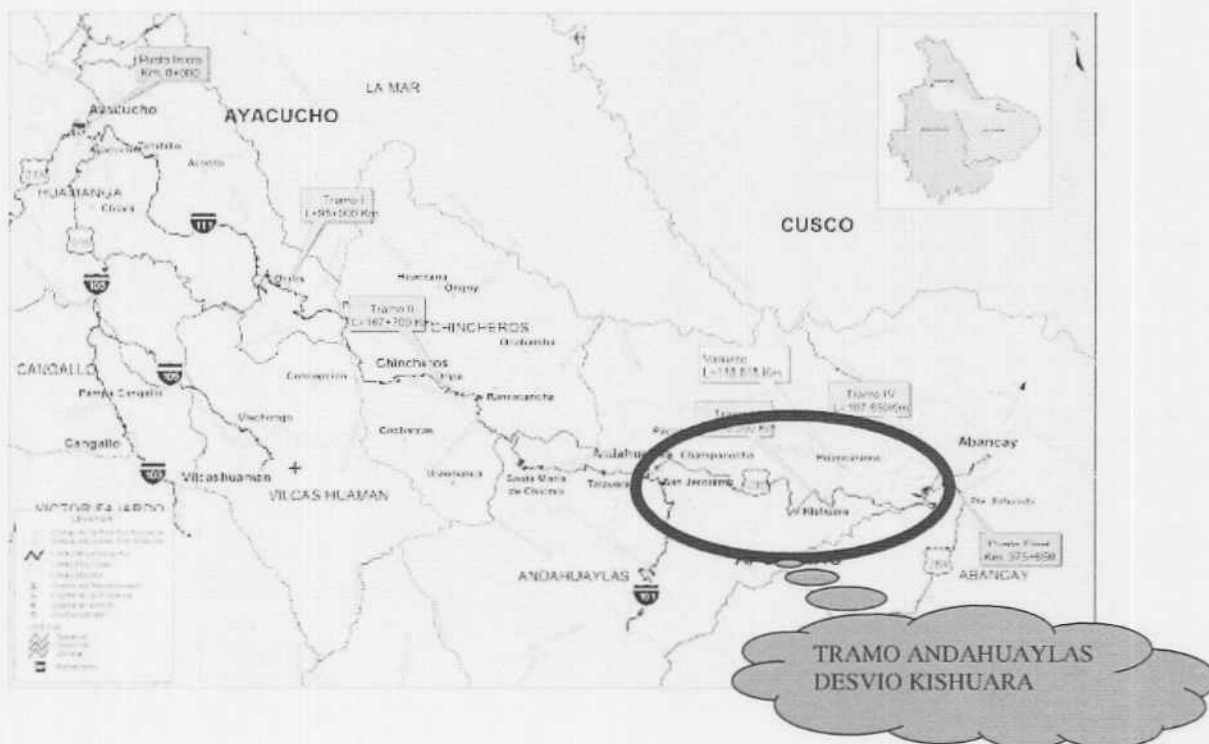



4. ANTECEDENTES:

ASFALTADO “CARRETERA AYACUCHO - CHINCHEROS - ANDAHUAYLAS – ABANCAY 372 Km.”.


Forma parte de la Ruta Nacional N° PE-3S, ubicada los departamentos de Ayacucho y Apurímac.

La Oficina de Inversiones del MTC otorgó la viabilidad al proyecto de rehabilitación y mejoramiento de la carretera Ayacucho – Andahuaylas – Champacocha – Kishuara (Variante Huancarama) – Alfapata– Puente Sahuinto, en base a la actualización del Estudio de Factibilidad aprobado mediante R. D. N° 4294-2007-MTC/20 del 25-09-07; de 386,82 Km. de longitud, por un costo estimado de inversión de S/. 792,36 Mill. a nivel de superficie de rodadura de carpeta asfáltica en caliente.

El proyecto, ha sido dividido en siete tramos; siendo estas:

- a. Ayacucho (Km. 0+000) – Km. 50+000
- b. Km. 50+000 – Km. 98+800 (Ocos)
- c. Km. 98+800 (Ocos) – Km.154+000 (Chincheros)
- d. Km.154+000 (Chincheros) – Km. 210+000
- e. Km. 210+000 – Km. 256+500 (Andahuaylas)
- f. Andahuaylas – Desvío Kishuara**
- g. Desvío Kishuara – Puente Sahuinto (Abancay).

TRAMO ANDAHUAYLAS – DESVIO KISHUARA

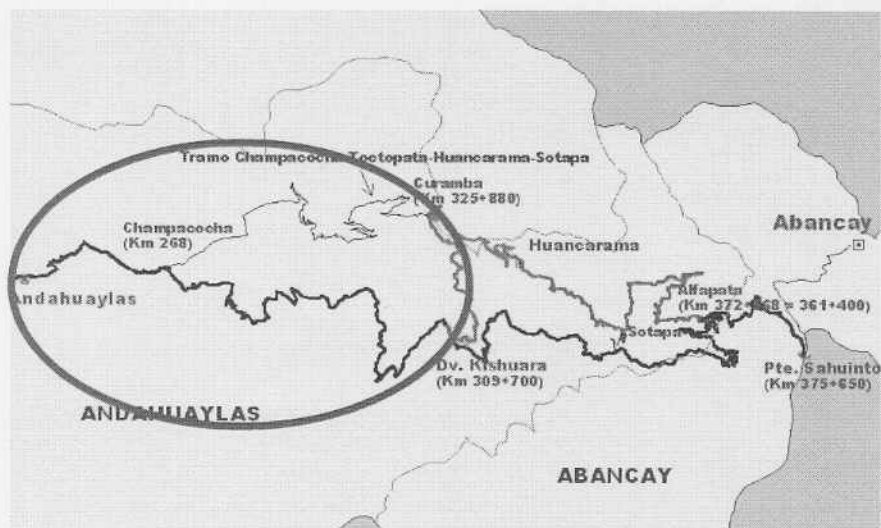

EJECUTOR DE OBRA

Modalidad de ejecución : Por Contrata. (Contrato N° 104-2008-MTC/20)

Empresa Ejecutora : Consorcio Vial Kishuará.

Monto de Contrato : S/ 90 256 509,22 (Noventa millones doscientos cincuenta y seis mil quinientos Nueve con 00/100 nuevos soles).

Plazo de Ejecución : 750 días.

Fecha de inicio de obra : 15 de Septiembre del 2009.

Supervisión : Consorcio Vial Andahuaylas (Lagesa Ingenieros Consultores S.A. -Motlima Consultores S.A. - Serconsult S.A.)

5. INSPECCIÓN FÍSICA DE OBRA.

De acuerdo a la inspección realizada en obra se indica lo siguiente:

- Se verifico que en obra se encuentran las siguientes maquinarias 1 moto niveladora CAT 140, rodillo liso vibratorio CAT 10 tn, 1 cisterna de 4,000 gl. 1 cargador frontal CAT 950h.
- Se verificó en obra materiales en cancha, tales como, cemento, fierros, etc. En cuanto a la calidad de estos materiales se efectuará el seguimiento correspondiente a fin que estos cumplan las especificaciones técnicas exigidos en el expediente técnico.
- Durante el proceso de inspección de obra se constató que el personal de obra cuenta con los mínimos elementos de protección personal tales como cascos, zapatos, guantes, botas, etc.
- **Se verifico el Movimiento de Tierras:** corte en material suelto, roca suelta y roca fija, entre las progresivas Km. 309+000 al Km. 309+802.50 el contratista ha ejecutado el movimiento de tierras (corte de talud) en un 100%.
- Se verifico las canteras en un total de 23 para diversos usos y 20 fuentes de agua en la Ruta Nacional 3S, así como 06 canteras y 02 fuentes de agua en la variante Huancarama.
- Se verificó que actualmente se vienen efectuando trabajos de apertura de zanjas para las instalación de las líneas de alcantarillas o cunetas.
- De acuerdo a la conversación sostenida con el residente y el representante de la Supervisión de la Obra se el avance de la Obra se encuentra al 28 de enero del 2010 en un 15% de Avance de Obra. Y que esta de acuerdo a lo programado.



CONCLUSIONES:

Es importante contar con una copia del expediente técnico definitivo el cual ha sido solicitado por mi despacho a la Oficina de Provias Nacional Lima, ya que éste es el documento básico y esencial con el que se dan los lineamientos generales y básicos, especificaciones técnicas y planos que rigen el proceso de ejecución de obra.

02. COORDINACION CON LAS AUTORIDADES DEL DISTRITO

REUNION DE COORDINACION CON LAS AUTORIDADES DEL DISTRITO DE CHIARA – ANDAHUAYLAS – APURIMAC. Día 28 de Enero

- ALCALDE DISTRITAL: SR. GABINO CARTOLIN ALTAMIRANO.
- AUTORIDADES COMUNALES.

ASUNTO:

Coordinar las gestiones que viene realizando mi Despacho Congresal con el **Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI)** para el financiamiento de 04 proyectos de Irrigación del distrito en mención a través de la conformación de núcleos Ejecutores. Es por ello que se les transmitió al alcalde el pedido del PSI de Cambio de Unidad Ejecutora de La Municipalidad Provincial de Andahuaylas al PSI para así poder dar inicio a la ejecución de dichos proyectos.

- Construcción del sistema de riego Vilcabamba – Chiara
- Ampliación y mejoramiento del sistema de riego Huillcayhua.
- Ampliación y mejoramiento del sistema de riego Yaurecc
- Ampliación y mejoramiento del sistema de riego Huanipa



03. VISITA A ZONAS AFECTADAS POR LAS GRANIZADAS Y **LLUVIAS**

Las lluvias y granizada que cayeron sobre el departamento de Apurímac, y en especial en las zonas de San Miguel de Chaccrampa, Turpo y Huayana, dejaron una serie de damnificados. Es por ello que me constituí a la zona de Turpo para poder constatar en el sitio la verdadera gravedad de los daños ocasionados. Por lo que se pudo apreciar por lo menos unos 35 damnificados y mas de una centena de afectados. Y una gran cantidad de hectáreas de cultivos dañados. Es por ello que al retornar a la ciudad de Andahuaylas informo este hecho ante la Oficina de Defensa Civil de Andahuaylas.

Es cuanto informo a usted, estando a su disposición para cualquier consulta o detalle respecto del mismo.

Atentamente,

ANTONIO LEÓN ZAPATA
Congresista de la República

ANEXOS

