



Gobierno del Perú

AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS

Comisión Especial de Seguimiento al proceso de reconstrucción en las zonas afectadas por el Fenómeno de El Niño Costero

Edgar Quispe Remón
Director Ejecutivo

20 de agosto de 2018

EL PERÚ PRIMERO

CONTENIDO

- I. Estado Situacional de las Intervenciones Previstas en el 2018
- II. Estado Situacional de las Viviendas
- III. Estado Situacional de las Soluciones Integrales en Ríos, Quebradas y Drenajes
- IV. Acciones de Prevención de Riesgos y Desastres



PERÚ

Presidencia
Del Consejo de Ministros

Autoridad para la
Reconstrucción Con Cambios

RE
CONSTRUCCIÓN
CON CAMBIOS

I. ESTADO SITUACIONAL DE LAS INTERVENCIONES PREVISTAS 2018




Avances: Nacional

**RE
CONSTRUCCIÓN**
CON CAMBIOS

FINANCIAMIENTO DE INTERVECIONES JUNIO 2017-AGOSTO 2018

Financiamiento por sector

(junio 2017 – Agosto 2018)

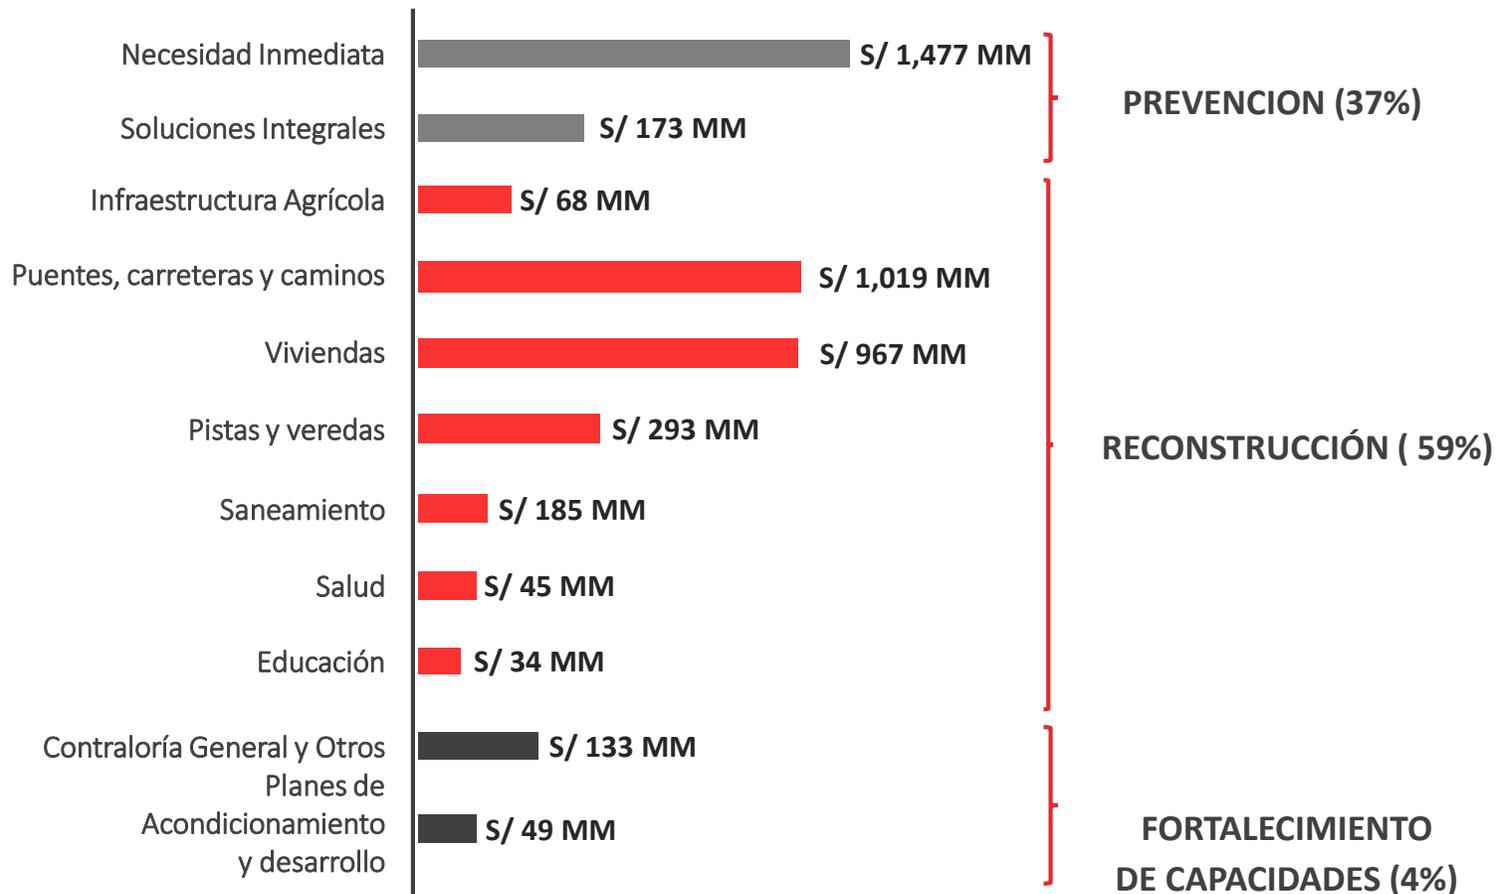

**TOTAL TRANSFERIDO
JUNIO 2017- AGOSTO 2018**

S/ 4,443 MM

INTERVENCIONES

Más de 1,600

+

VIVIENDAS

41,565

TOTAL TRANSFERIDO
JUNIO 2017-AGOSTO 2018

S/ 4,443 MM

(Solo 2018: S/ 2,235 MM)

INTERVENCIONES


Más de 1600

+ VIVIENDAS


41,565

Estado de las intervenciones (S/ MM)

Jun 17 – Ago 18

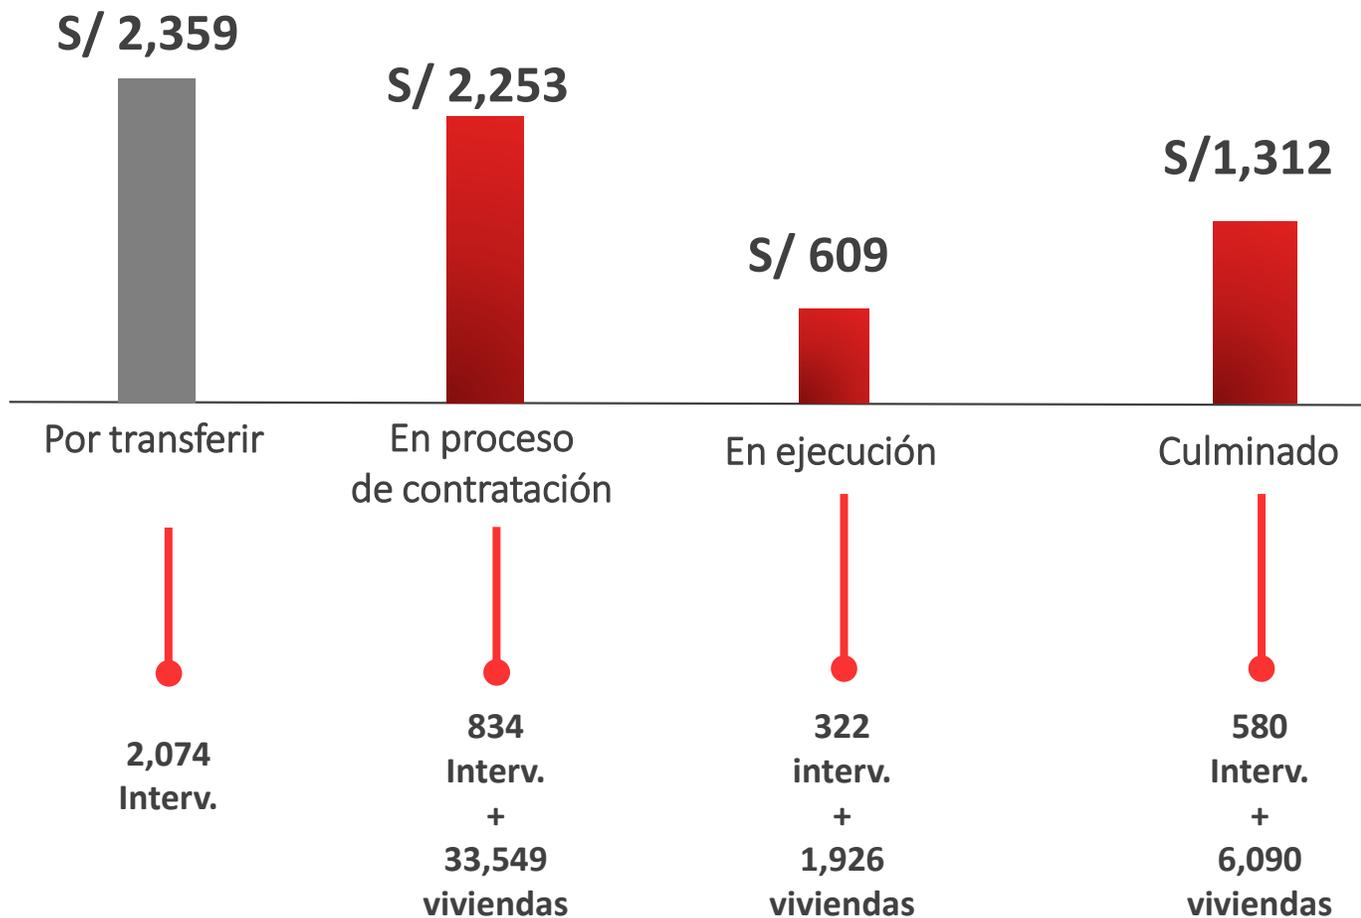

Financiamiento por tipología (enero – agosto 2018)

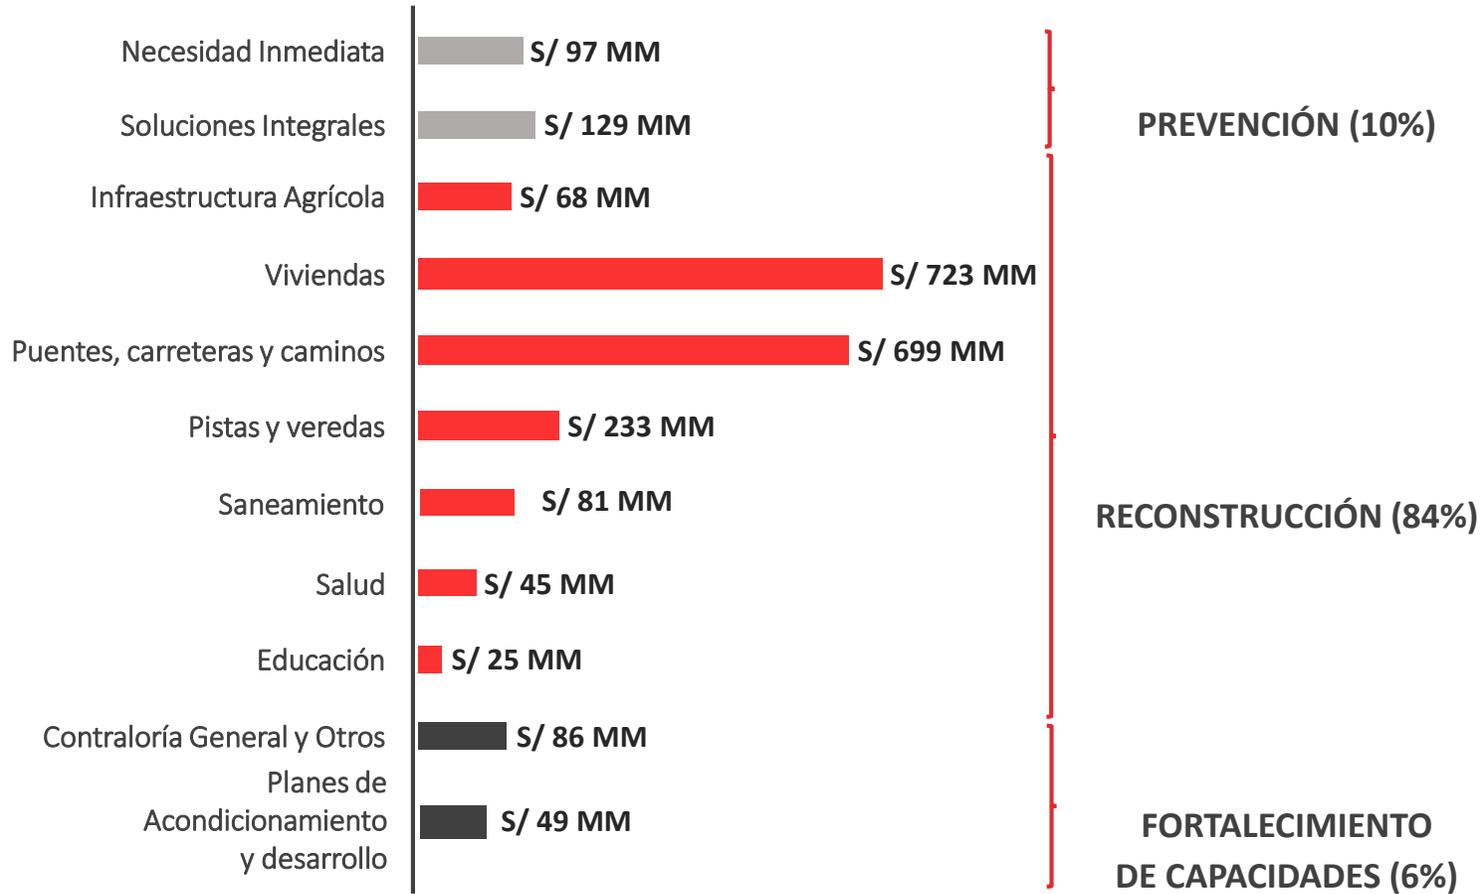

**TOTAL TRANSFERIDO
ENERO – AGOSTO 2018**

S/ 2,235 MM

INTERVENCIONES

1,237

VIVIENDAS

30,508

META AJUSTADA 2018

S/ 4,361 MM

TOTAL TRANSFERIDO
ENERO - JULIO 2018

S/ 3,000 MM*

INTERVENCIONES


1,237

+ VIVIENDAS

41,565

Estado de las intervenciones (S/ MM)

Financiado solo 2018

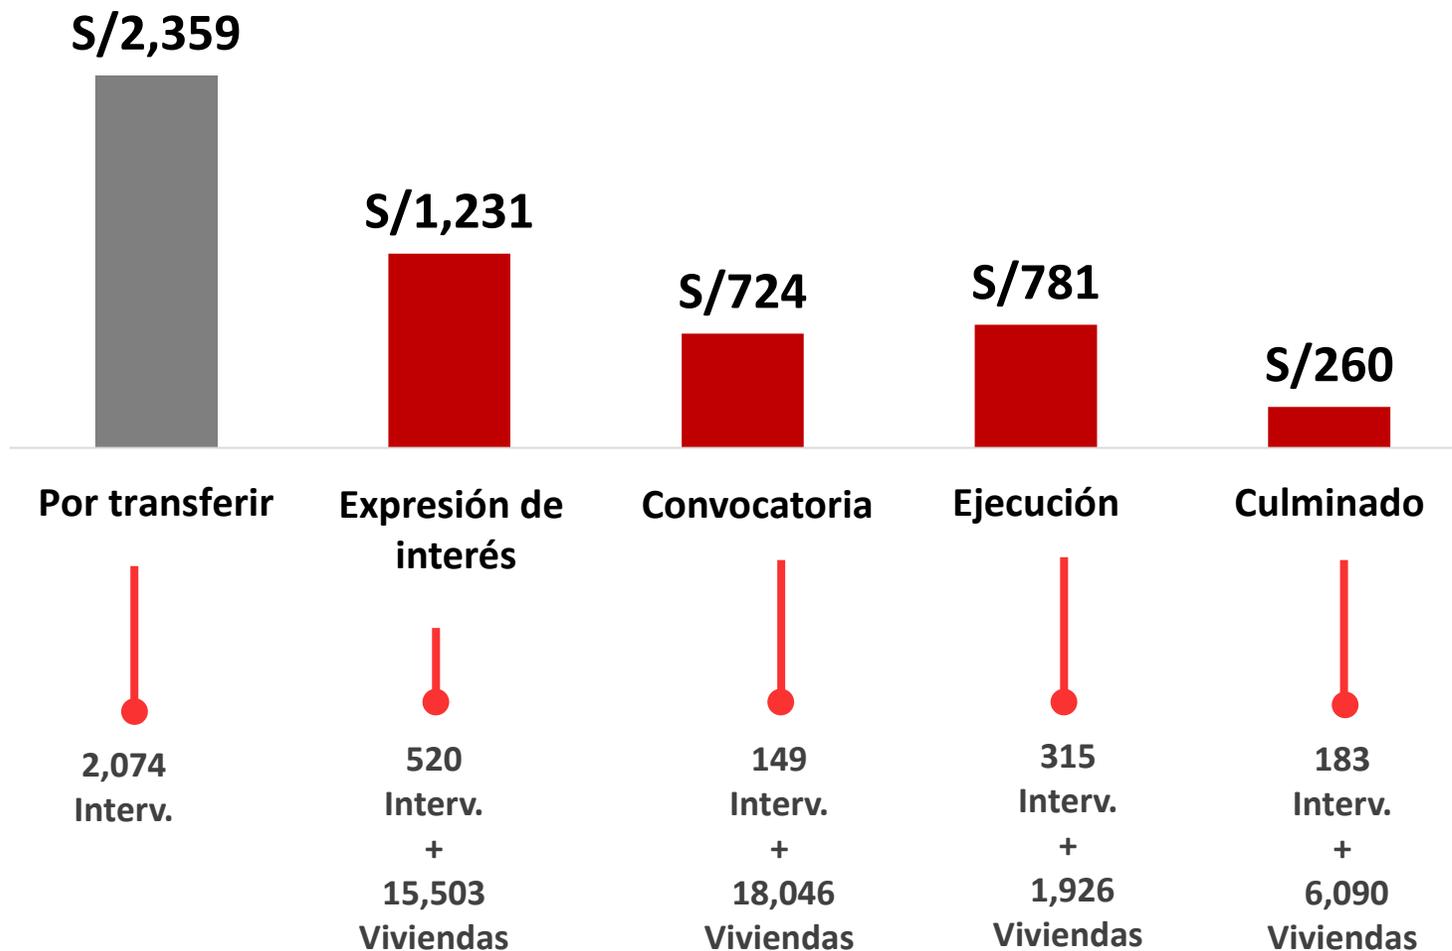



Avances: Región Piura

**RE
CONSTRUCCIÓN**
CON CAMBIOS

TOTAL TRANSFERIDO
ENERO - JULIO 2018

S/ 1015 MM*


INTERVENCIONES

550

+ VIVIENDAS

13,073

Estado de las intervenciones (S/ MM)

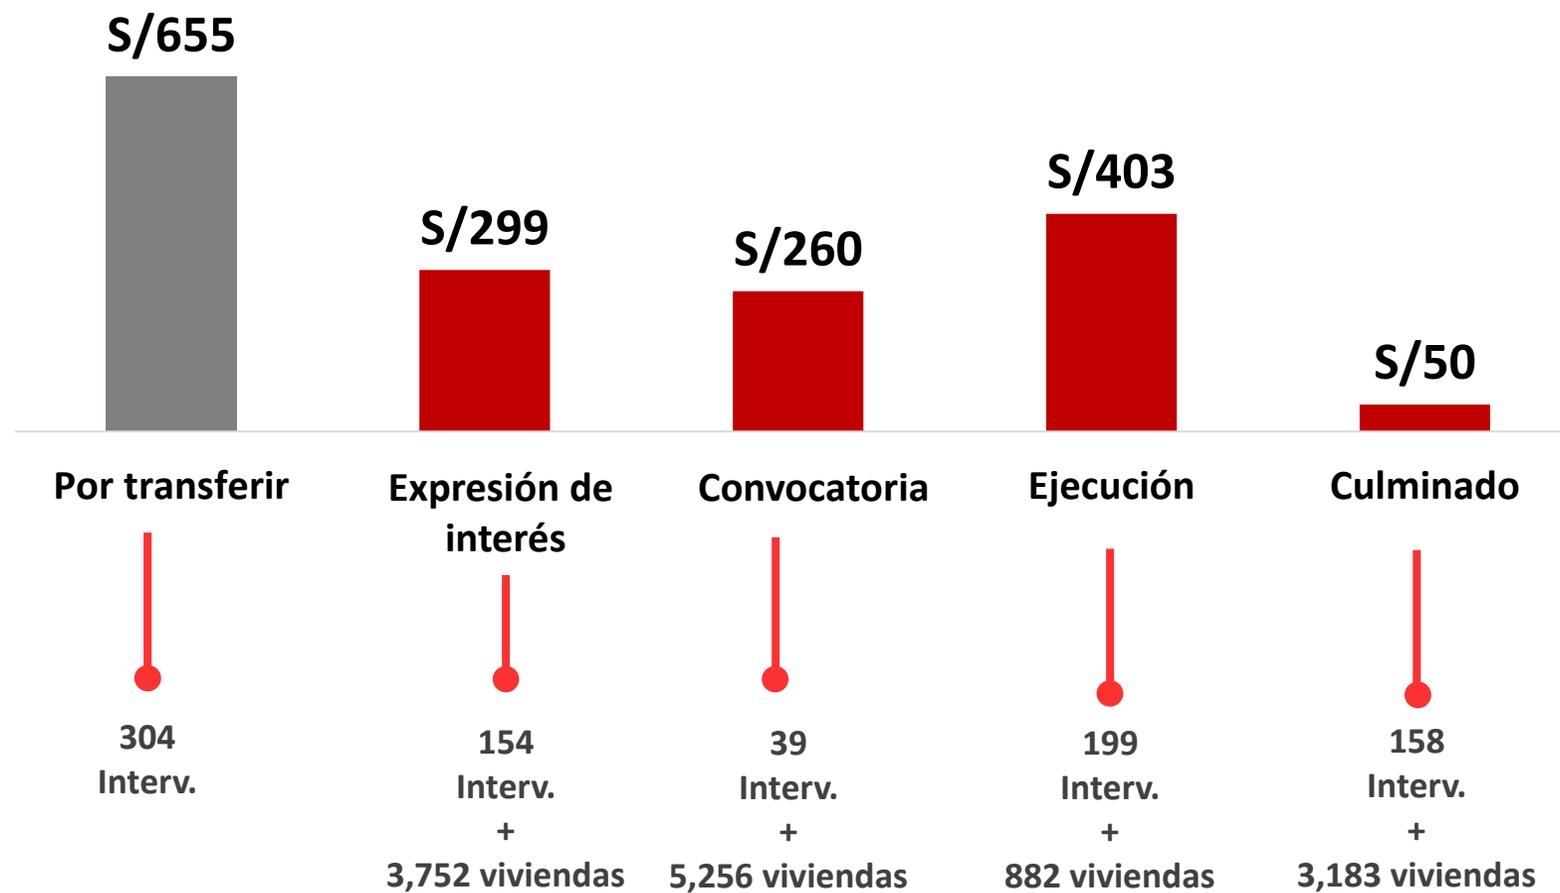

PRINCIPALES INTERVENCIONES CULMINADAS

CARRETERAS, CAMINOS y PUENTES



- **Instalación del puente Independencia en Catacaos (UE: MTC-PVN)**
Inversión: S/ 18 MM
Fecha de culminación: enero 2018
- **Rehabilitación de Av. Progreso (Castilla – Piura) (UE: MTC-PVN)**
Inversión: S/ 8.8 MM
Fecha de culminación: febrero 2018
- **Rehabilitación de carretera Sullana - Talara (UE: MTC-PVN)**
Inversión: S/ 53.5 MM
Fecha de culminación: julio 2018
- **Rehabilitación de carretera Div. Catacaos – Óvalo Bayóvar (UE: MTC-PVN)**
Inversión: S/ 26.5 MM
Fecha de culminación: julio 2018

PISTAS Y VEREDAS



- **Rehabilitación de 11 avenidas principales en Piura: Av. Grau, Francia, Loreto, Tallanes, Gullman, Sánchez Cerro, Prolongación Grau, Irazola, Av. R, Av. Cáceres y Calle Antonio Raimondi (UE: GORE PIURA Y MP PIURA)**
Inversión: S/ 14.4 MM
Fecha de culminación: enero - mayo 2018
- **Rehabilitación de la Av. Guardia Civil (UE: MTC-PVD)**
Fecha de culminación del tramo óvalo El Cantarito-Puente Primavera.
Julio 2018

PRINCIPALES INTERVENCIONES CULMINADAS

VIVIENDAS



- 3,183 viviendas construidas

DESCOLMATACIONES



- **Descolmatación de los ríos Piura (84 km) y Chira (31 km) (UE: MINAGRI-AGRORURAL)**
Inversión: S/ 291 MM
Fecha de culminación: enero 2018
- **Rehabilitación de 126 canales y bocatomas y 31 drenes en el Bajo Piura, Alto Piura, San Lorenzo y Sechura (UE: MINAGRI-AGRORURAL)**
Inversión: S/ 5 MM
Fecha de culminación: mayo - julio 2018
- **Rehabilitación de diques y descolmatación de drenes del río Piura. S/ 18.8 MM. (UE: GORE Piura)**
Dique derecho, inversión: 7.1 MM
Dren DS 13.08, inversión: 5.8 MM
Dren Sechura, inversión: 5.9 MM
Fecha de culminación: mayo 2018



PIURA

Pistas y veredas
Av. Progreso-Castilla



PIURA

Carretera
Sullana-Talara



PIURA

Pistas y veredas
Av. Guardia Civil



PIURA

Pistas y veredas
Av. Cáceres



PIURA

Viviendas
Catacaos

CARRETERAS



- **Rehabilitación de la carretera de acceso al campamento Illescas - Bayóvar. (UE: GORE PIURA)**
Inversión 2018: S/ 1.8 MM
Avance físico: 5%
Fecha estimada de culminación: octubre 2018
- **Mejoramiento de la carretera La Islilla. (UE: GORE PIURA)**
Inversión 2018: S/ 30 MM (Inversión multianual: 35 MM)
Avance físico: 2% (en actividades de trazo y replanteo)
Fecha estimada de culminación: junio 2019
- **Mejoramiento de la carretera Costanera Tramo II. (UE: GORE PIURA)**
Inversión 2018: S/ 123 MM (Inversión multianual: 173 MM)
Avance físico: 1% (en actividades de trazo y replanteo)
Fecha estimada de culminación: marzo 2020


PRINCIPALES INTERVENCIONES EN EJECUCIÓN

RESERVORIOS



- **Ampliación del reservorio Poechos. (UE: GORE PIURA)**
 Inversión 2018: S/ 111 MM (Inversión multianual: S/ 144.4 MM)
 Avance físico: 40%
 Fecha estimada de culminación: febrero 2019

SANEAMIENTO



- **Mejoramiento del sistema de saneamiento en AAHH Nuevo Catacaos. (UE: MVCS-PNSU)**
 Inversión 2018: S/ 7.6 MM
 Avance físico: 88%
 Fecha estimada de culminación: septiembre 2018
- **Rehabilitación de línea de impulsión y distribución de agua del Centro de Abastecimiento Agua Bayovar (UE: GORE Piura)**
 Inversión 2018: S/ 2.6 MM
 Avance físico: 5%
 Fecha estimada de culminación: diciembre 2018

VIVIENDAS



- 882 viviendas en construcción



PIURA

Saneamiento
Catacaos



PIURA

Reservorio
Pochos

PRINCIPALES INTERVENCIONES EN CONVOCATORIA

CARRETERAS



- Rehabilitación del tramo 1 de carretera Costanera (UE: GORE PIURA)**
 Inversión 2018: S/ 61 MM (Inversión multianual: 86 MM)
 Fecha estimada de inicio: septiembre 2018 (incluye la elaboración de expediente técnico)
 Fecha estimada de culminación: junio 2019

PUENTES



- Adquisición de 12 puentes modulares para Ayabaca, Huancabamba, Morropón y Piura (UE: MTC-PVD)**
 Inversión 2018: S/ 15 MM (Inversión multianual: 36.2 MM)
 Fecha estimada de inicio: septiembre 2018
 Fecha estimada de adquisición: diciembre 2018
- Creación de Puente Hualcatal (UE: MD Canchaque)**
 Inversión: S/ 4.2 MM
 Fecha estimada de inicio: septiembre 2018
 Fecha estimada de culminación: enero 2019

- **Rehabilitación de 10 caminos. S/24 MM (UE: Gob. Local)**

Camino vecinal Aranza - El Puerto (UE: MD Pacaipampa)

Inversión 2018: S/ 8.3 MM

Fecha estimada de inicio: septiembre 2018

Fecha estimada de culminación: marzo 2019

Camino vecinal Empalme Pacaipampa - PI-547 -Santa Rosa (UE:MD Pacaipampa)

Inversión 2018: S/ 3.5 MM

Fecha estimada de inicio: septiembre 2018

Fecha estimada de culminación: febrero 2019

Camino vecinal (EMP.PI-119) El Tambo - Sicchez Pampa (UE:MD Sicchez)

Inversión 2018: S/ 1.3 MM

Fecha estimada de inicio: septiembre 2018

Fecha estimada de culminación: noviembre 2018

Camino vecinal (EMP.PI-119) Oxahuay - Guir Guir (UE:MD Sicchez)

Inversión 2018: S/ 1.2 MM

Fecha estimada de inicio: septiembre 2018

Fecha estimada de culminación: noviembre 2018

CAMINOS VECINALES Y DEPARTAMENTALES



CAMINOS VECINALES Y DEPARTAMENTALES



Camino vecinal 20.08 Kms EMP.PE -1NK Noria Antigua–Noria Vieja–Noria Nemesio (UE: MD Matanza)

Inversión 2018: S/ 4.8 MM

Fecha estimada de inicio: septiembre 2018

Fecha estimada de culminación: febrero 2019

Camino vecinal - 1.39 Km Colán Arenal- Emp. R45 (UE: MD Colán)

Inversión 2018: S/ 0.5 MM

Fecha estimada de inicio: septiembre 2018

Fecha estimada de culminación: noviembre 2018

Camino vecinal - 0.41 Km en Emp. PI101 - Caleta la Esmeralda (UE: MD Colán)

Inversión 2018: S/ 0.2 MM

Fecha estimada de inicio: septiembre 2018

Fecha estimada de culminación: octubre 2018

Camino vecinal - 3.92 Km en Emp. PI101 (Pueblo Nuevo) - Cementerio - Tahona Alta (UE: MD Colán)

Inversión 2018: S/ 1.3 MM

Fecha estimada de inicio: septiembre 2018

Fecha estimada de culminación: diciembre 2018

PRINCIPALES INTERVENCIONES EN CONVOCATORIA

CAMINOS VECINALES Y DEPARTAMENTALES



Camino rural Puente La Esperanza - Puerto Pizarro (UE: MD. Colán)

Inversión 2018: S/ 0.9 MM

Fecha estimada de inicio: septiembre 2018

Fecha estimada de culminación: noviembre 2018

Camino vecinal pueblo nuevo de Colán – Puerto Pizarro – Centro Poblado La Bocana (UE: MD. Colán)

Inversión 2018: S/ 2.3 MM

Fecha estimada de inicio: septiembre 2018

Fecha estimada de culminación: diciembre 2018

VIVIENDAS




- 5,256 viviendas en convocatoria

PRINCIPALES INTERVENCIONES EN EXPRESIÓN DE INTERÉS

SOLUCIONES
INTEGRALES

- **Construcción del dren Las Monjas (UE: MD 26 de Oct.)**
Inversión 2018: S/. 0.8 MM (Inversión Multianual: 61 MM)
Fecha estimada de inicio: octubre 2018
Fecha estimada de culminación: febrero 2019
- **Rehabilitación del dren Paredes Maceda-Pumacahua-Telefónica(UE: MD 26 de Oct.)**
Inversión 2018: S/ 15.4 MM
Fecha estimada de inicio: octubre 2018.
Fecha estimada de culminación: diciembre 2018
- **Rehabilitación del dren Maldonado. (UE: MD 26 de Oct.)**
Inversión 2018: S/ 0.9 MM (Inversión Multianual: 31 MM)
Fecha estimada de inicio: diciembre 2018
Fecha estimada de culminación: febrero 2019
- **Rehabilitación del canal Vía Cieneguillo – Cola del Alacrán – Sullana. (UE: MP Sullana)**
Inversión 2018: S/. 11.8 MM
Fecha estimada de inicio: octubre 2018.
Fecha estimada de culminación: agosto 2019

SANEAMIENTO



- **Reparación del sistema de alcantarillado de Pedregal Grande, Catacaos. (UE: MVCS)**
Inversión 2018: S/ 4.8 MM (Inversión Multianual: 8.9 MM)
Fecha estimada de inicio: octubre 2018
Fecha estimada de culminación: marzo 2019
- **Renovación de la laguna de tratamiento de aguas residuales en Cura Mori. (UE: MVCS)**
Inversión 2018: S/ 1.7 MM
Fecha estimada de inicio: octubre 2018.
Fecha estimada de culminación: marzo 2019

EDUCACIÓN



- **Instalación de módulos educativos en 63 locales escolares (UE: MINEDU- PRONIED)**
Inversión 2018: S/ 5.7 MM (Inversión Multianual: 9.6 MM)
Fecha estimada de inicio: septiembre 2018.
Fecha estimada de culminación: febrero 2019

PRINCIPALES INTERVENCIONES EN EXPRESIÓN DE INTERÉS

CARRETERAS



- **Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Huancabamba – Canchaque. (UE: MTC-PVN)**
Inversión 2018: S/ 31.1 MM (Inversión Multianual: 195 MM)
Fecha estimada de inicio: septiembre 2018.
Fecha estimada de culminación: septiembre 2020
- **Conservación de la infraestructura vial del corredor Emp. PE- 1N (Piura)-La Obrilla- Sechura-Bayóvar - Terminal Bayóvar – Vappo - DV Sechura. (UE: MTC-PVN).**
Inversión 2018: S/ 20.9 MM (Inversión Multianual: S/ 104.6 MM)
Fecha estimada de inicio: octubre 2018
Fecha estimada de culminación: octubre 2019

SALUD



- **Construcción de hospital de Chulucanas. (UE: MINSA-PRONIS)**
Inversión 2018: S/ 2.6 MM (Inversión Multianual: 103 MM)
Fecha estimada de inicio: marzo 2019
Fecha estimada de culminación: I Trim. 2021

PRINCIPALES INTERVENCIONES POR TRANSFERIR

BOCATOMAS Y CANALES



- **Rehabilitación del servicio de agua para riego del canal Tablazo (UE:MINAGRI)**
Inversión: S/ 11 MM
- **Rehabilitación del servicio de agua para riego del canal Quiroz (UE:MINAGRI)**
Inversión: S/ 22 MM

CAMINOS VECINALES Y DEPARTAMENTALES



- **Rehabilitación camino vecinal Sapillica-La Arena Blanca en Sapillica (UE: GORE Piura)**
Inversión: S/ 40 MM
- **Rehabilitación camino vecinal Huarmaca-Hualcas en Huarmaca (UE: MD de Huarmaca)**
Inversión: S/ 25 MM.
- **Mejoramiento camino vecinal Huarmaca-Polvasal en Huarmaca (UE: MD de Huarmaca)**
Inversión: S/ 25 MM
- **Recuperación camino vecinal Chamana, Portugal en Huarmaca (UE: MD Huarmaca)**
Inversión: S/ 18 MM

SANEAMIENTO



- **Rehabilitación red de agua potable, estación de bombeo aguas residuales y colectores de Catacaos (UE: MVCS)**
Inversión: S/ 85 MM

PRINCIPALES INTERVENCIONES POR TRANSFERIR

PISTAS Y VEREDAS



- **Mejoramiento de la Av. Víctor Raúl Haya de la Torre; Jr. Francisco Bolognesi ; Jr. Junín; Jr. Los Pescadores; Jr. Rosa Campusano y Jr. Almirante Miguel Grau en Paíta (UE: MVCS)**
Inversión: S/ 24.9 MM
- **Mejoramiento P.J. San Martín; del Pueblo Joven La Merced y Jr. Miguel Grau de La Urbanización San Rafael; Calle Nueva Esperanza ; y Jr. Hermanos Cárcamo (UE: MP de Paíta)**
Inversión: S/ 10.4 MM
- **Mejoramiento de transitabilidad en calles de A.H. Andrés Razuri, en Tambo Grande (UE: MD de Tambo Grande)**
Inversión: S/ 18 MM

PUENTES



- **Reparación de puentes Quebrada Colorada y Quebrada Peña Blanca en distrito de Carmen de la Frontera (UE: MD de Carmen de la Frontera)**
Inversión: S/ 10 MM

EDUCACIÓN



- **Mejoramiento del servicio de I.E. Andrés Avelino Cáceres (UE: MP Chulucanas)**
Inversión: S/ 9.9 MM
- **Rehabilitación del local escolar 14616 Sabina Cueva Castillo (UE: MP Chulucanas)**
Inversión: S/ 2.2 MM
- **Mejoramiento del servicio de educación del I.E. 15143 en Pedregal Chico (UE: MD Catacaos)**
Inversión: S/ 5.9 MM

PRINCIPALES INTERVENCIONES POR TRANSFERIR

SALUD



- **Mejoramiento del servicio de salud en los hospitales de Ayabaca, Huancabamba, Huarmaca y Los Algarrobos (UE: GORE PIURA)**
Inversión: S/ 324 MM

SOLUCIONES INTEGRALES



- **Desarrollo del Plan Maestro y estudios de preinversión para la solución definitiva de la cuenca del río Piura y del drenaje pluvial de la ciudad (UE: GORE Piura)**
Inversión: S/ 15 MM
- **Actualización del perfil y elaboración del expediente técnico del proyecto de drenaje “Franja central” de la ciudad de Piura (UE: MVCS)**
Inversión: S/ 5 MM
- **Reparación del Canal Dren Gullman, Canal de Drenaje 06 de setiembre y Dren Sullana (UE: MP PIURA)**
Inversión: S/ 9.3 MM

Avances: Región La Libertad

RE
CO **CONSTRUCCIÓN**
CON CAMBIOS

TOTAL TRANSFERIDO
ENERO - JULIO 2018

S/ 443 MM *


INTERVENCIONES

137

+ VIVIENDAS

3,879

Estado de las intervenciones (S/ MM)

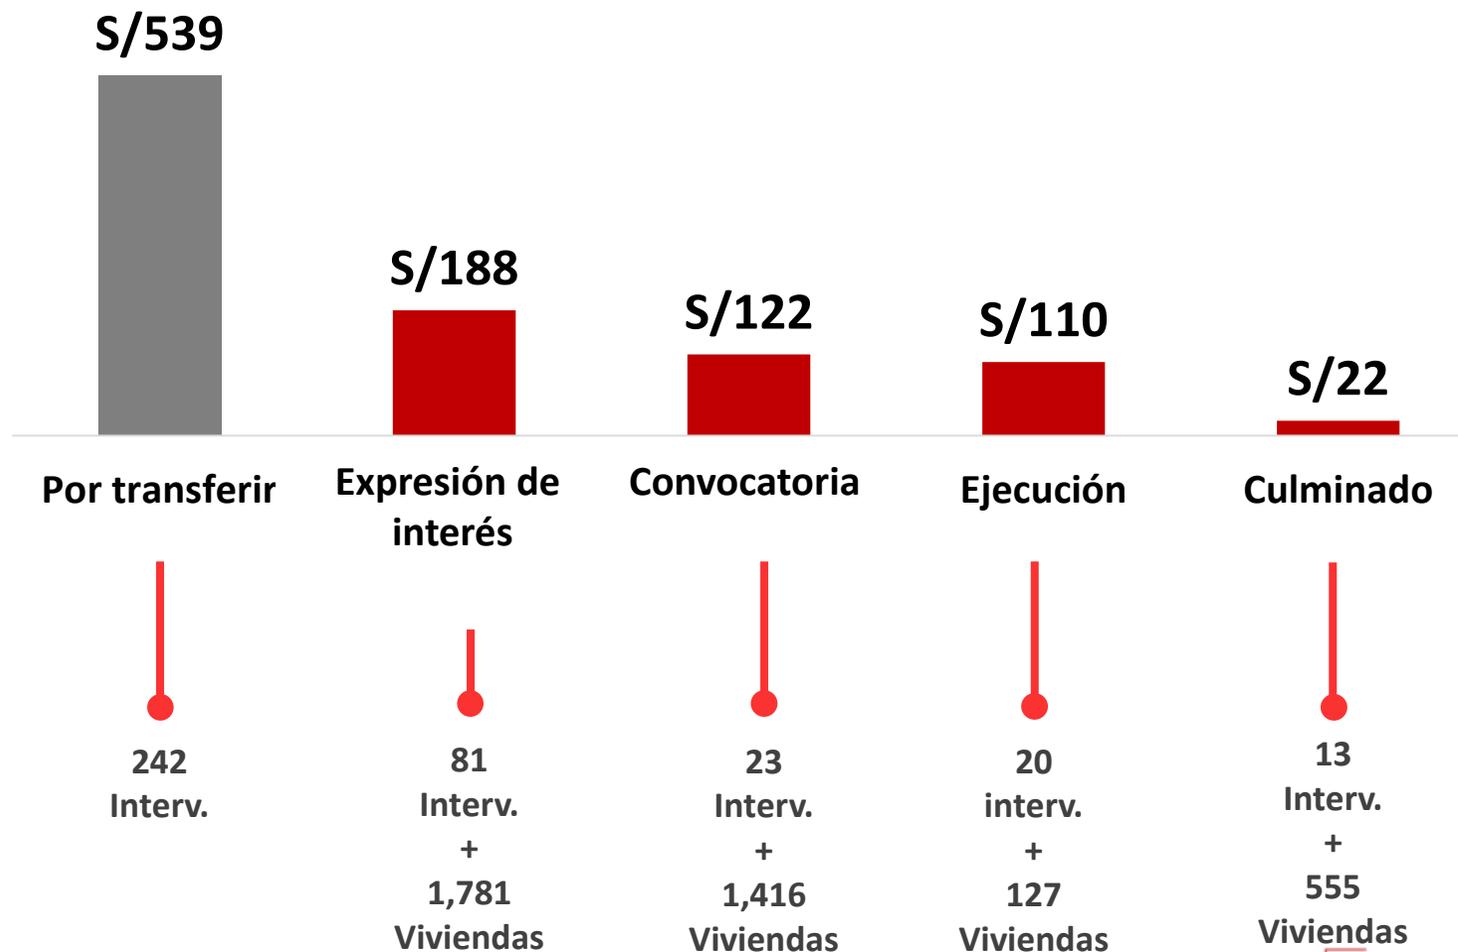

PRINCIPALES INTERVENCIONES CULMINADAS

PISTAS Y VEREDAS



- **Rehabilitación de 4 avenidas: Víctor Larco, Bolivia, Juan Pablo II y Huamán (UE: GORE La Libertad)**
Inversión: S/ 5.7 MM
Fecha de culminación: enero - junio 2018
- **Rehabilitación de 5 avenidas : Av. Mansiche, Antenor Orrego y Colibrí culminadas en enero y febrero; Av. Juan Pablo II y Jesús de Nazareth (UE: MP Trujillo)**
Inversión: S/ 2.9 MM
Fecha de culminación: enero – mayo 2018


VIVIENDAS



- 555 viviendas construidas

PRINCIPALES INTERVENCIONES CULMINADAS

LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN



- **Descolmatación del río Virú (UE: MINAGRI - PSI)**
Inversión: S/ 32.6 MM
Fecha de culminación: enero - marzo 2018
- **Limpieza y descolmatación del río Moche en provincia de Laredo (UE: MINAGRI - AGRORURAL)**
Inversión: S/ 11 MM
Fecha de culminación: julio 2018
- **Descolmatación de la quebrada El León a fines de febrero 2018. (UE: MD HUANCHACO)**
Inversión: S/ 8.7 MM
Fecha de culminación: febrero 2018
- **Limpieza y descolmatación del río Chicama (UE: MINAGRI - PSI)**
Inversión: S/ 22 MM
Fecha culminación: julio 2018.
- **Limpieza y descolmatación de quebradas Avendaño, Galindo, Bello Horizonte, Pedregal-Conache y San Carlos en distrito de Laredo (UE: MD. LAREDO)**
Inversión: S/ 7 MM
Fecha de culminación: junio 2018

ANTES

AHORA



La Libertad
Virú




LA LIBERTAD

Viviendas
AAHH Armando
Villanueva

PRINCIPALES INTERVENCIONES EN EJECUCIÓN

LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN



- **Descolmatación y encauzamiento (ríos Chorobal, Chao, Chicama, Huamanzaña y canales en el sector Puquio en el distrito de Paiján) (UE: MINAGRI - PEJEZA)**
 Inversión 2018: S/ 6 MM
 Avance físico: 30 %
 Fecha estimada de culminación: septiembre 2018
- **Descolmatación y encauzamiento del río Huamanzaña y afluentes y de la Quebrada La Agonía (UE: MINAGRI - PEJEZA)**
 Inversión 2018: S/ 5 MM
 Avance físico: 30 %
 Fecha estimada de culminación: septiembre 2018

SANEAMIENTO



- **Mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable y alcantarillado en el Distrito de Huanchaco (UE: MVCS - PNSU)**
 Inversión 2018: S/ 8 MM
 Avance físico: 30 %
 Fecha estimada de culminación: septiembre 2018

PRINCIPALES INTERVENCIONES EN EJECUCIÓN

CAMINOS VECINALES
Y DEPARTAMENTALES

- **Camino vecinal tramo DV. LI-119: Centro Poblado de Ancush (UE: MP. Julcán)**
Inversión 2018: S/ 7 MM
Avance físico: 10 %
Fecha de culminación: octubre 2018
- **Elaboración de 07 estudios para la rehabilitación Caminos departamentales (UE: GORE La Libertad)**
Inversión 2018: S/ 2 MM
Avance físico: 50 %
Fecha de culminación: septiembre 2018

VIVIENDAS



- 127 viviendas en construcción



LA LIBERTAD

Camino vecinal
Julcán



LA LIBERTAD

Saneamiento
Huanchaco

PRINCIPALES INTERVENCIONES EN CONVOCATORIA

CARRETERAS



- **Rehabilitación de carretera Pallasca - Mollepata - Mollebamba - Santiago de Chuco (UE: MTC- PVN)**

Inversión 2018: S/ 60 MM (Inversión multianual: S/ 247 MM)

Fecha estimada de inicio: septiembre-octubre 2018

Fecha estimada de culminación: enero 2020

CAMINOS VECINALES Y DEPARTAMENTALES



- **Mejoramiento del camino vecinal Shiran la Tranca - Con Con, Cushmun, Samne (UE: MD. Poroto)**

Inversión 2018: S/ 9 MM

Fecha estimada de inicio: septiembre 2018

Fecha estimada de culminación: marzo 2019

PUENTES



- **Mejoramiento y ampliación de los puentes: El Olivo, El Carrizo, Puente Piedra, Paja (UE: MD. CHUGAY)**

Inversión 2018: S/ 4.8 MM

Fecha estimada de inicio: septiembre 2018

Fecha estimada de culminación: enero del 2019

- **Adquisición de 21 puentes modulares para Bolívar, Chopán, Julcán, Otuzco, Patate y Sánchez Carrión, Santiago de Chuco y Trujillo (UE: MTC - PVD)**

Inversión 2018: S/ 19 millones (Inversión multianual: S/ 41 MM)

Fecha estimada de inicio: septiembre 2018

Fecha estimada de adquisición: diciembre 2018

PRINCIPALES INTERVENCIONES EN CONVOCATORIA

SANEAMIENTO



- **Reparación y abastecimiento de agua potable en el Distrito de Huancaspata (UE: MD Huancaspata)**
 Inversión 2018: S/ 0.5 MM
 Fecha estimada de inicio: septiembre 2018
 Fecha estimada de culminación: diciembre 2018

PISTAS Y VEREDAS



- **Recuperación de transitabilidad vehicular en calles Av. Huamachuco, Santa Rosa, San Isidro y Jr. Daniel A. Carrión (UE: MD. Chugay)**
 Inversión 2018: S/ 1.6 MM
 Fecha estimada de inicio: septiembre 2018
 Fecha estimada de culminación: diciembre 2018

VIVIENDAS



- 1,416 viviendas en convocatoria

PRINCIPALES INTERVENCIONES EN EXPRESIÓN DE INTERÉS

CAMINOS VECINALES Y DEPARTAMENTALES



- **Rehabilitación de 3 caminos vecinales en Sanchez Carrión – Huamachuco (UE: MP Sanchez Carrión-Huamachuco)**

Inversión 2018: S/ 32.2 MM (Inversión multianual: S/ 50.7 MM)

Fecha estimada de inicio: setiembre 2018.

Fecha estimada de culminación: julio 2019

Camino vecinal - 19.5 Km en Emp. PE - 09 de Octubre - Marcabal

Camino vecinal - 15 Km Huamachuco - El Olivo

Camino vecinal - 6 Km en Dv. Llampá - Puente el Ingenio

PISTAS Y VEREDAS



- **Recuperación de la Av. Miraflores (UE: GORE La Libertad)**

Inversión 2018: S/ 8.7 MM

Fecha estimada de inicio: Octubre 2018.

Fecha estimada de culminación: Junio 2019

- **Mejoramiento de la Av. Cesar Vallejo (UE: GORE La Libertad)**

Inversión 2018: S/ 3.9 MM

Fecha estimada de inicio: Octubre 2018.

Fecha estimada de culminación: Enero 2019

- **AV. Federico Villarreal (UE: GORE La Libertad)**

Inversión 2018: S/ 1.7 MM

Fecha estimada de inicio: Setiembre 2018.

Fecha estimada de culminación: Julio 2019

PRINCIPALES INTERVENCIONES EN EXPRESIÓN DE INTERÉS

EDUCACIÓN



- **Adquisición, transporte e instalación de 26 módulos educativos (UE: MINEDU – PRONIED)**
Inversión 2018: S/ 2.5 MM (Inversión multianual: S/ 6.2 MM)
Fecha estimada de inicio: Setiembre 2018.
Fecha estimada de culminación: Febrero 2019

CARRETERAS



- **Conservación de la infraestructura vial en el corredor Trujillo –Shorey; Puente El Cumbil – Santa Cruz; Puente El Cumbil – Cochabamba; Shorey –Cajamarca y corredor Chicama–Chilete (UE: MTC – PVN)**
Inversión 2018: S/ 11.9 MM (Inversión multianual: S/ 59.3 MM)
Fecha estimada de inicio: octubre 2018.
Fecha estimada de culminación: Junio 2019

PRINCIPALES INTERVENCIONES POR TRANSFERIR

AGRICULTURA



- **Rehabilitación de servicio de agua para riego en los canales Puqui, Matriz I y Bajo Guadalupito (UE:MINAGRI)**
Inversión: S/ 22 MM

CAMINOS VECINALES Y DEPARTAMENTALES



- **Mejoramiento de camino vecinal en el centro poblado de Sanagoran hasta centro poblado de Raunate (UE: MD de Sanagoran)**
Inversión: S/ 23 MM
- **Mejoramiento camino vecinal La Cuesta – Buena Vista de Caniac (UE: GORE La Libertad)**
Inversión: S/ 14 MM
- **Mejoramiento de trocha carrozable en Paccha, en Cachicadán (UE: MD de Cachicadán)**
Inversión: S/ 15 MM
- **Mejoramiento Camino Vecinal Otuzco – Pampa Grande, en Otuzco (UE: MD de Otuzco)**
Inversión: S/ 15 MM
- **Mejoramiento de camino vecinal en desvío Marcabal –El Olivo, en Marcabal (UE: MD de Marcabal)**
Inversión: S/ 12 MM
- **Mejoramiento de la carretera en tramo Santiago de Chuco, en Quiruvilca (UE: MD GORE La Libertad)**
Inversión: S/ 12 MM

PRINCIPALES INTERVENCIONES POR TRANSFERIR

SANEAMIENTO



- **Reparación de sistema de alcantarillado en Trujillo (UE: MVCS)**
Inversión: S/ 74 MM

PUENTES



- **Mejoramiento de transitabilidad en el puente Quinual, en Cachicadán (UE: MD de Cachicadán)**
Inversión: S/ 4 MM

EDUCACIÓN




- **Mejoramiento de I.E. Dean Saavedra en Huanchaco (UE: MD Huanchaco)**
Inversión: S/ 10 MM

SALUD



- **Mejoramiento del servicio de salud en EESS Alto Perú, Angamarca, Gran Chimú, Ramón Castilla, Samne y Sitabamba (UE: MINSA- PRONIS)**
Inversión: S/ 7 MM

**SOLUCIONES
INTEGRALES**

- Solución Integral en Quebrada San Ildefonso (UE: GORE La Libertad)
- Elaboración del Plan Maestro y estudios de perfil para el sistema de drenaje pluvial de la ciudad de Trujillo (UE: GORE La Libertad)
- Elaboración del Plan Integral y estudios de perfil para la solución definitiva de la ríos Chicama, Virú (UE: MINAGRI -PSI)
- Elaboración del Plan Integral y estudios de perfil para la solución definitiva de las quebradas El León y San Carlos (UE: GORE La Libertad)

A construction site in Lambayeque, Peru. In the foreground, a large yellow excavator bucket is suspended in the air, having just dumped a load of brown earth. A worker in a blue cap and grey shirt is crouching in the dirt, working with rebar. In the background, a group of about ten workers in white hard hats and light-colored shirts are standing and talking. Buildings and a street are visible in the distance under a bright sky.

Avances: Región Lambayeque

RE
CONSTRUCCIÓN
CON CAMBIOS

TOTAL TRANSFERIDO
ENERO - JULIO 2018

S/ 530 MM*


INTERVENCIONES

115

+ VIVIENDAS

15,900

Estado de las intervenciones (S/ MM)

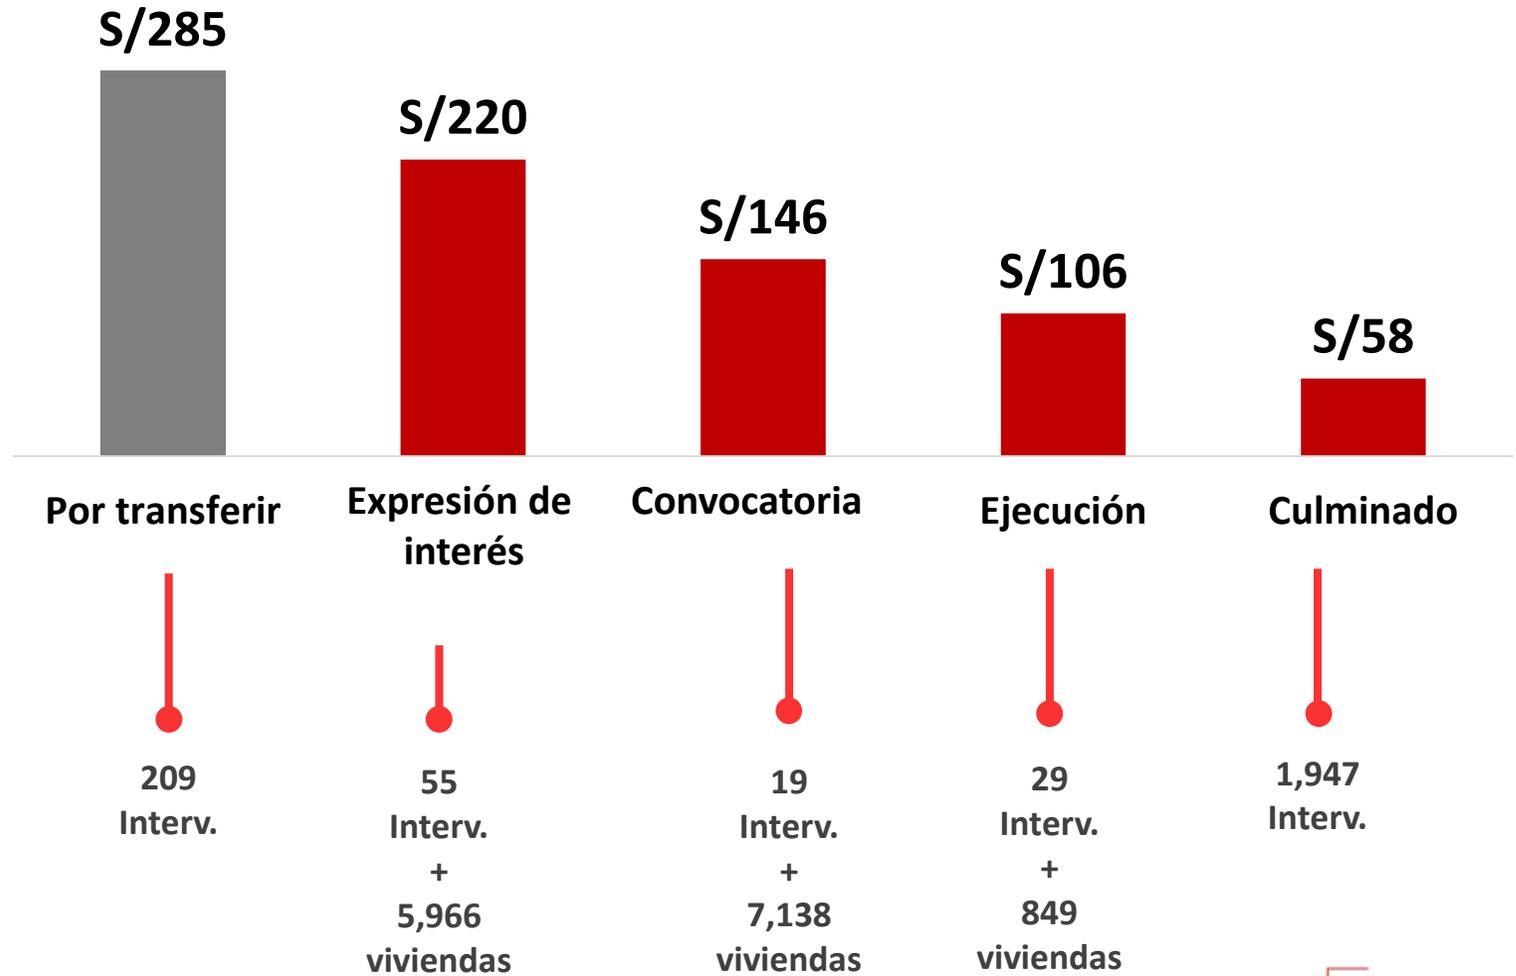

PRINCIPALES INTERVENCIONES CULMINADAS

PISTAS Y VEREDAS



- Rehabilitación de 9 pistas de la calle Sáenz Peña, 7 de enero, José Quiñones, Miguel Grau, Hipólito Unanue, Av. Fitzcarrald, Av. Pacasmayo, Calle Garcilazo de la Vega y Elvira García (UE: MP Chiclayo)**
 Inversión: S/ 10.6 MM
 Fecha de culminación: marzo –mayo 2018
- Mejoramiento del servicio de transitabilidad peatonal y vehicular en Av. Eliberto Casas desde Calle Luis Huamanchumo Venegas hasta el cementerio San Pedro (UE:MINTRA- PTP)**
 Inversión: S/ 1.2 MM
 Fecha de culminación: mayo 2018
- Calle Atahualpa cuadras 1-7 y calle 02-calle 01, Gonzales Prada Crdas 1, calle lima Cdras 0 y 1, Prolong. Calle Bolivar Cdra de Ciudad Eten (UE: MINTRA - PTP)**
 Inversión: S/ 1.2 MM
 Fecha de culminación: abril 2018

PUENTES



- Instalación del puente modular Laquipampa de 55 metros (UE: MTC - PROVIAS)**
 Inversión: S/ 1.4 MM
 Fecha de culminación: julio 2018

PRINCIPALES INTERVENCIONES CULMINADAS

VIVIENDAS



- 1,947 viviendas construidas

SANEAMIENTO



- **Servicio de reparaciones menores de redes colectoras y de agua potable colapsados en los distritos de Chiclayo, Pimentel, Túcume y Santa Rosa (UE: MVCS-PNSU)**

Inversión: S/ 2.4 MM

Fecha de culminación: junio 2018

DESCOLMATACIONES



- **Descolmatación de 198 km de los ríos Olmos, La Leche, Zaña, Motupe, Chancay, 4 km de la quebrada La Pared y 7 km de la quebrada Juana Ríos (UE: PSI – AGRORURAL)**

Inversión: S/ 119.2 MM

Fecha de culminación: enero - junio 2018

- **Descolmatación de 67.41 km de los drenes 1400, 2000, 3100 4000 y 4000 FAP (UE: GORE LAMBAYEQUE)**

Inversión: S/ 5.3 MM

Fecha de culminación: marzo - abril 2018

ANTES

AHORA



**Chiclayo
Av. Grau**

ANTES

AHORA



**Chiclayo
Ciudad Eten**



LAMBAYEQUE

Viviendas

Cruz del Médano

PRINCIPALES INTERVENCIONES EN EJECUCIÓN

SANEAMIENTO



- Mejoramiento del sistema de saneamiento en el Pueblo Joven Santa Rosa (UE: MVCS-PNSU)**
 Inversión 2018: S/ 7.4 MM
 Avance físico: 80 %
 Fecha estimada de culminación: septiembre 2018
- Mejoramiento del sistema de saneamiento en el Pueblo Joven Ricardo Palma (UE: MVCS-PNSU)**
 Inversión 2018: S/ 3.0 MM
 Avance físico: 90%
 Fecha estimada de culminación: agosto 2018
- Servicio de reparaciones menores de colectores primarios y secundarios colapsados en el distrito de José Leonardo Ortiz (UE: MVCS-PNSU)**
 Inversión 2018: S/ 6.3 MM
 Avance físico: 98 %
 Fecha estimada de culminación: agosto 2018

VIVIENDAS



- 849 viviendas en construcción**



LAMBAYEQUE

Pueblo joven
Ricardo Palma



LAMBAYEQUE

Dren 4000

PRINCIPALES INTERVENCIONES EN CONVOCATORIA

PISTAS Y VEREDAS



- Mejoramiento de transitabilidad vehicular en Calles Antenor Orrego, Macchu Picchu , Atahualpa y Av. Gran Chimú; Calles Orfebres, Ayllu y Coricancha (UE: MD La Victoria)**
 Inversión 2018: S/ 6 MM
 Fecha estimada de inicio: agosto 2018
 Fecha estimada de culminación: noviembre 2018
- Rehabilitación de 16 avenidas y calles Av. Independencia, Los Tréboles, Eufemio Lora, Victor Andrés Belaunde, Alexander Von Humboldt, Sta. Rosa, Mariscal Nievo, Oriente, Belaunde y Calles Tumbes Norte, Juan Buendía, Bolívar, Manuel Iturregui, Leoncio Prado y Loreto (UE: MP Chiclayo)**
 Inversión 2018: S/ 9.5 MM
 Fecha estimada de inicio: septiembre 2018
 Fecha estimada de culminación: noviembre-diciembre 2018

VIVIENDAS



- 7,138 viviendas en convocatoria

PRINCIPALES INTERVENCIONES EN CONVOCATORIA

PUENTES



- **Adquisición de 02 puentes modulares. (UE: MTC- PVD)**
Inversión 2018: S/ 2.4 MM (Inversión Multianual: S/ 5.7 MM)
Fecha estimada de inicio: septiembre 2018
Fecha estimada de adquisición: diciembre 2018

PRINCIPALES INTERVENCIONES EN EXPRESIÓN DE INTERÉS

SANEAMIENTO



- **Rehabilitación de colectores primarios y secundarios del distrito de José Leonardo Ortiz en elaboración de términos de referencia (UE: MVCS-PNSU)**
Inversión 2018: S/ 14.5 MM
Fecha estimada de inicio: septiembre 2018
Fecha estimada de culminación: mayo 2019
-

EDUCACIÓN



- **Adquisición, transporte e instalación de 14 módulos educativos (UE: MINEDU-PRONIED)**
Inversión 2018: S/ 13 MM (Inversión Multianual: S/ 2.2 MM)
Fecha estimada de inicio: Setiembre 2018.
Fecha estimada de culminación: Enero 2019

PRINCIPALES INTERVENCIONES POR TRANSFERIR

AGRICULTURA



- **Rehabilitación del servicio de agua para riego del canal Zapatero (UE:MINAGRI)**
Inversión: S/ 10 MM

CAMINOS VECINALES Y DEPARTAMENTALES



- **Mejoramiento de camino vecinal inicio KM 30.5 de carretera Fernando Belaúnde, en Pacora (UE: MD de Pacora)**
Inversión: S/ 14 MM
- **Rehabilitación de camino vecinal-7.16 km - Sector Taboadas –Sector Piscoya, en Pacora (UE: MD de Pacora)**
Inversión: S/ 1 MM
- **Rehabilitación de camino vecinal-7.45 km en la Tranca – El Porvenir, en Pacora (UE: MD Pacora)**
Inversión: S/ 2 MM
- **Rehabilitación de camino vecinal-10.10 km en los caseríos la Embarrada, San Pablo, la Victoria y Pueblo Viejo en Pacora (UE: MD Pacora)**
Inversión: S/ 3 MM
- **Mejoramiento de carretera cruce La Viña – La Represa – El Marco, en Jayanca (UE: MTC)**
Inversión: S/ 10 MM
- **Mejoramiento en vías de acceso a Valle Viejo Olmos, en Olmos (UE: MD de Olmos)**
Inversión: S/ 8 MM

PRINCIPALES INTERVENCIONES POR TRANSFERIR

SANEAMIENTO



- **Rehabilitación de colectores en el distrito de José Leonardo Ortiz (UE: MVCS)**
Inversión: S/ 155 MM

PISTAS Y VEREDAS



- **Mejoramiento del Servicio de transitabilidad vehicular y peatonal en pistas y veredas del Cercado Urbano en la provincia de Ferreñafe (UE: MP Ferreñafe)**
Inversión: S/ 9.6 MM

EDUCACIÓN



- **Mejoramiento de I.E. San Pedro del Centro Poblado El Romero, en Mórrope (UE: MD de Mórrope)**
Inversión: S/ 16 MM
- **Mejoramiento de I.E. San Juan de la localidad en Illimo (UE: MINEDU - PRONIED)**
Inversión: S/ 15 MM
- **Mejoramiento de I.E. Wadington Bajo, en Chongoyape (UE: GORE Lambayeque)**
Inversión: S/ 6 MM

PRINCIPALES INTERVENCIONES POR TRANSFERIR

CARRETERAS



- **Conservación de la infraestructura vial del corredor Lambayeque – Olmos (UE: MTC)**
Inversión: S/ 125.4 MM

SALUD



- **Mejoramiento del servicio de salud en EESS Chiñama, Huayabamba, Puchaca y Salas (UE: MINSA – PRONIS)**
Inversión: S/ 6 MM

SOLUCIONES INTEGRALES



- **Elaboración del Plan integral y perfiles para el control de inundaciones y movimientos de masas del río la Leche y Chancay (UE: GORE Lambayeque)**
Inversión: S/ 24 MM

Avances: Región Áncash



Estado de las intervenciones (S/ MM)

TOTAL TRANSFERIDO
ENERO - JULIO 2018


S/ 252 MM*

INTERVENCIONES

172

+ VIVIENDAS

2,332

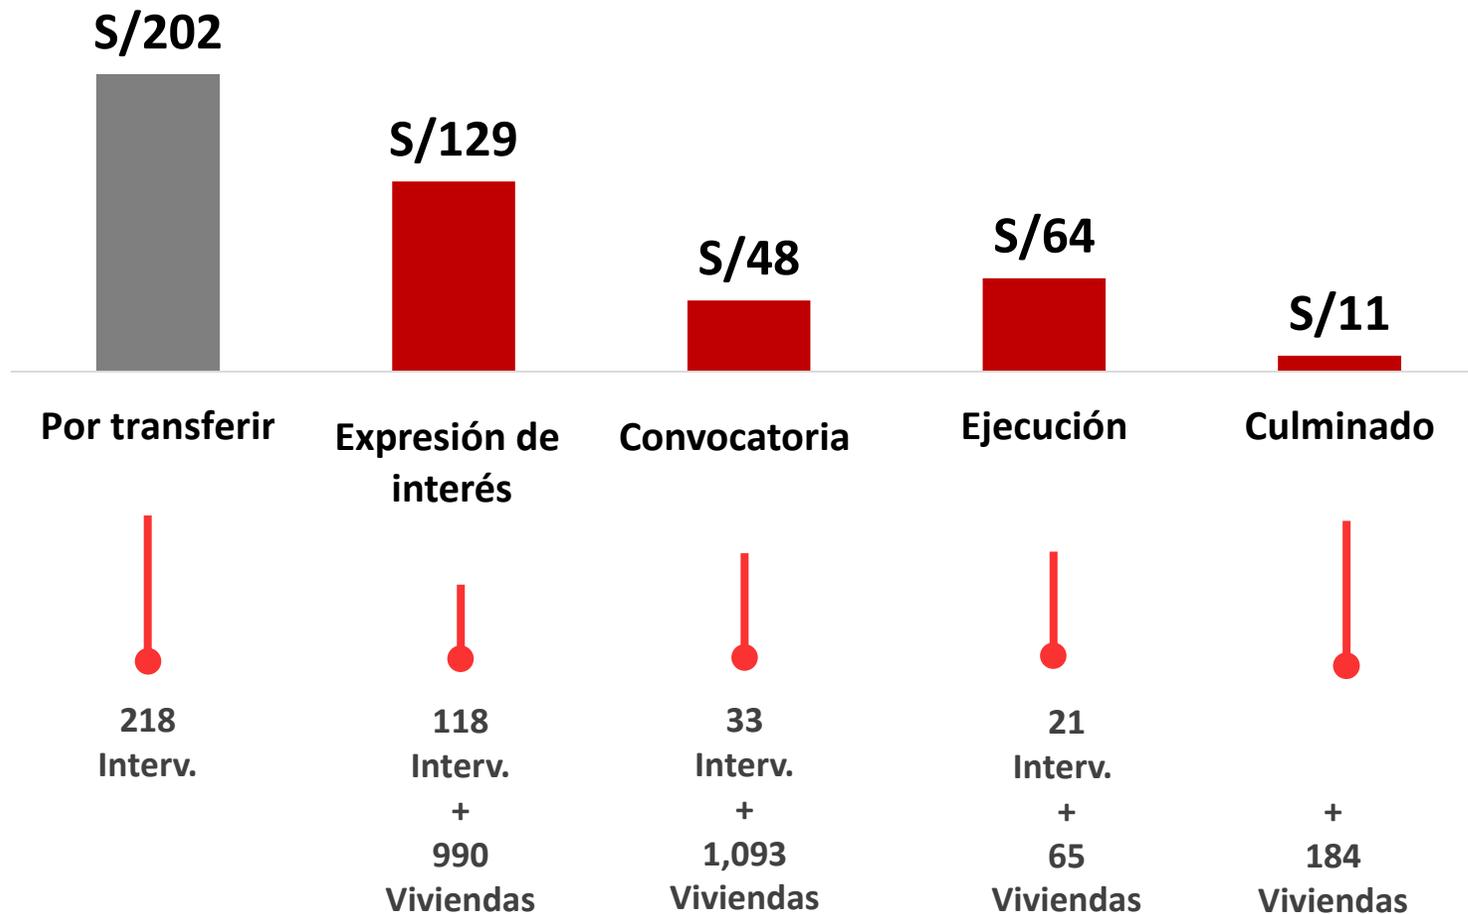

PRINCIPALES INTERVENCIONES CULMINADAS

VIVIENDAS



- 184 viviendas construidas

PUENTES



- **Instalación de 08 puentes modulares: Huaroyapampa, Paucho, Quircabamba, Yungayapampa, Shacsha, Calvario, Pasamayo y San Marcos (UE: MTC-PROVIAS NACIONAL)**
 Inversión: S/8.5 MM
 Fecha de culminación: noviembre 2017 - febrero 2018

DESCOLMATACIONES



- **Limpieza y descolmatación de 121 kilómetros de los ríos Huarmey, Casma, Lacramarca, Nepeña, Culebras, Santa y dren Cascajal (UE: PSI – AGRORURAL)**
 Inversión: S/ 79.4 MM
 Fecha de culminación: diciembre 2017 y junio 2018
- **Limpieza y descolmatación de canales, tomas y bocatomas en Tamboreal, La Huaca, Santa Clemencia, Cascajal Izquierdo, Cabeza de Toro, Huambacho, Macracancha en la provincia de Santa. (UE: PSI).**
 Inversión: S/ 1.2 MM
 Fecha de culminación: enero 2018



PERÚ

Presidencia
Del Consejo de Ministros

Autoridad para la
Reconstrucción Con Cambios

RE
CONSTRUCCIÓN
CON CAMBIOS



ANCASH

Viviendas
AAHH 9 de octubre



ÁNCASH

Río Huarmey

PRINCIPALES INTERVENCIONES EN EJECUCIÓN

DESCOLMATACIONES



- **Descolmatación de canales (ríos Sechin, Yautan, Casma, Huarmey y Culebras) y rehabilitación de defensas ribereñas en los ríos Lacramarca, Nepeña y Huarmey (UE: MINAGRI- PSI).**

Inversión 2018: S/ 6.3 MM

Fecha de culminación: septiembre-octubre 2018

VIVIENDAS



- 65 viviendas en construcción

PRINCIPALES INTERVENCIONES EN CONVOCATORIA

PUENTES



- **Adquisición de 33 puentes modulares (UE: MTC – PVD)**
Inversión 2018: S/ 22.8 MM (Inversión multianual: S/ 46.5 MM)
Fecha estimada de inicio: septiembre 2018
Fecha estimada de adquisición: diciembre 2018

SALUD



- **Rehabilitación del hospital de apoyo Yungay. (UE: MINSA-PRONIS)**
Inversión 2018: S/ 11.3 MM (Inversión multianual: S/ 66.4 MM)
Fecha estimada de inicio: octubre 2018
Fecha estimada de culminación: marzo 2019
- **Rehabilitación del hospital de apoyo Antonio Caldas Domínguez. (UE: MINSA-PRONIS)**
Inversión 2018: S/ 14.4 MM (Inversión multianual: S/ 94.8 MM)
Fecha estimada de inicio: Octubre 2018
Fecha estimada de culminación: IV trimestre 2020
- **Rehabilitación del hospital de apoyo San Juan de Dios. (UE: MINSA-PRONIS)**
Inversión 2018: S/ 16.7 MM (Inversión multianual: S/ 112 MM)
Fecha estimada de inicio: octubre 2018
Fecha estimada de culminación: IV trimestre 2020

EDUCACIÓN



- **85 módulos educativos (UE: MINEDU-PRONIED)**
Inversión 2018: S/ 9MM (Inversión Multianual: S/ 15.6 MM)
Fecha estimada de inicio: Setiembre 2018.
Fecha estimada de culminación: Febrero 2019

CARRETERAS



- **Conservación de infraestructura vial del corredor Casma- Huaraz (UE: MTC-PVN)**
Inversión 2018: S/. 7.8 MM (Inversión multianual: S/ 39.3 MM).
Fecha estimada de inicio: IV trimestre 2018.
Fecha estimada de culminación: II trimestre 2019

PRINCIPALES INTERVENCIONES POR TRANSFERIR

AGRICULTURA



- **Rehabilitación del servicio de agua para riego del canal Huamaná, Cascajal Izquierdo, L1, Oruna y Paredes Reyes (UE: MINAGRI)**
Inversión; S/ 49 MM

CAMINOS VECINALES Y DEPARTAMENTALES



- **Reparación de vías vecinales en sector Monsalve, en Malvas (UE: MP Huarmey)**
Inversión: S/ 6 MM
- **Reparación de carreteras de acceso Emp - PE -1n (Puente Carrizal) - Nivin del Valle de San Rafael en la Provincia de Casma (UE: MP Casma)**
Inversión: S/ 6.7 MM

PISTAS Y VEREDAS



- **Renovación de vías urbanas de la Av Reyna, Av Gamarra y Av Lima; la Av. Huaraz; Calle Nicolas de Pierola, Av Peru, Av Cesar Vallejo y La Av. Nepeña en la Provincia de Casma (UE: MP Casma)**
Inversión: S/ 5 MM
- **Reparación de vías vecinales en el Puente Colgante Isla Rio, en el Puente Colgante Uchipampa y en el Puente Alegre en la Provincia Recuay (UE: MP Recuay)**
Inversión: S/. 4.5 MM

PRINCIPALES INTERVENCIONES POR TRANSFERIR

CARRETERAS



- **Conservación de infraestructura vial del corredor Dv. Conococha – Conococha y Huaraz – Caraz (UE: MTC-PVN)**
Inversión: S/ 13.8 MM. (Inversión multianual: S/ 68.8 MM)

EDUCACIÓN




- **Rehabilitación del I.E. Antenor Sánchez, en Chimbote (UE: MINEDU-PRONIED)**
Inversión: S/ 8 MM

SALUD



- **Mejoramiento Hospital de Recuay, en Recuay (UE: MINSA-PRONIS)**
Inversión: S/ 97 MM
- **Mejoramiento de Centro de Salud de Quiches, en Quiches (UE: MINSA-PRONIS)**
Inversión: S/ 6 MM)

SOLUCIONES INTEGRALES



- **Elaboración del Plan Integral y perfiles para las soluciones definitivas de los ríos Casma, Huarmey y Lacramarca (UE: MINAGRI - PSI)**

Avances: Región Tumbes

RE
CONSTRUCCIÓN
CON CAMBIOS

TOTAL TRANSFERIDO
ENERO - JULIO 2018

S/ 111 MM


INTERVENCIONES

20

+ VIVIENDAS

64

Estado de las intervenciones (S/ MM)

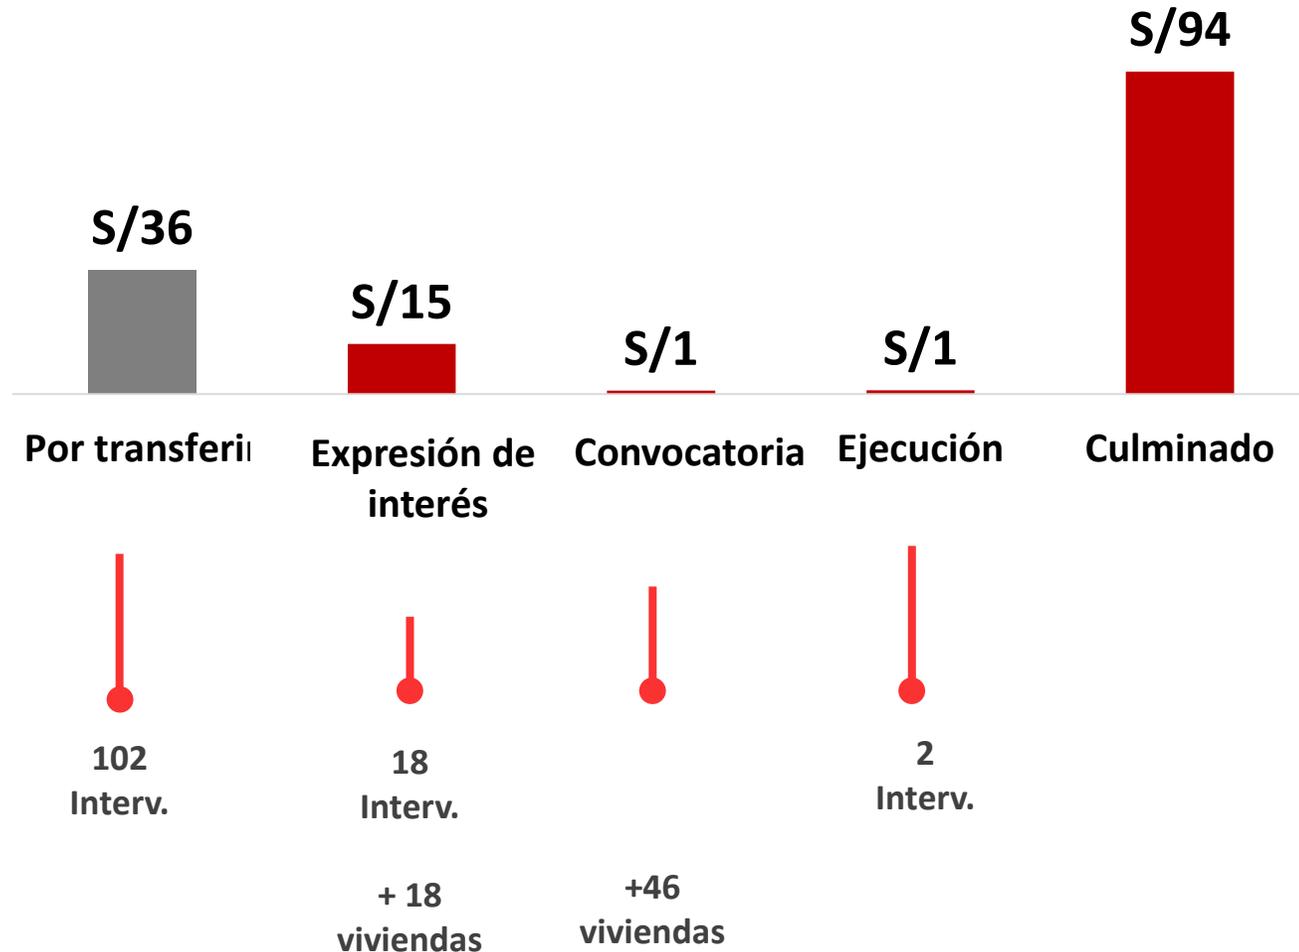

PRINCIPALES INTERVENCIONES CULMINADAS


DESCOLMATACIONES



- **Descolmatación de 80,30 km de los ríos Zarumilla, Tumbes, Quebrada Bocapán Luay y Pedregal (UE: MINAGRI - PSI – PEBPT)**
Inversión: S/ 103,72 MM
Fecha de culminación: enero-mayo 2018

PRINCIPALES INTERVENCIONES EN EXPRESIÓN DE INTERÉS

LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN



- **03 Intervenciones para limpieza y descolmatación de canales y drenes: en los subsectores Margen Izquierda, San Juan La Virgen y en la quebrada Luey Los Angeles (UE: MINAGRI-AGRORURAL)**
Inversión 2018: S/ 6.3 MM
Fecha estimada de inicio: septiembre 2018
Fecha estimada de culminación: noviembre 2018
- **02 intervenciones para limpieza y descolmatación de canales aductores de bombeo y del subsector La Tuna y Romeo (UE: MINAGRI- PEBPT)**
Inversión 2018: S/ 1.7 MM
Fecha estimada de inicio: septiembre 2018
Fecha estimada de culminación: octubre 2018



PERÚ

Presidencia
Del Consejo de Ministros

Autoridad para la
Reconstrucción Con Cambios

RE
CONSTRUCCIÓN
CON CAMBIOS



TUMBES

Río Tumbes

PRINCIPALES INTERVENCIONES POR TRANSFERIR

AGRICULTURA



- Reparación de canal de riego en el sector Los Aguchos y en el sector Tres Cruces (UE: MD Papayal, S/ 2.4 MM)

CAMINOS VECINALES Y DEPARTAMENTALES



- Renovación de caminos de Herradura, en San Juan de la Virgen (UE: MD de San Juan de la Virgen, S/ 5 MM)
- Reparación de camino departamental San Juan de la Virgen-Cañón del Tigre (UE: GORE Tumbes, S/ 2 MM)
- Rehabilitación de caminos rurales en los sectores Pueblo Nuevo, La Florida, Las Vacas, El Sauce y el Chivato, en Corrales (UE: MD de Corrales, S/ 1 MM)
- Reparación de carreteras de acceso en el centro de producción agrícola La Capitana, en San Jacinto (UE: MD de San Jacinto, S/ 2 MM)

PISTAS Y VEREDAS



- Reparación de vías urbanas en pistas y veredas de El Papayal (UE: MD de El Papayal, S/ 3 MM)
- Reparación de vías urbanas en Av. 3 de Octubre en de la Cruz (UE: MD de De la Cruz, S/ 3 MM)
- Renovación de pistas en Calle Leticia en Zarumilla (UE: MD de Zarumilla, S/ 2 MM)
- Reparación de vías urbanas en la ciudad de Tumbes (UE: MVCS, S/ 15,2 MM)

PRINCIPALES INTERVENCIONES POR TRANSFERIR

SANEAMIENTO



- Rehabilitación del sistema de saneamiento básico en el distrito de Tumbes (UE: MVCS, 17 MM)
-

EDUCACIÓN



- Reparaciones en las I.E. 004- Pampas de Hospital y I.E. 062 – Alejandro Sánchez Arteaga, en Pampas de Hospital (UE: MD de Pampas de Hospital, S/ 1 MM)
-

SALUD



- Centros de salud de Casitas y Bocapán (UE: MINSA, S/ 2 MM)

Avances: Región Lima



TOTAL TRANSFERIDO
ENERO - JULIO 2018

S/ 324 MM*


INTERVENCIONES

117

+ VIVIENDAS

2,244

Estado de las intervenciones (S/ MM)

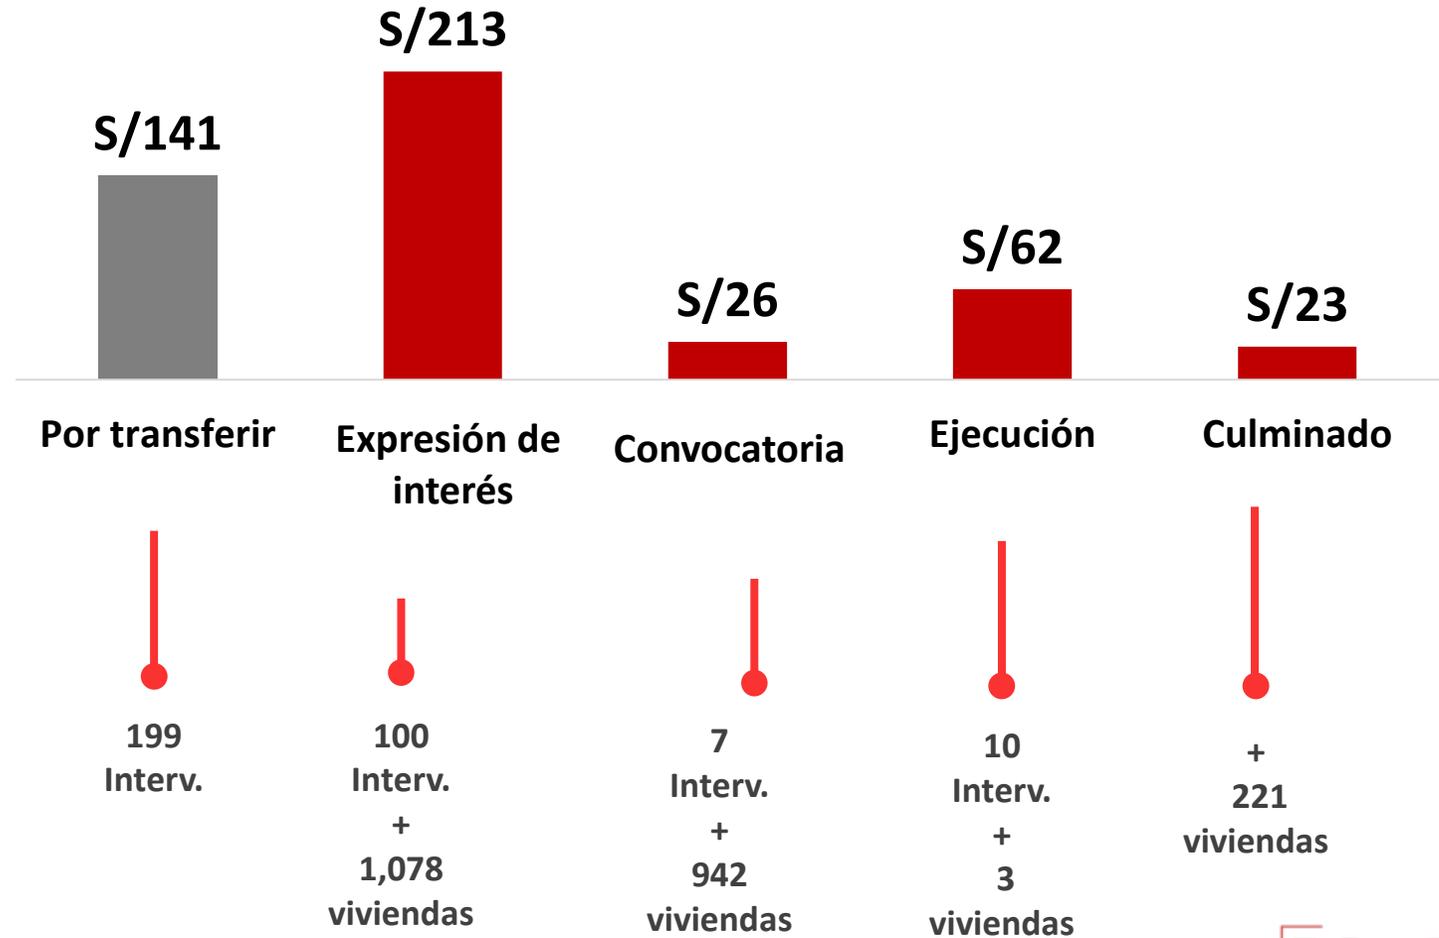

PRINCIPALES INTERVENCIONES CULMINADAS

VIVIENDAS



- 221 viviendas construidas

DESCOLMATACIONES



- **Descolmatación de 8.5 kilómetros del río Lurín (UE: GORE LIMA Y LIMA METROPOLITANA)**
Inversión: S/ 8.1 MM
Fecha de culminación: agosto 2018

PUENTES



- **Instalación de 02 puentes Las Torres y Choques (UE: MTC-PROVIAS NACIONAL)**
Inversión: S/6.2 MM
Fecha de culminación: diciembre 2017

ANTES

AHORA



Lima
Puente Choques
Carretera Oyón-Yanahuanca-Ambo

ANTES

AHORA



Lima
Puente Las Torres



LIMA


Lurigancho-Chosica

DESCOLMATACIONES



- **Descolmatación de 7.4 km del río Chillón (UE: Municipalidad Metropolitana de Lima)**
Inversión 2018: S/ 3.7 MM
Avance físico: 90 %
Fecha estimada de culminación: agosto 2018
-

SANEAMIENTO



- **03 obras de saneamiento en las localidades de Pampa Libre, Pativilca y Huaral (UE: MVCS-PNSU)**
Inversión 2018: S/ 17 MM
Avance físico: 75 %
Fecha estimada de culminación: diciembre 2018

PRINCIPALES INTERVENCIONES EN CONVOCATORIA

PUENTES



- **Adquisición de 09 puentes modulares. (UE: MTC-PVD)**
Inversión 2018: S/ 5.9 MM. (Inversión multianual: S/ 10.6 MM)
Fecha estimada de inicio: septiembre 2018
Fecha estimada de adquisición: diciembre 2018

PRINCIPALES INTERVENCIONES EN EXPRESIÓN DE INTERÉS

PUENTES



- **Creación del Puente Posanca en la carretera Santa Rosa de Quives (UE: GORE LIMA)**
Inversión 2018: S/ 3.8 MM
Fecha estimada de inicio: Octubre 2018
Fecha estimada de culminación: Enero 2019

CARRETERAS



- **Conservación de infraestructura vial del corredor Río Seco – Huaura (UE: MTC)**
Inversión 2018: S/. 1.3 MM (Inversión multianual: S/ 22.8 MM)
Fecha estimada de inicio: octubre 2018
Fecha estimada de culminación: agosto 2019

PRINCIPALES INTERVENCIONES POR TRANSFERIR

CAMINOS VECINALES Y DEPARTAMENTALES



- Mejoramiento de tránsito en sector Copa y Collanca, en Arahuary (UE: MD de Arahuary, S/ 6 MM)
- Mejoramiento de tránsito en localidad de Piedra Grande, en Santo Domingo de los Olleros (UE: MD de Santo Domingo de los Olleros, S/ 6 MM)

SANEAMIENTO



- Rehabilitación de la red de colectores y planta de tratamiento en Paramonga (UE: MVCS, S/ 24 MM)
- Renovación de línea de impulsión y abastecimiento de agua en San Vicente de Cañete (UE: MVCS, S/ 4 MM)

PISTAS Y VEREDAS



- Mejoramiento de pistas y veredas en Av. Campoy, Quinta Avenida y Av. Los Cisnes en Lurigancho (UE: Municipalidad de Lima Metropolitana, S/ 63 MM)
- Renovación de pista Av. Circunvalación en Yauyos (UE: MP de Yauyos, S/ 4 MM)

PRINCIPALES INTERVENCIONES POR TRANSFERIR

CARRETERAS



- Conservación de infraestructura vial del corredor Lima – Puente Ricardo Palma y Mala – La Capilla (UE: MTC, S/ 60.2 MM).

PUENTES



- Reconstrucción de puentes La Mina, Tumac, Catapalla, Huacán y el Molino (UE: GORE Lima, S/ 11 MM)

EDUCACIÓN



- Mejoramiento de servicios educativos de la I.E. Ciro Alegría Bazán, en Huancapón (UE: MINEDU, S/ 8 MM)
- Mejoramiento de servicios educativos de la I.E. Oscar Miro Quesada de la Guerra, en Cajatambo (UE: MINEDU, S/ 7 MM)

SOLUCIONES INTEGRALES



- Elaboración del Plan Integral y perfiles para las soluciones definitivas de los ríos Huaura, Rímac, Mala y Cañete (UE: MINAGRI-PSI)

Avances: Otras regiones

RE
CONSTRUCCIÓN
CON CAMBIOS

*Ica, Cajamarca, Loreto, Huancavelica, Arequipa, Ayacucho, Junín

Estado de las intervenciones (S/ MM)

TOTAL TRANSFERIDO
ENERO - JULIO 2018


S/ 325 MM

INTERVENCIONES

126

+ VIVIENDAS

4,073

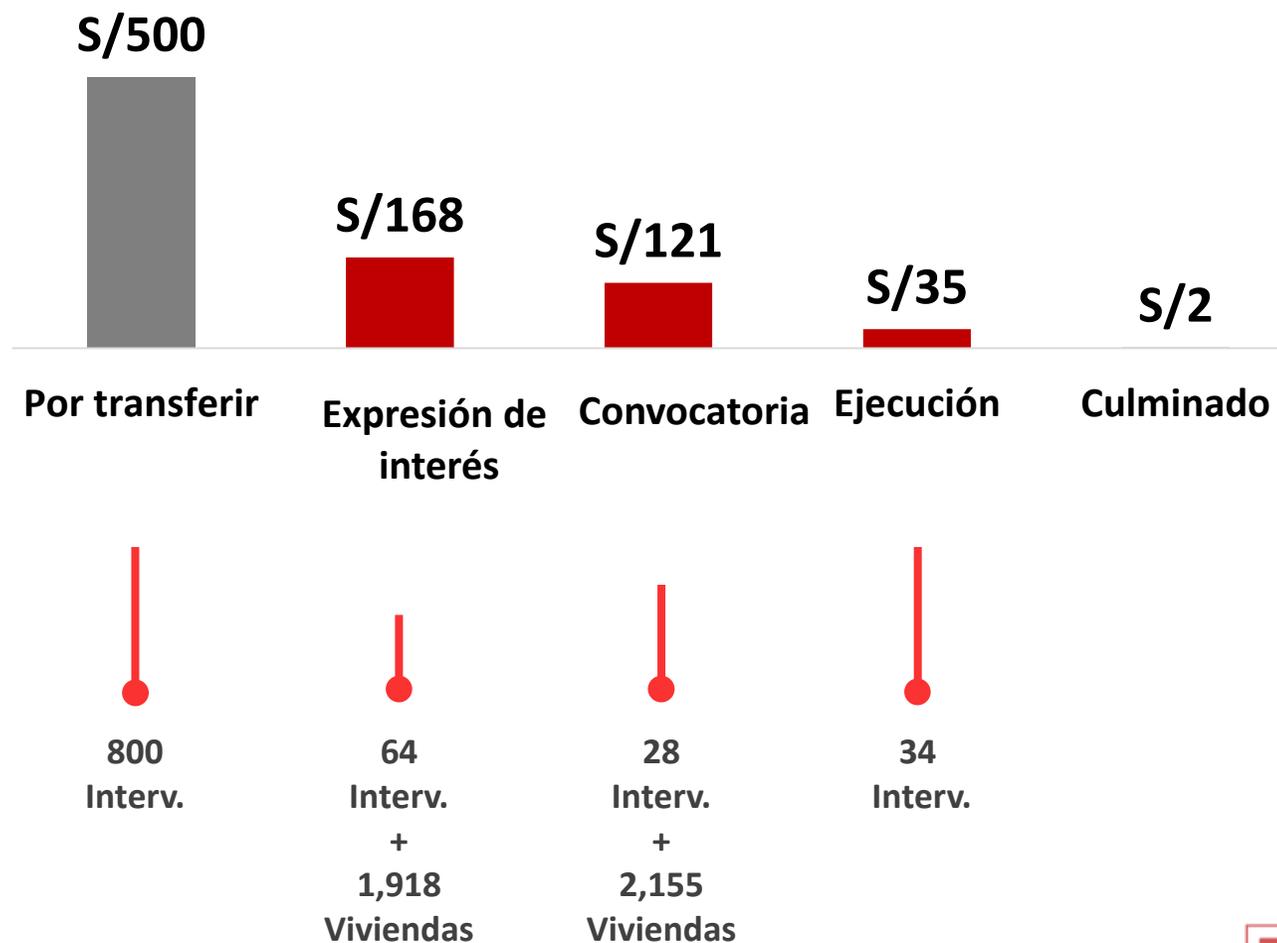

PRINCIPALES INTERVENCIONES CULMINADAS

LORETO



- **09 intervenciones de mejoramiento de pistas y veredas en las provincias de Dátém del Marañón, Loreto, Maynas, Requena y Ucayali (UE: MINTRA-PTP).**

Inversión: S/ 4.7 MM

Fecha de culminación: Entre enero y abril del 2018

- **Mejoramiento de transitabilidad vehicular y peatonal distrito de San Pablo. (UE: MINTRA- PTP)**

Inversión: S/ 0.8 MM

Fecha de culminación: mayo 2018

ICA



- **Limpieza y descolmatación de 28.7 km en los ríos Cansas y Matagente (UE: MINAGRI-PSI)**

Inversión: S/ 18 MM

Fecha de culminación: Entre noviembre 2017 y enero del 2018

CAJAMARCA



- **Mejoramiento de transitabilidad vehicular y peatonal distrito de San Pablo. (UE: MINTRA-PTP)**

Inversión: S/ 0.8 MM

Fecha de culminación: mayo 2018

- **10 intervenciones de limpieza y descolmatación de canales y bocatomas en los distritos de Pomahuaca, Chirinos, Bellavista y San Felipe (UE: MINAGRI-PEJSIB)**

Inversión: S/ 3.5 MM

Fecha de culminación: Entre enero y marzo del 2018

PRINCIPALES INTERVENCIONES CULMINADAS

HUANCAVELICA




- **Intervenciones de defensa ribereña en el Río Paccari y río Cusicancha (UE: MINTRA-PTP)**
Inversión: S/ 1.3 MM
Fecha de culminación: Entre enero y marzo del 2018
- **05 intervenciones de mejoramiento de pistas y veredas en los distritos de Acobamba y Marcas. (UE: MINTRA-PTP)**
Inversión: S/ 2.6 MM
Fecha de culminación: Entre enero y marzo del 2018.
- **02 intervenciones de saneamiento en el CP de Curimaray y Sector Casa Blanca. (UE: MINTRA-PTP)**
Inversión: S/ 1.5 MM
Fecha de culminación: Entre enero y marzo del 2018
- **08 intervenciones de descolmatación de canales en los distritos de Ayahuanca, Carapo - Huancasancos y Víctor Fajardo (UE: MINTRA-PTP)**
Inversión: S/ 0.8 MM
Fecha de culminación: Entre enero y marzo del 2018
- **03 intervenciones de mejoramiento de pistas y veredas en el distrito de Anchihua (UE: MINTRA-PTP)**
Inversión: S/ 1.4 MM
Fecha de culminación: Entre enero y marzo del 2018

HUANCAVELICA



- **Protección contra inundaciones de poblados en Anchaclla, Lircay y Ocopa. Estudio de impacto ambiental aprobado. (UE: GORE HUANCAVELICA)**
Inversión: S/ 43.9 MM
En proceso de saneamiento físico – legal

AYACUCHO



- **Recuperación de transitabilidad vehicular en tramos de la calle Coronel Víctor Fajardo y Jirón Colca del distrito de Alcamenca (UE: MD Alcamenca)**
Inversión: S/ 3.3 MM
Fecha estimada de inicio: septiembre 2018
Fecha estimada de culminación: enero 2019

AREQUIPA, CAJAMARCA AYACUCHO, ICA, JUNÍN Y HUANCAVELICA

- **Adquisición de 23 puentes modulares en Arequipa (9), Cajamarca (4), Huancavelica (4), Ayacucho (3), Ica (3). (UE: MTC – PVD)**
Inversión 2018: S/ 24.3 MM (Inversión multianual S/ 48.5 MM)
Fecha estimada de inicio: septiembre 2018
Fecha estimada de adquisición: diciembre 2018

PRINCIPALES INTERVENCIONES POR TRANSFERIR

LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN



- **Rehabilitación del servicio de agua para riego en los canales La Angostura y Bernales en Ica (UE: MINAGRI)**
Inversión: S/ 17 MM

CAMINOS VECINALES Y DEPARTAMENTALES



- **Mejoramiento del servicio de transitabilidad en San Juan Chorunga, en Río Grande (UE: GORE Arequipa)**
Inversión: S/ 29 MM
- **Mejoramiento de camino vecinal Alto Molino – La Barrera, en Río Grande (UE: GORE Arequipa)**
Inversión: S/ 24 MM
- **Recuperación de camino vecinal de Trajín – Ccarhuaccocco, en Paras (UE: GORE Ayacucho)**
Inversión: S/ 7 MM
- **Mejoramiento carretera vecinal en Chiribamba a Incachaca, en Santa Ana (UE: GORE Huancavelica)**
Inversión: S/ 3 MM

PRINCIPALES INTERVENCIONES POR TRANSFERIR

SANEAMIENTO



- **Rehabilitación de la línea de conducción de agua en Celendín, Cajamarca (UE: MVCS)**
Inversión: S/ 19 MM

CARRETERAS



- **Conservación de la infraestructura vial del corredor Pampano – Santa Inés en Huancavelica (UE: MTC)**
Inversión: S/ 36 MM
- **Conservación de la infraestructura vial del corredor Andamarca – Abra Tocto en Ayacucho (UE: MTC)**
Inversión: S/ 25 MM

SALUD



- **Mejoramiento de Establecimiento de Salud de Parcona en Ica (UE: MINSA)**
Inversión: S/ 34 MM
- **Mejoramiento de Establecimiento de Salud de Calconca en Cajamarca (UE: MINSA)**
Inversión: S/ 5 MM

PUENTES



- **Reconstrucción de los puentes Chamorro y Taralla en Chincha (UE: MTC)**
Inversión: S/ 49 MM



PERÚ

Presidencia
Del Consejo de Ministros

Autoridad para la
Reconstrucción Con Cambios

RE
CONSTRUCCIÓN
CON CAMBIOS

II. ESTADO SITUACIONAL DE LAS VIVIENDAS




III. ESTADO SITUACIONAL DE LAS SOLUCIONES INTEGRALES EN RÍOS, QUEBRADAS Y DRENAJES

SOLUCIONES DEFINITIVAS E INTEGRALES

Planes Integrales para 19 ríos, 5 quebradas y drenaje de 7 ciudades

Región	19 Ríos	5 Quebradas	7 Sistemas de drenaje
Tumbes	(1) Tumbes y (2) Zarumilla		(1) Tumbes
Piura	(3) Piura		(2) Talara, (3) Sullana, (4) Piura, (5) Paíta
Lambayeque	(4) La Leche, (5) Chancay, Lambayeque, (6) Olmos, (7) Motupe, (8) Zaña		(6) Chiclayo
La Libertad	(9) Chicama, (10) Virú	Quebradas: (1) San Ildefonso, (2) De León, (3) San Carlos	(7) Trujillo
Áncash	(11) Lacramarca, (12) Casma, (13) Huarmey		
Lima	(14) Huaura, (15) Cañete, (16) Rímac, (17) Mala	(4) Quebrada Huaycoloro	
Ica	(18) Matagente, (19) Ica	(5) Quebrada Cansas	

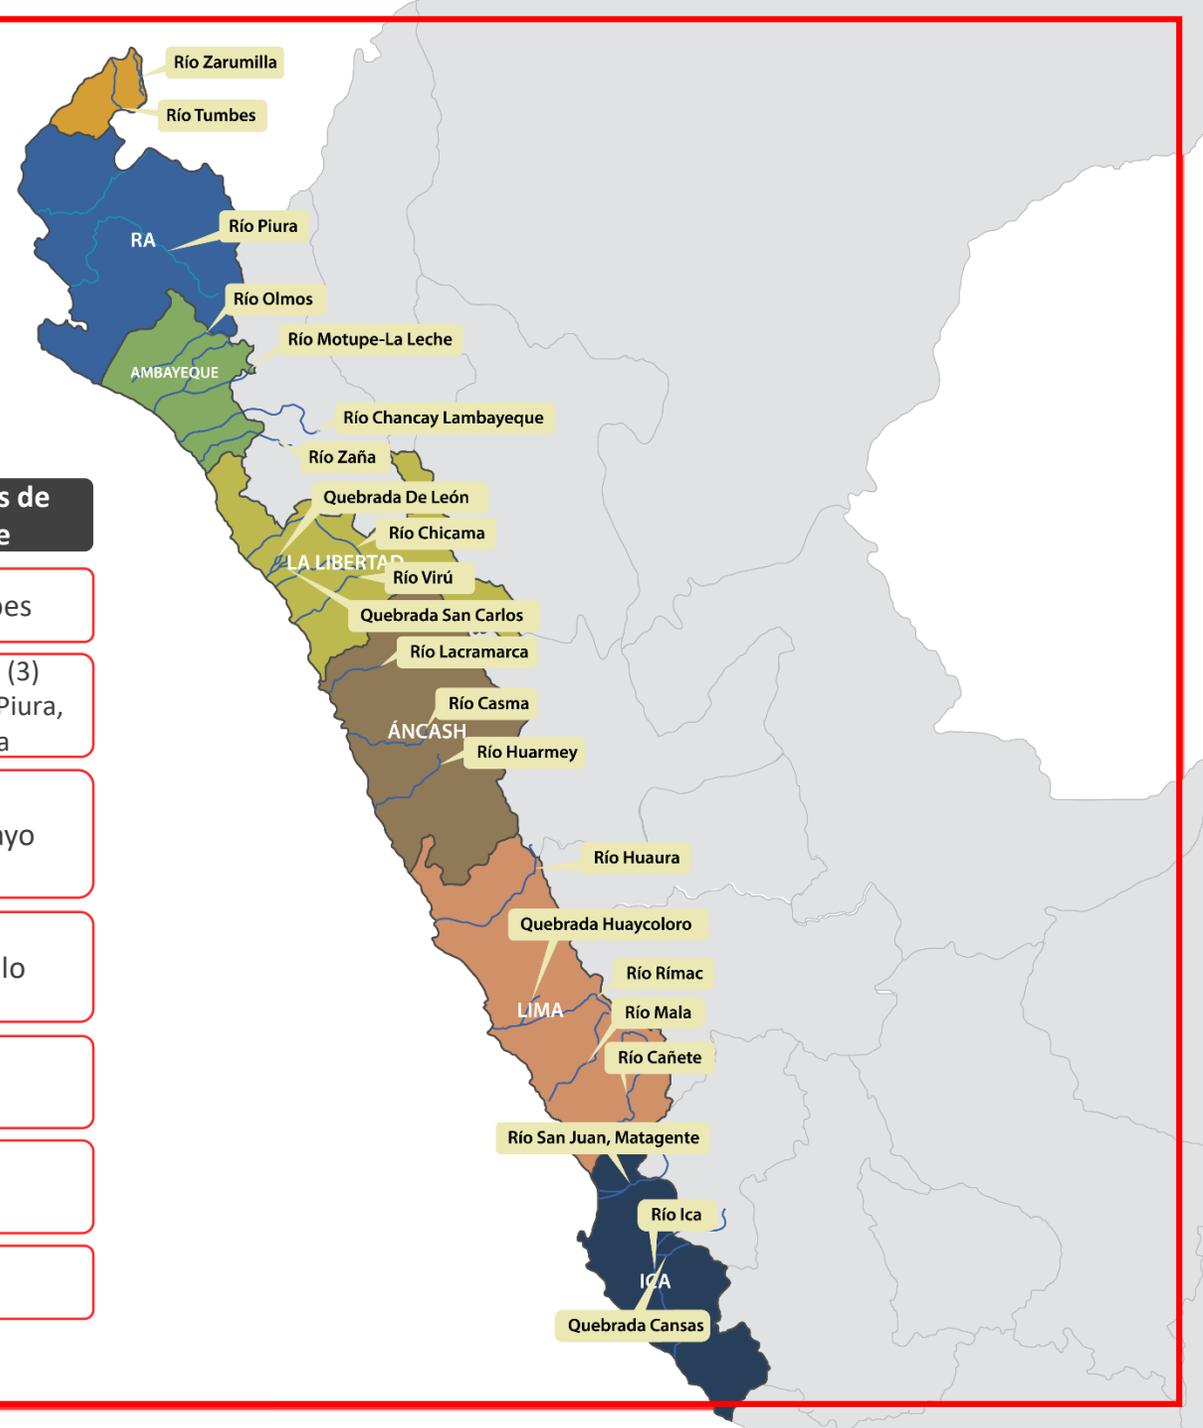

PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES

FASE DE PREINVERSIÓN

FASE DE INVERSIÓN

Términos de referencia

Modalidad de ejecución

2 productos a obtener

- Planes integrales:**
- 17 Ríos
 - 7 Drenes pluviales
 - 3 quebradas

- Público
- Oxi

Aplica Marco Normativo según corresponda

1 Plan
Plan de Control de Inundaciones y Movimientos de Masas de Ríos

2 Perfiles

Componentes "A"
Reducción del riesgo al 60% en la cuenca – 04 perfiles:
Def. Riber.: Enrocados, gaviones, espigones

Componentes "B"
Mitigación 35% – perfiles adicionales: Presas, Reservorios, otros

Componentes "C"
Reducción del riesgo del 5% - perfiles adicionales: Forestación, reforestación

Proceso de contratación del Expediente Técnico/Obra

Modalidad de ejecución

- Obra Público
- Oxi
- Estado-Estado

Implementado solo con perfil viable, ya que este será el costo tope del valor referencial con estudios básicos y prediseños.

30 DC

Componente "A" "B" y "C"
210 DC + 60 DC

COMPONENTES DE LA SOLUCIÓN INTEGRAL

Perfiles componentes

A


Defensas ribereñas; espigones; diques transversales; barreras dinámicas; diques de contención; construcción, habilitación y mejoramiento de drenes; captación; derivación y almacenamiento temporal en zonas de depresión natural y similares.



Perfiles componentes

B

Estructuras de almacenamientos, regulación y laminación; presas; pequeños y medianos reservorios y similares.

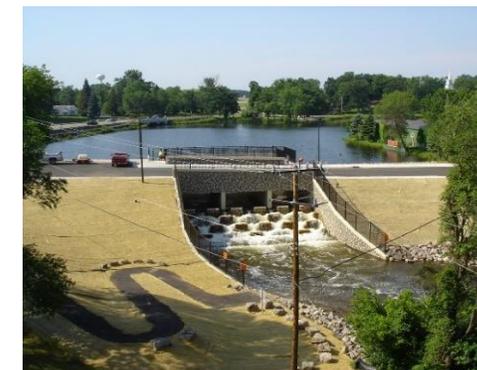

Perfiles componentes

C

Tratamiento de cárcavas; forestación y reforestación; ordenamiento del uso de suelo; sistemas de alerta temprana; reubicación de poblaciones y actividades situadas en áreas de riesgo; programas de formación y capacitación de líderes de comunidades apoyándolos para enfrentar eventos extremos; terrazas; andenes y similares.



1 Determina el alcance del Convenio

- Elaboración de términos y el alcance de los servicios requeridos



2 Pre-Calificación

Preselección de gobiernos:

- Marco legal
- Políticas anticorrupción, transparencia y eficiencia.
- Experiencia previa en obras de igual o mayor alcance.



3 Recepción de Expresión de Interés

- Se invita a los Estados a presentar propuestas.
- Estados interesados remiten propuesta, compromiso de integralidad y confidencialidad.

4 Evaluación de propuestas

- Evaluación de capacidades
- Plan de Ejecución
- Gestión de proyecto



5 Elección de mejor oferta

- Se comparan condiciones ofrecidas por los Estados interesados y selecciona la que presente mas ventajas para el Estado peruano.




6 Suscripción de convenio


- Negociación y firma de convenio Estado - Estado
- Inicio de Fase de Inversión, Expediente Técnico y ejecución de obra

PLAZO REFERENCIAL DEL PROCESO - 90 DIAS CALENDARIO

PLAN INTEGRAL RÍO PIURA: POSIBLES INTERVENCIONES EN RÍO Y DRENAJE PLUVIAL

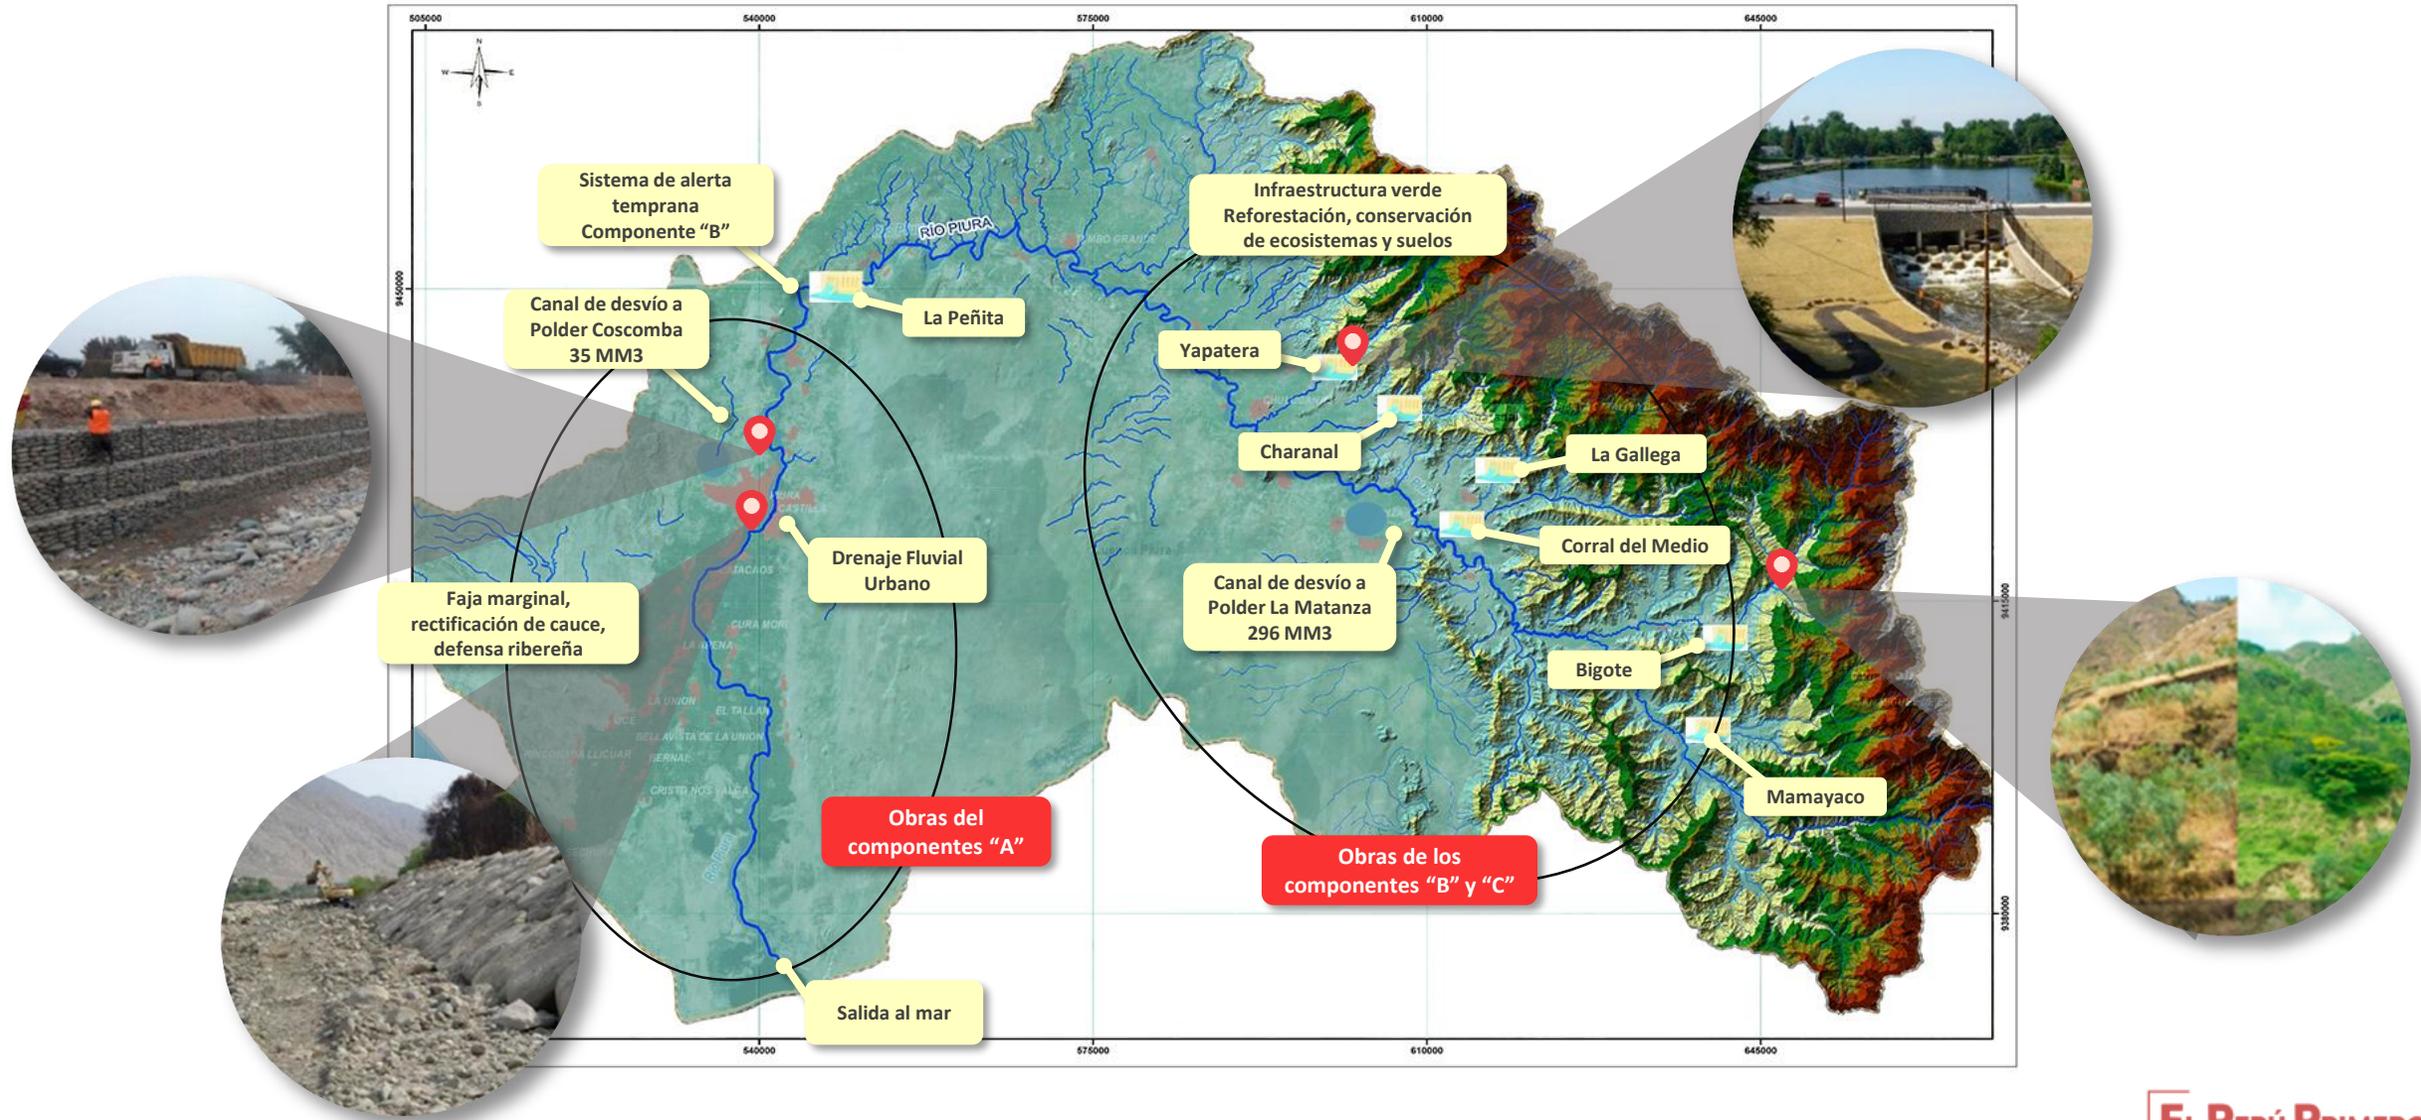

PLAN INTEGRAL RÍO LA LECHE: PROPUESTA HIDRÁULICA

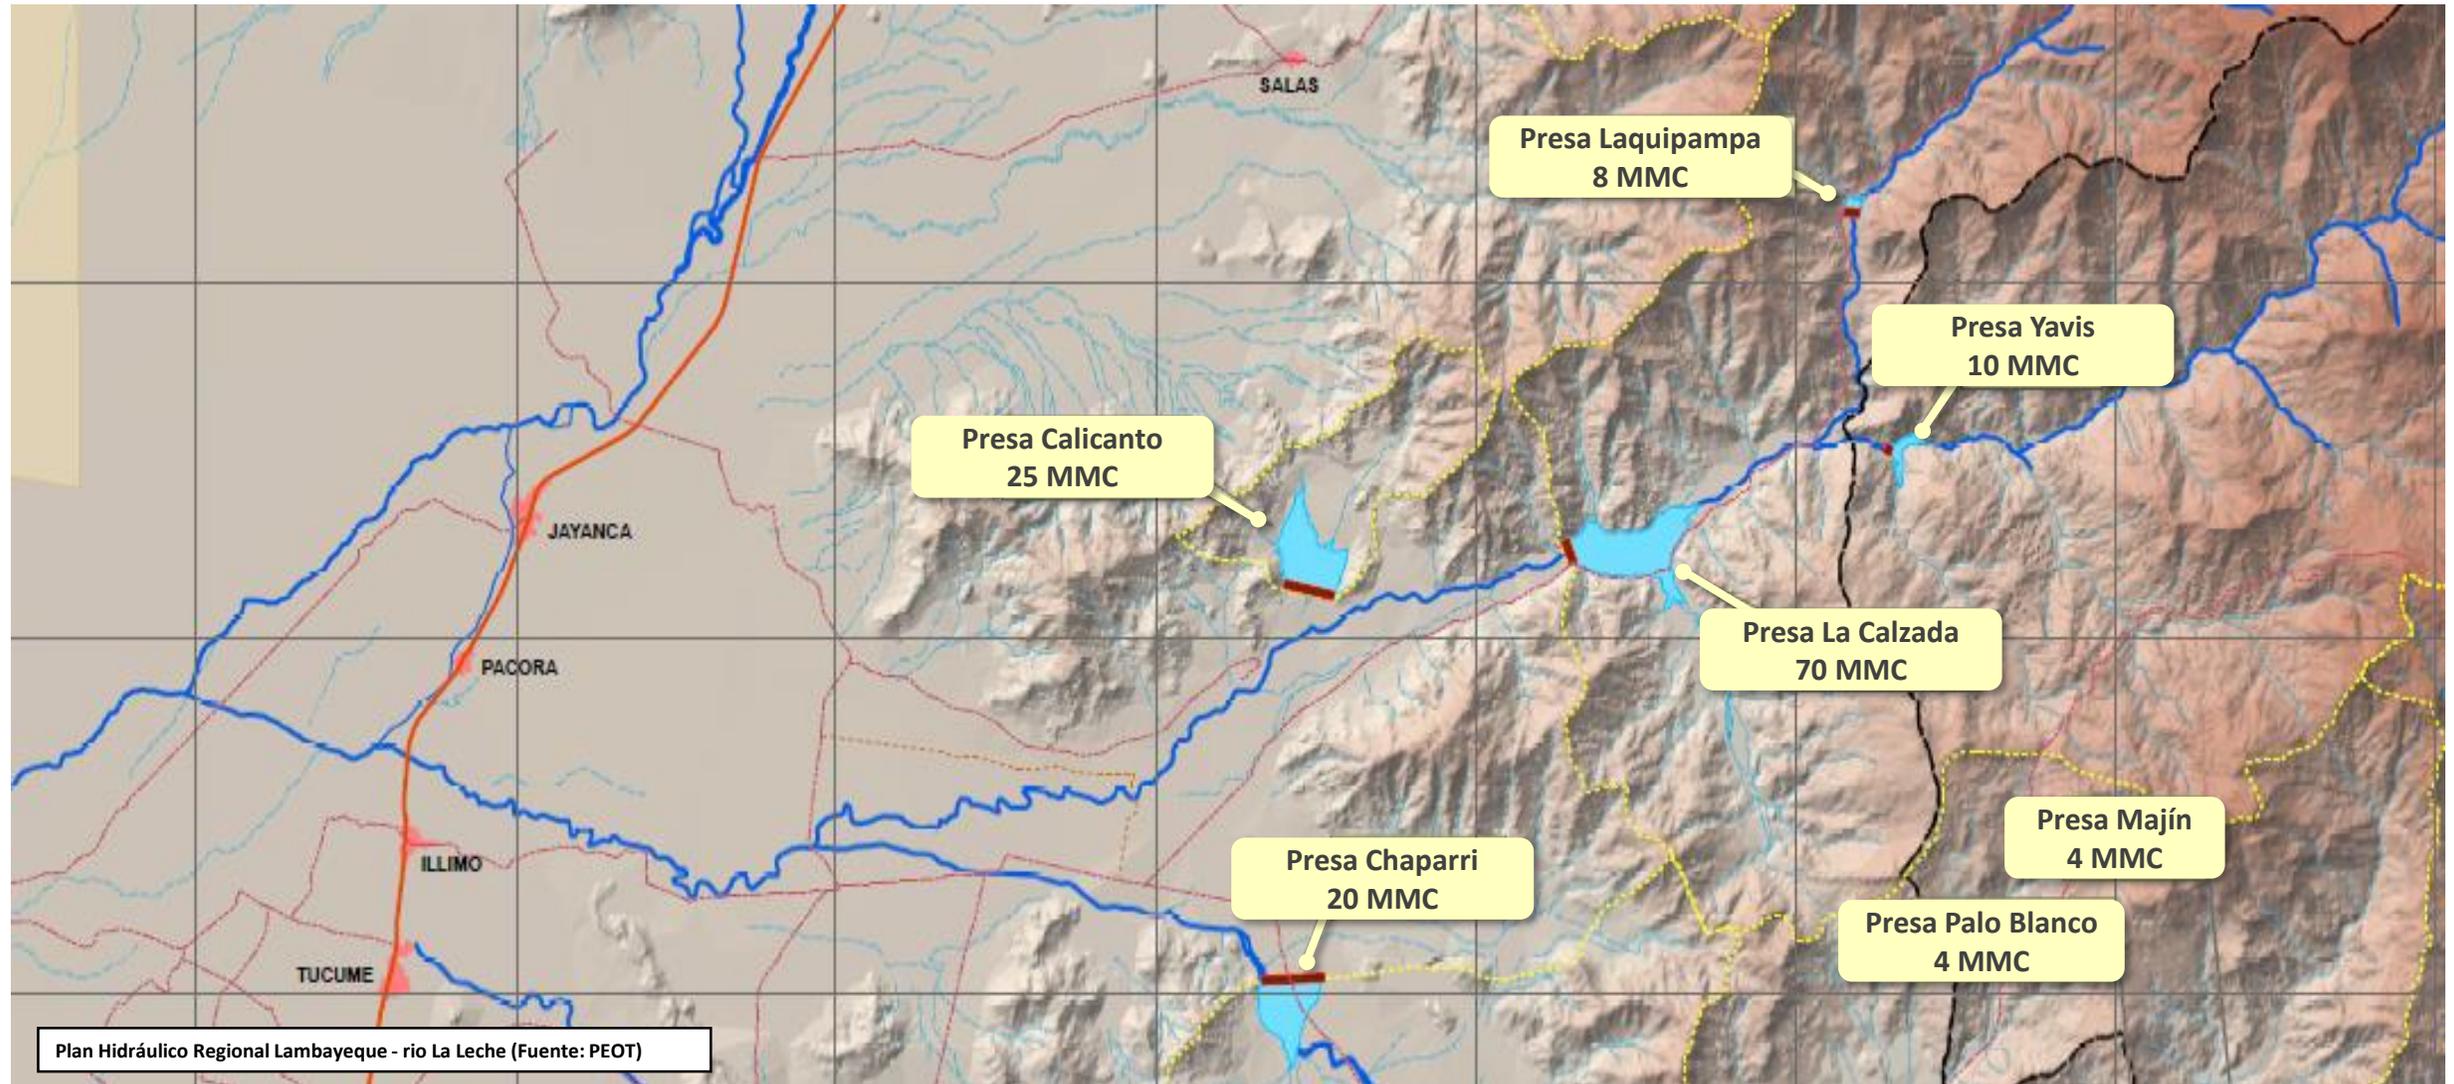

PRINCIPALES INTERVENCIONES CULMINADAS

DEFENSAS RIBEREÑAS



- **Rehabilitación del dique derecho del río Piura (UE: GORE Piura)**
Inversión: S/ 7.2 MM
Fecha de culminación: mayo 2018

PRINCIPALES INTERVENCIONES EN EJECUCIÓN

RESERVORIOS



- **Ampliación del reservorio Poechos. (UE: GORE PIURA)**
Inversión: S/ 111 MM (inversión multianual de S/ 144.4 MM)
Avance físico: 35%
Fecha estimada de culminación: febrero del 2019

PRINCIPALES INTERVENCIONES EN EJECUCIÓN

DEFENSAS RIBEREÑAS



- Intervención de rehabilitación del dique izquierdo (UE: GORE Piura)**
 Inversión: S/ 28.6 MM
 Avance físico: 90%
 Fecha estimada de culminación: agosto 2018
- Mejoramiento y ampliación del servicio de protección contra Inundaciones de las ciudades Piura y Castilla , entre el puente Cáceres y el futuro puente Integración de la margen derecha (UE: GORE Piura)**
 Inversión: S/ 43.7 MM
 Avance físico: Tramo II en proceso de replanteamiento técnico - presupuestal
 Fecha estimada de culminación: abril 2019
- Mejoramiento y ampliación del servicio de protección contra inundaciones de las ciudades Piura y Castilla en ambas márgenes del río Piura, en el tramo: represa Los Ejidos al puente Cáceres (UE: GORE Piura)**
 Inversión: S/ 61.1 MM
 Avance físico: Tramo I en proceso de replanteamiento técnico - presupuestal
 Fecha estimada de culminación: agosto 2019

PRINCIPALES INTERVENCIONES EN CONVOCATORIA

DEFENSAS RIBEREÑAS



- **Protección contra inundaciones de poblados en Anchaclla, Lircay y Ocopa. Estudio de impacto ambiental aprobado. (UE: GORE HUANCAVELICA)**
 Inversión: S/ 43.9 MM
 En proceso de saneamiento físico – legal

PRINCIPALES INTERVENCIONES EN EXPRESIÓN DE INTERÉS

DRENES



- **Rehabilitación del dren Las Monjas, en Piura. (UE: MD 26 de Octubre).**
 Inversión: S/ 60 MM
- **Rehabilitación del dren Paredes Maceda-Pumacahua-Telefónica, en Piura. (UE: MD 26 de Octubre)**
 Inversión: S/ 15 MM.
- **Mejoramiento del dren Maldonado, en Piura. (UE: MD 26 de Octubre).**
 Inversión: S/ 30 MM.

**SOLUCIONES
INTEGRALES****Estudios**

- Formulación del Plan Maestro y perfiles para la solución definitiva de la cuenca del río Piura y del drenaje pluvial de la ciudad (UE: GORE Piura, S/ 15 MM)
- Formulación de los Planes integrales y perfiles para el control de inundaciones y movimientos de masas de los ríos: Tumbes, Olmos, Motupe, Zaña, Chicama, Virú, Lacramarca, Huarmey, Huaura, Rímac, Mala, Cañete, San Juan (Matagente – río Seco), (UE: MINAGRI S/ 158.9 MM)
- Formulación de Planes Maestros de drenaje pluvial de las ciudades de: Tumbes, Sullana, Paíta, Chiclayo, Trujillo (UE: MVCS S/ 38.1 MM)
- Actualización del perfil y elaboración del expediente técnico del proyecto de drenaje “Franja central” de la ciudad de Piura (UE: MVCS, S/ 5 MM).
- Formulación de perfiles para el control de inundaciones de las quebradas: San Carlos y El León (UE: GORE La Libertad S/ 6.2 MM)

SOLUCIONES
INTEGRALES**Obras**

- Construcción de defensas ribereñas en el río Zarumilla (UE: MINAGRI S/ 137 MM)
- Construcción del sistema de control de inundaciones del río Ica y quebrada Cansas (UE: GORE Ica, S/ 205 MM)
- Reparación del Canal Dren Gullman, Canal de Drenaje 06 de setiembre y Dren Sullana (UE: MP PIURA, S/. 9.3 MM)
- Proyecto para el control de inundaciones de la quebrada San Ildefonso (UE: GORE La Libertad – Oxl - S/ 230 MM)
- Proyecto para el control de inundaciones quebrada Huaycoloro (UE: MCVS S/ 140 MM)



PERÚ

Presidencia
Del Consejo de Ministros

Autoridad para la
Reconstrucción Con Cambios

RE
CONSTRUCCIÓN
CON CAMBIOS

IV. ACCIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES

SOLUCIONES INTEGRALES-ACCIONES DE PREVENCIÓN 2018

OBJETIVO: Proteger y liberar zonas de alto riesgo y evitar ocupaciones en cauces de ríos

1 Ejecución de 24 proyectos para atender 57 puntos críticos en ríos

S/ 200 MM

- **UNIDAD EJECUTORA: MINAGRI – PSI**
- En 16 ríos y 64 Km. con defensas ribereñas definitivas.
Fecha culminación: DIC 2018

2 Delimitación y monumentación de fajas marginales

- **UNIDAD EJECUTORA: AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA**
- Se atenderán 19 ríos considerados en el Plan para soluciones integrales

TODAS LAS ACCIONES PLANTEADAS EN LAS SOLUCIONES INTEGRALES CONTRIBUYEN A LA PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES, DERIVADOS DE FUTUROS EVENTOS NATURALES EN EL MARCO DEL PIRCC

PIURA

ITEMS	RIO	SECTOR	INTERVENCIONES
1	Piura	Simbila y Viduque	Enrocado de talud (Margen Izquierda)
2	Piura	San Vicente-San Rafael	Espigones de roca (Margen Izquierda)
3	Piura	Olivares-Parales	Dique con Espigones de roca (Margen derecha)
4	Piura	La Cordillera	Enrocado de talud y espigones (Margen derecha)
5	Piura	Caserío Vicus	Dique enrocado (Margen Izquierda)

TUMBES

ITEMS	RIO	SECTOR	INTERVENCIÓN
1	Tumbes	Malval	Dique enrocado (Margen Izquierda)
2	Tumbes	Bellavista-Noria	Dique enrocado (Margen Izquierda)
3	Tumbes	Bellavista	Dique enrocado (Margen Izquierda)
4	Tumbes	El Palmar I	Dique enrocado (Margen Izquierda)
5	Tumbes	Pampa Grande	Dique enrocado (Margen derecha)
6	Tumbes	La Tuna	Dique enrocado (Margen Izquierda)
7	Tumbes	La Tuna-Romero	Dique enrocado (Margen derecha)
8	Zarumilla	Los Correas	Espigones de roca (Margen Izquierda)
9	Zarumilla	Los Correas	Espigones de roca (Margen Izquierda)
10	Zarumilla	Los Correas	Espigones de roca (Margen Izquierda)
11	Zarumilla	Los Aguchos	Conformación de dique (Margen Izquierda)
12	Zarumilla	Los Aguchos	Enrocado (Margen Izquierda)
13	Zarumilla	Los Aguchos	Espigones de roca (Margen Izquierda)

PUNTOS CRÍTICOS-INTERVENCIONES EN 16 RÍOS

LAMBAYEQUE

ITEMS	RIO	SECTOR	INTERVENCIONES
1	Motupe	Higuerón	Dique con enrocado (Margen Izquierda)
2	Motupe	Tres Tomas	Dique con enrocado
3	Motupe	La Arena	Dique con enrocado (Margen derecha)
4	Motupe	Las Juntas	Dique con enrocado (Margen derecha)
5	Motupe	Marripon	Dique con enrocado (Margen Izquierda)
6	Motupe	Arrozal	Dique con enrocado (Margen derecha)
7	La Leche	San Juan	Dique con enrocado (Margen Izquierda)
8	La Leche	Mayascón	Dique con enrocado (Margen Izquierda)
9	La Leche	El Palto	Dique con enrocado (Margen Izquierda)
10	La Leche	El Culpón	Dique con enrocado (Margen Izquierda)
11	La Leche	Caserío Las Juntas Bajo-Señor de Luren	Dique con enrocado (Margen Izquierda)
12	Olmos	La Juliana	Dique con enrocado (Margen Izquierda)
13	Olmos	Toma de río	Dique enrocado (Margen derecha)
14	Olmos	Nueva Esperanza	Dique enrocado (Margen Izquierda)
15	Zaña	La Leonera (Tramo I)	Dique enrocado (Margen derecha)
16	Zaña	Santa Rosa-Mocupe	Dique enrocado (Margen Izquierda)
17	Zaña	Las Vegas	Dique enrocado (Margen derecha)
18	Zaña	Caserío Pozo I	Dique enrocado (Margen derecha)

LA LIBERTAD

ITEMS	RIO	SECTOR	INTERVENCIONES
1	Chicama	Galaxia-Pampa Hermosa	Dique enrocado (Margen Izquierda)
2	Chicama	Paijan -Facala	Enrocado (Margen derecha)
3	Chicama	Alayo	Enrocado(Margen derecha)
4	Chicama	Alayo	Enrocado (Margen derecha)
5	Chicama	Puente Victoria aguas abajo	Enrocado (Margen Izquierda)
6	Viru	Zaraque - Toma Sta Clara aguas arriba	Dique enrocado (Margen Izquierda)
7	Viru	Toma Carmelo	Dique enrocado (Margen derecha)
8	Viru	María Laura (tramo 1)	Dique enrocado (Margen derecha)

PUNTOS CRÍTICOS-INTERVENCIONES EN 16 RÍOS

ÁNCASH

ITEMS	RIO	SECTOR	INTERVENCIONES
1	Lacramarca	Curva-El Milagro	Dique enrocado (ambas márgenes)
2	Casma	Casablanca-Hualgayoc	Dique enrocado (ambas márgenes)
3	Huarmey	El Arenal - Puente Panamericana	Dique enrocado (ambas márgenes)

LIMA

ITEMS	RIO	SECTOR	INTERVENCIONES
1	Rímac	Carapongo	Dique enrocado (Margen derecha)
2	Rímac	La Estrella	Dique enrocado (Margen Izquierda)
3	Rímac	Castrillejo - Malecón	Dique enrocado (Margen Izquierda)
4	Rímac	Nueva Alianza	Dique enrocado (Margen Izquierda)
5	Rímac	Los ángeles	Dique enrocado (Margen Izquierda)

PUNTOS CRÍTICOS-INTERVENCIONES EN 16 RÍOS

ICA

ITEMS	RIO	SECTOR	INTERVENCIONES
1	Ica	Tiraxi	Dique enrocado (Margen derecha)
2	Ica	Montalván	Dique enrocado (Margen Izquierda)
3	Ica	Trapiche	Dique enrocado (Margen Izquierda)
4	Matagente	San Carlos-Sra Vargas	Dique enrocado (Margen derecha)
5	Chico	C.P San Francisco	Dique enrocado (Margen Izquierda)



Anexos

RE
CONSTRUCCIÓN
CON CAMBIOS

Distribución de **recursos en S/ MM** (setiembre 2017)




Total PIRCC **S/ 25,655 MM**



Distribución **intervenciones** según nivel de gobierno ejecutor (**% y N°**)

PIRCC Inicial (12,761)
(Setiembre 2017)

PIRCC Modificado (12,514)
(Julio 2018)

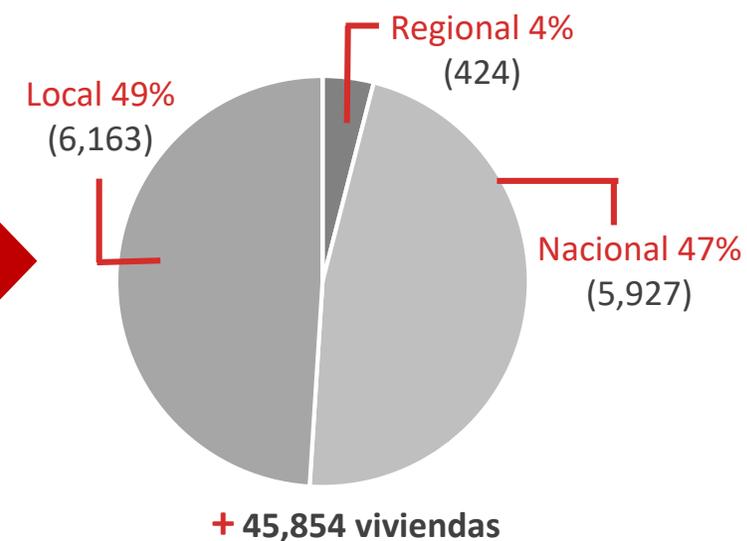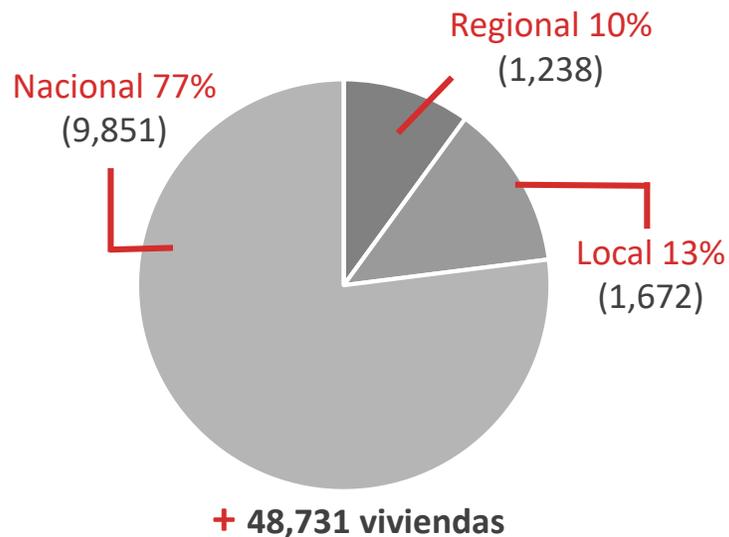

Número de **ejecutores**

Gobierno Nacional:
5 ejecutoras

Gobierno Regional:
10 ejecutoras

Gobierno Local:
708 ejecutoras

Programación de la ejecución: S/ 4,361 MM.

MÁS DE

2,500

PROYECTOS A SER FINANCIADOS



AGRICULTURA

S/ 200 MM

34 proyectos



EDUCACIÓN

S/ 150 MM

708 proyectos



PISTAS Y VEREDAS

S/ 477 MM

699 proyectos



SALUD

S/ 179 MM

118 proyectos



SANEAMIENTO

S/ 224 MM

428 proyectos



TRANSPORTES

S/ 916 MM

159 proyectos



PREVENCIÓN

S/ 1,196 MM

535 proyectos



ESTUDIOS*


S/ 252 MM

26

✓ **Más de 33 mil** viviendas convocadas (100% del total).


Ejecución Financiera: Total (*)

TOTAL RECONSTRUCCIÓN 2017-2018 (Montos en S/ MM)

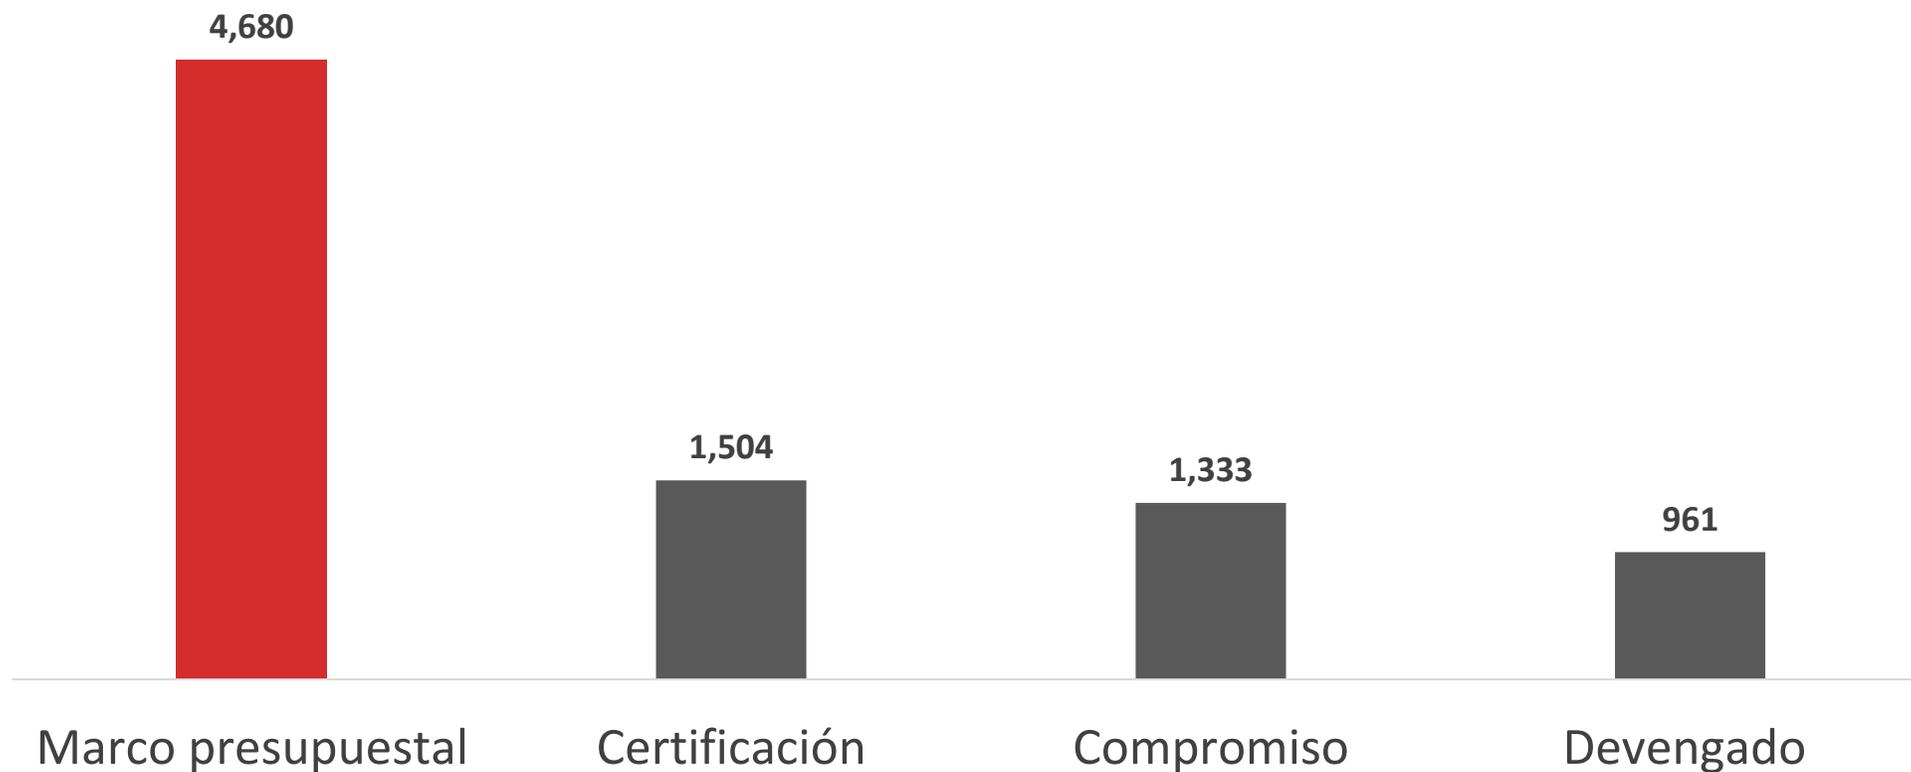


Ejecución Financiera: Total (*)

2017
(En S/ MM)

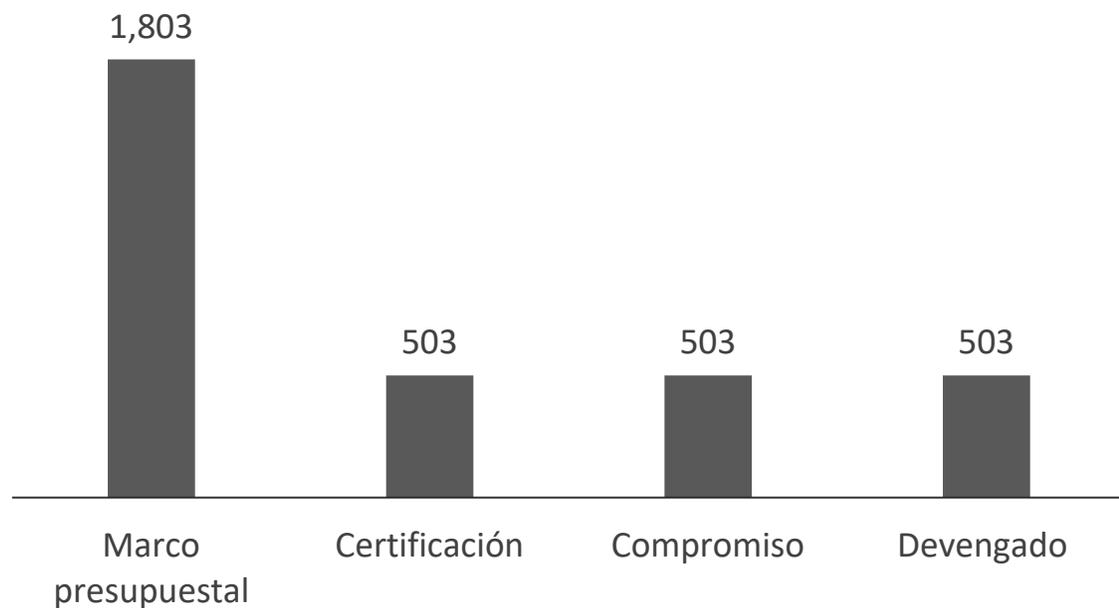


2018
(En S/ MM)

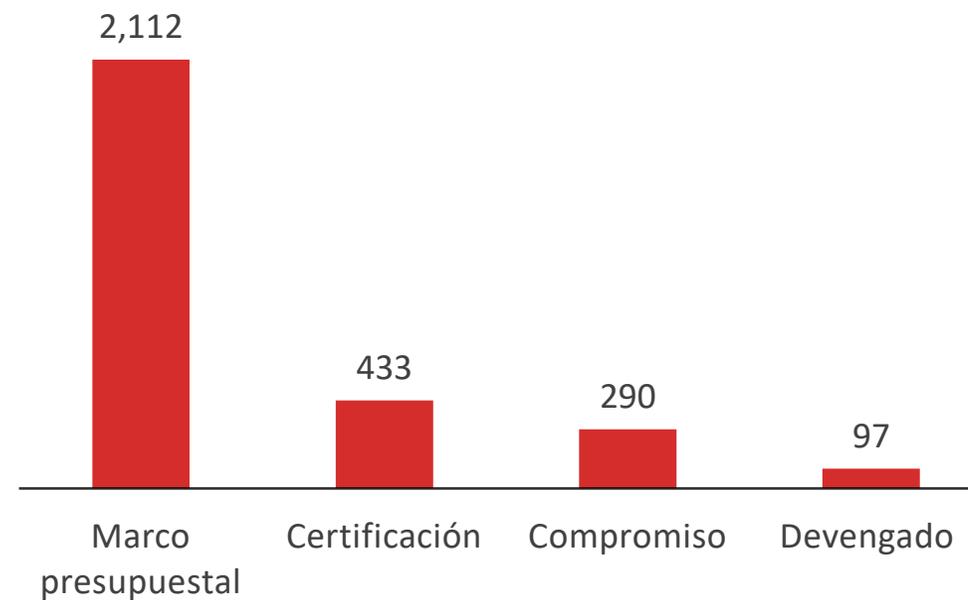


Ejecución Financiera por niveles de Gobierno

NIVEL DE GOBIERNO 2017
(En S/ MM)

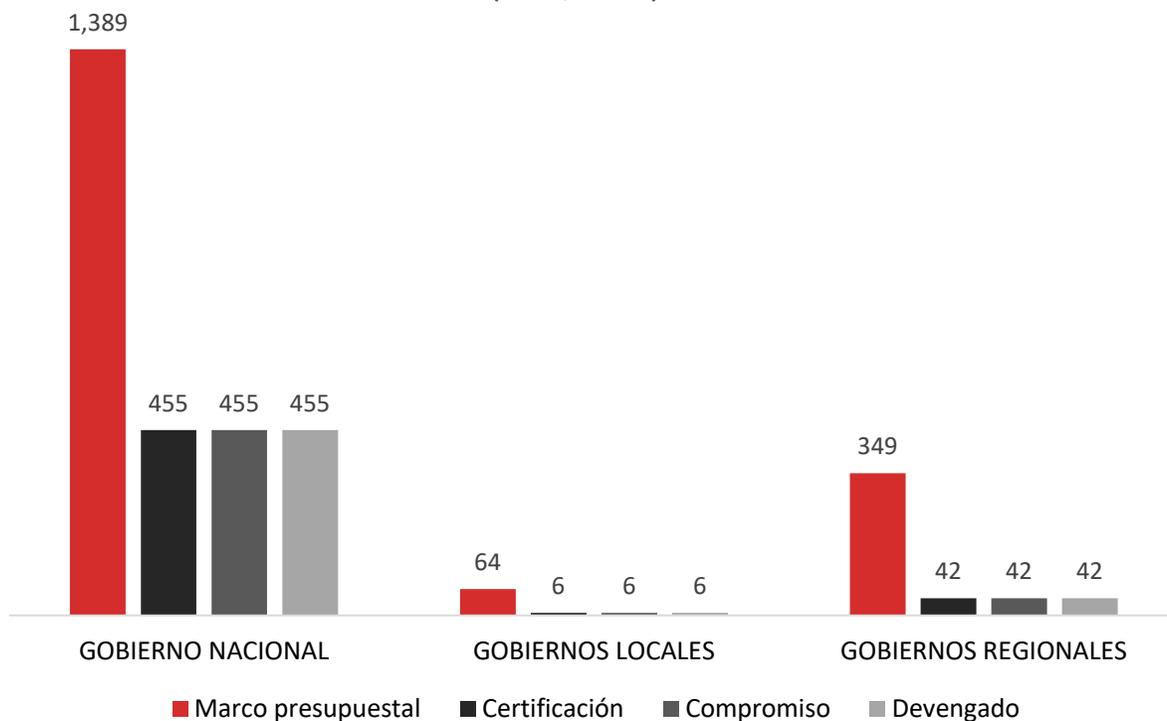

NIVEL DE GOBIERNO 2018
(En S/ MM)

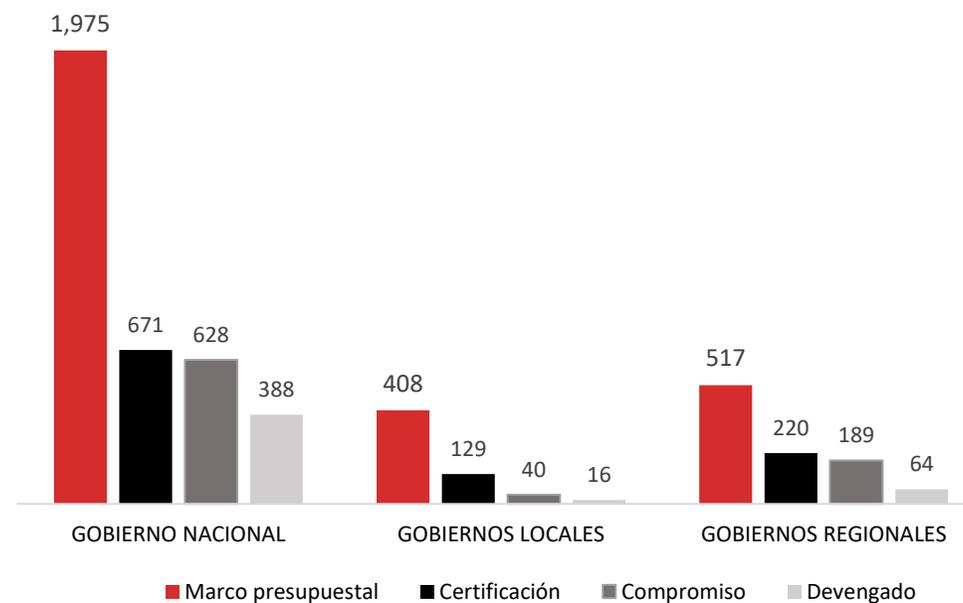

Ejecución Financiera por Departamentos

RECONSTRUCCIÓN POR DEPARTAMENTOS 2018 (En S/ MM)

