



Gobierno del Perú

# AVANCE, CUMPLIMIENTO Y PROGRAMACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS

*Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República*

Edgar Quispe Remón  
Director Ejecutivo

22 de Mayo de 2018

**EL PERÚ PRIMERO**



## CONTENIDO

1. El rol de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios
2. Ejes de actuación
3. Avances del Plan Integral de la Reconstrucción con Cambios
  - 3.1 Transferencias
  - 3.2 Ejecución física
  - 3.3 Ejecución financiera
4. Programación 2018
5. La transparencia en la Reconstrucción

# 1. EL ROL DE LA AUTORIDAD

## LIDERA

La reconstrucción de la infraestructura pública y la prevención para el control de inundaciones con un enfoque integral

## ARTICULA

Las intervenciones multisectoriales de 5 ministerios, GR y GL de 13 regiones

## MONITOREA

La ejecución y transparencia del plan

## PROMUEVE E IMPULSA

La generación de proyectos de inversión

## FORTALECE

Las capacidades de los ejecutores



### 13 Regiones

- Gobiernos Regionales
- Gobiernos Locales
- 881 Municipalidades



### 5 Ministerios

- Vivienda
- Transportes y Comunicaciones
- Agricultura
- Educación
- Salud

## 2. EJES DE ACTUACIÓN



# PLAN INTEGRAL DE LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS



Contamos con un plan que refleja los daños causados por el FEN

Total PIRCC **S/ 25,655 MM**


Distribución de recursos en **S/ MM** (setiembre 2017)



Distribución territorial de intervenciones (% y N°)

## PIRCC Inicial (12,761)


(Setiembre 2017)



+ 48,731 viviendas

## PIRCC Modificado (12,514)

(Mayo 2018)

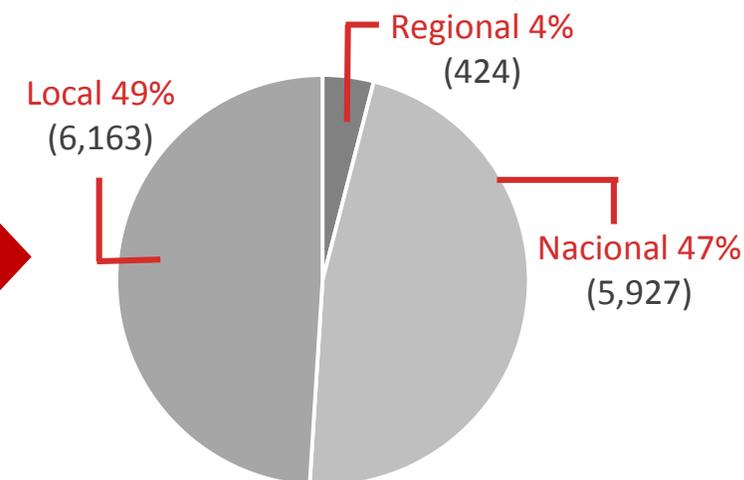

+ 45,854 viviendas

Número de **ejecutores**

Gobierno Nacional:  
5 ejecutoras

Gobierno Regional:  
10 ejecutoras

Gobierno Local:  
708 ejecutoras


## 3. AVANCES EN EL PIRCC

### 3.1 Transferencias

A la fecha, hemos asignado recursos a la reconstrucción y a la prevención con énfasis en la atención de sectores críticos.

#### Recursos del FONDES transferidos a ejecutores

(junio 2017 – Mayo 2018)

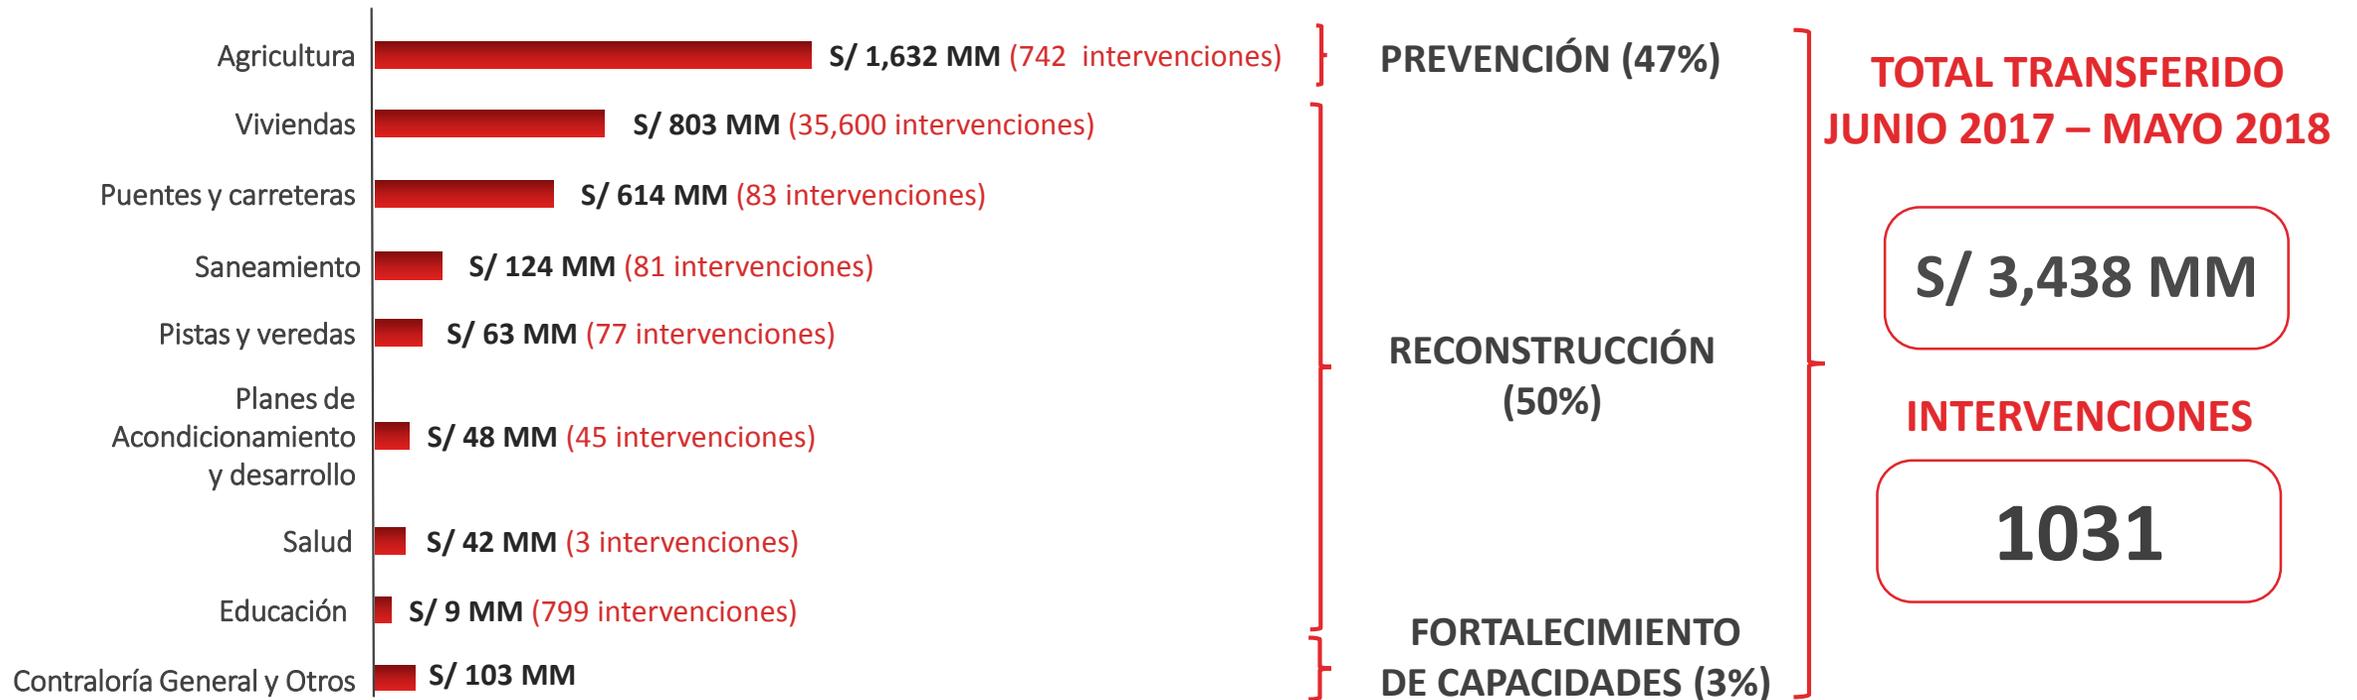

### 3. AVANCES EN EL PIRCC

A mayo de 2018, se vienen ejecutando las siguientes acciones en Prevención y Reconstrucción

<b>TOTAL</b>	▶	522 intervenciones	S/ 2,859 MM
PREVENCIÓN	▶	300 intervenciones	S/ 1,291 MM
RECONSTRUCCIÓN	▶	222 intervenciones	S/ 1,568 MM
CULMINADOS	▶	332 intervenciones	S/ 957 MM

#### 3.2 Ejecución Física: Prevención (I Etapa) – Necesidad Inmediata

- 300 intervenciones por S/, 1,291 MM
- Se ha concluido con la limpieza de 673 km de ríos y 85 km de quebradas; y se encuentra en ejecución la limpieza 325 km de ríos y 36 km de quebradas, entre otras actividades, que ha permitido proteger a agricultores y familias con una inversión de más de S/ 1,291 MM.

**32 ríos**  
**S/ 866 MM**

- **17 ríos concluidos**
- **15 ríos en ejecución**

**Principales ríos concluidos:**

Tumbes, Zarumilla, Chira, La Leche, Zaña, Olmos, Motupe, Virú, Cañete, Chancay, Supe, Huaura, Mala, Fortaleza, Pativilca, Santa Eulalia, Matagente.

**24 quebradas**  
**S/ 67 MM**

- **18 quebradas concluidas**
- **6 quebradas en ejecución**

**Principales quebradas concluidas:**

San Ildefonso, Yapatera, El León, Luey, Pedregal, Juana Ríos, Cansas, San Antonio de Pedregal, La Libertad y Huaycoloro.

**Otras 204 intervenciones**  
**S/ 358 MM**

- **170 intervenciones concluidos**
- **26 intervenciones en ejecución**
- **8 intervenciones por iniciar**

**Otros tipos de intervenciones concluidas:**

13 bocatomas, 128 canales, 42 defensas ribereñas, 17 drenes y 4 reservorios.

**Adicionalmente se ha emitido el DS 77 2018 EF: S/. 97 MM:** 441 intervenciones de descolmatación de 7 ríos y 16 quebradas en tramos críticos, 307 canales, 23 defensas ribereñas y 88 drenes, que se encuentran en proceso de contratación.

### 3. AVANCES EN EL PIRCC


#### 3.2 Ejecución Física: Prevención (II Etapa) - Soluciones Integrales

Hemos iniciado el diseño de soluciones integrales para que fenómenos naturales tipo FEN no generen nuevos daños

- TDR culminados para contratación de Planes Maestros de control de inundaciones y movimientos de masas para 18 ríos, 7 sistemas de drenaje y 4 quebradas.
- Estudio de Pre-Inversión por concluir (julio 2018) para la quebrada San Ildefonso, que se ejecuta mediante Obras por Impuestos (Oxi).
- Expresión de interés para ejecución mediante Oxi para quebrada Huaycoloro.
- Expresión de interés para ejecución mediante Oxi para río Huarmey-Áncash.
- Un expediente técnico para la solución del río Ica incluyendo la quebrada Cansas y otro en fase de culminación del río Zarumilla.
- Dos expedientes técnicos de infraestructura verde en el río Piura.
- Expedientes técnicos concluidos para el drenaje de la ciudad de Piura que permitirán iniciar obras en paralelo a la formulación del Plan Maestro.



Las soluciones integrales consideran una visión de cambios y un enfoque territorial

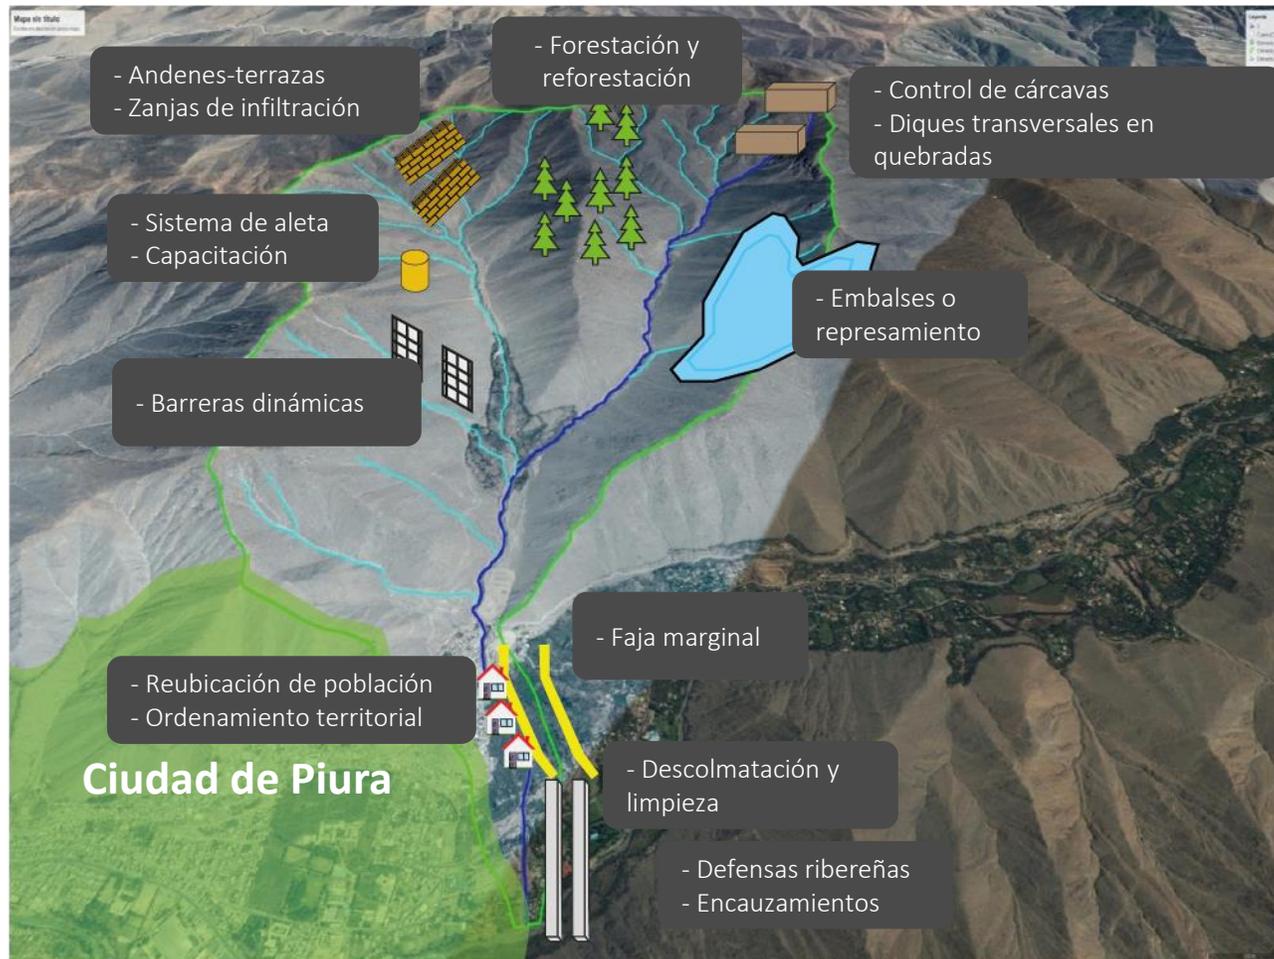


## COMPONENTES DEL PLAN MAESTRO

Su contenido mínimo incluye, entre otros:

- Levantamiento de información topográfica.
- Levantamiento de las zonas vulnerables ante inundaciones-huaycos.
- Modelación hidrológica e hidráulica.
- Propuesta de proyectos en los tres niveles de la cuenca (alta, media y baja).

### 3. AVANCES EN EL PIRCC: RECONSTRUCCIÓN

Se está ejecutando 222 intervenciones y la construcción de 35,600 viviendas como parte del proceso de **reconstrucción** por un total de S/ 1,568 MM.

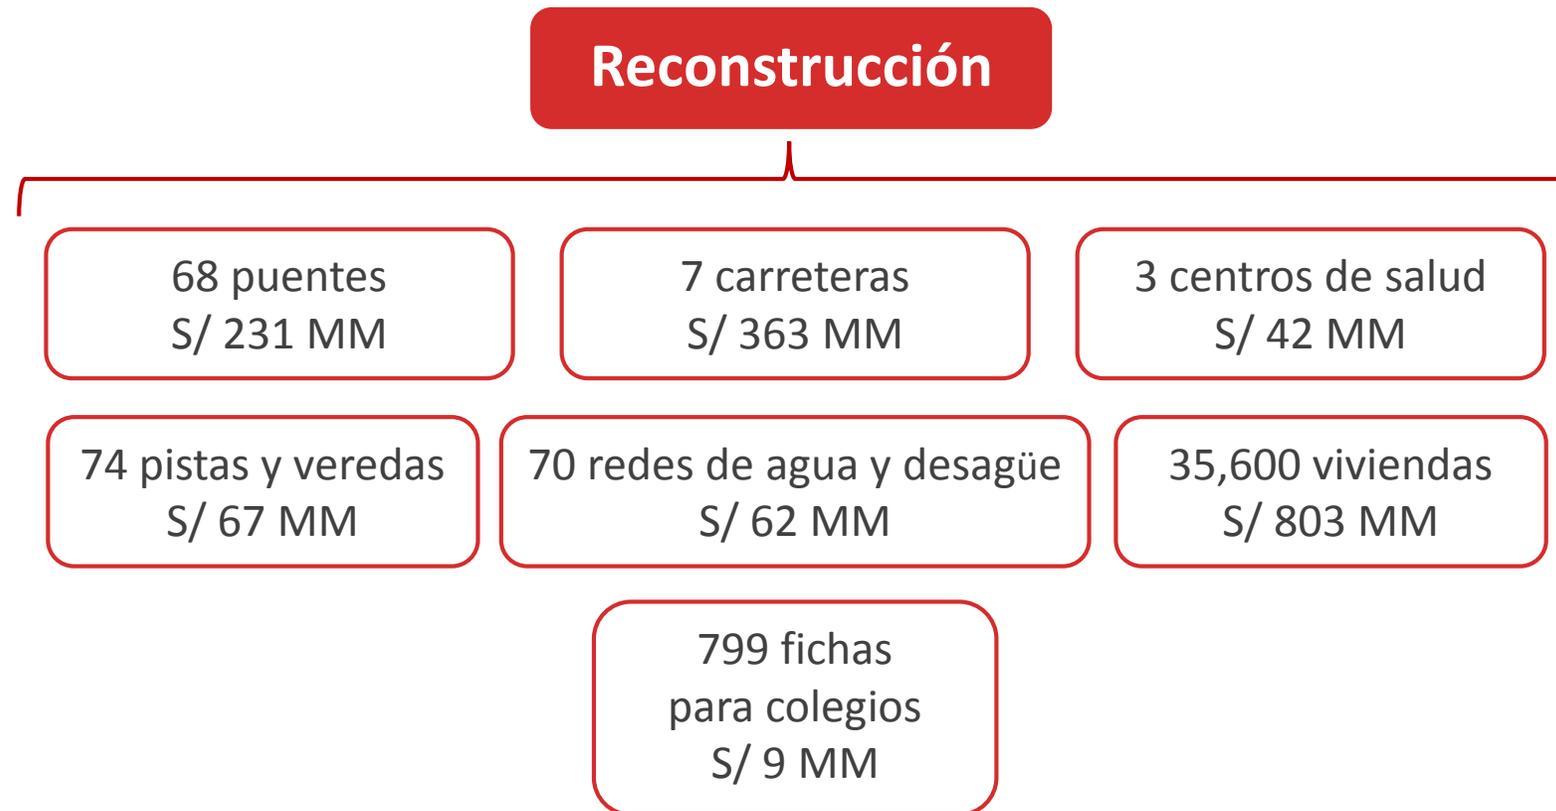

### 3. AVANCES EN EL PIRCC

#### 3.2 Ejecución Física: RECONSTRUCCIÓN

La instalación de **puentes** está recuperando la conectividad entre ciudades.

**68 puentes  
S/ 231 millones**

Tipo	Culminado	En ejecución	En contratación
<b>Puentes definitivos</b>	3 puentes por S/ 24 MM en Piura y Tumbes	1 puente por S/ 53.9 MM en Piura	13 puentes por S/ 79.2 MM en Tumbes
<b>Puentes modulares</b>	18 por S/ 47.2 MM en Áncash, Lima, La Libertad (Virú) y Piura (Independencia).	3 puentes por S/ 3,2 MM	30 puentes por S/ 23.2 MM

**ANTES**

**AHORA**



La Libertad  
Virú

**ANTES**

**AHORA**



Lima  
**Puente Choques**  
Carretera Oyón-Yanahuanca-Ambo

**ANTES**



**AHORA**



Lima  
Puente Las Torres

**ANTES**

**AHORA**



Piura  
Puente Independencia



# PIURA

Puente  
Independencia

### 3. AVANCES EN EL PIRCC

#### 3.2 Ejecución Física: RECONSTRUCCIÓN

Se viene recuperando la transitabilidad en **carreteras** con una inversión de S/ 363 millones.

**7 carreteras  
S/ 363 millones**

##### Culminado

Avenida Progreso en Piura  
por S/ 8,8 MM

**5,3 km**

##### En ejecución

- Desvío Catacaos-Óvalo Bayóvar en Piura por S/ 26,5 MM.
- Sullana-Talara en Piura por S/ 53,5 MM

**96,6 km**

##### En contratación

- Costanera (Tramos I y II) en Piura por S/ 184 MM
- La Islilla en Piura por S/ 30 MM
- Mollepata-Pallasca en Áncash por S/ 60,6 MM

**228 km**

- Adicionalmente, se ha financiado 7 intervenciones de estudios de pre-inversión, que están en proceso contratación para el mejoramiento de **caminos departamentales** por **S/ 1.9 MM** a cargo del GORE La Libertad



# PIURA

Carretera  
Sullana-Talara

**ANTES**



**AHORA**



Piura  
Carretera Sullana-Talara

**ANTES**

**AHORA**



Piura  
Av. Progreso

## 3.2 Ejecución Física: RECONSTRUCCIÓN

Se han transferido más de S/ 42 millones para el mejoramiento de 3 **hospitales** en la región Áncash de una inversión multianual de S/ 354 millones, que se encuentran próximo a convocarse por concurso oferta.

Centro de salud	Monto	Beneficiarios
Hospital de Apoyo Yungay	S/ 11,2 MM	Más de 460 mil personas
Hospital de Apoyo Antonio Caldas Domínguez (Pomabamba)	S/ 14,4 MM	Más de 1,4 millones de personas
Hospital de Apoyo San Juan de Dios (Caraz)	S/ 16,7 MM	Más de 880 mil personas

### 3. AVANCES EN EL PIRCC

#### 3.2 Ejecución Física: RECONSTRUCCIÓN

Las ciudades empiezan a recuperarse con la rehabilitación de **pistas** y **veredas**.

**74 intervenciones  
S/ 67 MM**

**50 intervenciones concluidas**  
(más de S/. 38 MM)



**Avenidas principales concluidas:** Av. Grau y Los Tallanes (Piura); Sáenz Peña (Lambayeque); Larco Herrera y Huamán (La Libertad)

**24 intervenciones en ejecución**  
(más de S/. 29 MM)



**Avenidas principales en ejecución:** Av. Prolongación Grau, Av. Cáceres e Irazola (Piura); Av. Paseo del Deporte y Elvira García (Lambayeque); Av. Jesús de Nazareth y Juan Pablo II (La Libertad)

- **3 intervenciones por iniciar obra (Más de S/ 4.6 MM):** Elaboración de ET (Av. Cayetano Heredia) en Piura por S/. 0.2 MM; Intervención de Trabaja Perú en Ancash por S/. 1.17 MM; y otra en proceso de contratación en el distrito La Victoria en Chiclayo

### 3. AVANCES EN EL PIRCC

#### 3.2 Ejecución Física: RECONSTRUCCIÓN

**Pistas y veredas,** Gobiernos regionales y locales desarrollan acciones en Piura, La Libertad y Lambayeque.



**ANTES**

**AHORA**



**Chiclayo  
Ciudad Eten**



# PIURA

Av. César Vallejo



# PIURA

Av. Tallanes



# PIURA

Av. Progreso


### 3. AVANCES EN EL PIRCC

#### 3.2 Ejecución Física: RECONSTRUCCIÓN

Los servicios de **saneamiento** se están restableciendo con intervenciones en redes de agua y desagüe en el ámbito urbano.

**70 intervenciones  
S/ 62 MM**

**26 intervenciones concluidas**  
(más de S/ 10 MM)

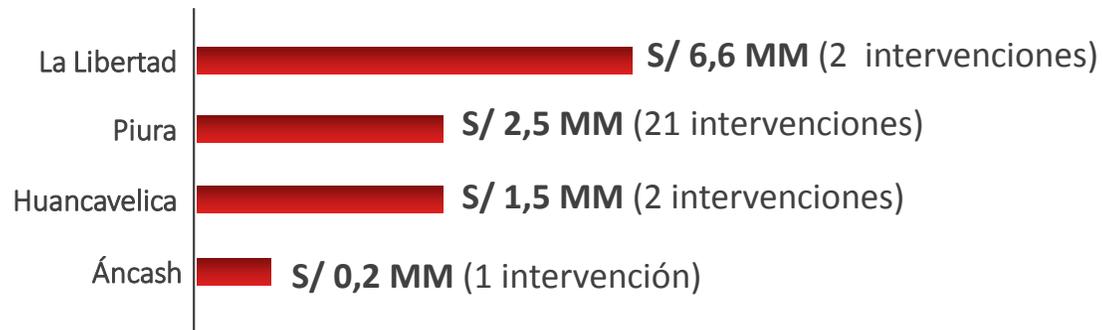

**Principales intervenciones concluidas:** Restablecimiento del servicio del sistema de saneamiento básico en 19 localidades rurales de las provincias de Ayabaca y Morropón (Piura).

**44 intervenciones en ejecución**  
(más de S/ 51 MM)



**Principales intervenciones en ejecución:** Distritos de Catacaos y Chulucanas (Piura); Pativilca, Huaral y Pampa Libre (Lima); Santa Rosa y Ricardo Palma (Lambayeque).



# PIURA

Catacaos



# PIURA

Catacaos



# LAMBAYEQUE


Pueblo joven  
Ricardo Palma

### 3. AVANCES EN EL PIRCC

#### 3.2 Ejecución Física: RECONSTRUCCIÓN

La población afectada está recuperando sus viviendas.


- **Meta:** Atender 45,854 viviendas por **S/ 1,174 MM**
- **Financiado:** 35,600 viviendas por **S/ 803 MM**
- **Por financiar:** 10,254 viviendas por **S/ 371 MM**

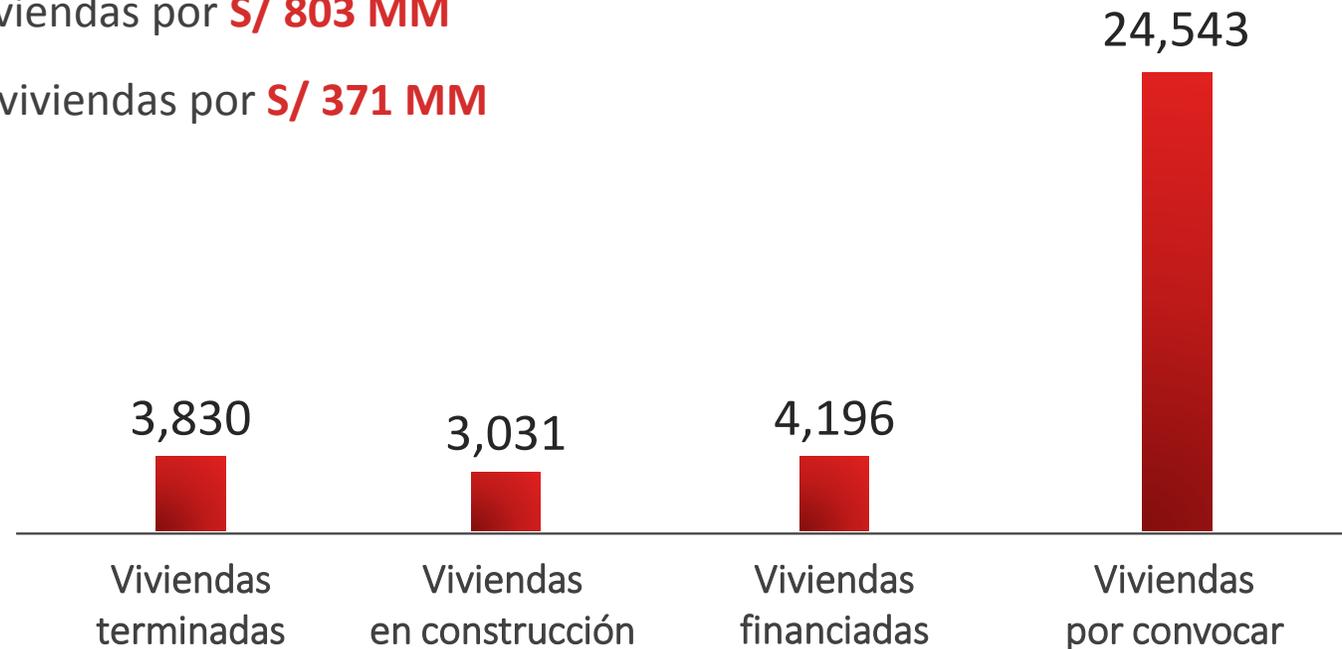

### 3. AVANCES EN EL PIRCC

#### VIVIENDAS

- Meta: **45,854**
- Concluidas: **3,830**

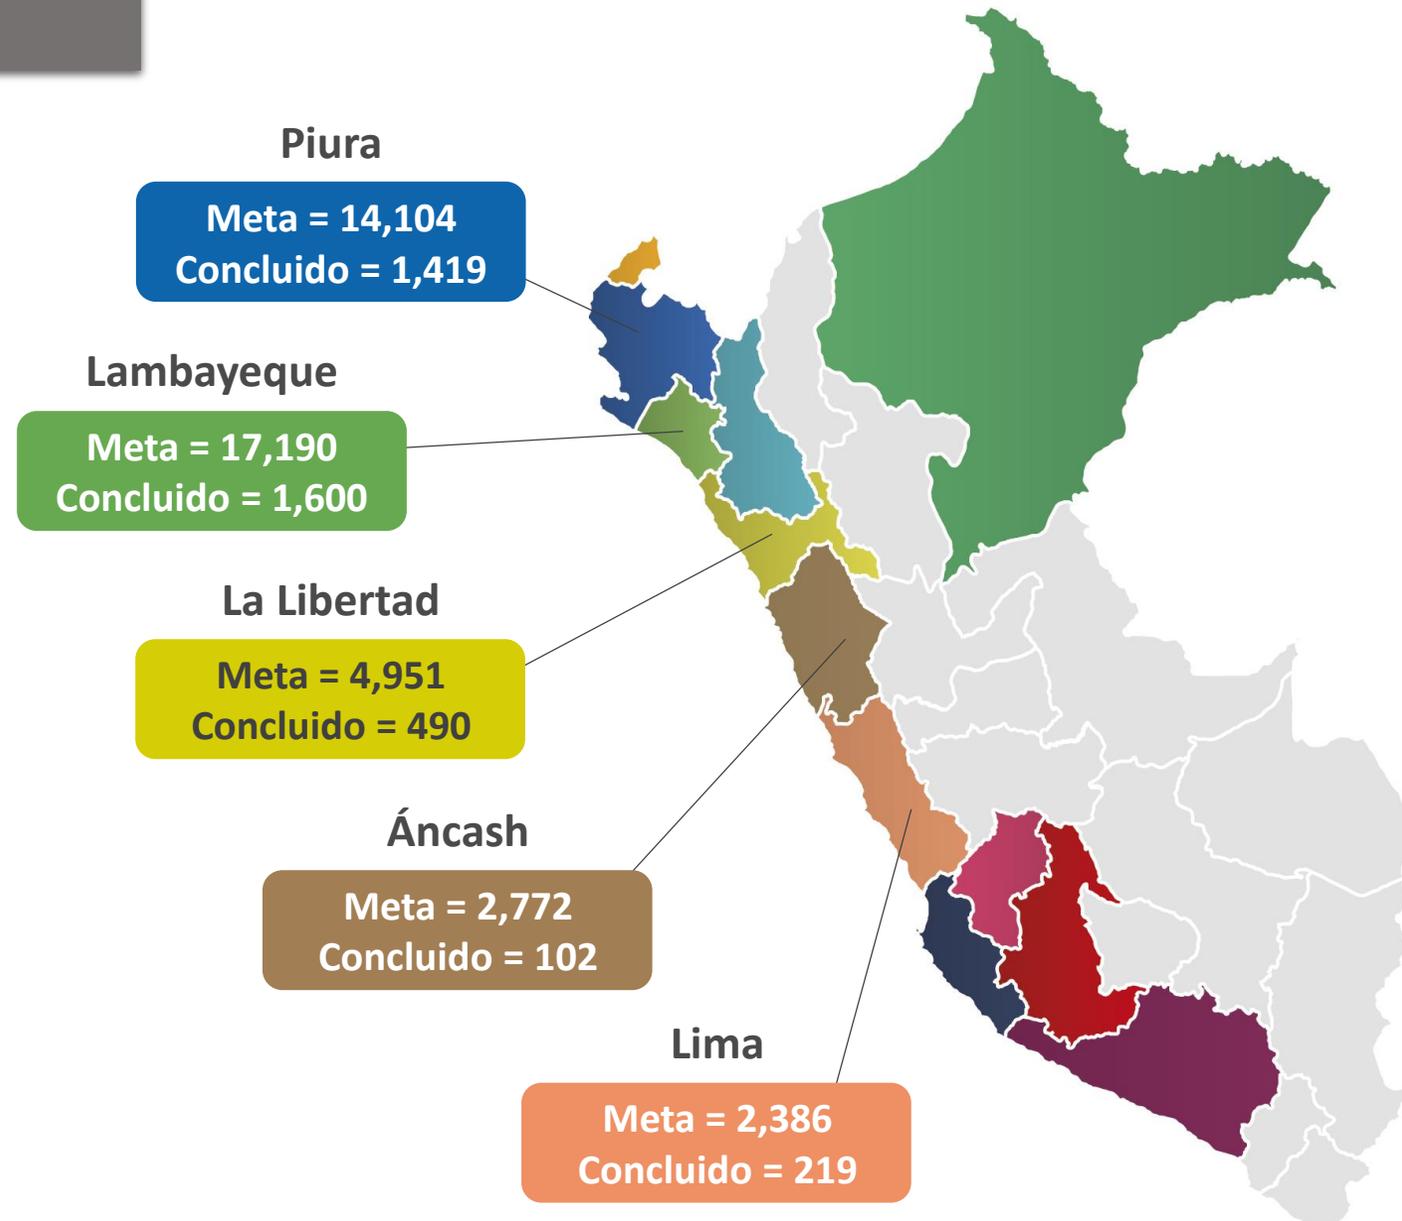



## CAJAMARQUILLA

Lurigancho-Chosica



# PIURA

Castilla



# PIURA

Catacaos



# LAMBAYEQUE

Mórrope

Cruz del Médano



# PIURA


AAHH Las Montero

### 3. AVANCES EN EL PIRCC

#### 3.2 Ejecución Física: RECONSTRUCCIÓN

Rehabilitación de **Instituciones Educativas**.

##### Elaboración de fichas técnicas para la rehabilitación de Instituciones Educativas

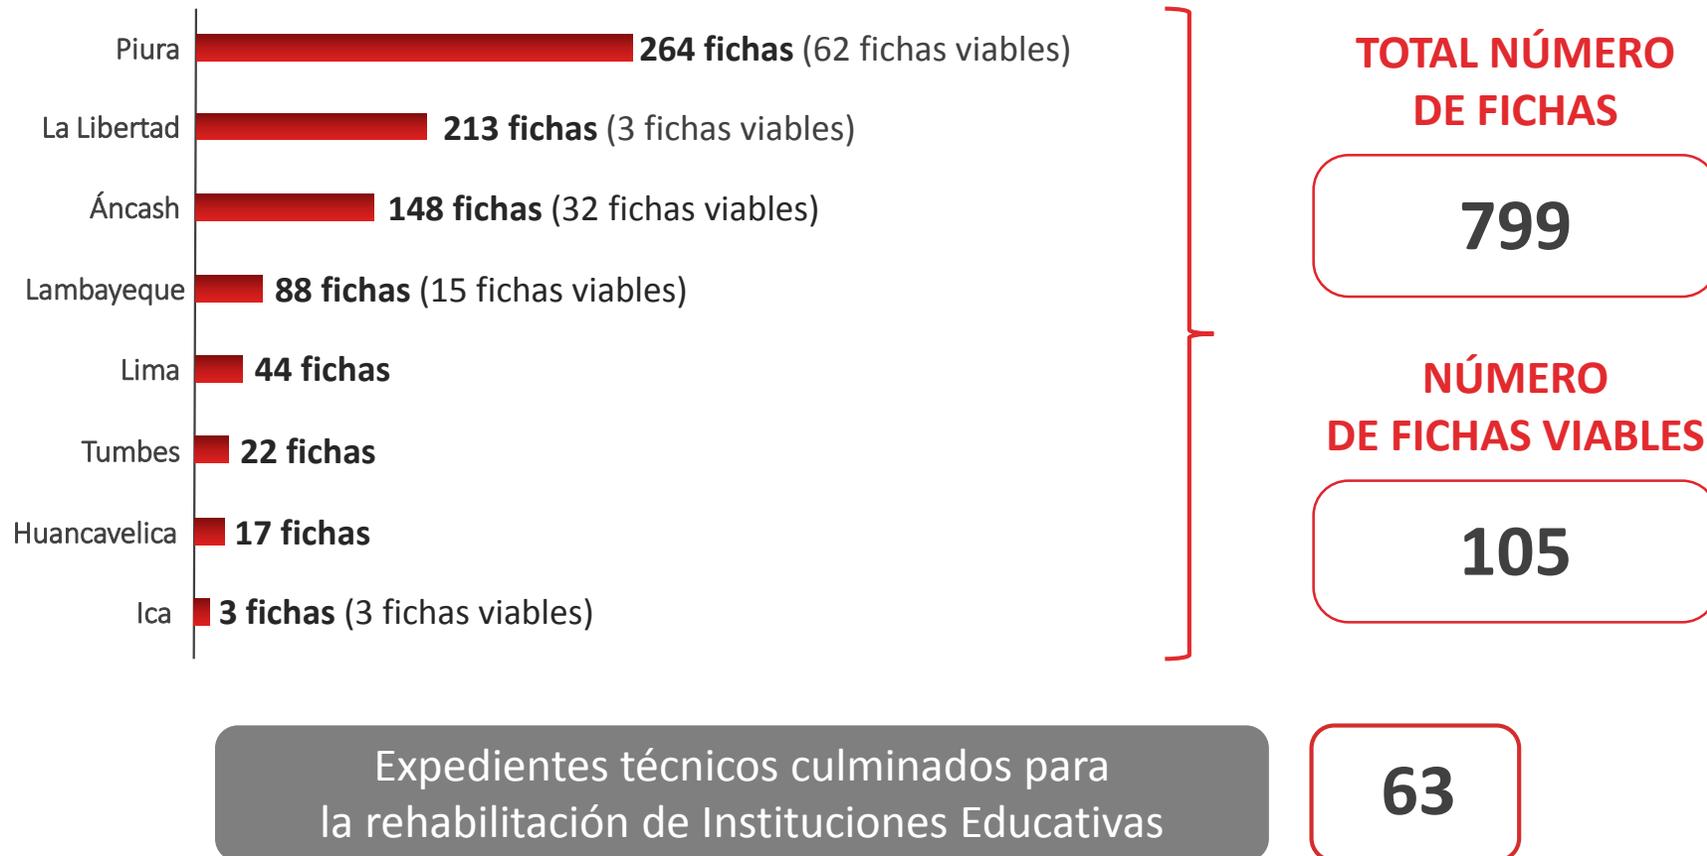

# EMPLEO TEMPORAL GENERADO

La Reconstrucción ha generado más de 130 mil empleos directos a través de las intervenciones de prevención y reconstrucción.

**36**  
**UNIDADES**  
**EJECUTORAS**

<b>Gobierno Nacional</b> <b>19 ejecutoras</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Agricultura</li> <li>Vivienda Construcción y Saneamiento</li> <li>Educación</li> <li>Salud</li> <li>Trabajo y Promoción del Empleo</li> <li>Transportes y Comunicaciones</li> </ul>
<b>Gobierno Regional</b> <b>5 ejecutoras</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Piura</li> <li>Lambayeque</li> <li>La Libertad</li> <li>Lima</li> <li>Huancavelica</li> </ul>
<b>Gobierno Local</b> <b>12 ejecutoras</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Provincial: Piura, Chiclayo y Trujillo</li> <li>Distrital: Santa Eulalia, Cura Mori, El Tallán, La Arena, Cristo Nos Valga, Tambo Grande, El Porvenir, Huanchaco y Laredo</li> </ul>

**50,445**  
**EMPLEOS**  
**GENERADOS**

**80,415**  
**EMPLEOS**  
**GENERADOS**

Prevención	
Intervenciones en:	Empleo generado
39 ríos	31,510
40 quebradas	2,886
otros	16,049


  

Reconstrucción	
Intervenciones en:	Empleo generado
Pistas y veredas	3,414
Saneamiento	3,360
Puentes	4,524
Carreteras	3,209
Mejoramiento de hospitales	2,276
Vivienda	63,629


### 3. AVANCES EN EL PIRCC

#### 3.2 Ejecución Financiera: Total (\*)

**Transferencias 2017-2018 a Mayo**  
(S/. MM)

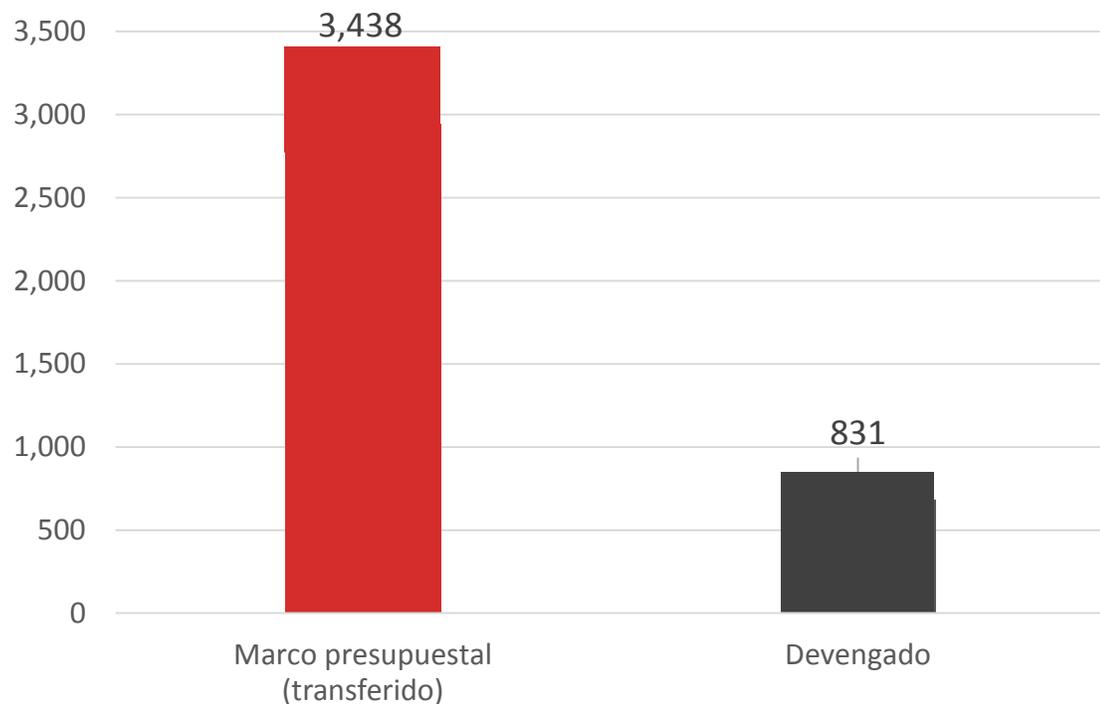

**2018**  
(S/ MM)

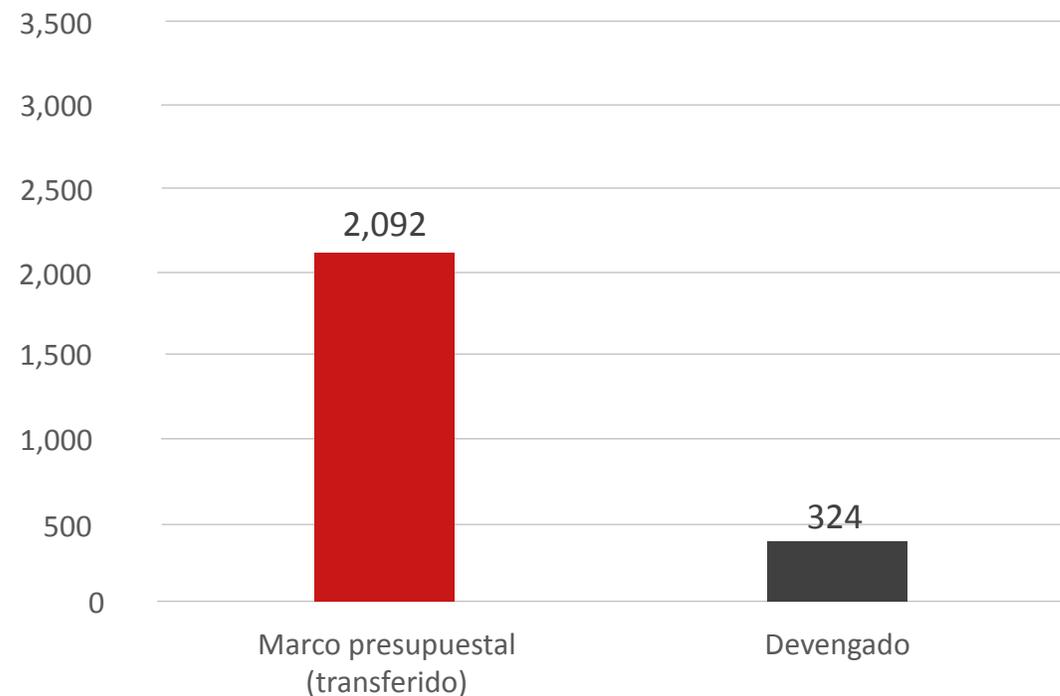

(\*) Considera todos los recursos FONDES

Fuente: Consulta amigable SIAF FONDES - MEF a mayo 2018.

## 4. PROGRAMACIÓN 2018

Hemos ajustado la programación de la ejecución a S/ 4,361 MM.

MÁS DE

2,000

PROYECTOS QUE  
INICIARÁN OBRAS



AGRICULTURA

S/ 200 MM

34 proyectos



EDUCACIÓN

S/ 58 MM

29 proyectos



PISTAS Y VEREDAS

S/ 474 MM

689 proyectos



SALUD

S/ 176 MM

75 proyectos



SANEAMIENTO

S/ 223 MM

427 proyectos



TRANSPORTES

S/ 908 MM

286 proyectos



PREVENCIÓN

S/ 1,137 MM

501 proyectos




ESTUDIOS\*

S/ 215 MM

3,277


✓ **Más de 33 mil**  
viviendas convocadas  
(100% del total).

### Por nivel de Gobierno

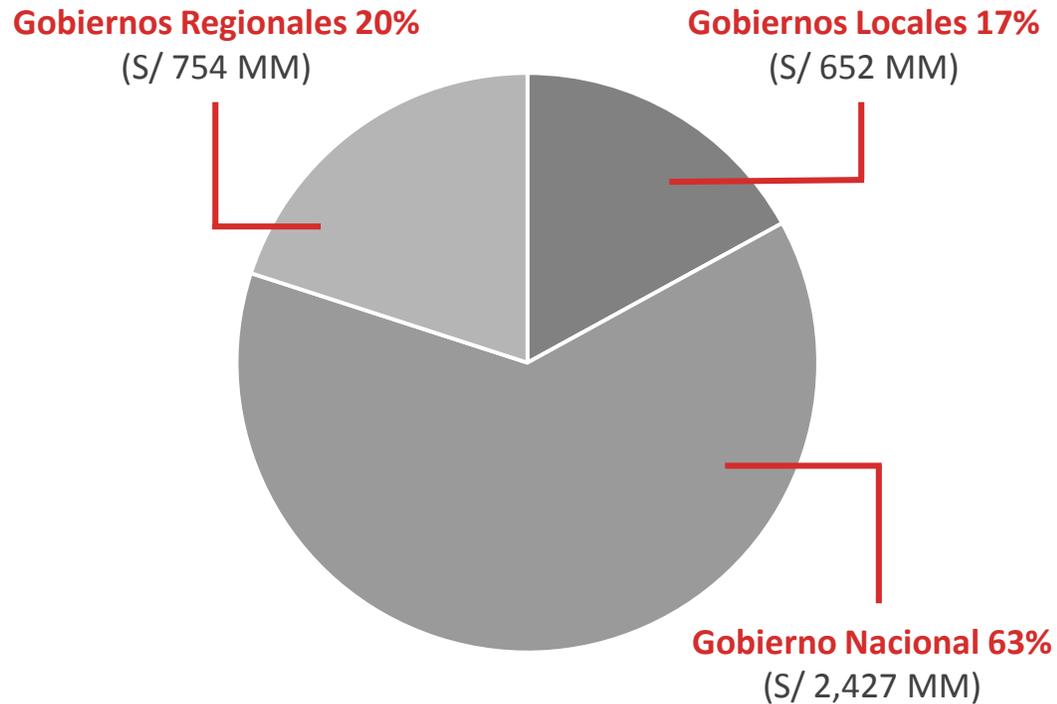


- Adicionalmente se considera S/ 527 MM para soluciones integrales de prevención en 18 ríos, 4 quebradas y 7 sistemas de drenaje.

### Por componente del PIRCC

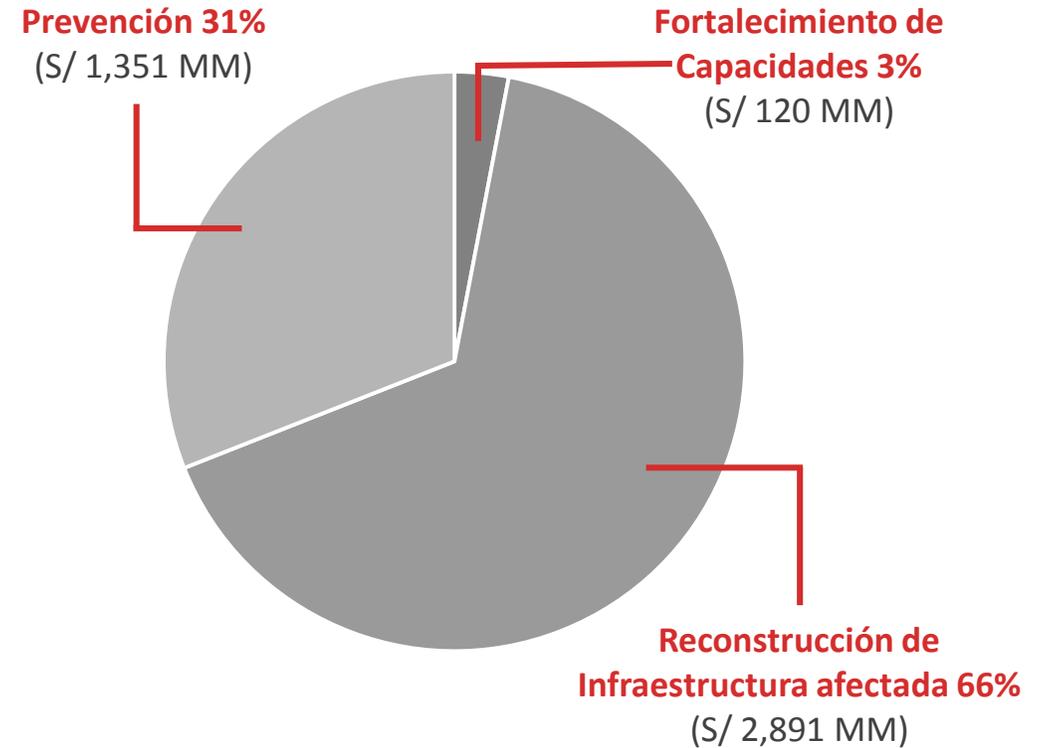

- En prevención se incluye las soluciones integrales y las actividades de corto plazo.

### Gobierno Nacional S/ 2,427 MM

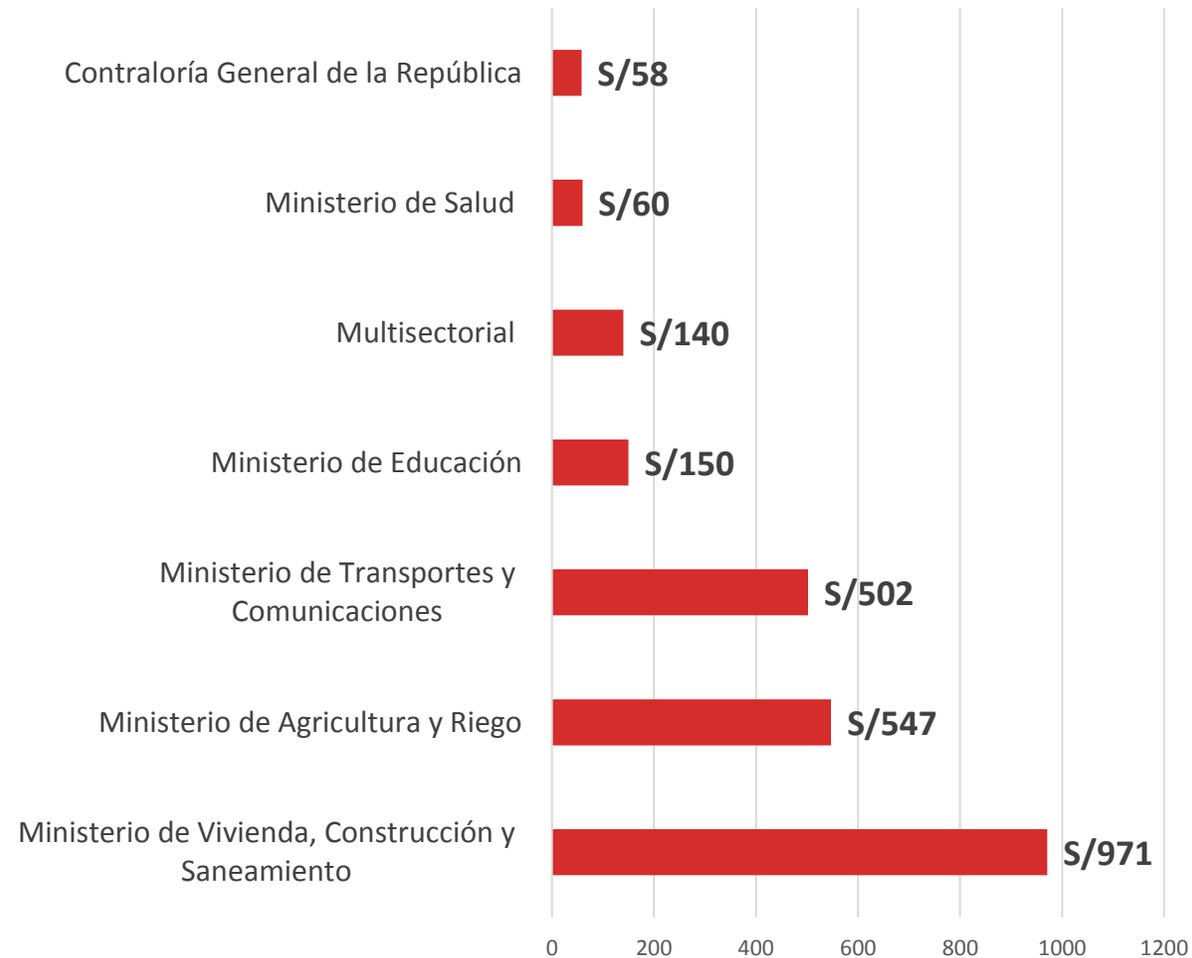

## MONTO PROGRAMADO 2018

**S/547 MM**

## NÚMERO DE INTERVENCIONES

**397**

Subsector	I - Trim	II - Trim	III - Trim	IV - Trim	Total (S/ MM)
Agricultura	214,8	279,6	45,7	6,8	546,9

## PRINCIPALES INTERVENCIONES

- Rehabilitación de diques derecho e izquierdo en el rio Piura (Piura) **S/ 47 MM**
- Ampliación de la capacidad de presa Sullana (Piura) **S/ 4,9 MM**
- Descolmatación de drenes en el sector Tablazo Alto (Piura) **S/ 2,3 MM**
- Limpieza y descolmatación de canales en el sector hidráulico margen izquierda de los distritos Corrales, San Jacinto y La Cruz (Tumbes) **S/ 5,7 MM**

**TOTAL**

**S/ 60 MM**

## MONTO PROGRAMADO 2018

**S/150** MM

## NÚMERO DE INTERVENCIONES

**708\***

\*672 estudios

Subsector	II - Trim	III - Trim	IV - Trim	Total (S/ MM)
Rehabilitación de locales escolares	3,2	8,7	138,5	150,4

## PRINCIPALES INTERVENCIONES

- Intervenciones en la Universidad Nacional de Piura (Piura)
- Elaboración de fichas técnicas reforzadas (Varias Regiones)
- Rehabilitación del local escolar San Pedro (Tumbes)
- Rehabilitación del local escolar CEBA-Rosa Flores de Oliva (Lambayeque, 137 alumnos beneficiados)

## MONTO

**S/ 23,8 MM**

**S/ 7,9 MM**

**S/ 7,1 MM**

**S/ 4,1 MM**

**TOTAL**

**S/ 42,9 MM**

**MONTO PROGRAMADO  
2018**

**S/60 MM**

**NÚMERO DE  
INTERVENCIONES**

**113**

Subsector	II - Trim	III - Trim	IV - Trim	Total (S/ MM)
Rehabilitación de establecimientos de salud	1,2	4,7	53,9	59,9

**PRINCIPALES INTERVENCIONES**

- Rehabilitación del Hospital de Caraz (Áncash) **S/ 16,7 MM**
- Rehabilitación del Hospital Pomabamba (Áncash) **S/ 14,4 MM**
- Rehabilitación del Hospital de Yungay (Áncash) **S/ 11,3 MM**
- ET para la rehabilitación del Hospital de Sullana (S/ 26 MM) **S/ 0,06 MM**
- Estudios de pre-inversión **S/ 3,8 MM**

**TOTAL**

**S/ 46,26 MM**

**MONTO PROGRAMADO  
2018**

**S/502 MM**

**NÚMERO DE  
INTERVENCIONES**

**285**

Subsector	II - Trim	III - Trim	IV - Trim	Total (S/ MM)
Red Nacional-Carreteras	24,8	11,9	390,5	427,2
Red Subnacional-Caminos	0	1,7	1,7	3,4
Red Subnacional-Puentes	0	6,8	64,4	71,2
<b>Total general</b>	<b>24,8</b>	<b>20,4</b>	<b>456,6</b>	<b>501,8</b>

## PRINCIPALES INTERVENCIONES

- Paquetes de conservación de 142 tramos de carretera  
(Pallasca-Huaraz en Áncash, Río Seco-Oyón en Lima, Sullana-Dv. Tambo Grande en Piura)
- Adquisición de 62 puentes (PVD)  
(Áncash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Piura)
- Reconstrucción de carretera Mollepata-Pallasca  
(Áncash)
- Estudios: carreteras Casma-Pariacoto y Sullana-Talara  
(Áncash y Piura)

## MONTO

**S/ 324,6 MM**

**S/ 60,0 MM**

**S/ 48,7 MM**

**S/ 5,7 MM**

**TOTAL**

**S/ 439,0 MM**

**MONTO PROGRAMADO  
2018**

**S/971 MM**

**NÚMERO DE  
INTERVENCIONES**

**719  
+ 33 mil viviendas**

Subsector	II - Trim	III - Trim	IV - Trim	Total (S/ MM)
Rehabilitación de pistas y veredas	0	0	58,7	58,7
Saneamiento	37,4	62,7	104,1	204,2
<b>Total general</b>	<b>560,1</b>	<b>108,9</b>	<b>301,8</b>	<b>970,8</b>

## PRINCIPALES INTERVENCIONES

- Construcción de más de 33 mil viviendas (Áncash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Piura y Tumbes)
- Rehabilitación del sistema de agua y alcantarillado de La Unión (Piura)
- Rehabilitación de colectores primarios José Leonardo Ortiz (Lambayeque)
- Rehabilitación de pistas y veredas en el PJ Santa Rosa (Piura)

## MONTO

**S/ 707,9 MM**

**S/ 27,5 MM**

**S/ 14,5 MM**

**S/ 5,6 MM**

**TOTAL**

**S/ 755,4 MM**

**MONTO PROGRAMADO  
2018**

**S/526 MM**

**NÚMERO DE  
INTERVENCIONES**

**59**

Subsector	II - Trim	III - Trim	IV - Trim	Total (S/ MM)
Prevenición	0,3	105,0	325,9	431,2
Prevenición-estudios	5,8	46,7	42,8	95,3
<b>Total general</b>	<b>6,1</b>	<b>151,7</b>	<b>368,7</b>	<b>526,5</b>


## PRINCIPALES INTERVENCIONES

- Solución integral contra inundaciones en el río Zarumilla (Áncash, Arequipa) **MONTO S/ 30,0 MM**
- Solución integral para el sistema de Drenaje Pluvial en Tumbes **S/ 28,8 MM**
- Control de desbordes e inundaciones en el río Ica y en la quebrada Cansas **S/ 158,0 MM**
- Solución integral para el sistema de Drenaje Pluvial en la ciudad de Piura **S/ 33,2 MM**
- Planes de acondicionamiento territorial y Planes de Desarrollo Urbano (Áncash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Piura y Tumbes) **S/ 40,5 MM**

**TOTAL**

**S/ 290,5 MM**

### Gobiernos Regionales S/ 754 MM

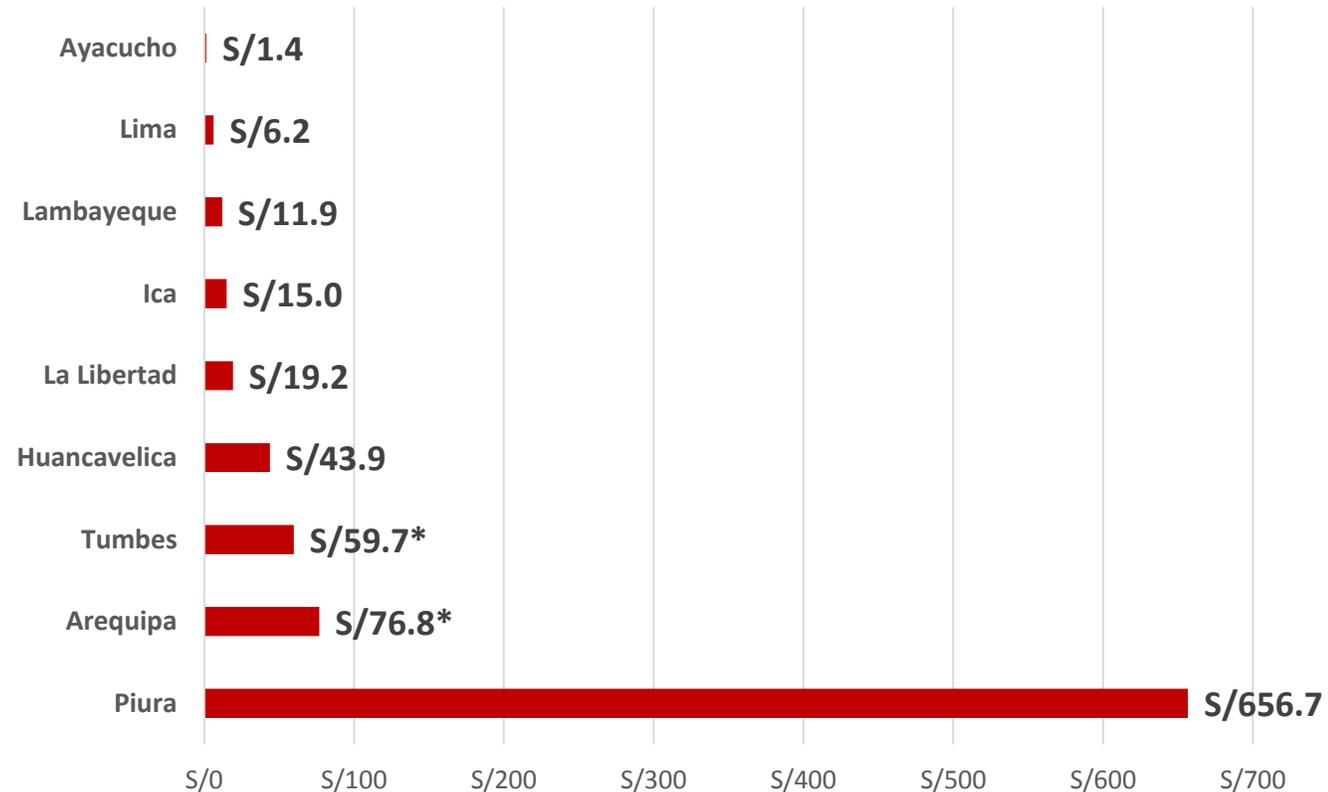

\*Son recursos adicionales que se están contemplado en la programación dado que se cuenta con una cartera de expedientes técnicos en ambas regiones.

## GOBIERNOS REGIONALES

### MONTO PROGRAMADO 2018

**S/754 MM**

### NÚMERO DE INTERVENCIONES

**103**

\*Son recursos adicionales que se están contemplado en la programación dado que se cuenta con una cartera de expedientes técnicos en ambas regiones.

Gobierno Regional	II - Trim	III - Trim	IV - Trim	Total (S/ MM)
Ayacucho	0	0	1,4	1,4
Huancavelica	0,9	12,3	30,8	43,9
Ica	0	0	15,0	15,0
La Libertad	4,9	6,2	8.1	19,2
Lambayeque	7,5	4,4	0	11,9
Lima	6,2	0	0	6,2
Piura	88,9	233,7	334,0	656,7
<b>Total general</b>	<b>108,4</b>	<b>256,6</b>	<b>389,3</b>	<b>754,3</b>
Arequipa*	0	49,6	27,2	76,8
Tumbes*	0	10,2	49,5	59,7

### PRINCIPALES INTERVENCIONES

- Costanera Tramos I y II (Piura)
- Reconstrucción de los hospitales Huancabamba y Ayabaca (Piura)
- Ampliación de la capacidad del Reservorio Poechos-Sistema Hidráulico Chira-Piura
- Protección con inundaciones en el río Sicra (Huancavelica)

### MONTO

S/ 158,6 MM

S/ 66,9 MM

S/ 96,6 MM

S/ 31 MM

**TOTAL**

**S/ 353,1 MM**

## GOBIERNOS LOCALES

**MONTO PROGRAMADO  
2018**

**S/652 MM**

**NÚMERO DE  
INTERVENCIONES**

**528**

Gobierno Regional	II - Trim	III - Trim	IV - Trim	Total (S/ MM)
Agricultura	34,6	38,3	1,4	73,1
Pistas y veredas	4,3	0	379,6	383,9
Prevención	10,4	6,2	0	16,6
Red Subnacional-Caminos	0	0	156,1	156,1
Red Subnacional-Puentes	0	0	5,1	5,1
Saneamiento	0	0	15,1	15,1
Trabajo y Promoción del empleo	782,4	0,9	0,9	2,6
<b>Total general</b>	<b>50,1</b>	<b>45,4</b>	<b>556,9</b>	<b>652,5</b>

### PRINCIPALES INTERVENCIONES

- Rehabilitación de la trocha carrozable Huarmaca-Hualcas (Piura)
- Descolmatación del túnel Culki y canal Tablazos (Lima)
- Rehabilitación del camino vecinal Sanagoran-La Arena (La Libertad)
- Rehabilitación de la Av. Canal vía Cieneguilla (Piura)

### MONTO

S/ 10,5 MM  
S/ 1,21 MM  
S/ 9,6 MM  
S/ 9.6 MM

**TOTAL**

**S/ 30,91 MM**

## 5. TRANSPARENCIA EN LA RECONSTRUCCIÓN

La Ley N° 30556 establece mecanismos de control durante la ejecución de la reconstrucción.



### Plan de Acción de Control de la Reconstrucción 2017-2020

Resolución de Contraloría N° 361-2017-CG

Control concurrente para la Reconstrucción

Resolución de Contraloría N° 405-2017-CG

163 informes de control concurrente

### Veeduría ciudadana

“Programa de participación Voluntaria veedores ciudadanos”

Obras menores a S/ 2,4 mil

### Financiamiento

S/ 11,898,500  
D.S. N° 382-2017-EF

S/ 60'574,210  
D.S. N° 025-2018-EF

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

## 5. TRANSPARENCIA EN LA RECONSTRUCCIÓN

La CGR ha realizado un operativo de control concurrente.

**36** unidades  
ejecutoras/pliegos

- Gobierno Nacional
- Gobiernos Regionales
- Gobiernos Locales

**300** visitas de  
campo

- Componentes de:
- Prevención
  - Reconstrucción



Menor ocurrencia de adicionales de obra y ampliaciones de plazo

**Adicionales**  
Obras/Servicios  
300

**Ampliaciones**  
Obras/Servicios  
300

**Con**  
adicionales  
11

**Sin**  
adicionales  
289

**Con**  
ampliación  
de plazo 44

**Sin**  
ampliación  
de plazo 256

- Ahorros significativos de recursos
- Menor espacio para la corrupción



PERÚ

Presidencia  
Del Consejo de Ministros

Autoridad para la  
Reconstrucción Con Cambios



**Gracias**



PERÚ

Presidencia  
Del Consejo de Ministros

Autoridad para la  
Reconstrucción Con Cambios



# **ACELERANDO** **LA RECONSTRUCCIÓN** **CON CAMBIOS**
