

Comisión de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Carlos Lozada Contreras

Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento



Octubre 2020

Agenda a informar (*)

(*): Solicitada según:

- Oficio N°297-2020-2021/JCOR-CVC-CR de fecha 09.10.2020.
- Oficio N°314-2020-2021/JCOR-CVC-CR de fecha 13.10.2020.

- 1 Criterios para la distribución presupuestal en gobiernos regionales y locales del DU-070-2020 y DU-114-2020.
- 2 Situación de los prestatarios de los programas de vivienda del ámbito del sector. Políticas para la morosidad y sostenibilidad de los programas.
- 3 Ejecución presupuestal del Sector y presupuesto del Año Fiscal 2021.
- 4 Planes urbanos del departamento de Piura, afectados por el Fenómeno El Niño Costero 2017.
- 5 Programa Nacional de Vivienda Rural con énfasis en la región Ancash.
- 6 Obras (concluidas, paralizadas o en ejecución) de agua y saneamiento en el departamento de Loreto y financiamiento de las obras de infraestructura urbana y equipamiento.

Criterios del DU 070 y DU 114

Metas, avances físicos y presupuestales.

1



Criterios para determinar los proyectos de inversión en el marco del DU 070-2020



Objetivo

Reactivación económica



Estrategia

Focalizar inversiones de corto plazo que generen actividad económica en construcción y empleo a través de su pronto inicio y culminación.



Criterios

1

UNIDADES
EJECUTORAS

Gobiernos
locales o
regionales

2

PLAZO DE
EJECUCIÓN

Menor o igual a
6 meses

3

PROYECTOS

Con
conformidad
técnica del
MVCS

4

PROYECTOS

Sin duplicidades ni
fraccionamiento en
sus registros

Directiva N°002-2017-EF/63.01

- **Duplicidad de Proyectos:** Son los que comparten el mismo objetivo, beneficiarios directos, localización geográfica y componentes.
- **Fraccionamiento:** Cuando no contiene todos los componentes y las acciones necesarias para solucionar el problema central y requerirá de la ejecución de otro PI con los componentes y las acciones que se omitieron.

Criterios para determinar los gobiernos locales que elaboren las IOARR

PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

1

Que hayan recibido recursos entre los años 2009-2017.

2

Cerrados en el banco de inversiones.

3

Con más de 80% de ejecución financiera respecto al monto de inversión actualizado.

4

Sin ejecución financiera en el AF-2020.

5

Que no se encuentren incorporados en el PMI vigente.



Cumplieron todos los criterios, según DU-070 Anexo n°3

182
Gobiernos locales

Criterios para determinar las IOARR



*1/ Este criterio fue considerado solamente para las nuevas IOARR y generó 263 posibles IOARR, se utilizó la siguiente fórmula:
Entre S/ 1.6 MM y S/ 6 MM IOARR = 30% del costo del PI.*

Criterios para determinar los proyectos de inversión en el marco del DU 114-2020*



*Se establecieron en coordinación con el MEF

Directiva N°002-2017-EF/63.01

- **Duplicidad de Proyectos:** Son los que comparten el mismo objetivo, beneficiarios directos, localización geográfica y componentes.
- **Fraccionamiento:** Cuando no contiene todos los componentes y las acciones necesarias para solucionar el problema central y requerirá de la ejecución de otro PI con los componentes y las acciones que se omitieron.

Evaluación de los expedientes de saneamiento para financiamiento

Actividades y procesos de evaluación

PRESET (Plataforma de Registro, Evaluación y Seguimiento de Expedientes Técnicos)

OPMI



Ingreso del **Expediente Técnico** mediante la plataforma **PRESET**, a cargo de los **GR, GL y/o EPS** a fin de realizar la evaluación respectiva.



Proceso de **evaluación** del expediente a cargo de los especialistas de los CAC's.

Admisibilidad a trámite

- Verificación que la documentación se encuentre completa (no se verifica la consistencia de la documentación).
- Inexistencia de transferencias pendientes de Liquidación.

Calidad técnica

Verifican que el contenido de los expedientes técnicos cumpla la normatividad del sector, se revisa el planteamiento técnico:

- Estudios Básicos
- Parámetros de diseño
- Presupuesto
- Saneamiento físico-legal de los terrenos
- Estudio de impacto ambiental (FTA/EIA).
- Acreditación de disponibilidad hídrica.
- CIRA, Otros, según corresponda.

- El proyecto debe contar con conformidad técnica y estar registrado en el banco de inversiones.
- Opinión favorable de la **OPMI** del **MVCS**, siempre que la inversión registrada no presentará duplicidad, fraccionamiento o sobredimensionamiento.




Conformidad Técnica

Evaluación de los expedientes de infraestructura urbana para financiamiento

Actividades y procesos de evaluación

REVISIÓN TÉCNICA

- ✓ Ingreso del **Expediente Técnico** (físico y/o virtual), a cargo de **los GR, GL** a fin de realizar la evaluación respectiva.



Proyectos Integrales

- ✓ Proceso de evaluación del expediente a cargo de los especialistas del PMIB.

Admisibilidad

Lista de chequeo :

- Proyectos integrales.
- Estudio de Pre Inversión declarado viable y vigente.
- Certificado de la Empresa Prestadora de Servicio (EPS) o el documento equivalente, que acredite la existencia y operatividad de la infraestructura sanitaria.
- Documento que acredite el derecho de propiedad y titularidad del terreno materia de intervención a nombre de la Unidad Ejecutora.

Si cumple, se designa revisor y se inicia el proceso.

Calidad Técnica

- En esta etapa se revisa el planteamiento técnico.
- Se registra en SSP como **EVALUACIÓN CULMINADA**.

OPMI

- Opinión técnica favorable de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones (OPMI) del MVCS, en donde se realiza la revisión siempre que la inversión registrada no presentará duplicidad, fraccionamiento o sobredimensionamiento.



Formato N°08-C Registros en la Fase de Ejecución

Formato N°12-B Seguimiento a la ejecución de inversiones 

Criterios para determinar el monto del financiamiento de las inversiones DU 070-2020 y DU 114-2020.

DU 070-2020

1

Monto de inversión – (Monto ejecutado 2019 + PIM 2020)

PROYECTOS DE
CONTINUIDAD

2

Monto de inversión - PIM 2020

PROYECTOS
NUEVOS

DU 114-2020

1

Monto de inversión –(Monto ejecutado 2019 + PIM 2020)

PROYECTOS DE
CONTINUIDAD

2

Monto de inversión – PIM 2020.

PROYECTOS
NUEVOS

Reactivación económica 2020-2021

Mediante **DU 070-2020**, **DS 262-2020-EF** y **DU 114-2020**, se han transferido recursos a los gobiernos locales y regionales, para la ejecución de inversiones en saneamiento e infraestructura y equipamiento urbano.

515
gobiernos
locales(513) y
gobiernos
regionales (02)



846
proyectos



Más de
280 000
puestos de
trabajo mensual




Inversión 2020:
s/ 1 723.6 MM.

Inversión 2021:
s/ 1 176.9 MM.





TOTAL INVERSIÓN

S/. 2 901 MM

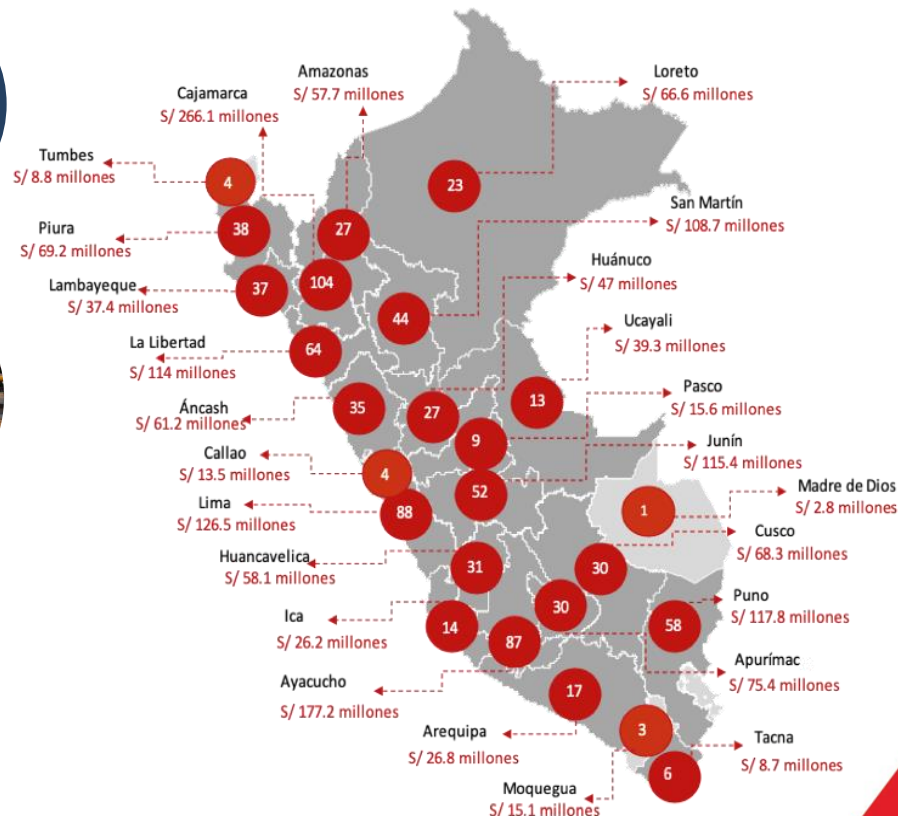


Recursos transferidos 2020

N° de Inversiones por Región

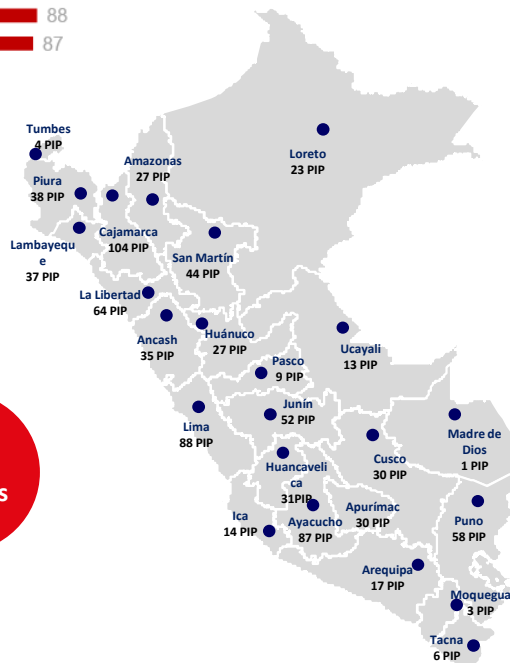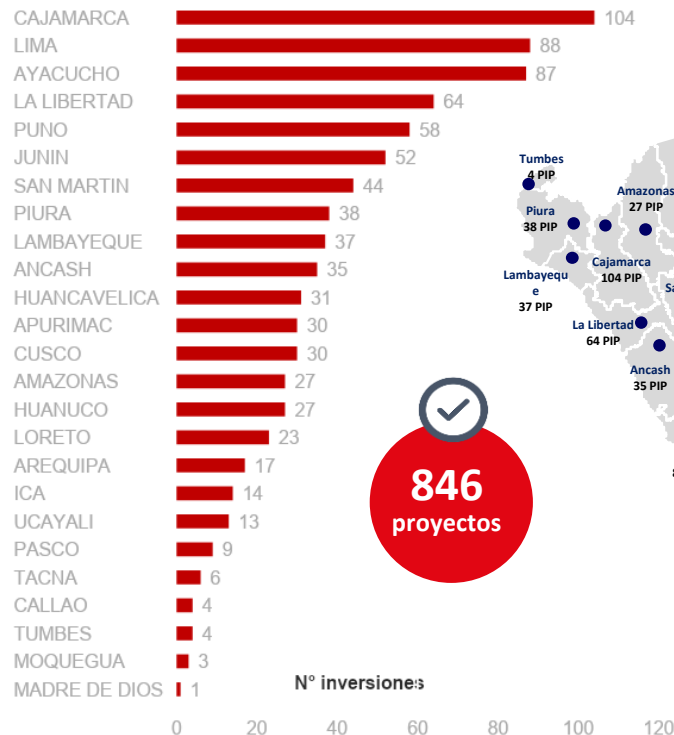

Monto de inversión por Región

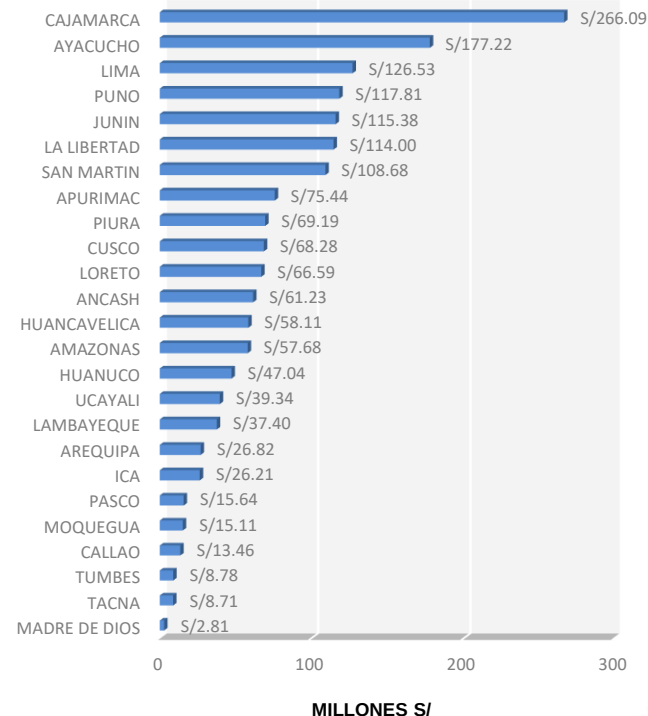

Inversión 2020:
s/ 1 724 MM.

Estado y avance de ARRANCA PERÚ 1

D.U-070-2020^{1/} y D.S 262-2020-EF^{2/}

I. Inversiones



Tipo de inversión	N° de Inversiones
Infraestructura vial y equipamiento urbano.	483
Saneamiento.	31
TOTAL	514

(Millones S./.)

Tipo de inversión	Monto transferido 2020	Certificado anual 2020	Compromiso anual 2020	Devengado 2020	% de Ejecución
Infraestructura vial y equipamiento urbano.	751.18	694.89	186.34	42.17	5.61%
Saneamiento.	96.95	90.85	48.59	18.90	19.49%
Total general	848.13	785.74	234.92	61.07	7.20%

Fuente: Consulta amigable MEF al 16.10.20

II. Viviendas - Bono Familiar Habitacional

Intervenciones en vivienda urbana.	N° BONOS	N° Bonos desembolsados al 30.10.20	% Avance	Intervenciones en vivienda urbana.	Total de inversión (Millones S/)	Monto desembolsado al 30.10.20 (Millones S/)	% Avance
Bono Familiar Habitacional	19,100	11,158	58.4%	Bono Familiar Habitacional	535.3	303.2	56.6%

1/ Publicado en el diario El Peruano el 19.06.20.

2/ Publicado en el diario El Peruano el 12.09.20.

54 Por convocar

113 Convocados

69 Adjudicados

82 Consentido

20 Apelado, nulos, desiertos y retrotraídos

91 Contratados

84 Ejecución

01 Concluido



514
inversiones

Fuente: SEACE 16.10.20



Estado y avance de ARRANCA PERÚ 2

DU-114-2020^{1/}



Tipo de inversión	N° de inversiones
Infraestructura vial y equipamiento urbano.	75
Saneamiento.	257
TOTAL	332

(Millones S/.)

Tipo de inversión	Monto transferido 2020	Certificado anual 2020	Compromiso anual 2020	Devengado 2020	% de Ejecución
Infraestructura vial y equipamiento urbano.	277.34	157.41	0.50	0.50	0.2%
Saneamiento.	598.11	180.98	12.43	2.98	0.5%
Total	875.45	338.3	12.93	3.47	0.40%

Fuente: Consulta amigable MEF al 16.10.20



332
inversiones



100% incorporados en sus presupuesto.



100% ET actualizados



99.6^{2/} % Incorporados en el PMI.



293 Por Convocar



28 Convocados



-- Adjudicados



03 Consentido



-- Contratados



08 En ejecución

1/ Publicado en el diario El Peruano el 23.09.20.

2/ La Municipalidad Distrital de Primavera – Ancash presenta problemas administrativos para poder incorporar en el PMI 2020.

Fuente: SEACE 16.10.20

Arranca Perú 2

Principales hitos D.U 114-2020

1

Actualización del ET.

15 días hábiles

Hasta el 14.10.20

2

Plazo máximo de convocatoria.

25 días hábiles

Hasta el 28.10.20

3

Proceso de selección:
Adjudicación simplificada.

12 días hábiles

Hasta 11.11.20

4

Devengado de los recursos
transferidos.

S/ 875.5 MM

Hasta el 31.12.20


Políticas para la morosidad y sostenibilidad de los programas.

2



Morosidad en créditos Hipotecarios

TASA DE MOROSIDAD CRÉDITOS HIPOTECARIOS

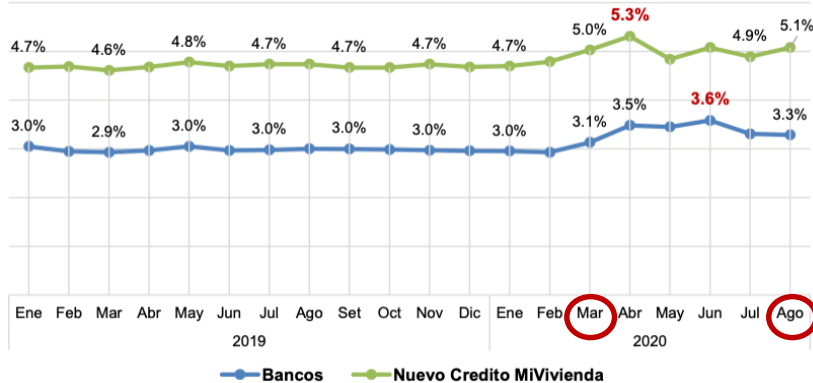

Desde la declaración del estado de emergencia en el mes de marzo, hasta agosto del presente año, vemos una variación en la morosidad de **0.1%**, la cual es mínima, como consecuencia de la reprogramación.

LABORES DEL FONDO MiVivienda

- ✓ Seguimiento mensual de la morosidad de la cartera MIVIVIENDA.
- ✓ Revisión de cartera según fase de colocación.
- ✓ Permanente contacto con las entidades financieras, de tal forma que informen las gestiones realizadas para el control de la morosidad.
- ✓ Revisión y seguimiento mensual de las garantías para la independización y constitución de los créditos hipotecarios MIVIVIENDA.
- ✓ Visitas de inspección a entidades financieras para revisión de expedientes de créditos y cumplimiento de políticas de créditos de la entidad y reglamento de producto del Nuevo Crédito MIVIVIENDA (NCMV).

Políticas para la morosidad y sostenibilidad de los programas


REPROGRAMACIÓN DE CRÉDITOS (NCMV)

El FMV reprogramó créditos (**3 meses, en promedio¹**), a través de **16 entidades financieras en 20 departamentos**, lo que ha permitido controlar un posible despegue de la tasa de morosidad del NCMV.


8%

Créditos en los últimos 10 años

Institución	N° de Reprogramaciones
Bancos	5,241
Financiera	524
Edpyme	633
Cooperativas	26
Cajas	795
Total	7,219



Se elaboró el **Reglamento de Refinanciamiento y Reprogramación de Deuda** para los Productos MIVIVIENDA que fue aprobado mediante Acuerdo de Directorio N° 01-12D-2020 de fecha 13.06.2020.

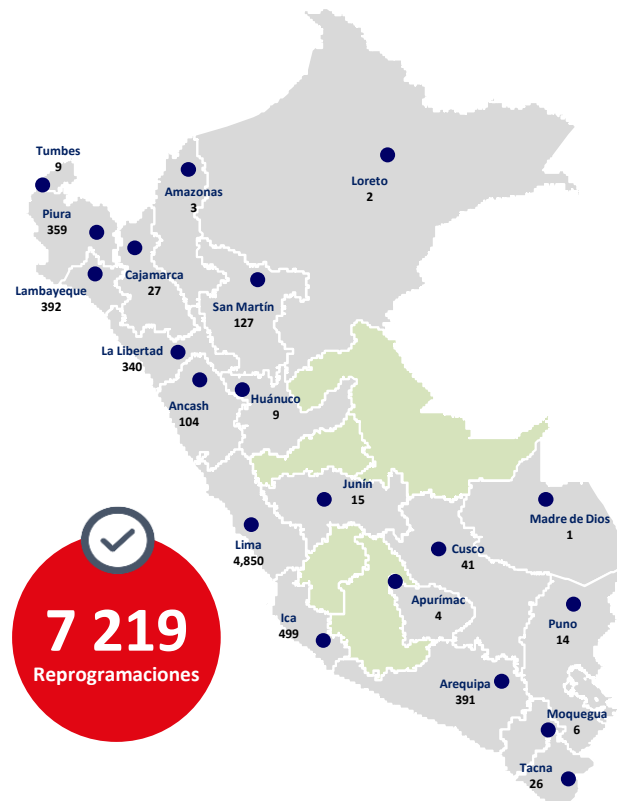

7 219
Reprogramaciones

1/ Para mantener el valor de la cuota se ampliaba el plazo de pagos. Si se optaba por mantener el mismo plazo de pagos, se carga a la cuota la reprogramación.

Ejecución presupuestal AF-2020.

Presupuesto del AF-2021
(Prioridades y monto por región)

3



Ejecución financiera 2020- Sectorial

Toda fuente de financiamiento

(en millones de soles)

GENERICA DE GASTOS	PIA	PIM	EJEC. AL 18 DE OCT.	AVANCE	PROY OCT-DIC	PROYEC. ANUAL	AVANCE	SALDO
GASTOS CORRIENTES	1,158.4	1,228.0	648.2	52.8%	506.6	1,154.8	94.0%	73.2
5.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	42.4	43.1	26.4	61.3%	14.7	41.2	95.6%	1.9
5.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2.9	23.8	2.5	10.4%	21.3	23.8	100.0%	0.0
5.3. BIENES Y SERVICIOS	613.1	685.3	336.1	49.0%	278.9	614.9	89.7%	70.3
5.4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS ^{1/}	33.3	14.5	8.1	56.0%	6.4	14.5	100.0%	0.0
5.5. OTROS GASTOS ^{2/}	466.7	461.3	275.1	59.6%	185.3	460.4	99.8%	0.9
GASTOS DE CAPITAL	2,688.3	2,708.2	1,788.4	66.0%	441.8	2,230.2	82.4%	478.0
6.4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS ^{3/}	1,043.4	1,324.0	1,276.0	96.4%	0.0	1,276.0	96.4%	48.0
6.5. OTROS GASTOS	0.0	81.3	47.0	57.8%	34.3	81.3	100.0%	0.0
6.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,644.9	1,302.9	465.5	35.7%	407.5	872.9	67.0%	429.9
Proyectos de Inversión	1,594.2	1,266.4	456.7	36.1%	400.2	856.9	67.7%	409.6
Otros gastos (no incluye PIP)	50.7	36.4	8.8	24.1%	7.3	16.1	44.1%	20.4
TOTAL	3,846.8	3,936.1	2,436.6	61.9%	948.4	3,385.0	86.0%	551.1

86.0%

PLIEGO	PIA	PIM	EJEC. AL 18 DE OCT.	AVANCE	PROY OCT-DIC	PROYECCION ANUAL	AVANCE	SALDO
037. MVCS	3,437.1	3,485.4	2,239.8	64.3%	801.4	3,041.1	87.3%	444.3
056. SBN	44.6	44.4	25.2	56.8%	18.9	44.1	99.5%	0.2
205. SENCICO	93.3	136.6	51.0	37.3%	41.1	92.1	67.4%	44.5
207. OTASS	137.2	140.3	72.5	51.7%	50.9	123.4	88.0%	16.9
211. COFOPRI	134.7	129.5	48.2	37.2%	36.2	84.3	65.1%	45.2
TOTAL	3,846.8	3,936.1	2,436.6	61.9%	948.4	3,385.0	86.0%	551.1

1/. OTASS: Transferencias a EPS

2/. Mejoramiento de Viviendas (PNVR S/ .466.0 mll)

3/. BFH (S/ 568.4 mll), BBP (S/ 75 mll) y Transf Saneamiento (S/ 400 mll)

Metas y Avances en el Año Fiscal 2020 vivienda y urbanismo

Acceso a vivienda digna

80 127 viviendas serán promovidas (*)



**Inversión:
s/ 2,117,7 MM.**

1/ Incluye BFH Reconstrucción

(*) Incluye Recursos del BFH transferidos el año 2019

Producto	Meta 2020	
	N°	Monto S/
Bono de Buen Pagador	7,200	100,800,000
CSP: Construcción en Sitio Propio	46,044	1,172,293,081
AVN: Vivienda Nueva	11,607	431,671,944
BFH Reconstrucción	2,000	60,274,288
Bono Reforzamiento	1,000	15,080,275
Vivienda Rural	12,276	337,590,000
TOTAL	80,127	2,117,709,589

**500 predios (1 330 ha)
entregados al cierre de año-SBN**



**Inversión:
s/ 44.3 MM.**

A la fecha SBN: 320 predios entregados (275 ha)
para el desarrollo de proyectos inmobiliarios y otros.

Infraestructura y Equipamiento

112 proyectos-PMIB



**Inversión:
s/ 239 MM.**

Transferencias a 63 Gobiernos locales de 17 regiones en beneficio de 369 000 personas.

(*) No se considera 1,800 Nuevos Créditos MIVIVIENDA desembolsados sin componente BBP

Metas y Avances en el Año Fiscal 2020 vivienda y urbanismo



Infraestructura y equipamiento urbano-PNC

- **Mantenimiento de cauces, drenajes y estructuras de seguridad física frente a peligros: 79.5 Km.** intervenidos en 18 regiones. Además de 80 mil m³ de agua potable distribuida en 11 regiones.



Inversión 2020:
s/ 12.4 MM.



Planificación urbana-DGPPVU

- **17** Planes de Acondicionamiento Territorial (8 Regiones) y **25** Planes de Desarrollo Urbano (8 Regiones). Más de **3.8** Millones de beneficiados.



Inversión 2020:
s/ 27 MM.

- A la fecha se ha culminado **12 Planes** (05 planes de acondicionamiento territorial y 07 de Desarrollo urbano)



Formalización predial urbana-COFOPRI

- Se proyecta al cierre de 2020 la formalización de **37 892 predios** en beneficio de 150 mil personas.



Inversión 2020:
s/ 50 MM.

- **A la fecha 12 240 predios formalizados** por el COFOPRI en beneficio de más de 48 mil personas.

Metas para el Año Fiscal 2020 agua y saneamiento

Meta anual en ejecución directa



S/ 1 126 Mill.

REGION	Nº Proyecto*	PIM
AMAZONAS	25	12,541,029
ANCASH	92	18,999,052
APURIMAC	11	16,785,411
AREQUIPA	25	54,927,371
AYACUCHO	26	3,047,580
CAJAMARCA	90	71,823,977
CALLAO	1	1,648,899
CUSCO	27	12,399,725
HUANCAVELICA	23	2,361,708
HUANUCO	15	9,537,142
ICA	13	5,048,853
JUNIN	47	31,370,908
LA LIBERTAD	79	26,033,912
LAMBAYEQUE	70	42,569,884
LIMA	94	372,835,260
LORETO	47	80,125,195
MADRE DE DIOS	2	339,791
MOQUEGUA	8	1,837,204
PASCO	1	17,011
PIURA	227	162,896,305
PUNO	51	95,992,515
SAN MARTIN	83	67,226,288
TACNA	14	8,106,266
TUMBES	14	7,913,993
UCAYALI	17	19,490,450
TOTAL	1,102	1,125,875,729

1 102
Proyectos

Proyectos por ejecución directa que culminarían

62

Proyectos

Generando	
Conexiones de agua	9930
Población beneficiaria	38 729
Conexiones de alcantarillado	11 092
Población beneficiaria	43 264

Avances al III Trimestre-culminados



PNSR (ámbito rural)

45 Proyectos que permitirán 3,919 conexiones de agua que beneficiarán a 15,290 habitantes y 3,993 conexiones de alcantarillado que beneficiarán a 15,576 habitantes.

46

Proyectos



PNSU (ámbito urbano)

01 Proyecto que permitirán 992 conexiones de agua que beneficiarán a 3,869 habitantes y 106 conexiones de alcantarillado que beneficiarán a 413 habitantes.

Metas para el Año Fiscal 2020 agua y saneamiento

Proyectos por transferencia



S/ 292 Mill.
(Monto Transferido Año 2020)

Financiamiento de recursos a los gobiernos locales, regionales y EPS , para ejecución física de sus proyectos de saneamiento, a través de nuestros programas PNSU y PNSR.

Concepto	N° proy.	Transferencia S/
SANEAMIENTO (GL y GR)	113	245.03
EPS	3	47.17
TOTAL	116	292.2 Millones

116
Proyectos

Proyectos por transferencia que culminarían

70
Proyectos

Transferencias – Meta Anual:

Conexiones de agua	22 108
Población beneficiaria	86 224
Conexiones de alcantarillado	18 272
Población beneficiaria	71 263

Avances al III Trimestre -Culminados



PNSR-Ámbito rural

54 Proyectos que permitirán 12 887 conexiones de agua que beneficiarán a 50 259 habitantes y 14 376 conexiones de alcantarillado que beneficiarán a 56 069 habitantes

66
Proyectos



PNSU-Ámbito urbano

12 Proyectos que permitirán 4,926 conexiones de agua que beneficiarán a 19 212 habitantes y 3,365 conexiones de alcantarillado que beneficiarán a 13 125 habitantes.


AF - 2021



Participación sectorial en el presupuesto nacional

Periodo 2015 - 2021

(en millones de soles)

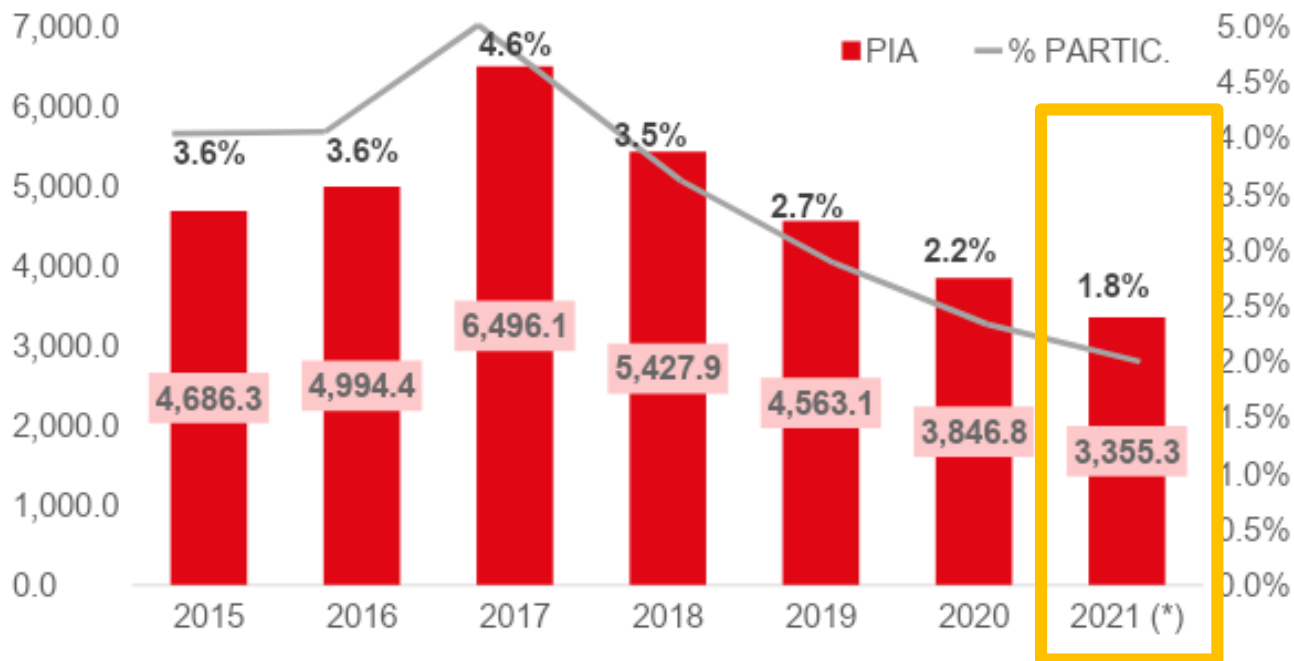

PGR	130,621	138,491	142,472	157,159	168,074	177,368	183,030
-----	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

(*) Proyecto de Presupuesto

Proyecto de presupuesto sectorial

Toda fuente de financiamiento (en millones de soles)

CATEGORIA Y GENERICA DE GASTO	2019		2020		2021 (*)		Variación 2021-2020	
	PIA	% Part.	PIA	% Part.	PIA	% Part.	Importe	%
GASTOS CORRIENTES	801.2	17.6%	1,158.4	30.1%	875.3	26.1%	-283.1	-24.4%
5.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	44.4	1.0%	42.4	1.1%	42.0	1.3%	-0.5	-1.1%
5.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3.4	0.1%	2.9	0.1%	3.0	0.1%	0.1	1.7%
5.3. BIENES Y SERVICIOS	476.0	10.4%	613.1	15.9%	573.9	17.1%	-39.2	-6.4%
5.4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS ^{1/}	45.1	1.0%	33.3	0.9%	26.4	0.8%	-6.9	-20.6%
5.5. OTROS GASTOS ^{2/}	232.4	5.1%	466.7	12.1%	230.1	6.9%	-236.7	-50.7%
GASTOS DE CAPITAL	3,762.0	82.4%	2,688.3	69.9%	2,479.9	73.9%	-208.4	-7.8%
6.4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS ^{3/}	1,576.4	34.5%	1,043.4	27.1%	1,043.4	31.1%	0.0	0.0%
6.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,185.5	47.9%	1,644.9	42.8%	1,436.5	42.8%	-208.4	-12.7%
Proyectos de Inversión	2,073.1	45.4%	1,594.2	41.4%	1,425.0	42.5%	-169.3	-10.6%
Otros gastos (no incluye PIP)	112.4	2.5%	50.7	1.3%	11.5	0.3%	-39.1	-77.2%
TOTAL	4,563.1	100.0%	3,846.8	100.0%	3,355.3	100.0%	-491.5	-12.8%

(*) Proyecto de Presupuesto

1/. OTASS: Transferencias a EPS

2/. Mejoramiento de Viviendas (PNVR S/.229.3.0 mll). Bajo las condiciones establecidas en el numeral 23.2 del Proyecto de Ley de Presupuesto para el 2021, recibirá S/ 262.0 mll


3/. BFH (S/ 768.4 mll), BBP (S/ 75 mll) y Transf principalmente Saneamiento (S/ 200 mll)

Cartera de inversión ejecución directa del sector 2021

PLIEGO	N° PI	MONTO 2021
037. MVCS	358	901.7
001. ADM. GENERAL	7	44.0
004. PNSU	36	362.6
005. PNSR	306	286.0
006. PASLC	9	209.1
205. SENCICO	5	30.8
207. OTASS	1	35.0
211. COFOPRI	1	27.6
TOTAL	365	995.1


NOTA: Adicionalmente se cuenta con S/ 429.9 MM (GtoG)

N° de Inversiones por Región

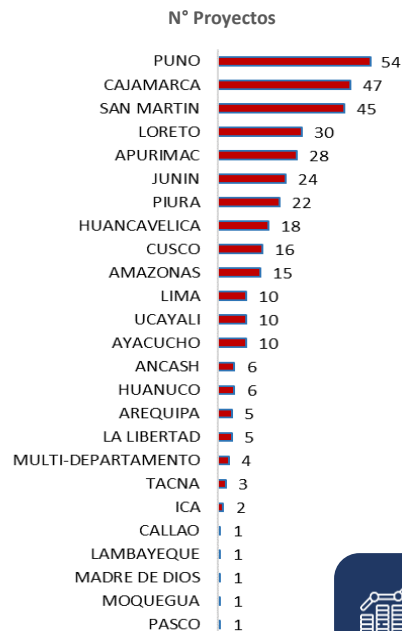


365
proyectos

Inversión 2021:
s/ 995 MM.

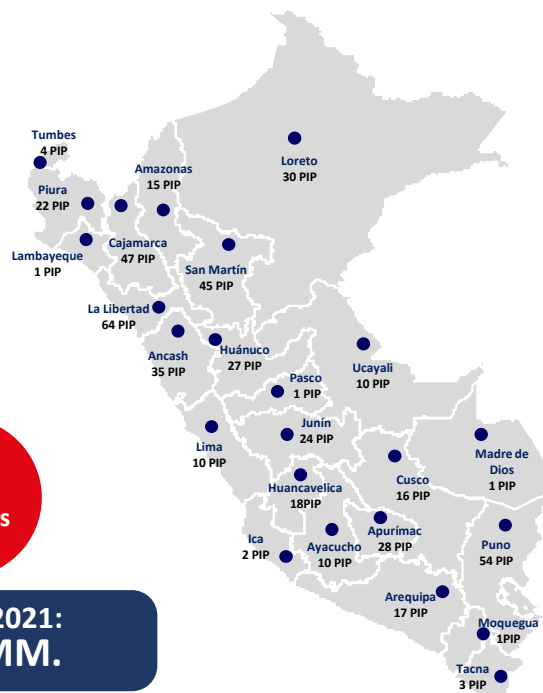

Monto de inversión por Región

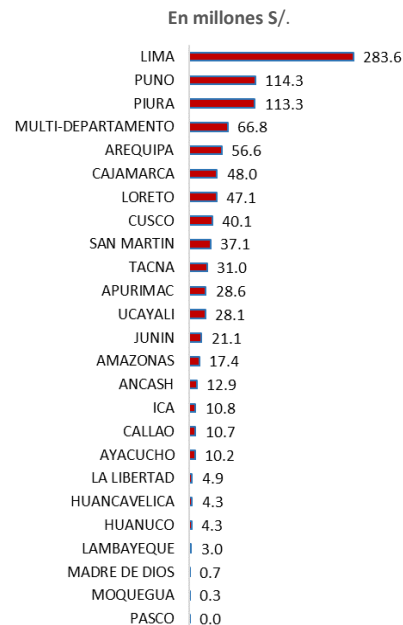


Cartera de transferencias por continuidad de inversiones por región 2021

Anexo I PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO-AÑO FISCAL 2021

PROGRAMA	TRANSF-2018-2019		ANEXO I DU-014-2019		DS N° 152 - 2020 EF		TOTAL	
	N°	S/ MILL	N°	S/ MILL	N°	S/ MILL	N°	S/ MILL
PMIB	7	11.82	12	8.65	54	113.01	73	133.47
PNSR	16	7.74	42	95.97	58	155.54	116	259.26
PNSU	2	6.20	7	74.07	27	178.26	36	258.52
TOTAL	25	25.76	61	178.69	139	446.81	225	651.26

N° de inversiones por Región

N° Proyectos

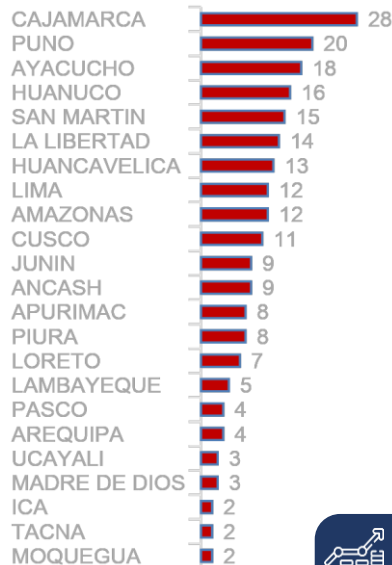


225 proyectos

Inversión 2021: s/ 651 MM.



Monto de inversión por región

En millones S/.

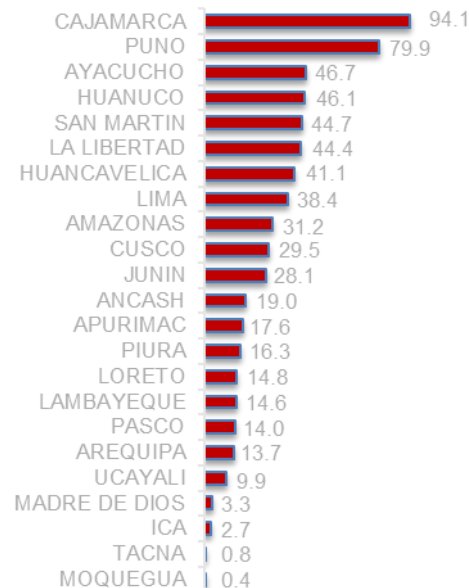

Presupuesto por resultados con programas presupuestales

	✓ PP0082: Programa Nacional de Saneamiento Urbano	✓ PP0083: Programa Nacional de Saneamiento Rural	✓ PP0111: Programa de Apoyo al Hábitat Rural (Programa Nacional de Vivienda Rural)	✓ PP0146: Acceso de las familias a vivienda y entorno urbano adecuado (Viviendas)	✓ PP0146: Acceso de las familias a vivienda y entorno urbano adecuado (pistas y veredas)	✓ PP0058: Acceso de la población a la propiedad predial formalizada
Indicador	Porcentaje de población urbana con acceso a agua potable por red pública.	Porcentaje de población rural que tiene acceso al servicio de agua por red pública.	Variación de temperatura promedio, de las familias rurales , en grados centígrados (°C) de la habitación mejorada de la vivienda	Porcentaje de familias urbanas de los niveles socioeconómicos C, D y E con déficit cuantitativo habitacional.	Porcentaje de población en hogares urbanos con acceso a servicios de infraestructura y movilidad urbana	Porcentaje de informalidad (3.4 millones) de la propiedad predial urbana de terrenos del estado ocupadas al 31 de diciembre de 2004.
Ámbito	Urbano	Rural	Rural	Nacional	Nacional	Nacional
2019	94.90%	75.60%	Entre 10.1 °C y 12°C	3.70%	52.73%	23.00%
2020	94.92%	77.20%	12°C	3.60%	53.80%	22.00%
2021	95.03%	80.07%	12°C	3.50%	54.40%	21.00%
	(*) ENAPRES	(*) ENAPRES	(*) PNVR	(*) ENAPRES, INEI	(*) ENAPRES, INEI	(*) COFOPRI, SUNARP

Programas presupuestales del sector

Toda fuente de financiamiento

(en millones de soles)

PROGRAMA PRESUPUESTAL	2019	2020	2021
	PIA	PIA	PIA
0058. Acceso de la población a la Propiedad Predial Formalizada	52.5	55.6	45.8
0068. Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres ^{1/}	268.8	504.0	516.1
0082. Programa Nacional de Saneamiento Urbano	1,685.5	1,347.3	1,331.4
0083. Programa Nacional de Saneamiento Rural	911.6	793.3	426.5
0109. Nuestras Ciudades	62.3	34.4	15.7
0111. Apoyo al Hábitat Rural	5.4	4.6	3.4
0146. Acceso de las familias a vivienda y entorno urbano adecuado	1,092.9	656.3	858.2
TOTAL PLIEGO	4,079.2	3,395.6	3,197.1

95.3%

Representa al presupuesto del sector

^{1/} S/ 262.1 millones condicionados a culminar expedientes técnicos para 17,765 viviendas (PMAHF 2021)



Metas para el Año Fiscal 2021 vivienda y urbanismo

Acceso a vivienda digna



52 348 viviendas serán promovidas (*)



**Inversión:
s/ 1 349 MM.**



**592 predios (1 510 ha)
entregados al cierre de año-SBN**



**Inversión:
s/ 35.3 MM.**

Producto	Meta 2021	
	N°	Monto S/
Bono del Buen Pagador	5,357	75,000,000
CSP: Construcción en Sitio Propio	21,619	518,420,800
AVN: Vivienda Nueva	7,102	250,000,000
Bono Reforzamiento	505	7,575,000
Vivienda Rural (*)	17,765	497,100,000
TOTAL	52,348	1,348,768,174

A través de la SBN:

592 predios serán entregados para el desarrollo de proyectos de inversión pública y privada, con énfasis en proyectos inmobiliarios y otros.

(*) S/ 262.1 millones condicionados a culminar expedientes técnicos para 17,765 viviendas (PMHF 2021)

Metas para el Año Fiscal 2021 vivienda y urbanismo



S/ 20,6 Mill.



Infraestructura y equipamiento urbano

Inicio de la ejecución física de la **Nueva ciudad de Belén (Vialidad, saneamiento, drenaje)** que beneficiará a 10 mil habitantes.



S/ 9,9 Mill. (*)



Planificación urbana

01 Plan de Desarrollo Metropolitano para Lima Metropolitana y **01** Plan de Desarrollo Metropolitano para el Callao. **Más de 9.5 Millones de personas beneficiadas.**

09 Planes de Acondicionamiento Territorial (La libertad y Lambayeque), **02** Planes de Desarrollo Metropolitano (La Libertad y Lambayeque) y **22** Planes de Desarrollo Urbano (La Libertad y Lambayeque). **Más de 2.6 Millones de personas beneficiadas.**



S/ 45,8 Mill.



Formalización predial urbana

44,194 predios formalizados por el COFOPRI, en beneficio de más de 163 mil personas

(*) Sujeto a continuidad de recursos.

Metas para el Año Fiscal 2021 agua y saneamiento

Meta anual en ejecución directa



S/ 1 307 Mill.*

DEPARTAMENTO	Nº Proyectos*	Presupuesto
AMAZONAS	14	13,283,028
ANCASH	6	12,878,141
APURIMAC	28	26,848,652
AREQUIPA	5	56,564,760
AYACUCHO	10	10,249,438
CAJAMARCA	46	41,314,277
CALLAO	1	10,718,236
CUSCO	16	40,131,038
HUANCAVELICA	18	4,325,932
HUANUCO	6	4,258,381
ICA	1	2,135,553
JUNIN	23	13,161,078
LA LIBERTAD	4	918,429
LAMBAYEQUE	1	2,969,315
LIMA**	10	711,344,907
LORETO	29	38,195,877
MADRE DE DIOS	1	700,000
MOQUEGUA	1	323,700
PASCO	1	6,035
PIURA	22	113,326,940
PUNO	53	106,977,428
SAN MARTIN	45	37,080,867
TACNA	3	30,953,400
UCAYALI	10	28,130,989
TOTAL	354	1,306,796,401

354

Proyectos

Proyectos culminados por ejecución directa

243

Proyectos

Total Ejecución Directa:

Conexiones de Agua	38,509
Población Beneficiaria	150,196
Conexiones de Alcantarillado	36,387
Población Beneficiaria	141,920



PNSR (ámbito rural)

238 Proyectos que incluirán 28,100 conexiones de agua que beneficiarán a 109,602 habitantes y 26,182 conexiones de alcantarillado que beneficiarán a 102,121 habitantes.



PNSU (ámbito urbano)

05 Proyectos que incluirán 10,409 conexiones de agua que beneficiarán a 40,594 habitantes y 10,205 conexiones de alcantarillado que beneficiarán a 39,799 habitantes del ámbito urbano.

* Se considera el monto total de proyectos programados por el MVCS.

Metas para el Año Fiscal 2021 agua y saneamiento



S/ 200 Millones

Financiamiento de recursos a los gobiernos locales y regionales de ejecución física para **nuevos Proyectos** de infraestructura urbana y saneamiento que se encuentren **aptos técnicamente**, a través de nuestros programas :PMIB, PNSU y PNSR.



Proyectos que culminarían por transferencia

260
Proyectos

Total Transferencias:

Conexiones de Agua	136,968
Población Beneficiaria	534,191
Conexiones de Alcantarillado	131,155
Población Beneficiaria	511,522



PNSR (ámbito rural)

181 Proyectos que incluirán 46,506 conexiones de agua que beneficiarán a 181,383 habitantes y 46,580 conexiones de alcantarillado que beneficiarán a 181,674 habitantes.



PNSU (ámbito urbano)

79 Proyectos que incluirán 90,462 conexiones de agua que beneficiarán a 352,808 habitantes y 84,575 conexiones de alcantarillado que beneficiarán a 329,848 habitantes.


**Planes de Desarrollo Urbano y Territorial
de las provincias y ciudades de Piura
afectados por el Fenómeno El Niño
Costero 2017**

4



Consecuencias del FEN-2017

49,088
Damnificados

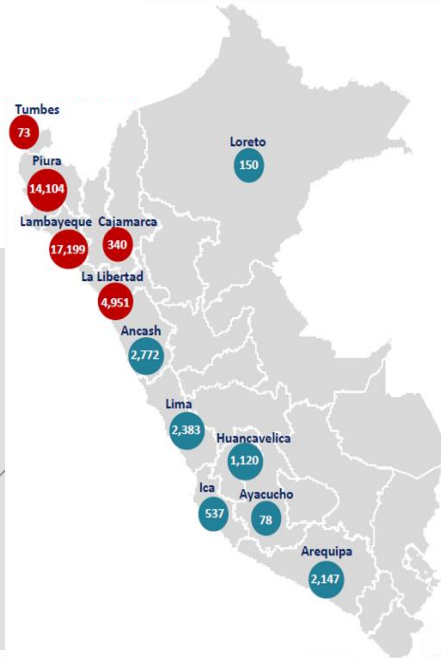

Zona norte del país
80% de damnificados con
viviendas inhabitables y colapsadas

Resto del país
20% de damnificados con
viviendas inhabitables y colapsadas

Los daños del Niño costero en Piura



Fuente: Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN)

Elaboración de Planes Urbanos en Piura

Beneficios de la Planificación Urbana: i) **Ocupación Ordenada del Suelo**, ii) **Sostenibilidad del Desarrollo de la Ciudad**, iii) **Prevención del Riesgo, Accesibilidad y movilidad urbana**, iv) **Identificación y Alternativas de Mitigación**; y, v) **Generación de cartera de Proyectos de Inversión**.

Regulación:

- i) **Decreto Supremo N° 022-2016-VIVIENDA (*)**
- ii) **Términos de Referencia** dentro del marco de la RCC.
- iii) **Procesos participativos**.

(*) *Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sostenible.*

Proceso Participativo:



184

eventos



2,086

participantes

342
observaciones



38
de Colegios
Profesionales

Plazo de Ejecución: **225 días calendario (*)**

Estado actual: Proceso de levantamiento de observaciones:


- Inició el 28 de setiembre de 2020
- Conclusión: Noviembre próximo.

Aprobación: corresponde a las Municipalidades Provinciales (según Ley Orgánica de Municipalidades).


(*) *Contado desde día siguiente de la firma del contrato (fines 2018).*

Los plazos de entrega se encuentran condicionados al otorgamiento de la conformidad por parte de la municipalidad. Los días de emergencia sanitaria no han sido computados en el plazo de ejecución contractual.

GEOPLAN

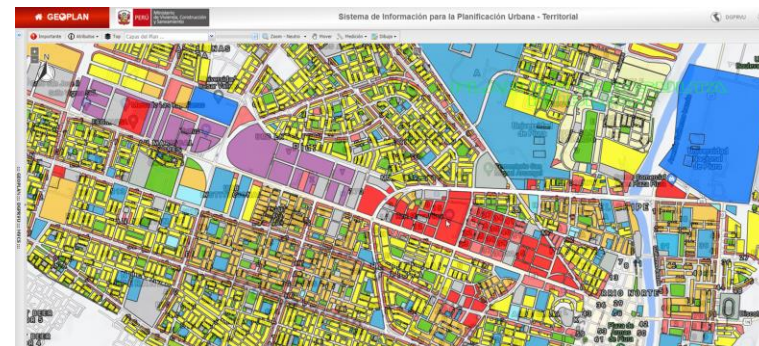


Herramienta tecnológica implementada por el MVCS, para que el proceso de observaciones sea ejecutado con la mayor transparencia y en tiempo real (en línea).

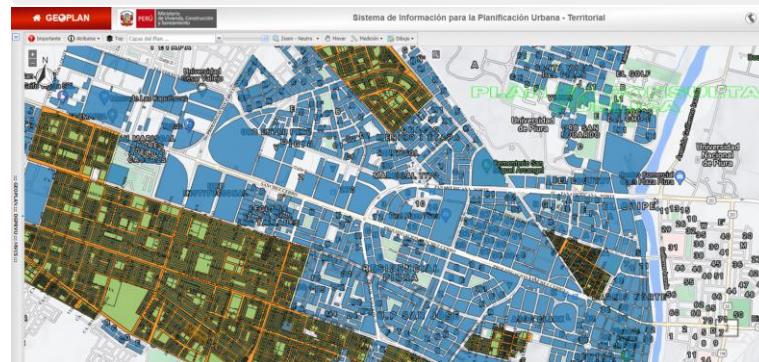

Instrumentos de planificación en Piura - RCC

✓
17
Planes

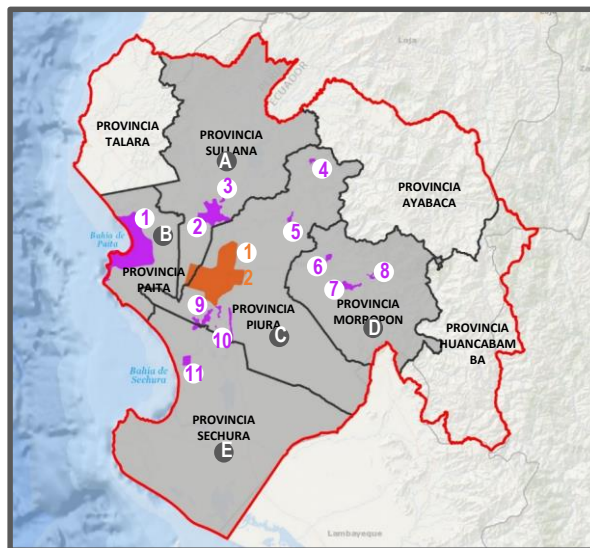

05
PAT

- PAT (5)**
- A SULLANA
 - B PAITA
 - C PIURA
 - D MORROPON
 - E SECHURA

01
PDM

- PDM (1)**
- PIURA, CATACAOS, CASTILLA, 26 DE OCTUBRE

11
PDU

- PDU (11)**
- 1 PAITA
 - 2 SULLANA
 - 3 QUERECOTILLO
 - 4 LAS LOMAS
 - 5 TAMBO GRANDE
 - 6 CHULUCANAS
 - 7 LA MATANZA
 - 8 MORROPON
 - 9 LA ARENA – LA UNION – VICE
 - 10 CURA MORI – EL TALLÁN
 - 11 SECHURA

- Del 100% de la población de la Región Piura, el **80%** (1'481,871 habitantes) contará con Planes Urbanos y Territoriales.
- Del 100% del territorio de la Región Piura, el **62%** (5 de 8 provincias) contará con Planes Territoriales.

Etapas y estado situacional del Desarrollo de Planes Urbanos



Consultor Ejecutor

CONSORCIO AYESA-UG21

- Conformado por: AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.C y CONSULTORES DE INGENIERIA UG 21 SOCIEDAD LIMITADA.
- Contrato N° 175-018-VIVIENDA-OGA-UE.001.



Consultor Supervisor

PROYECTOS Y ESTUDIOS MUNDIALES DE INVERSIÓN S.A.C – PROESMIN S.A.C

- Contrato N° 172-018-VIVIENDA-OGA-UE.001





Monto Contractual:
s/ 8 222 125



Población Beneficiada:
1.5 millones

1,502 Mapas
2,171 Capas




Riesgo por Inundación



Riesgo por Sismo



Cobertura de Agua



Material predominante en las paredes de Vivienda



Modelo de Desarrollo Urbano



PLAN DE TRABAJO

- 01/03/2019



DIAGNÓSTICO (I y II)

- (I Etapa) – 24/06/2019
- (II Etapa) – 25/10/2019



PROPUESTA GENERAL Y ESPECÍFICA

- 23/12/2019



PROGRAMA DE INVERSIÓN Y GESTIÓN

- 24/07/2020



VERSIÓN FINAL DEL PLAN (*)

- 04/11/2020



APROBACIÓN DEL PLAN (**)


- 24/11/2020

Nota: Los plazos establecidos se encuentran sujetos a la ejecución contractual

(*) Etapa en Proceso

(**) Etapa Final, una vez culminada la etapa de Audiencia Pública (Versión Final)

Geo Vivienda – Geo Plan: Herramienta pública y eficaz para la gestión

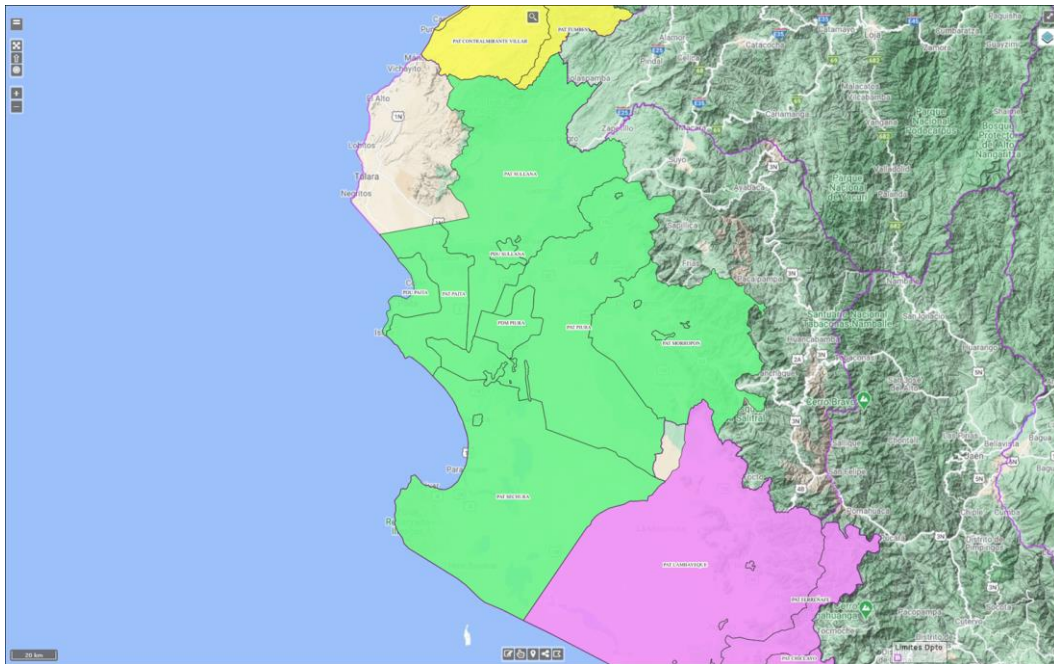

Acceso Público

<https://geo.vivienda.gob.pe/enlaces/geoplan.html>

Programa Nacional de Vivienda Rural

5



Tipo de intervenciones del PNVR

Intervenciones de Forma Regular

El PNVR realiza su intervención en todo el mapa de pobreza del país, considerando el déficit cualitativo, es decir las deficiencias en la calidad de la vivienda, expresado en las variables: materialidad (paredes, pisos y techo), y espacio habitable (hacinamiento)



- Programa Presupuestal 0111 - "Apoyo al Hábitat Rural"

Plan Integral de Reconstrucción con Cambios (PIRCC)

La intervención se efectúa con el objetivo de atender a la población damnificada con viviendas colapsadas o inhabitables por efectos del Fenómeno El Niño Costero, contribuyendo a restituir el bienestar social de los grupos sociales más vulnerables. Deben ser parte del catastro de daños de COFOPRI.



- Decreto Supremo N° 091-2017-PCM
- Programa Presupuestal 0111 - "Apoyo al Hábitat Rural"

Plan Multisectorial ante Heladas y Friaaje (PMHF)

El Plan PMHF 2019-2021 establece la articulación multisectorial para intervenir en los centros poblados y distritos focalizados vulnerables a las heladas y friaaje. En ese marco, el PNVR atiende a la población en situación de pobreza con la dotación de viviendas seguras y acondicionadas térmicamente.



- Decreto Supremo N° 015-2019-PCM
- Decreto Supremo N° 104-2020-PCM
- Programa Presupuestal 068 "Reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres"

Criterios de Focalización y Atención

Criterios de Focalización

Plan Multisectorial ante Heladas y Friaje (PMAHF)

Población pobre y extremadamente pobre en el ámbito de Heladas y Friaje.


Plan Integral de Reconstrucción con Cambios (PIRCC)

Viviendas colapsadas e inhabitables según la evaluación de daños realizada por COFOPRI.

Criterios de Atención

ASPECTO	Nº	CONDICIÓN
SOCIAL	1	Es pobre o extremadamente, según SINAFOH
	2	No ha sido beneficiado anteriormente en mejora de vivienda con Programas Sociales
	3	Reside permanentemente en la vivienda evaluada
	4	Es propietario - posesionario de terreno rural
TECNICO	1	Actual vivienda permanente deteriorada
	2	Actual vivienda permanente no favorece confort térmico
	3	Actual vivienda permanente presenta riesgo estructural
	4	El terreno disponible y su entorno presentan condiciones seguras para la construcción
	5	El terreno disponible muestra características favorables para la construcción
	6	El terreno disponible tiene la dimensión apropiada, según modelo de unidad habitacional a implementar.
	7	No existen limitaciones legales para la construcción
	8	Existen condiciones de accesibilidad para el transporte de materiales.

Criterios de Focalización en Zonas de Heladas y Friaaje

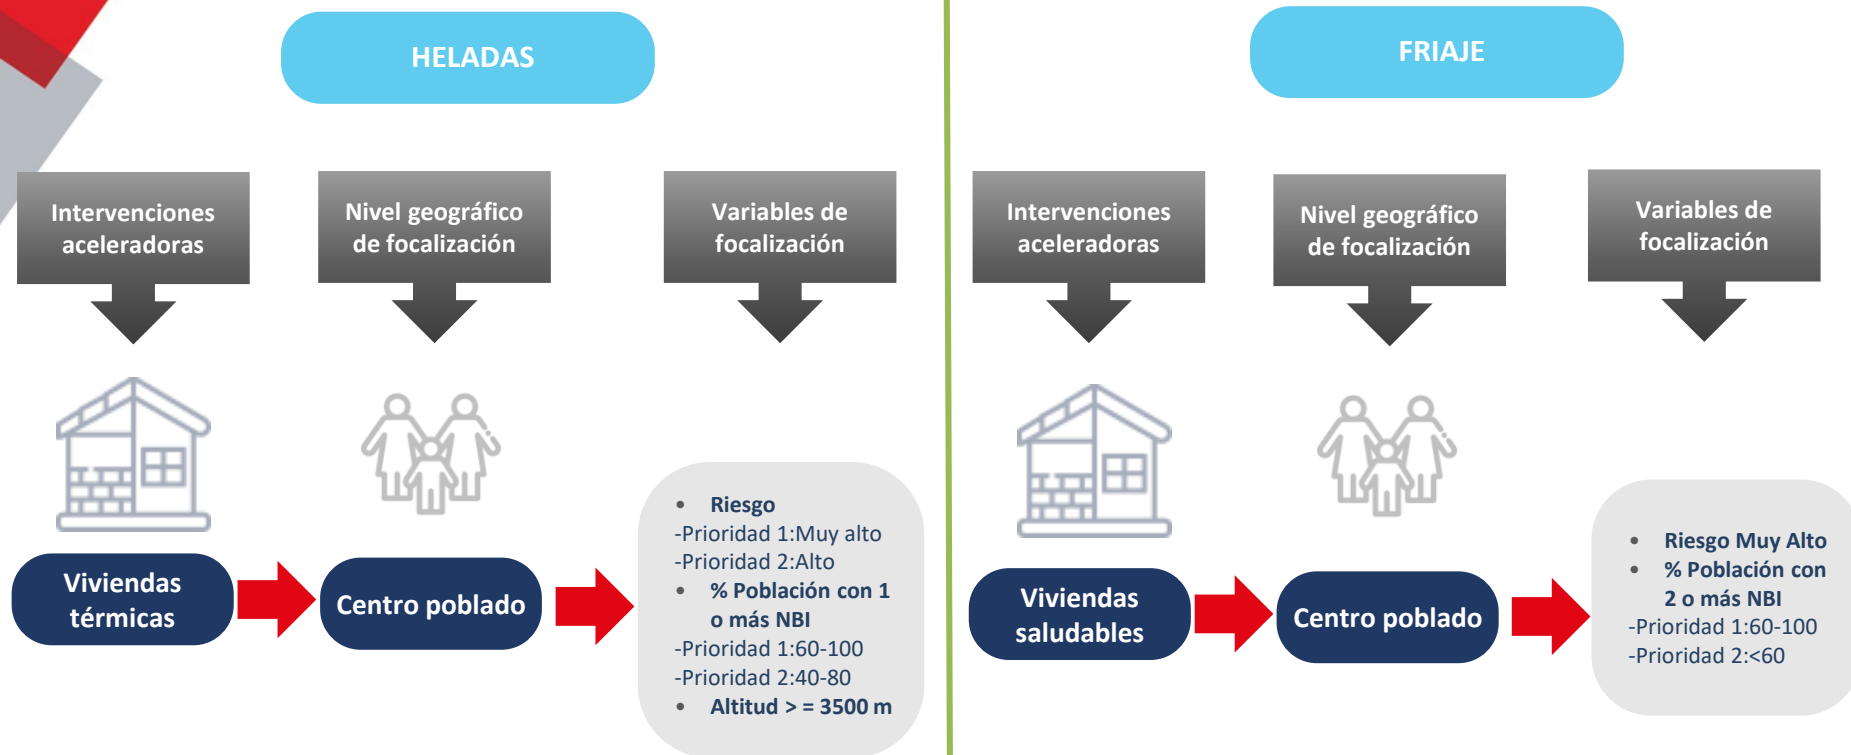

Diseño Típico de SUMAQ WASI

Planta típica de SUMAQ WASI en adobe



Área techada de SUMAQ WASI en adobe

AMBIENTE	ÁREA PISO
Dormitorio 1	5.30
Dormitorio 2	5.80
Cocina Comedor	8.60
Área tapón	1.05
Vereda	2.10


33
Área Construida
(m2)


Elevación típica de SUMAQ WASI en adobe



Especificaciones técnicas en acabados

CARACTERÍSTICAS	
Piso	Madera machihembrada en dormitorios /cemento frotachado en cocina - comedor
Ventanas	Marco de aluminio con sistema corredizo y vidrio 6mm. Llevará contraventana de madera contraplacada con triplay 4 mm y relleno con material termoaislante.
Puertas	Puerta principal con marco de madera, madera machihembrada en la cara exterior, aislante térmico en la parte central y la cara interior recubierta con triplay de 4mm. Las puertas interiores serán contraplacadas con triplay 4mm.
Cobertura	Techo de calamina galvanizada 11 canales, con aislante térmico y cielo raso de fibrocemento 4mm + ventana cenital con vidrio laminados. Llevará canaleta de hierro galvanizado, en ambas caídas.

Viviendas Terminadas 2017-2020

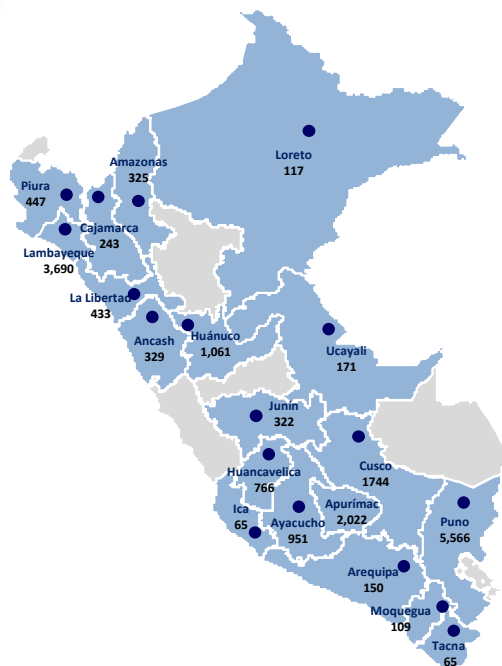

AÑOS	VIVIENDAS CONSTRUIDAS
2017	3,279
2018	4,046
2019	8,549
2020	2,702
Total	18,576



18 576 Viviendas



Viviendas ejecutadas después del FEN 2017

Plan de Forma Regular

Departamento	Año 2017	Año 2018	Año 2019	Total
AMAZONAS		267	58	325
ANCASH		-	26	26
APURIMAC	931	657	-	1,588
AREQUIPA		82	43	125
AYACUCHO	279	472	108	859
CUSCO		376	332	708
HUANCAVELICA		252		252
HUANUCO	421	397	80	898
JUNIN		290	32	322
LAMBAYEQUE		51		51
LA LIBERTAD		-	135	135
LORETO		-	117	117
PUNO	1349	701	330	2,380
UCAYALI	20	151		171
CAJAMARCA	170			170
MOQUEGUA	109			109
Total	3,279	3,696	1,261	8,236

Plan Multisectorial ante Heladas y Friaaje (PMAHF)

Departamento	Año 2019	Año 2020*	Total
APURIMAC		434	434
AREQUIPA	15	10	25
AYACUHO		92	92
CUSCO	805	231	1036
HUANCAVELICA	8	313	321
JUNIN	15	148	163
PUNO	2445	741	3186
TACNA		65	65
Total	3288	2034	5,322

Plan Integral de Reconstrucción con Cambios (PIRCC)

Departamento	Año 2018	Año 2019	Año 2020*	Total
PIURA	105	47	295	447
LAMBAYEQUE	35	3,500	104	3,639
CAJAMARCA	18	1	54	73
LA LIBERTAD	19	233	46	298
ANCASH	104	154	45	303
ICA		65		65
HUANCAVELICA	69		124	193
TOTAL	350	4,000	668	5,018



18 576 Viviendas



92 880 Pobladores beneficiados

Programación de las Viviendas a ejecutarse -2020

Pendiente por ejecutar

Plan Multisectorial ante Heladas y Friaaje (PMAHF)

Departamento	Octubre	Noviembre	TOTAL
PUNO	92	209	301
CUSCO	21		21
APURÍMAC	74		74
AREQUIPA		76	76
AYACUCHO	82		82
TOTAL	269	285	554

Plan Integral de Reconstrucción con Cambios (PIRCC)

DEPARTAMENTO	Octubre	Noviembre	Diciembre	SUB TOTAL
PIURA	29	8	24	61
LAMBAYEQUE	-	-	152	152
CAJAMARCA	19	-	-	19
LA LIBERTAD	82	99	37	218
ANCASH	71	120	82	273
ICA	8	-	-	8
AYACUCHO	1	-	-	1
HUANCAVELICA	-	30	84	114
LIMA	-	26	16	42
TOTAL	210	283	395	888



1 442 Viviendas

Avance Financiero del PIRCC



171.2
Millones

Transferencias realizadas

Año	Transferencia realizada (Millones)	%
2017	14.6	8.5%
2018	109.8	64.1%
2019	45.6	26.6%
2020	1.2	0.7%
Total	171.2	100%

Meta en el PIRCC



5 912
Viviendas

Se realizó el 100% de las transferencias para ejecución y se culminaron el 85% (5,018 viviendas)

Metas de Intervención del año 2021 en PMHF

Región	Heladas	Friaje	Total
ANCASH	191		191
APURIMAC	383		383
AREQUIPA	200		200
AYACUCHO	231		231
CUSCO	1,980		1,980
HUANCAVELICA	732		732
HUANUCO	30		30
JUNIN	168	639	807
LA LIBERTAD	225		225
LIMA	274		274
MOQUEGUA	269		269
PASCO	247	175	422
PIURA	28		28
PUNO	11,966		11,966
TACNA	27		27
TOTAL	16,951	814	17,765



17 765

Viviendas


**Informe sobre las obras de agua,
saneamiento y alcantarillado en el
departamento de Loreto.**

**Evaluación de Financiamiento de 02
obras de infraestructura urbana y
equipamiento.**

6



Proyectos de Saneamiento - Transferencias Totales 2006 al 2020

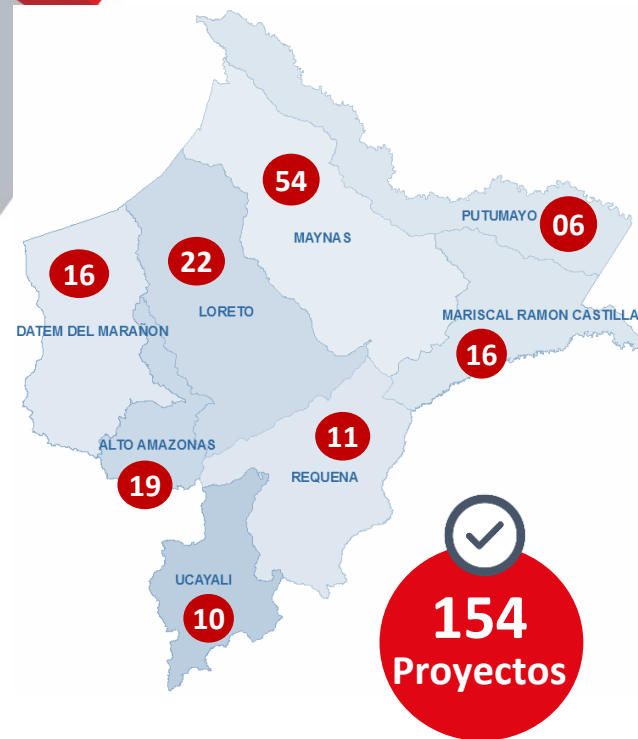


PROVINCIA	N° PROY	POBLACIÓN BENEFICIADA	COSTO DE INVERSION S/	MONTO TOTAL TRANSFERIDO S/
ÁMBITO RURAL (PNSR)				
ALTO AMAZONAS	1	1,120	2,341,687	2,101,520
DATEM DEL MARAÑON	11	8,617	74,801,809	56,684,769
LORETO	19	16,589	119,064,943	82,653,816
MARISCAL RAMON CASTILLA	10	9,630	35,271,922	27,261,220
MAYNAS	13	25,966	43,219,445	35,167,284
PUTUMAYO	6	2,979	29,235,525	23,432,721
REQUENA	8	10,799	43,076,251	32,791,885
UCAYALI	6	6,503	43,808,567	28,323,083
ÁMBITO URBANO (PNSU)				
ALTO AMAZONAS	18	108,601	59,759,357	42,806,062
DATEM DEL MARAÑON	5	18,809	48,306,836	44,103,992
LORETO	3	41,055	200,464,407	81,075,694
MARISCAL RAMON CASTILLA	6	36,310	77,802,993	18,347,947
MAYNAS	41	782,067	629,483,675	127,358,753
REQUENA	3	28,301	40,229,159	38,303,967
UCAYALI	4	29,185	12,591,688	14,538,093
Total	154	1,126,531	1,459,458,266	654,950,805

ESTADO	N° PROY	COSTO DE INVERSION S/	MONTO TOTAL TRANSFERIDO S/
OBRA			
Actos Previos	8	243,900,088	82,609,597
En Ejecución	6	43,325,684	26,677,223
Paralizada	9	81,953,884	65,472,176
Concluido	121	503,475,111	437,871,098
EXPEDIENTE TECNICO			
Actos Previos	1	28,209,903	26,670,104
Concluido	8	65,766,275	8,946,495
PREINVERSION			
Convenio y/o Contrato Resuelto	1	492,827,320	6,704,111
Total	154	1,459,458,266	654,950,805

 **Transferencia:**
s/ 655 Millones

Proyectos de Saneamiento - Transferencias 2020 /1

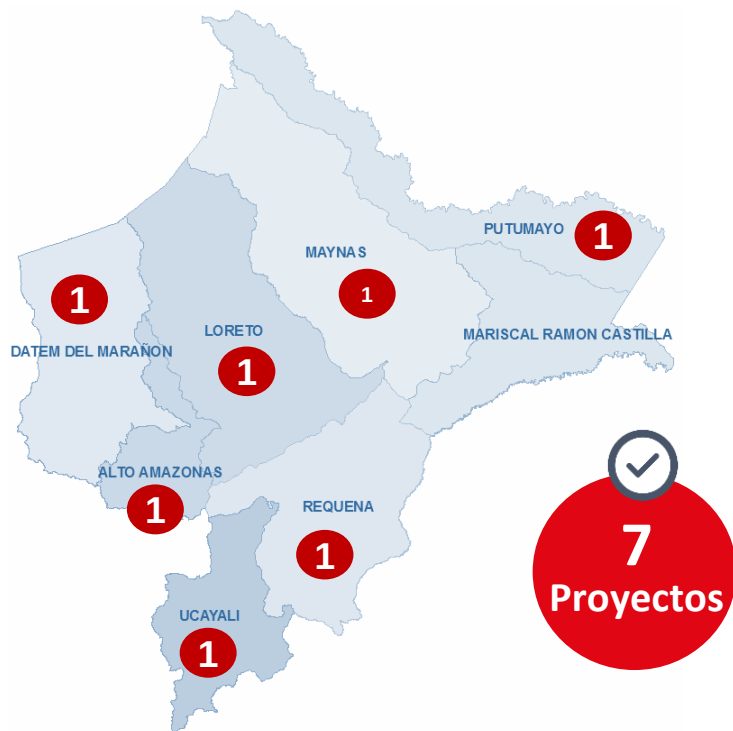

PROVINCIA	N° PROJ.	MONTO TRANSFERIDO 2020 (S/)	COSTO DE INVERSION (S/)	POBLACIÓN BENEFICIADA
ÁMBITO RURAL (PNSR)	4	17,751,795.00	50,177,796.71	5,307.00
DATEM DEL MARAÑON	1	976,251.00	5,244,006.04	740.00
PUTUMAYO	1	2,897,375.00	7,740,764.13	611.00
REQUENA	1	5,394,101.00	14,039,666.85	427.00
UCAYALI	1	8,484,068.00	23,153,359.69	3,529.00
ÁMBITO URBANO (PNSU)	3	9,014,246.00	42,792,739.02	13,527.00
ALTO AMAZONAS	1	4,177,337.00	6,969,228.83	7,232.00
LORETO	1	879,884.00	28,209,902.77	3,773.00
MAYNAS	1	3,957,025.00	7,613,607.42	2,522.00
Total	7	26,766,041.00	92,970,535.73	18,834.00

ESTADO	N° PROJ.	MONTO TRANSFERIDO 2020 (S/)	COSTO DE INVERSION (S/)
Actos Previos	6	25,789,790.00	87,726,529.69
Por Convocar	4	20,732,569.00	52,547,398.09
Por Iniciar	1	4,177,337.00	6,969,228.83
Proceso de Selección	1	879,884.00	28,209,902.77
En Ejecución	1	976,251.00	5,244,006.04
Obra Reiniciada	1	976,251.00	5,244,006.04
Total	7	26,766,041.00	92,970,535.73

/1 Se consideran los proyectos que recibieron transferencias en el 2020 (DS 152-2020-EF/ DU 070-2020-EF/ DU-114-2020-EF)




Transferencia 2020:
s/ 26.8 Millones

Proyectos por Ejecución Directa – Saneamiento ^{/1}



15 550

Pobladores beneficiados

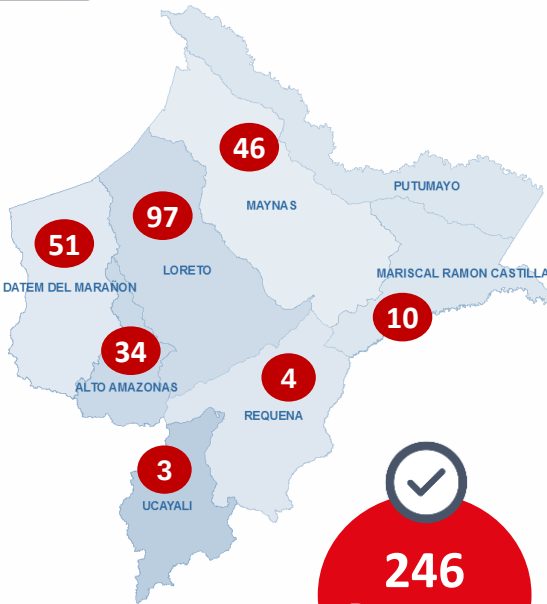

246
Proyectos

PROVINCIA	N°	POBLACIÓN BENEFICIADA	COSTO DE INVERSIÓN (S/)	PIM 2020 (S/)
ALTO AMAZONAS	34	13,085	131,698,022.49	889,812.00
DATUM DEL MARAÑON	51	11,817	146,223,270.89	7,727,700.00
LORETO	97	21,540	278,107,290.41	31,663,178.00
MARISCAL RAMON CASTILLA	10	3,139	40,002,328.00	-
MAYNAS	46	429,100	630,695,228.63	36,411,895.00
REQUENA	4	1,056	12,581,648.00	-
UCAYALI	3	1,024	5,666,094.17	-
VIARIOS	1	55,353	150,000,000.00	-
Total	246	536,114	1,394,973,882.59	76,692,585.00




PIM 2020:
s/ 76.7 Millones

ETAPAS-ESTADOS	N°	COSTO DE INVERSIÓN (S/)	PIM 2020 (S/)
IDEA DE PROYECTO	14	45,014,176.44	-
Actos Previos	14	45,014,176.44	-
PRE INVERSIÓN	56	132,168,195.51	-
Actos Previos	1	840,000.00	-
Concluido	18	50,718,982.51	-
Convenio y/o Contrato Resuelto	11	17,535,000.00	-
En formulación	26	63,074,213.00	-
EXPEDIENTE TÉCNICO	128	466,838,865.69	15,327,900.00
Actos Previos	16	22,242,964.22	-
Concluido	56	213,410,817.63	15,255,132.00
Convenio y/o Contrato Resuelto	39	170,885,244.59	72,768.00
En elaboración	16	56,136,116.25	-
Etapas preliminar	1	4,163,723.00	-
OBRA	46	200,952,644.95	61,364,685.00
Actos Previos	15	35,107,497.95	769,882.00
Concluido	5	20,245,984.20	1,141,701.00
En Ejecución	11	95,152,495.48	58,834,249.00
Paralizada	6	11,812,601.62	-
Post Ejecución	7	35,370,929.33	618,853.00
Transferido O y M	2	3,263,136.37	-
FASE DE FORMULACIÓN	1	150,000,000.00	-
FASE DE PLANEAMIENTO Y PROGRAMACIÓN	1	400,000,000.00	-
Total	246	1,394,973,882.59	76,692,585.00

/1 Se consideran los proyectos ejecutados directamente por el Ministerio contrata(166), Núcleo Ejecutor(26), proyectos de Asociación Público Privada – APP (02) y OXI(12).

Intervenciones de Emergencias – Saneamiento

Ámbito de O&M de 64 PTAP - 4 cuencas

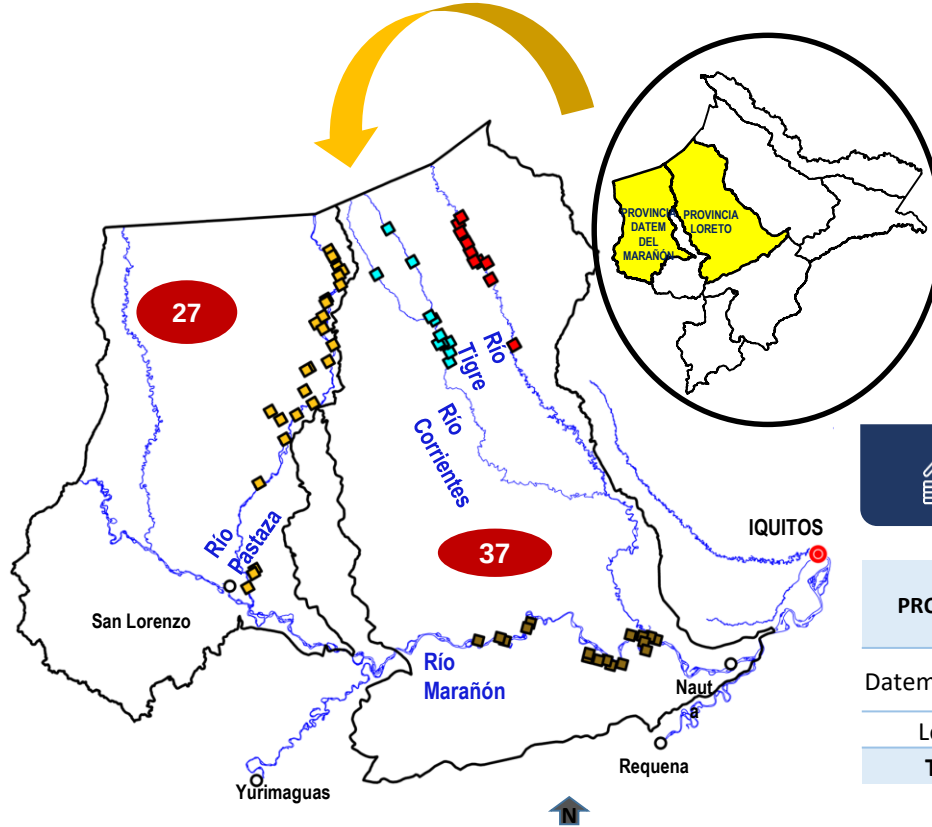

✓ **64** PTAP Compactas

✓ **15 550** Pobladores beneficiados

 **Monto Contratado:**
s/ 2 985 107

PROVINCIA	N° PTAP	POBLACIÓN BENEFICIADA	MONTO CONTRATADO S/
Datem Marañón	27	6575	2,985,107
Loreto	37	8975	
Total	64	15 550	2,985,107

Nota: un solo servicio de emergencia en el año 2020 brinda abastecimiento de agua apta para el consumo humano a través de las 64 plantas potabilizadora.

Obras por Impuesto (OXI) - Saneamiento



Proyectos a Nivel de Pre inversión



1 476

Pobladores
beneficiados



12

Proyectos



Inversión:
s/ 18.9 Millones

01 EMPRESA PRIVADAS INTERESADA

LORETO

1 Paquete de 12
Proyectos
S/ 18.91 Millones



Cuentan con Opinión favorable sobre capacidad
presupuestal para la ejecución de proyectos.

Proyectos de Saneamiento – Plan de Cierre de Brechas de Loreto

Circuito Petrolero



Proyectos a Nivel de Expedientes técnicos



5 481

Pobladores
beneficiados

PROVINCIA	DISTRITO	Nº	Monto 2021
DATEM DEL MARAÑÓN	MANSERICHE	3	5,257,823.00
LORETO	NAUTA	17	59,446,619.00
	TROMPETEROS	1	4,859,762.00
Total		21	69,564,204.00



21
Proyectos



Monto 2021:
s/ 69.6 Millones

Gracias
