



PERÚ

Ministerio
de Salud

MAYO 2021

PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD – PRONIS

VICEMINISTERIO DE PRESTACIONES Y ASEGURAMIENTO EN SALUD

Dr. Bernardo Elvis Ostos Jara
Viceministro de Prestaciones y
Aseguramiento en Salud
Eco. Hernán Yaipén Aréstegui
Coordinador General del PRONIS



BICENTENARIO
PERÚ 2021





PERÚ

Ministerio de Salud

Viceministerio de Prestaciones y Aseguramiento en Salud

Programa Nacional de Inversiones en Salud



FUNCIONES



Hospital distrital de Pacasmayo – La Libertad

FORMULA

EVALÚA

EJECUTA

proyectos de inversión en salud, para todos los niveles de complejidad a nivel nacional.

Brinda asistencia técnica a través de convenios a los gobiernos regionales, gobiernos locales .

Gestiona y supervisa el cumplimiento de las obligaciones contractuales de los proyectos de inversión bajo las modalidades de asociación público privada y obras por impuestos.




PERÚ

Ministerio de Salud

Viceministerio de Prestaciones y Aseguramiento en Salud

Programa Nacional de Inversiones en Salud

FLUJOGRAMA DE INTERVENCIÓN



1

FORMULACIÓN DEL PIP

- Formulamos las fichas técnicas y estudios de preinversión.
- Declaramos su respectiva viabilidad.

2

ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

- Con el PIP aprobado se elabora y supervisa el expediente técnico.

3

EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

- Aprobado el expediente técnico se coordina y monitorea los procesos de ejecución.
- Equipamiento y supervisión de obra.

4

RECEPCIÓN E INAUGURACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD

Somos unidad ejecutora del **pliego MINSA**, las decisiones de intervención y la de sostenibilidad presupuestal son bajo consenso y autorización del **Despacho Ministerial**.



PERÚ

Ministerio
de Salud

PLAN DE CIERRE DE BRECHAS EN INFRAESTRUCTURA 2021-2024

PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD - PRONIS
VICEMINISTERIO DE PRESTACIONES Y ASEGURAMIENTO EN SALUD



BICENTENARIO
PERÚ 2021



218

Asistencias técnicas permanentes en evaluación y verificación del saneamiento físico legal de predios y NTS al 2021

Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (art.24º y 32º R.D.006-2020-EF/63.01)

Durante la Formulación del PI y/o al inicio de la Elaboración del Expediente Técnico o documento equivalente, se verifica que el predio a intervenir cuente:

- *Saneamiento físico legal
- *Arreglos institucionales
- *Disponibilidad física del área



EE.SS. CON ASISTENCIA TÉCNICA EN SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL Y NORMAS TÉCNICAS DE SALUD

HOSPITALES	CENTROS DE SALUD	PUESTOS DE SALUD	DATA CENTER	ALMACÉN	MAT	TOTAL
52	109	38	3	4	12	218

Presupuesto Requerido para el año 2021: S/ 1.0 Millones




PERÚ

Ministerio de Salud

Viceministerio de Prestaciones y Aseguramiento en Salud

Programa Nacional de Inversiones en Salud

FASES DEL CICLO DE INVERSIONES

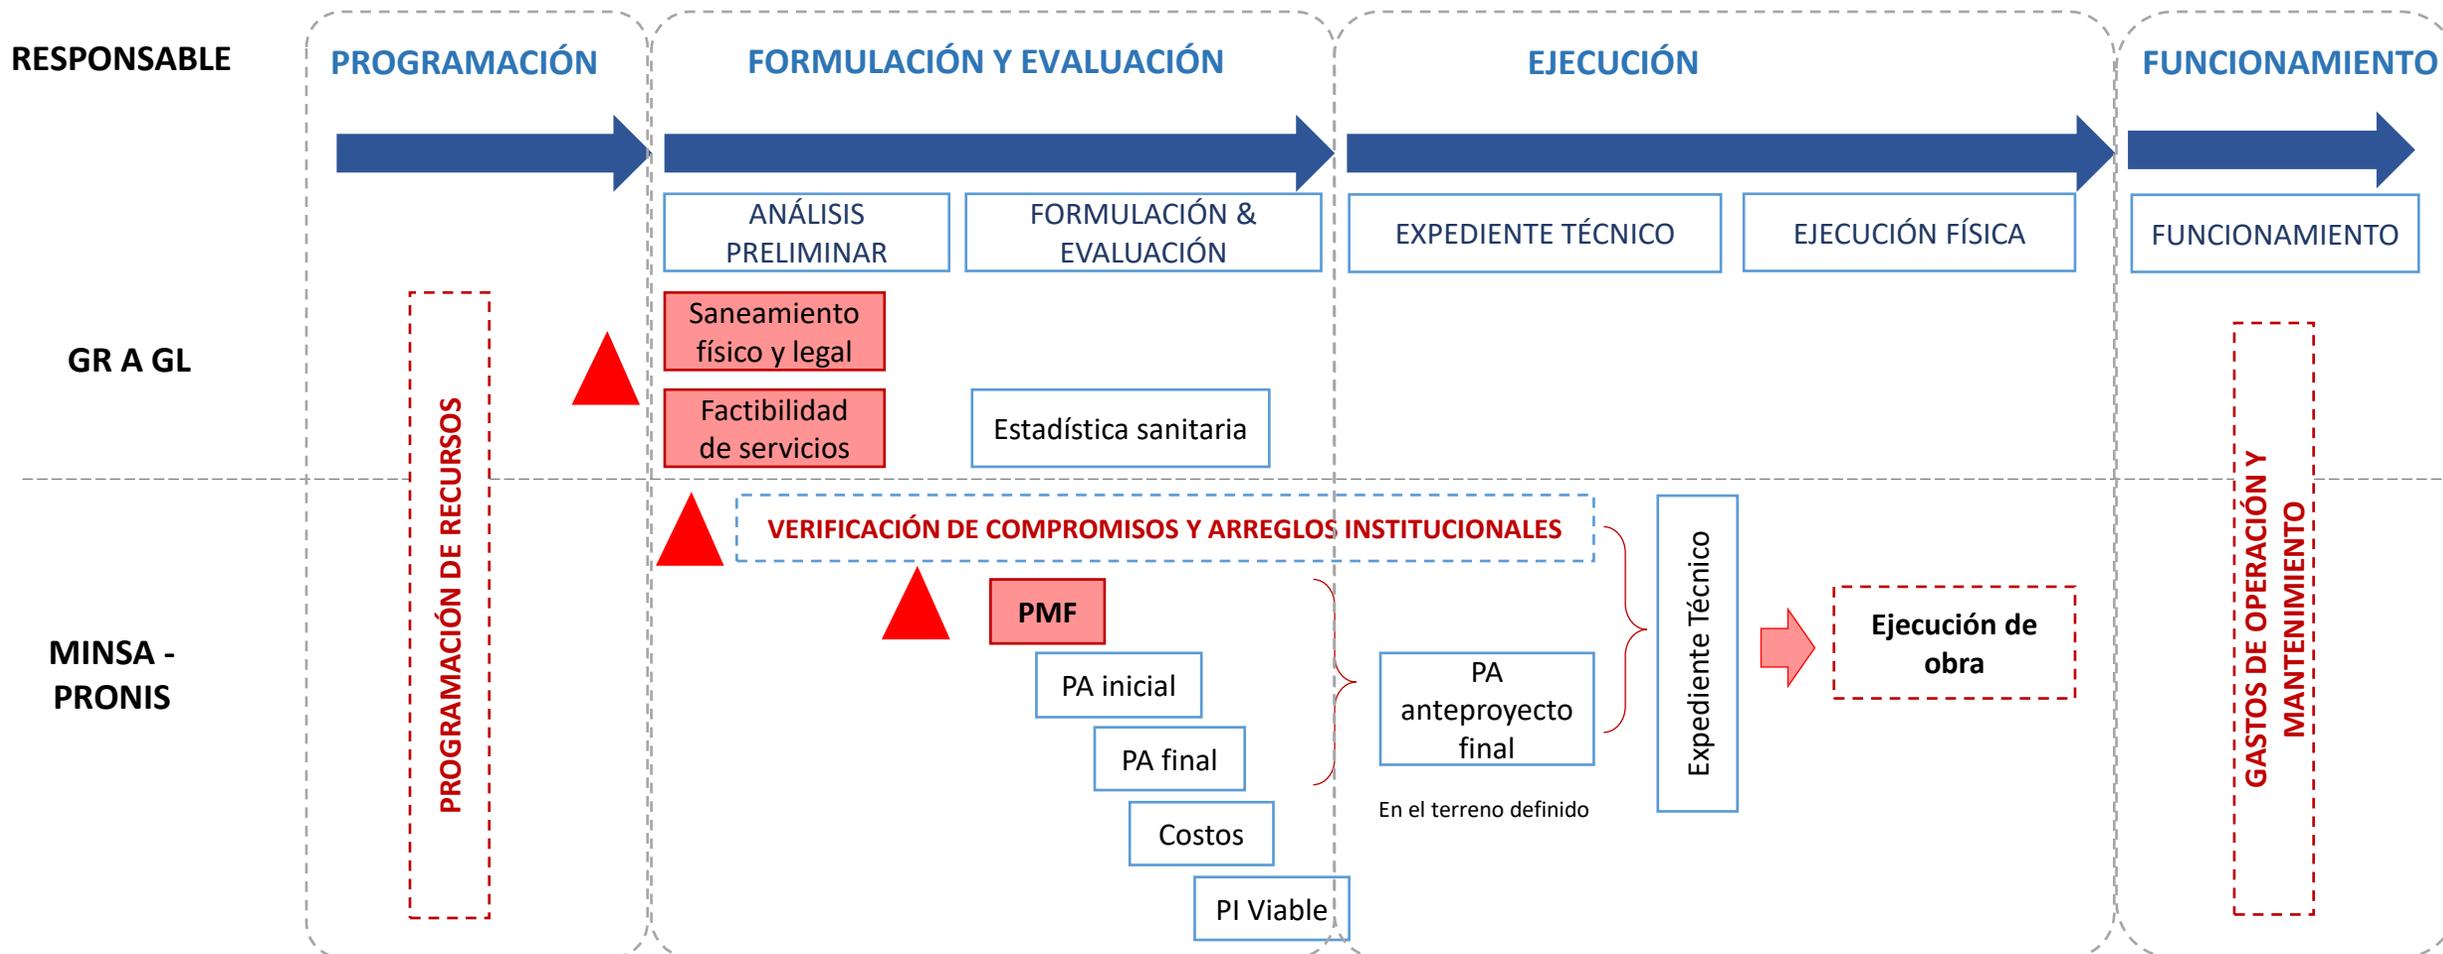

NUDO CRÍTICO

IMPORTANTE Programar presupuesto para dar inicio a las inversiones y para el funcionamiento una vez ejecutadas

PMF Programa Médico Funcional
PA Programa Arquitectónico
PI Proyecto de inversión



PERÚ

Ministerio de Salud

Viceministerio de Prestaciones y Aseguramiento en Salud

Programa Nacional de Inversiones en Salud

ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN



AMAZONAS

EE.SS. Hosp. Gustavo Lanatta (II-2) **+ / ++**
EESS. CS Jalca Grande (I-3) **+ / ++**

CAJAMARCA

EE.SS. CS Magdalena (I-4) **++**

LAMBAYEQUE

EE.SS. CS Toribia Castro (I-4) **++**

SAN MARTIN

EE.SS. Hosp. Juanjui (II-1) **++**

LIMA REGIÓN

EE.SS. Hosp. Huacho (II-2) **++**
EESS Hosp. San Juan Bautista Huaral (II-1) **++**

LIMA METROPOLITANA

EE.SS. Hosp. Papa Francisco (II-1) **++**

EESS Hosp. Huaycan (II-1)

EESS Hosp. San Juan de Lurigancho (II-2)

EESS Hosp. Arzobispo Loayza (III-1) **++**
EESS Inst. Nacional Salud del Niño (III-2) **++**
EESS Hosp. Cayetano Heredia (III-1) **++**
EESS Hosp. Dos de Mayo (III-1) **++**

AYACUCHO

EE.SS. Hosp. Bicentenario (II-1) **++**

AREQUIPA

EE.SS. CS ACARI (I-3) **++**

LA LIBERTAD

EE.SS. IREN Norte (III-2)
EE.SS. Instituto Regional Materno Perinatal (III-2)
EE.SS. Hospital Regional Docente Trujillo (III-1)
EE.SS. CS Julcan (I-4)

CALLAO

EE.SS. Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión (III-1)
EE.SS. Hospital San Jose (II-1)
EE.SS. Hospital Ventanilla (II-1)
EE.SS. Hospital de Rehabilitación

APURIMAC

EE.SS. Hospital Guillermo Diaz de la Vega (III-1)

COMPROMISOS CON CONVENIOS



Categoría	Convenio para Formulación & Evaluación		Convenio para Asistencia Técnica		Total N°	Total S/. Millones
	Cant	S/. Millones	Cant	S/.		
I-3	2	S/. 60.00			2	S/. 60.00
I-4	2	S/. 80.00	1		3	S/. 80.00
II-1	5	S/. 850.00	3		8	S/. 850.00
II-2	3	S/. 850.00			3	S/. 850.00
III-1	3	S/. 3,600.00	3		6	S/. 3,600.00
III-2	1	S/. 1,200.00	2		3	S/. 1,200.00

+ Convenio Vencido
++ Proyecto Sin financiamiento

S/. 6.3 Millones necesarios para culminar estudios

2021	S/ 1.7 Millones
2022	S/ 4.6 Millones



PERÚ

Ministerio de Salud

Viceministerio de Prestaciones y Aseguramiento en Salud

Programa Nacional de Inversiones en Salud

ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN SOLICITADOS 2020-2021



LAMBAYEQUE

- EE.SS. C.S. Fernando Carbajal (I-3) ++
- EE.SS. C.S. Morrope (I-3) ++
- EE.SS. C.S. Enrique Tirado (I-3) ++

LORETO

- EE.SS. C.S. San Felipe (I-1) ++
- EE.SS. C.S. San Isidro (I-1) ++
- EE.SS. C.S. San Antonio (I-1) ++

CAJAMARCA

- EE.SS. Hosp. de Apoyo Celendín (II-1) ++
- EE.SS. CS Lajas (I-3) ++
- EE.SS. CS Cadmalca (I-2) ++
- EE.SS. CS Llangoden (I-2) ++
- EE.SS. CS Pampacancha (I-2) ++
- EE.SS. CS Chinlanlan (I-1) ++
- EE.SS. CS Churucancha (I-1) ++
- EE.SS. CS Corazón de María (I-1) ++
- EE.SS. CS El Arenal (I-1) ++
- EE.SS. CS Marcopampa (I-1) ++
- EE.SS. CS Olmos (I-1) ++
- EE.SS. CS Pacobamba (I-1) ++
- EE.SS. CS San Carlos (I-1) ++
- EE.SS. CS La Sinra (I-1) ++
- EE.SS. CS Tauripampa (I-1) ++
- EE.SS. CS San Miguel de Pangoray (I-4) ++
- EE.SS. CS Llangoden Bajo (Anexo) ++
- EE.SS. CS Yacuchingana (Anexo) ++
- EE.SS. CS EL Lirio (Anexo) ++
- EE.SS. CS Quinuapampa (Anexo) ++

JUNÍN


- EE.SS. CS Perené (I-4) ++
- EE.SS. CS San Luis de Shuaro (I-3) ++
- EE.SS. CS San Ramón (I-4) ++
- EE.SS. CS Huachac (I-3) ++
- EE.SS. CS Comas (I-3) ++
- EE.SS. CS Chongos Alto (I-3) ++
- EE.SS. CS El Tambo (I-3) ++
- EE.SS. CS Sapallanga (I-3) ++
- EE.SS. CS Acolla (I-3) ++
- EE.SS. CS Llocllapampa (I-3) ++
- EE.SS. CS Sincos (I-3) ++
- EE.SS. CS Carhuamayo (I-3) ++
- EE.SS. CS Ulcumayo (I-3) ++
- EE.SS. CS Tziriari (I-3) ++
- EE.SS. CS Poyeni (I-3) ++
- EE.SS. CS Acobamba (I-4) ++
- EE.SS. CS Huasahuasi (I-4) ++
- EE.SS. CS Palca (I-3) ++
- EE.SS. CS Santa Rosa de Sacco (I-3) ++
- EE.SS. Hospital La Oroya (II-2) ++

LIMA METROPOLITANA

- EE.SS. C.S. Materno Infantil Surquillo (I-4) ++

AYACUCHO

- EE.SS. C.S. de Hualla (I-4) ++

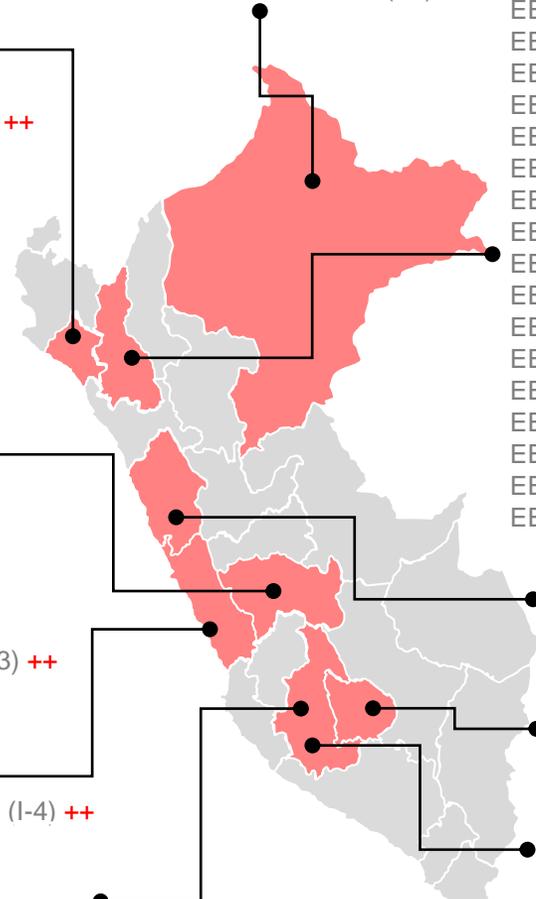

ANCASH

- EE.SS. Hospital Regional de Huaraz (III-1) ++

APURIMAC

- EE.SS. C.S. Manchaybamba (I-3) ++
- EE.SS. C.S. Argama (I-3) ++
- EE.SS. C.S. Pacucha (I-3) ++

AYACUCHO

- EE.SS. C.S. Anchiuay (I-2) ++

++ Proyecto Sin financiamiento

SIN CONVENIOS

28

Formulación de Estudios

25

Asistencias Técnicas

782

MILLONES INVERSIÓN PROYECTADA 2022-2024

Categoría	Solicitud para Formulación & Evaluación		Solicitud para Asistencia Técnica		Total N°	Total S/. Millones
	Cant	S/. Millones	Cant	S/.		
ANEXO			4		4	
I-1	3	S/ 12	11		14	S/ 12
I-2			4		4	
I-3	15	S/ 270	4		19	S/ 270
I-4	9	S/ 225			9	S/ 225
II-1			1		1	
II-2	1	S/ 275			1	S/ 275
III-1			1		1	

S/. 9.3 Millones necesarios para culminar estudios



2021	S/ 3.7 Millones
2022	S/ 5.6 Millones



PERÚ

Ministerio de Salud

Viceministerio de Prestaciones y Aseguramiento en Salud

Programa Nacional de Inversiones en Salud

IOARR (MODULARES) REGISTRADOS EN EL BANCO DE INVERSIONES



CAJAMARCA

HOSP. SAN JAVIER DE BELLAVISTA
MAT BELLAVISTA
S/. 24.3 millones
HOSP. 30 camas

HUÁNUCO

HOSP. HERMILIO VALDIZAN
MAT HUÁNUCO
S/. 16.7 millones
HOSP. 50 camas

PASCO

HOSP. ROMAN EGOAGIL PANDO
MAT VILLA RICA
S/. 11.5 millones
HOSP. 30 camas

APURÍMAC

HOSP. REGIONAL GUILLERMO DIAZ DE LA VEGA
MAT ABANCAY
S/. 17.3 millones
HOSP. 50 camas

HOSP. SUBREG DE ANDAHUAYLAS MAT
ANDAHUAYLAS
S/. 16.9 millones
HOSP. 50 camas

UCAYALI

HOSP. AMAZÓNICO DE YARINACocha
MAT BELLAVISTA
S/. 29.9 millones
HOSP. 30 camas

CUSCO

HOSP. DE SANTO TOMÁS MAT
SANTO TOMÁS
S/. 29.1 millones
HOSP. 30 camas

HOSP. REGIONAL CUSCO
MAT
S/. 16.7 millones
HOSP. 50 camas

08

IOARR
CULMINADOS

162.9

MILLONES
MONTO TOTAL

UBICACION	CANT	S/. MILLONES
SIERRA	07	133.0
SELVA	01	29.9

No requiere recursos para elaboración de IOARR



PERÚ

Ministerio de Salud

Viceministerio de Prestaciones y Aseguramiento en Salud

Programa Nacional de Inversiones en Salud



FTE (Ficha Técnica Estándar)*

FICHA TECNICA ESTANDAR- FTE

INTERVENCIÓN A TRAVÉS DE SISTEMAS MODULARES PREFABRICADOS Y ESTANDARIZADOS.

VENTAJAS,

- AGILIZA EL PROCESO DE EJECUCIÓN
- REDUCE TIEMPOS
- REDUCE COSTOS.



CAPACITACIONES


A NIVEL NACIONAL EN COORDINACIÓN CON EL MINSa.



DISEÑO MODULAR PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EN ZONA RURAL



LA ELABORACION DE LA FTE SE DESARROLLO CON UN EQUIPO ESPECIALIZADO DEL PRONIS, MINSa Y MEF.

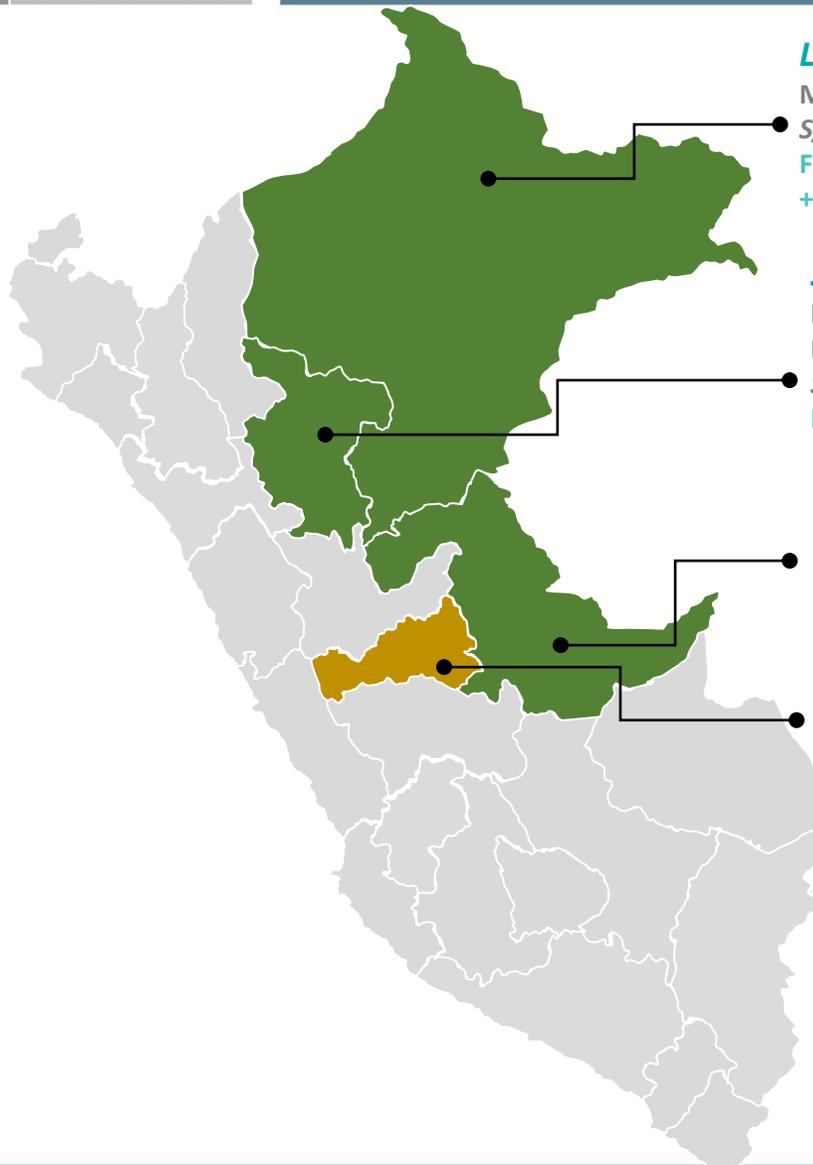

LORETO

MAT. BASIC. NUEVA ALIANZA
 S/. 8.9 millones
 FTE (EN PROCESO) I-1
 + (EXP. TÉCNICO)

SAN MARTÍN

HOSP. DE BELLAVISTA
 MAT BELLAVISTA
 S/. 13.4 millones
 FTE + I-3 (EN PROCESO)

UCAYALI

HOSP. REGIONAL DE PUCALLPA
 MAT SAN JUAN
 S/. 13.4 millones
 FTE + I-3 (EN PROCESO)

PASCO

HOSP. GENERAL DE OXAPAMPA
 MAT CONSTITUCIÓN
 S/. 13.4 millones
 FTE + I-3 (EN PROCESO)



Ubicación	FTE	
	Cant	S/. Millones
SELVA	4	49.3

S/. 150,000 necesarios para la **elaboración** de Ficha Técnica Estándar

→ 2021 S/ 150,000

*Es un Proyecto de inversión



PERÚ

Ministerio de Salud

Viceministerio de Prestaciones y Aseguramiento en Salud

Programa Nacional de Inversiones en Salud

EXPEDIENTES TÉCNICOS EN ELABORACION 2021



PROGRAMACION 2021

CAJAMARCA

H. BAMBAMARCA S/ 123.1 Millones
EN ELABORACIÓN – MAYO 2021
OBRA: SIN FINANCIAMIENTO

LA LIBERTAD

EESS VIRU
S/ 106.2 Millones
EXP. TEC: SIN FINANCIAMIENTO
HOSP. TOMAS LA FORA
S/ 163.2 Millones
EXP. TEC: SIN FINANCIAMIENTO

ANCASH

HUARI
S/ 192.4 Millones
APROBADO CON RESOLUCION
OBRA: SIN FINANCIAMIENTO

HUARMEY

S/ 177 Millones
EN ELABORACION – MAYO 2021
OBRA: CON FINANCIAMIENTO

LIMA

IOARR CERCO SJL.
S/ 1.0 Millón
EN ELABORACION –MAYO 2021
OBRA: CON FINANCIAMIENTO
ENRIQUE MONTENEGRO
S/ 138 MILLONES
EXP. TEC: SIN FINANCIAMIENTO

CALLAO - 01

E.S PALMERAS DE OQUENDO.
S/ 18.1 Millones
EXP. TEC: SIN FINANCIAMIENTO

APURIMAC

H. TAMBOBAMBA
S/ 121.3 Millones
APROBADO CON RESOLUCION OBRA A CARGO DE PEIP

AREQUIPA

C.S VIRACO
S/ 30.2 Millones
EXP. TEC: SIN FINANCIAMIENTO

AMAZONAS

EE.SS. POMACOCCHAS I-4
S/ 29.5 Millones
EN ELABORACION – MAYO 2021
OBRA: SIN FINANCIAMIENTO

CON RECURSOS PARA INICIAR ELABORACION DE E.T. LORETO

EE.SS. 12 DE OCTUBRE - S/ 29.85 Millones
EE.SS ANTOQUÍA - S/ 4.7 Millones
EE.SS PAMPA HERMOSA - S/ 6.1 Millones
EE.SS NUEVA JERUSALÉN - S/ 6.9 Millones
EE.SS NUEVO ANDOAS - S/ 30.1 Millones
EE.SS. LA PETROLERA - S/ 4.9 Millones
EE.SS MAYURIAGA - S/ 4.9 Millones
EE.SS ALIANZA CRISTIANA - S/ 20.4 Millones
EN ELABORACION – II SEMESTRE -2021
EXP. TEC: CON FINANCIAMIENTO
POR D.U. 040-2021
OBRA: SIN FINANCIAMIENTO

CUSCO

EE.SS. QUIÑOTA - S/ 11.1 Millones
EN ELABORACION -MAYO 2021
OBRA: SIN FINANCIAMIENTO

EESS MACHUPICCHU - S/ 29.5 Millones
EXP. TECNICO SALDO DE OBRA EN ELABORACION
OBRA: SIN FINANCIAMIENTO

EE.SS. QUILLABAMBA - / 185.2 Millones
EXP. TECNICO SALDO DE OBRA POR UCI
EXP. TEC: SIN FINANCIAMIENTO

AYACUCHO

E.S SAN SEBASTIAN DE SACRACA I-3
S/ 14.5 Millones
EXP. TEC: SIN FINANCIAMIENTO

23

EXPEDIENTES TÉCNICOS PROGRAMADOS EN EL PRESENTE AÑO

02

EXPEDIENTES TÉCNICOS APROBADOS

06

EXPEDIENTES TECNICOS EN ELABORACION

08

EXPEDIENTES TECNICOS CON FINANCIAMIENTO (se tiene) S/ 7.35 MILLONES

07

EXPEDIENTES TECNICOS SIN FINANCIAMIENTO (se requiere) S/ 11.2 Millones



PERÚ

Ministerio de Salud

Viceministerio de Prestaciones y Aseguramiento en Salud

Programa Nacional de Inversiones en Salud

PROYECTOS PROGRAMADOS PARA EJECUCION 2021 - 2023



PROGRAMACIÓN 2022-2024

CAJAMARCA - 02

- C.S SAN MIGUEL
- S/ 44.5 Millones
- C.S. MAGDALENA

LAMBAYEQUE - 04

- C.S. TORIBIO CASTRO
- C.S. CARBAJAL SEGURA
- C.S. MORROPE
- C.S. VICTOR RAUL TIRADO BONILLA

LIMA - 12

- RECUPERACION DE ALMACEN DE MEDICAMENTOS
- S/ 1.2 Millones
- E.S HUAYCAN II-1
- S/ 120 Millones
- HOSP. HUACHO II-2
- S/ 550 Millones
- HOSP. SAN JUAN DE LURIGANCHO II-2
- S/ 360.2 Millones
- HOSP. MANCHAY
- HOSP. LOAYZA
- HOSP. CAYETANO HEREDIA.
- INST. DEL NIÑO BREÑA
- HOSP. HUARAL
- HOSP 2 DE MAYO
- C.S. MATERNO INFANTIL SURQUILLO

AREQUIPA - 01

- C.S. CARAVELI

06 - AMAZONAS

- C.S GALILEA I-4
- S/ 39.9 Millones
- C.S CANDUNGOS I-3
- S/ 33.7 Millones
- C.S PUTUYAKAT
- S/ 27.7 Millones
- C.S. JUMBILLA
- C.S. JALCA GRANDE
- HOSP. LANATTA LUJAN

01 - SAN MARTIN

- HOSP. JUANJUI

07 - AYACUCHO

- E.S CCALACCAPCHA I-2
- S/ 5.2 Millones
- E.S CORCULLA I-2
- S/ 5.4 Millones
- E.S SAN JOSE DE USHUA I-2
- S/ 5.04 Millones
- E.S DE OYOLO I-3
- S/ 3.4 Millones
- E.S DE PAUSA I-4
- S/ 21.9 Millones
- HOSP. BICENTENARIO II-1
- S/ 350 Millones
- C.S. HUALLA

07 - LORETO

- C.S. BARRANQUITA DE CAHUAPANAS
- C.S. SAN RAMOS DE SINAR
- C.S. PALMICHE I-1
- C.S. KAUPAN I-1
- C.S. SAN MIGUEL I-1
- P.S. SAMTA ,AROA DEHUAPANAS I-2
- P.S. SAN ANTONIO DE CAHUAPANAS I-2

21 - JUNIN

- HOSP. APOYO JUNIN II-1
- S/ 120 Millones
- C.S. PERENE I-4
- C.S. SAN LUIS DE CHUARO I-3
- C.S. SAN RAMON I-4
- C.S. HUACHAC I-3
- C.S. COMAS I-3
- C.S. CHONGOS ALTO I-3
- C.S EL TAMBO I-3
- C.S. SAPALLANGA I-3
- C.S. ACOLLA I-3
- C.S. LLOCLLAPAMPA I-3
- C.S. SINCOS I-3
- C.S. CARHUAMAYO I-3
- C.S. ULCUMAYO I-3
- C.S. TZIRIARI I-3
- C.S. POYENI I-3
- C.S. ACOBAMBA I-4
- C.S. HUASAHUASI I-4
- C.S. PALCA I-3
- C.S. SANTA ROSA DE SACCO I-3
- HOSP. LA OROYA II-2

60 EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA ELABORACION

EXPEDIENTES TÉCNICOS PROGRAMADOS ELABORACION PARA 2021-2024

S/. 93.9 MILLONES

SE REQUIERE PARA EL 2021

S/. 33.2 Millones

SE REQUIERE PARA EL 2022

S/. 14.8 Millones

SE REQUIERE PARA EL 2023

S/. 45.9 Millones



PERÚ

Ministerio de Salud

Viceministerio de Prestaciones y Aseguramiento en Salud

Programa Nacional de Inversiones en Salud

ASISTENCIAS TÉCNICAS – EXPEDIENTES TÉCNICOS



AMAZONAS - 1

EE.SS. EL MILAGRO
TOTAL - S/ 6.42 Millones

PIURA - 3

EE.SS. VICACHANI
EE.SS. BERNAL (GR)
EE.SS. SANTA VICTORIA
TOTAL - S/ 24.62 Millones

HUANCAVELICA - 7

EE.SS. CCOYLLORPANCCA
EE.SS. ONGOY
EE.SS. SAN PEDRO DE CORIS
EE.SS. COBRIZA
EE.SS. LOCROJA
EE.SS. YAULI
EE.SS. SANTO TOMAS DE PATA
TOTAL - S/ 64.85 Millones

AYACUCHO - 12


EE.SS. MANCHIRI
EE.SS. VISCHONGO
EE.SS. AUCARA
EE.SS. TAMBILLO
EE.SS. CCARHUACCAPAMPA
EE.SS. LLOCHEGUA
EE.SS. SAN LUIS BAJA DE SANCOS
EE.SS. OLLEROS
EE.SS. CHACA
EE.SS. PAMPA CANGALLO
EE.SS. ORONCCOY
EE.SS. MARIA PARADO DE BELLIDO
TOTAL - S/ 104.94 Millones

ICA - 1

EE.SS. SAN PEDRO DE HUARCAPANA
TOTAL - S/ 0.77 Millones

TACNA - 1

H. HIPOLITO UNANUE (GR)
TOTAL - S/ 327.74 Millones

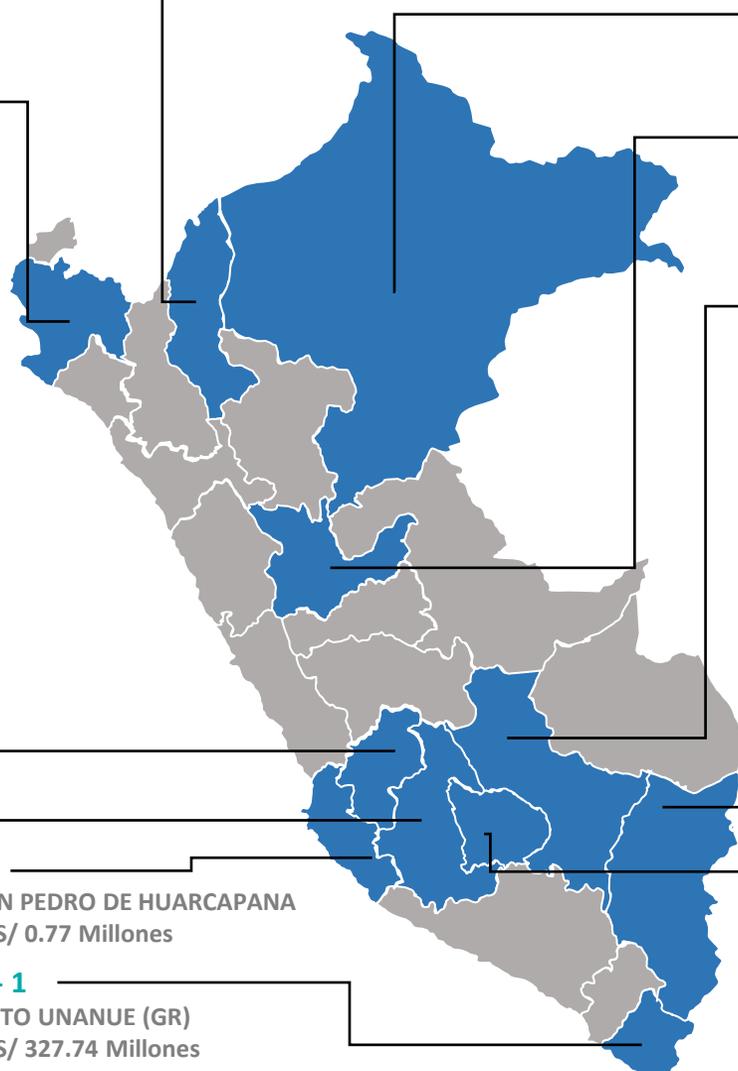

LORETO - 1

EE.SS. SAN JUAN DE MORONA
TOTAL - S/ 7.12 Millones

HUANUCO - 2

EE.SS. DE PACHAS
EE.SS. CHUQUIS
TOTAL - S/ 33.01 Millones

CUSCO - 7

EE.SS. DE HAMPATURA
EE.SS. HUALLHUA Y MARA MARA
EE.SS. SAN JUAN DE CHACÑA
EE.SS. VILLAVIRGEN
EE.SS. PILLPINTO
EE.SS. LUTTO
EE.SS. VELILLE
TOTAL - S/ 59.52 Millones

PUNO - 2

EE.SS. ANAPIA
EE.SS. PUEBLO LIBRE
TOTAL - S/ 13.10 Millones

APURIMAC - 6

EE.SS. SAURI BAJO
EE.SS. POLTOCSA
EE.SS. CHACA
EE.SS. COCHARCAS
EE.SS. SACCLAYA
EE.SS. ROCCHACC
TOTAL - S/ 38.59 Millones

- El PRONIS viene brindando asistencias técnicas a 43 proyectos en etapa de expedientes técnicos en elaboración por parte de los GORE y GOLO.
- La aprobación de los expedientes y su ejecución es entera responsabilidad de los GORE y GOL, en calidad de unidades ejecutoras.

02 PROYECTOS DE GOBIERNO REGIONALES

41 PROYECTOS DE GOBIERNOS LOCALES

43 ASISTENCIAS TÉCNICAS

Monto de inversión

S/ 677.68 MILLONES



PERÚ

Ministerio de Salud

Viceministerio de Prestaciones y Aseguramiento en Salud

Programa Nacional de Inversiones en Salud

13 PROYECTOS EN EJECUCIÓN 2021



LA LIBERTAD Y PUNO

H. PACASMAYO (II-E) y C.S. PUTINA (I-4)

Funcionamiento

Obra entregada

Equipamiento en ejecución (92% Avance)

LIMA

H. SAN JUAN DE LURIGANCHO

S/ 360.2 Millones

(Cerco Perimétrico)

S/0.9 Millones

Fecha tentativa de inicio de Obra: Julio 2021

HUANCAVELICA

H. ZACARIAS CORREA (II-2)

S/ 342.9 Millones

491,278 beneficiarios

Avance acumulado de Obra 28.55 %

Demanda Adicional 2021: 35.9 Millones

APURÍMAC

H. CHALLHUAHUACHO (II-1)

S/ 80.0 Millones

52,766 beneficiarios

Avance acumulado de Obra 70.96%

Demanda Adicional 2021: 4.1 Millones

C.S. COTABAMBAS (I-4)

S/ 42.0 Millones

4,237 beneficiarios

Avance acumulado de Obra 17.74%


Fecha tentativa de Reinicio de Obra: 24/05/2021

C.S. HAQUIRA (I-4)

S/ 39.1 Millones

11,562 beneficiarios

Avance acumulado de Obra 70.78%

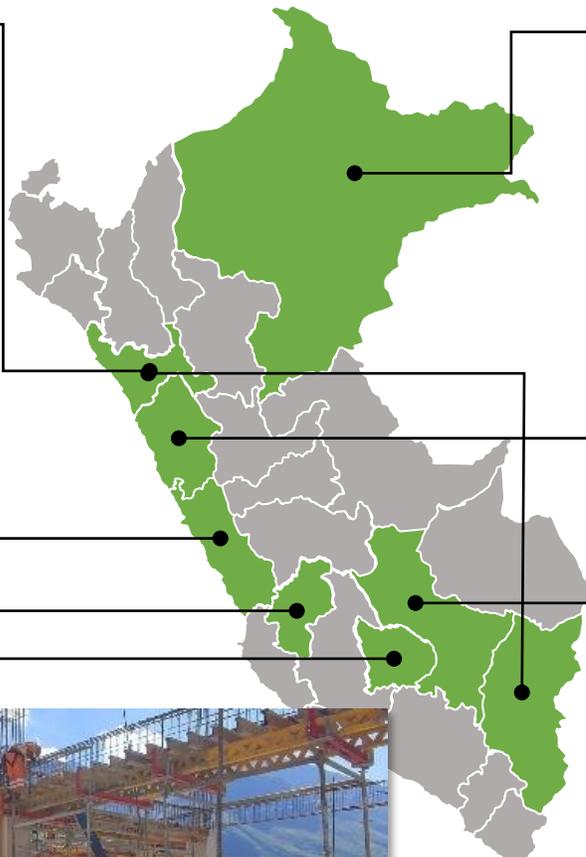

LORETO

C.S. NUEVO ANDOAS (I-4)

S/43.6 Millones

2,426 beneficiarios

Fecha tentativa de inicio de Obra:

Junio 2021

C.S. NUEVO ALIANZA

S/8.9 Millones

2,426 beneficiarios

Fecha tentativa de inicio de Obra:

Junio 2021

ÁNCASH

C.S. PROGRESO (II-E)

S/70.2 Millones

84 474 beneficiarios

Demanda Adicional 2021: 14.7 Millones

Fecha tentativa de inicio de Obra: Junio 2021

CUSCO

H. ESPINAR (II-1)

S/ 130.7 Millones

69,146 beneficiarios

Avance acumulado de Obra 4.12 %

Demanda Adicional 2021: 15.1 Millones

C.S. MACHUPICCHU (I-4)

S/ 29.4 Millones

6,499 beneficiarios

Fecha tentativa de inicio de Saldo de Obra:

Noviembre 2021

Demanda Adicional 2021: 3.5 Millones

H. QUILLABAMBA (II-1)

S/ 185.2 Millones

145,145 beneficiarios

40.35% Avance de Obra

Fecha tentativa de inicio de Obra: Noviembre 2021



Ejecución
2018
S/106.9
Millones

Ejecución
2019
S/165.7
Millones

Ejecución
2020
S/146.3
Millones

PIM 2021
S/59.1
Millones

MONTO
PROYECTADO
PARA EL 2021
S/127.3
Millones



PERÚ

Ministerio de Salud

Viceministerio de Prestaciones y Aseguramiento en Salud

Programa Nacional de Inversiones en Salud

7 OBRAS SIN FINANCIAMIENTO CON EXPEDIENTES TÉCNICOS APROBADOS 2021



CAJAMARCA

C.S. LA RAMADA (I-4) CONTINGENCIA

S/ 37.9 Millones

10 664 beneficiarios

OBRA Adjudicada para la firma de Contrato

(Demanda Adicional S/. 19.3 Millones)

Supervisión cuenta con Contrato Suscrito.

Fecha tentativa de inicio de Obra: junio 2021

H. BAMBAMARCA (II-1)

S/ 122.9 Millones

129 698 beneficiarios

CONTINGENCIA expediente técnico culminado.

OBRA DE CONTINGENCIA: **(Demanda Adicional**

S/. 14.8 Millones)

OBRA PRINCIPAL fecha de aprobación: mayo 2021

Fecha tentativa de inicio de Obra: setiembre 2021

LAMBAYEQUE

H. MOTUPE (II-E)

S/ 119.8 Millones

87,343 beneficiarios

Expediente técnico Aprobado

OBRA: **(Demanda Adicional S/. 29.8 Millones)**

Fecha tentativa de inicio de Obra: setiembre 2021



AMAZONAS

EE.SS. POMACOCHAS (I-4)

S/ 42 Millones

14 374 beneficiarios

(Demanda Adicional S/. 11.0 Millones)

Aprobación del Expediente Técnico: mayo 2021

Fecha tentativa de inicio de Obra: setiembre 2021

LA LIBERTAD

H. APOYO LEONCIO PRADO (II-1)

S/ 163.3 Millones

173,699 beneficiarios

(Demanda Adicional S/. 43.5 Millones)

Fecha tentativa de inicio de Obra: junio 2021

CUSCO

EE.SS. QUIÑOTA (I-3)

S/ 20.6 Millones

(Demanda Adicional S/. 4.2 Millones)

Aprobación del Expediente Técnico: mayo 2021

Fecha tentativa de inicio de Obra: setiembre 2021

PUNO

C.S. DESAGUADERO (I-4)

S/ 63.0 Millones

31,524 beneficiarios

OBRA: Inicio de Procedimiento de Selección,

(Demanda Adicional S/. 13.8 Millones)

Fecha tentativa de inicio de Obra: setiembre 2021

Inversión
2018

S/35.1
Millones

Inversión
2019

S/33.1
Millones

Inversión
2020

S/2.6
Millones



MONTO
PROYECTADO
PARA EL 2021
S/136.4
Millones



PERÚ

Ministerio de Salud

Viceministerio de Prestaciones y Aseguramiento en Salud

Programa Nacional de Inversiones en Salud

RCC: METAS 2021 - OBRAS



PIURA

CENTRO DE SALUD DE SAPILLICA (I-3)

S/ 2 Millones
Inicio de ejecución: Febrero 2020
En etapa de recepción de obra
Culminación de obra: Mayo 2021



PUESTO DE SALUD SAN PEDRO (I-2)

S/ 6.9 Millones
Inicio de ejecución: Octubre 2020
En ejecución
Avance físico acumulado: 32.37 %
Culminación de obra: Julio 2021



HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU – COREA (II-2)

S/ 15.9 Millones
Inicio de ejecución: Diciembre 2020
Reinicio de ejecución: Marzo 2021
En ejecución
Avance físico acumulado: 5.92 %
Culminación de obra: Agosto 2021

CENTRO DE SALUD LAS LOMAS (I-3)

S/ 5.9 Millones
Inicio de ejecución: Octubre 2020
Obra suspendida desde noviembre 2020 por trámite de Adicional N°01 de obra.
Reinicio de ejecución: Junio 2021

ICA

CENTRO DE SALUD PARCONA (I-3)

S/ 28.1 Millones
Obra por iniciar proceso de contratación
Firma de contrato: Junio 2021
Inicio de ejecución: Julio 2021

LAMBAYEQUE

CENTRO DE SALUD MOYAN (I-2)

S/ 3.5 Millones
Inicio de ejecución: Octubre 2020
En ejecución
Avance físico acumulado: 78.14 %
Culminación de obra: Junio 2021



CENTRO DE SALUD INCAHUASI (I-3)

S/ 28.9 Millones
Por iniciar expresión de interés
Inicio de ejecución: Julio 2021

ANCASH

PUESTO DE SALUD MAGDALENA NUEVA (I-2)

S/ 1.4 Millones
Inicio de ejecución: Febrero 2020
Culminada
Recepción de obra: Enero 2021



PUESTO DE SALUD SAPCHA (I-1)

S/ 6 Millones
Suscripción de contrato. Diciembre 2020
Inicio de ejecución: Marzo 2021
En ejecución
Avance físico acumulado: 24.74 %
Culminación de obra: Septiembre 2021

- 01 HOSPITAL
- 05 CENTROS DE SALUD
- 03 PUESTOS DE SALUD

Monto financiado para ejecución de obras:
S/ 78,5 millones



PERÚ

Ministerio de Salud

Viceministerio de Prestaciones y Aseguramiento en Salud

Programa Nacional de Inversiones en Salud

RCC: METAS 2021 – EXPEDIENTES TÉCNICOS



CAJAMARCA (01)

P.S. CALLANCAS – APROBACIÓN: JUNIO
INVERSIÓN 2021: S/ 0.2 MILLONES

PIURA (07)

C.S. LA UNIÓN – APROBADO: MARZO
EN TRÁMITE DE FINANCIAMIENTO DE OBRA
C.S. LANCONES – APROBACIÓN: MAYO
C.S. MIGUEL CHECA - APROBACIÓN: MAYO
C.S. IGNACIO ESCUDERO - APROBACIÓN: MAYO
C.S. COMUNIDAD SALUDABLE – APROBACIÓN: SEPTIEMBRE
C.S. TAMBOGRANDE – APROBACIÓN: SEPTIEMBRE
P.S. TEJEDORES - APROBACIÓN: SEPTIEMBRE
INVERSIÓN 2021: S/ 1.4 MILLONES

LA LIBERTAD (09)

C.S. CASA GRANDE - APROBACIÓN: JUNIO
P.S. PANGO - APROBACIÓN: JUNIO
C.S.M.I. QUIRUVILCA - APROBACIÓN: JUNIO
C.S. SAYAPULLO - APROBACIÓN: JUNIO
P.S. HUANCASPATA - APROBACIÓN: JUNIO
C.S. ALTO TRUJILLO - APROBACIÓN: JULIO
C.S. LUCMA - APROBACIÓN: AGOSTO
C.S. CALIPUY - APROBACIÓN: AGOSTO
C.S. CALIFORNIA - APROBACIÓN: SEPTIEMBRE
INVERSIÓN 2021: S/ 2.9 MILLONES

LIMA (05)

P.S. PASAC – APROBACIÓN: AGOSTO
P.S. DIGNIDAD NACIONAL – APROBACIÓN: AGOSTO
C.S. SAYAN – APROBACIÓN: SEPTIEMBRE
C.S. CHURIN – APROBACIÓN: SEPTIEMBRE
C.S. BUENOS AIRES – APROBACIÓN: SEPTIEMBRE
INVERSIÓN 2021: S/ 1.2 MILLONES


LAMBAYEQUE (13)

P.S. TALLAPAMPA – EN TRÁMITE DE FINANCIAMIENTO DE OBRA
P.S. LA ESTANCIA – EN TRÁMITE DE FINANCIAMIENTO DE OBRA
P.S. NUEVA ARICA – APROBADO: MARZO
C.S. PUCALA – APROBACIÓN: MAYO
P.S. HUACAPAMPA – APROBACIÓN: JULIO
P.S. HIERBA BUENA – APROBACIÓN: JULIO
P.S. LA TRANCA – APROBACIÓN: JULIO
C.S. CAYALTI – APROBACIÓN: JULIO
P.S. CHIÑAMA – APROBACIÓN: AGOSTO
C.S. SALAS – APROBACIÓN: AGOSTO
P.S. PUCHACA – APROBACIÓN: AGOSTO
P.S. HUAYABAMBA – APROBACIÓN: AGOSTO
P.S. MOCUPE TRADICIONAL – APROBACIÓN: SEPTIEMBRE
INVERSIÓN 2021: S/ 1.8 MILLONES

ANCASH (11)

P.S. HUACACHI – EN TRÁMITE DE FINANCIAMIENTO DE OBRA
P.S. CHASQUITAMBO – APROBACIÓN: MAYO
C.S. MORO – APROBACIÓN: MAYO
C.S. SAN LUIS – APROBACIÓN: AGOSTO
C.S. PUEBLO LIBRE – APROBACIÓN: AGOSTO
C.S. NICRUPAMPA – APROBACIÓN: AGOSTO
C.S. VICTOR RAUL – APROBACIÓN: AGOSTO
C.S. PISCOBAMBA – APROBACIÓN: SEPTIEMBRE
P.S. MASIN – APROBACIÓN: SEPTIEMBRE
P.S. PONTO – APROBACIÓN: SEPTIEMBRE
P.S. LLAMA – APROBACIÓN: SEPTIEMBRE
INVERSIÓN 2021: S/ 2.0 MILLONES

46
intervenciones
con financiamiento
para expediente
técnico por el
monto de
S/ 9.5 Millones

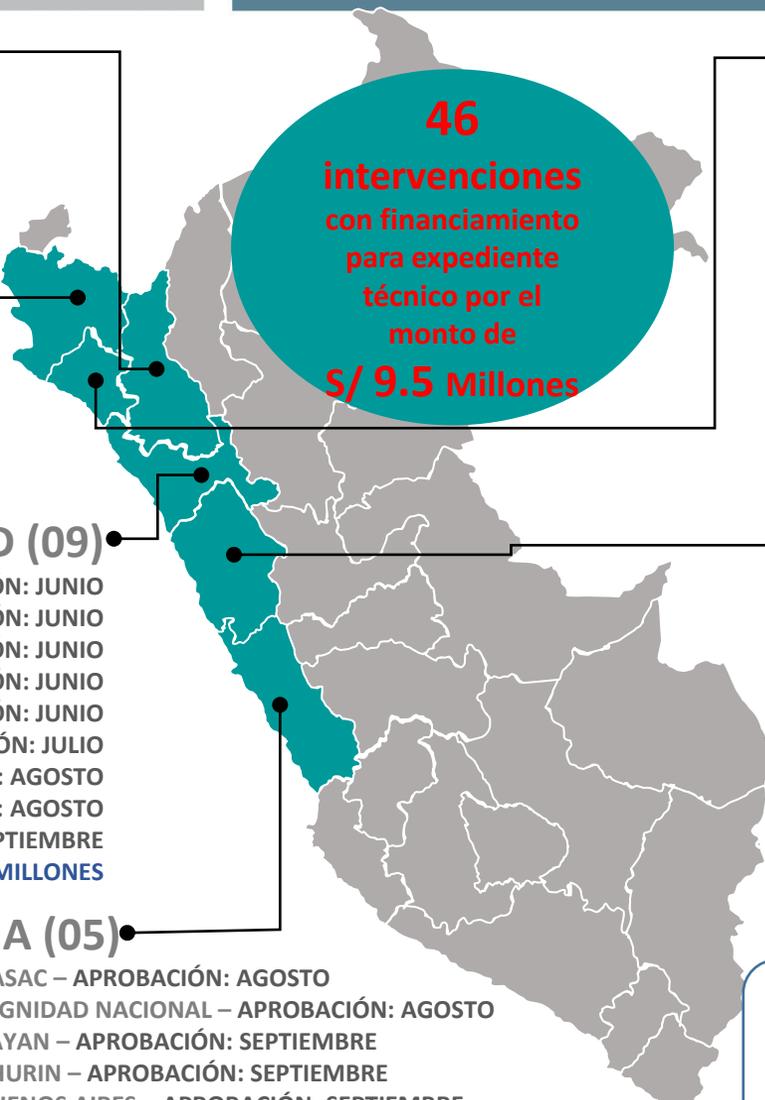

MES/AÑO	Nº DE EXPEDIENTES APROBADOS
2020	3
MARZO	2
MAYO	6
JUNIO	6
JULIO	5
AGOSTO	12
SEPTIEMBRE	12
TOTAL	46

2020: Se aprobaron 3 ET.
2021: Se aprobaron 2 ET, continua la elaboración de 21 expedientes por contrata, 03 expedientes se encuentran en proceso de contratación y se viene contratando el diagnóstico para 17 expedientes técnicos.

Monto de inversión estimado para ejecución de obra : S/ 234 millones – sin financiamiento



PERÚ

Ministerio de Salud

Viceministerio de Prestaciones y Aseguramiento en Salud

Programa Nacional de Inversiones en Salud

OBRAS POR IMPUESTO



ÁNCASH: HOSPITAL DE HUARMEY (II-1)

Beneficiados: 33 419 habitantes

Inversión: S/ 188,5 millones

Con solicitud de **Modificación Presupuestal**



ÁNCASH: EE.SS. HUARI (II-1)

Beneficiados : 102 129 habitantes

Inversión: S/ 192. 4 millones

Con solicitud de **Demanda Adicional (S/.27 millones)**



HUANUCO: EE.SS. LLATA (II-E)

Beneficiados : 47, 499 habitantes

Inversión : S/ 147, 9 millones



CUSCO: CHUMBIVILCAS -SERVICIOS DE ATENCIÓN PRE-HOSPITALARIA Y TELESALUD, EN EL MARCO DE LAS RIAPS (II-1)

Beneficiados : 82 411 habitantes

Inversión : S/ 7,2 millones

Con solicitud de **Modificación Presupuestal**





PERÚ

Ministerio de Salud

Viceministerio de Prestaciones y Aseguramiento en Salud

Programa Nacional de Inversiones en Salud

CONVENIO ESTADO A ESTADO



ENTRE MINSA Y CONSORCIO FRANCÉS

HOSPITAL ANTONIO LORENA EN CUSCO



NIVEL: III-1
BENEFICIADO: 444 080 habitantes
MONTO DE INVERSIÓN: S/ 464. 2 millones

CARTERA DE SERVICIOS:
 314 camas hospitalarias, 48 camas UCI, 06 cunas, 08 camas obstétricas, 02 salas de operaciones, 03 salas de parto, 40 consultorios

ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITA DE PAR

APHP INTERNATIONAL

egis


1. Project Management Office (PMO)
2. Organizar la convocatoria para la selección del contratista.
3. Supervisión de los estudios.
4. Convocatorias de selección del proveedor.

H. NACIONAL SERGIO E. BERNALES EN LIMA



NIVEL: III-1
BENEFICIADO: 901 300 habitantes
MONTO DE INVERSIÓN: S/ 723.7 millones

CARTERA DE SERVICIOS:
 525 camas hospitalarias, 10 camas de cuidados intensivos, 15 camas cuidados intermedios, 14 incubadoras cuidados intensivos, 22 incubadoras cuidados intermedios

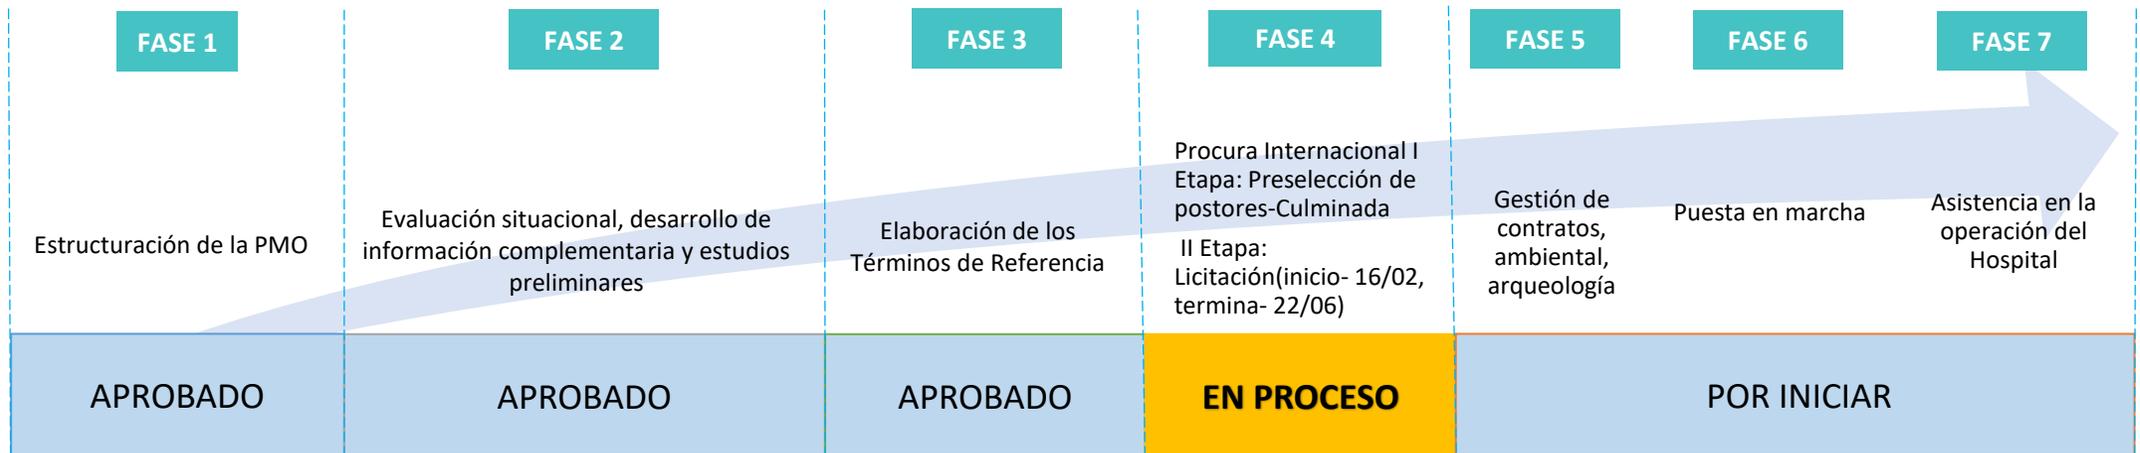

Hospital Antonio Lorena en Cusco y Hospital Sergio Bernales en Lima



PERÚ

Ministerio de Salud

Viceministerio de Prestaciones y Aseguramiento en Salud

Programa Nacional de Inversiones en Salud

CONVENIO ESTADO A ESTADO



OTROS CONVENIOS ESTADO A ESTADO EN PROCESO

El 08 de abril 2021 el MINSA convocó a diversas embajadas interesadas en la construcción de 02 hospitales, participaron representantes de: España, Holanda, Suecia, Canadá y Japón.

DETALLES	APURIMAC	PIURA
Nombre del Proyecto	Mejoramiento de la capacidad resolutive de los servicios de atención de la salud del Hospital Guillermo Diaz de la Vega	Creación de los servicios especializados, Hospital de alta complejidad en el distrito 25 de octubre, prov. Piura, departamento Piura
Monto de Inversión	S/. 160 Millones (Saldo de obra)	S/. 968.7 Millones
Beneficiarios	210,355 personas	2'136,634 personas
Componentes	<ul style="list-style-type: none"> • Construcción de ambientes de atención, • Equipamiento biomédico • Capacitación a personal, • Programa de promoción de servicios de salud preventivos y recuperativos de la comunidad. 	<ul style="list-style-type: none"> • Infraestructura • Equipamiento, • Gestión, organización • Plan de difusión y sensibilización.



PERÚ

Ministerio de Salud

Viceministerio de Prestaciones y Aseguramiento en Salud

Programa Nacional de Inversiones en Salud

Programa de Creación de Redes Integradas de Salud – PCRIS



PCRIS

Programa de Inversión (CUI: 2416127), contiene 10 PIP

FINANCIAMIENTO

Endeudamiento público (DS N° 320-2018-EF)

- BID US\$ 125 mill
- Banco Mundial: US\$ 125 mill
- Contrapartida Nacional: US\$65.65 millones

PLAZO DE EJECUCIÓN

5 años (2019 - 2024)


META:

29 RIS consolidadas a nivel nacional

- **25 RIS** regional
- **4 RIS** en DIRIS-LM

AMBITO DE INTERVENCIÓN

- 25 RIS regional
- 4 RIS en DIRIS-LM

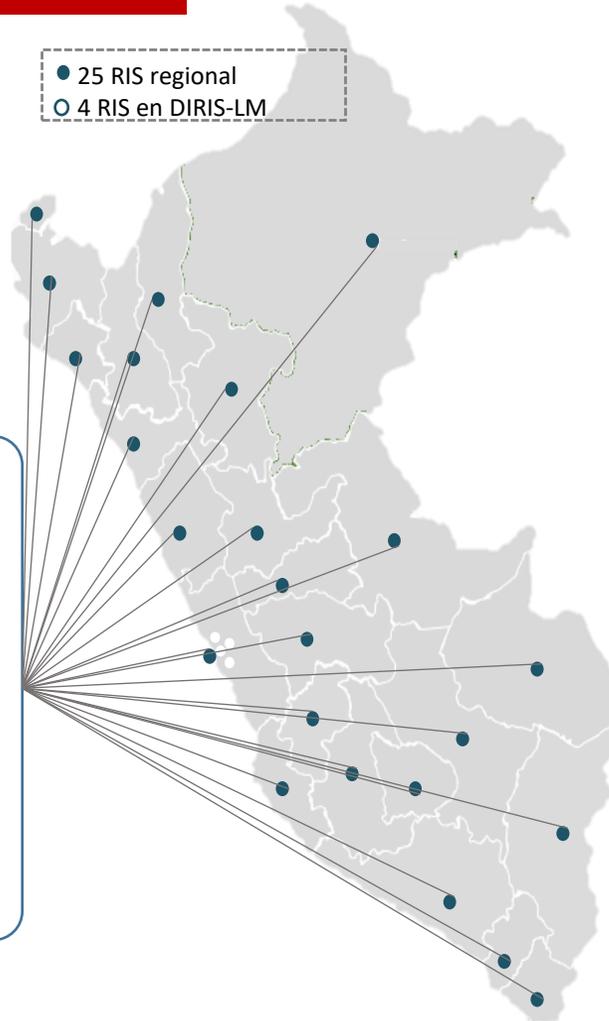

PROPÓSITO:

- Mejora sist. información en salud (Hist.Clin.Electr.)
- Mejora sistema de diagnóstico
- Mejora de cadena de suministro de medicamentos
- Capacitación (personal asistencial y administrativo)
- Mejora regulatoria y procesos
- Financiamiento per cápita

METAS 2021

COMPONENTE 1: MODELO RIS

- Implementación del modelo RIS
- Implementación de la Historia Clínica electrónica
- Capacitaciones y pasantías

COMPONENTE 2: IOAAR 29 RIS

- Iniciar implementación IOARR de una RIS /Región
- Entrega de equipos de reposición y nuevo

COMPONENTE 3: SISTEMAS DE INFORMACIÓN

- 03 Data Center con alcance nacional

COMPONENTE 4 : DIAGNOSTICO Y APOYO

- 01 Expediente Técnico de Servicios
- Adquisición de equipamiento

COMPONENTE 5: SUMINISTROS

- **01** Expediente Técnico de la Cadena de Suministro de Medicamentos con alcance nacional.



PERÚ

Ministerio de Salud

Viceministerio de Prestaciones y Aseguramiento en Salud

Programa Nacional de Inversiones en Salud

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL 2022-2024

RESUMEN DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES 2022-2024
(En Millones de S/)

CONCEPTO	COSTO ACTUALIZADO DE LA INVERSIÓN	EJECUCIÓN AL 31-12-2020	PIM 2021	PROYECCIÓN DE EJECUCIÓN 2021	PROGRAMACIÓN MULTIANUAL 2022-2024		
					AÑO 2022	AÑO 2023	AÑO 2024
ESTUDIOS	0.00	0.95	0.44	0.30	6.30	7.68	8.23
ESTUDIOS DEFINITIVOS	78.73	20.45	2.06	17.78	47.84	7.27	6.81
G&G - INVERSIONES	2,830.24	344.42	213.89	270.35	1,058.04	745.20	316.90
MÓDULO DE ATENCIÓN TEMPORAL	226.61	0.00	0.00	22.19	174.96	12.10	17.36
OBRAS PÚBLICAS	3,759.24	261.84	59.45	114.08	1,011.70	1,160.40	737.61
OXI - INVERSIONES	533.50	6.92	82.43	92.79	332.94	100.31	0.00
RCC - INVERSIONES	94.40	1.53	78.48	49.32	43.56	0.00	0.00
CAAT COVID	0.00	0.00	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00
PCRIS 12 INVERSIONES	1,086.23	19.09	159.73	159.73	484.92	365.41	57.09
Total general	8,608.95	655.19	600.07	730.12	3,160.26	2,398.36	1,144.00

S/ 488.4

NOTA:

Para el año 2021, se requiere la atención de la demanda adicional de S/ 488.4 millones



PERÚ

Ministerio de Salud

Viceministerio de Prestaciones y Aseguramiento en Salud

Programa Nacional de Inversiones en Salud

AVANCE DE EJECUCIÓN AL 15-05-2021



PRESUPUESTO COMPARATIVO 2021 - 2020

(En Millones de S/)

TIPO DE GASTO	PIA 2020 (1)	MODIF. (+/-)	PIM 2020	EJEC. 2020	% EJEC. 2020	PIA 2021 (2)	VARIACIÓN PIA (2)-(1)	PIM 2021	EJEC.	% AVANCE
INVERSIONES	610.86	-157.76	453.10	218.95	48%	414.97	-195.89	600.07	54.46	9%
ACTIVIDADES	60.52	135.26	195.78	180.75	92%	67.78	7.27	177.69	68.40	38%
TOTAL	671.38	-22.50	648.88	399.71	62%	482.75	-188.63	777.76	122.86	16%

AVANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LAS INVERSIONES 2021

(En Millones de S/)

DETALLE	CANTIDAD INVERSIÓN	PIA	MODIF. (+/-)	PIM	CERTIFICADO	% AVANCE (Cert./PIM)	COMPROMISO ANUAL	% AVANCE (Comp./PIM)	DEVENGADO	% AVANCE (Dev./PIM)
TOTAL INVERSIONES	60	414.97	185.10	600.07	267.26	45%	87.00	14%	54.46	9%
ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	3	0.00	0.44	0.44	0.11	25%	0.11	25%	0.07	16%
EXP. TECNICO	4	0.00	2.06	2.06	1.52	73%	1.51	73%	1.10	53%
G & G	2	100.00	113.89	213.89	95.12	44%	6.10	3%	5.80	3%
OBRA PÚBLICA	10	60.63	-1.18	59.45	50.45	85%	41.31	69%	23.69	40%
OXI	1	82.43	0.00	82.43	53.05	64%	15.98	19%	15.96	19%
PCRIS - INVERSIONES	12	159.73	0.00	159.73	23.04	14%	1.47	1%	1.08	1%
UGIR - INVERSIONES RCC	15	12.18	66.30	78.48	40.38	51%	19.07	24%	5.31	7%
CAAT - COVID 19 - EQUIPOS	13	0.00	3.59	3.59	3.59	100%	1.45	40%	1.45	40%
TOTAL ACTIVIDADES		67.78	109.91	177.69	137.76	78%	113.24	64%	68.40	38%
Total general	60	482.75	295.01	777.76	405.02	52%	200.24	26%	122.86	16%

NOTA: información generada de la data SIAF-MPP al 15-05-2021 a horas 2:00 am

MUCHAS GRACIAS



BICENTENARIO
PERÚ 2021



PERÚ

Ministerio
de Salud
