

Reconstrucción con Cambios en Piura

Dirección Ejecutiva

Marzo 2023

#Unidos
Creamos Futuro



AGENDA

1. Avances del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios.
2. Avances del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios en la región Piura.
3. Estado situacional de las intervenciones en educación y salud en la región Piura.
4. Intervenciones con problemas en su ejecución en la región Piura.
5. Estado situacional de las intervenciones Gobierno a Gobierno en la región Piura.
6. Prioridades de la gestión

01

Avances del Plan
Integral de
Reconstrucción



Reconstrucción

10,628 intervenciones:

- 998 Transportes
- 3,206 Saneamiento
- 3,053 Pistas y veredas
- 1,717 Agricultura
- 149 Salud
- 1,500 Educación
- 5 Defensa



Construcción

Megaproyectos en 19 ríos, 5 quebradas y 7 drenajes pluviales

* **13 regiones:** Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Áncash, Lima, Ica, Arequipa, Huancavelica, Ayacucho, Junín, Cajamarca, Loreto

** **Costo actual del PIR:** S/ 50,833 millones. (incluye soluciones de Vivienda y fortalecimiento de capacidades)

Plan Integral

Cartera a cargo de ARCC

- Mediante la modalidad de Gobierno a Gobierno y/o PEC se implementan colegios, establecimientos de salud e infraestructura preventiva
- 222 proyectos con una inversión de S/ 23,885 millones.*

Cartera a cargo de GN, GR y GL


- Transfiere recursos para financiar proyectos contemplados en el Plan a través de la modalidad PEC
- 10,558 intervenciones con una inversión de S/ 23,939.*
- Monitorear a más de 800 Entidades Ejecutoras

(*) Corresponde al costo actualizado según Informe N° 04-2023-ARCC/DE/OGP.


PEC = Proceso Especial de Contratación en el marco de la Reconstrucción

Elaboración: Oficina de Gestión de Proyectos ARCC

Avance Financiero: se ejecutó
71% del monto financiado

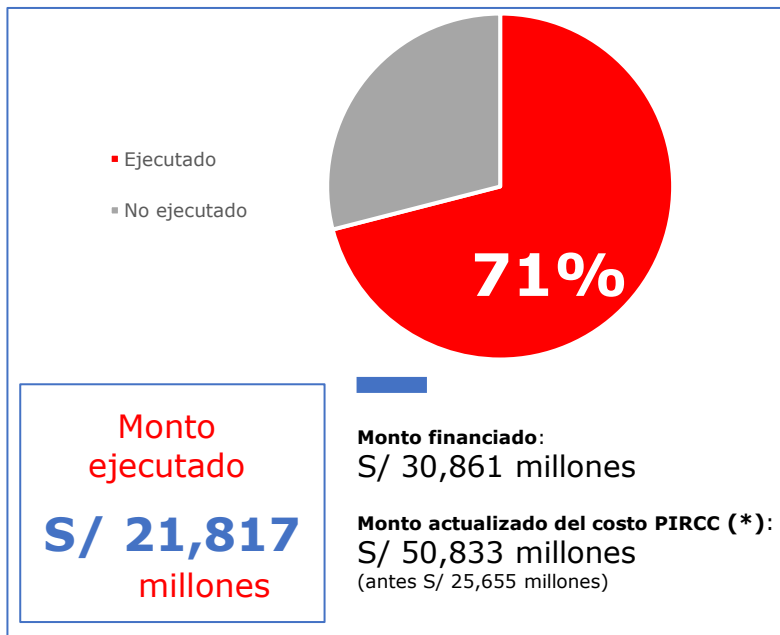

Avance Físico: 69% de intervenciones
culminadas de un total de 10,810

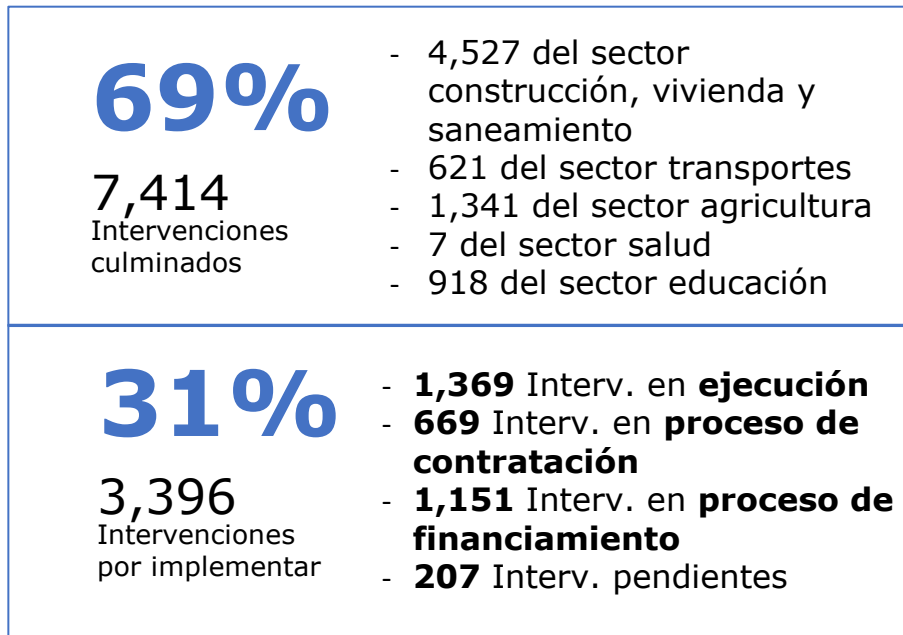

(*) Corresponde al costo actualizado según Informe N° 04-2023-ARCC/DE/OGP.

02

Avances del Plan Integral de Reconstrucción en la región Piura



Reconstrucción

2,317 intervenciones:

- 291 Transportes
- 561 Saneamiento
- 400 Pistas y veredas
- 518 Agricultura
- 38 Salud
- 506 Educación
- 3 Defensa

Alcance en más
de 5 sectores
con un costo
inicial de
**S/ 7,541
millones**

Construcción

Solución integral del río Piura, Drenajes pluviales de las ciudades de Sullana, Talara, Paita y Piura

* **Costo actual del PIRCC en Piura:** S/ 14,919 millones (incluye soluciones de Vivienda y Necesidades inmediatas por un monto de S/ 847 millones). Corresponde al costo actualizado según Informe N° 04-2023-ARCC/DE/OGP.

Gestión de la implementación del Plan Integral en Piura

Plan Integral




Cartera a cargo de ARCC

- Mediante la modalidad de Gobierno a Gobierno y/o PEC se implementan colegios, establecimientos de salud e infraestructura preventiva
- 55 proyectos con una inversión de S/ 5,219 millones*.


Cartera a cargo de GN, GR y GL

- Transfiere recursos para financiar proyectos contemplados en el Plan a través de la modalidad PEC
- 2,302 intervenciones con una inversión de S/ 8,853 millones*.

Avance Financiero: se ejecutó **70%** del monto financiado

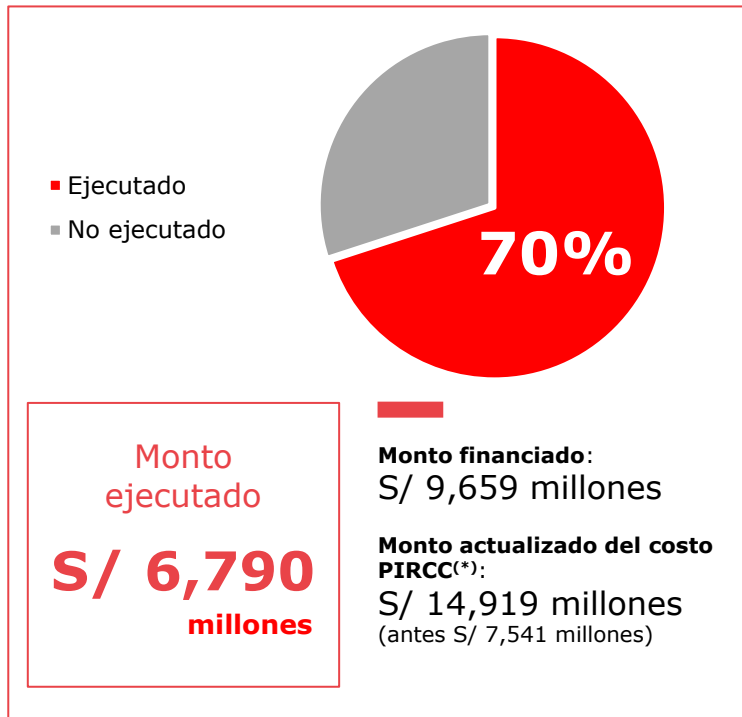

Avance Físico: **67%** de intervenciones culminadas de un total de 2,357

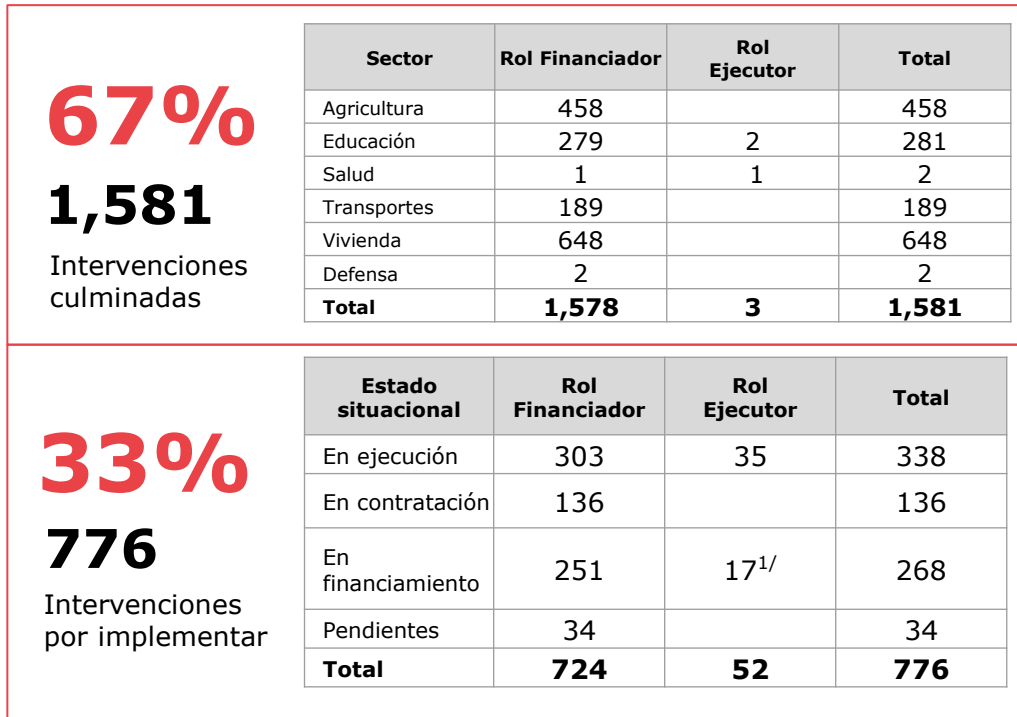

(*) Corresponde al costo actualizado según Informe N° 04-2023-ARCC/DE/OGP.

1/ Incluye 10 intervenciones mediante PEC.

Estado situacional de transferencia en Piura

Nivel de Gobierno	Financiamiento 2017 – 2023 (S/ Millones)	Ejecutado (S/ Millones)	Avance %	PIM 2023 ^{1/} (S/ Millones)
Financiamiento EE*	7,479	5,150	69%	1,135
Nacional	1,967	1179	60%	328
Regional	1868	1207	65%	291
Local	3644	2764	76%	516
ARCC	2,180	1,640	75%	640
Total	9,659	6,790	70%	1,775

1/ PIM 2023 al 31.01.23 (FONDES)

*EE=Entidades Ejecutoras

Fuente: Monitor ARCC al 31.01.23 para avance financiero y Direcciones Sectoriales – ARCC | Elaboración: Oficina de Gestión de Proyectos ARCC

Estado situacional: financiamiento del año 2023

En el presupuesto 2023 se ha consignado **S/ 1,775 millones** para financiar **604 proyectos**. Asimismo, se tiene en cartera pendiente de financiar **29** nuevos proyectos que representan **S/ 144 millones**. En total se tiene previsto para el 2023, financiar **633 proyectos**, de los cuales **37 proyectos** responden a la modalidad G2G por un monto de **S/ 640 millones** considerado en la Ley Presupuesto 2023.

Sector	Financiado (PIM 2023)		Pendiente de financiar		Total N° proy	Total (S/ millones)
	N° proy	Monto (S/ millones)	N° proy	Monto (S/ millones)		
Agricultura	61	265	5	16	66	281
Educación	232	601	10	47	242	648
Salud	22	333	1	11	23	344
Transporte	72	511	3	47	75	558
Vivienda	217	65	10	23	227	88
Total	604	1,775	29	144	633	1,919

Provincias de Piura

La provincia con mayor presupuesto asignado en el 2023 es **Piura**, con **S/ 504 millones** para la atención de **195 proyectos**.

Provincia	Financiado (Ley N° 31638)		Pendiente de financiar		Total N° proy	Total (S/ millones)
	N° proy	Monto (S/ millones)	N° proy	Monto (S/ millones)		
Ayabaca	155	201	3	5	158	206
Huancabamba	71	161	4	16	75	177
Morropón	88	211	3	7	91	218
Paita	17	72	1	0.1	18	72
Piura	181	433	14	71	195	504
Sechura	20	42			20	42
Sullana	54	490	2	19	56	509
Talara	18	165	2	26	20	191
Total	604	1,775	29	144	633	1,919

Para 2023, en la region Piura se registró un PIM de S/ 1,775 millones, donde se ejecutó el **6%** al 31 enero 2023.


Nivel de Gobierno	PIM 2023 (S/ millones)	Ejecución al 31 Ene (S/ millones)	Avance %
GOBIERNO NACIONAL	S/ 968	S/ 105.0	11%
ARCC	S/ 640	S/ 99	15%
MTC	S/ 137	S/ 0.8	1%
MINEDU	S/ 79	S/ 1.0	1%
MIDAGRI	S/ 45	S/ 0	0%
VIVIENDA	S/ 35	S/ 4.0	11%
SALUD	S/ 31	S/ 0	0%
GOBIERNO REGIONAL	S/ 291	S/ 3	1%
GOBIERNO LOCAL	S/ 516	S/ 7	1%
TOTAL	S/ 1,775	S/ 115	6%

03

Estado situacional
de los sectores:
Educación y Salud




Avance Financiero: se ejecutó **72%** del monto financiado

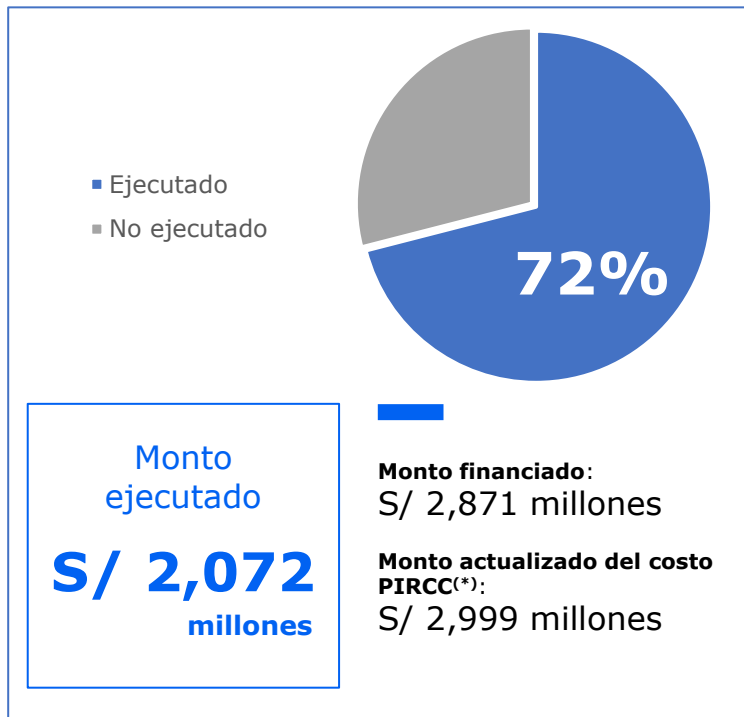

(*) Corresponde al costo actualizado según Informe N° 04-2023-ARCC/DE/OGP.

Avance Físico: **56%** de intervenciones culminadas de un total de 506

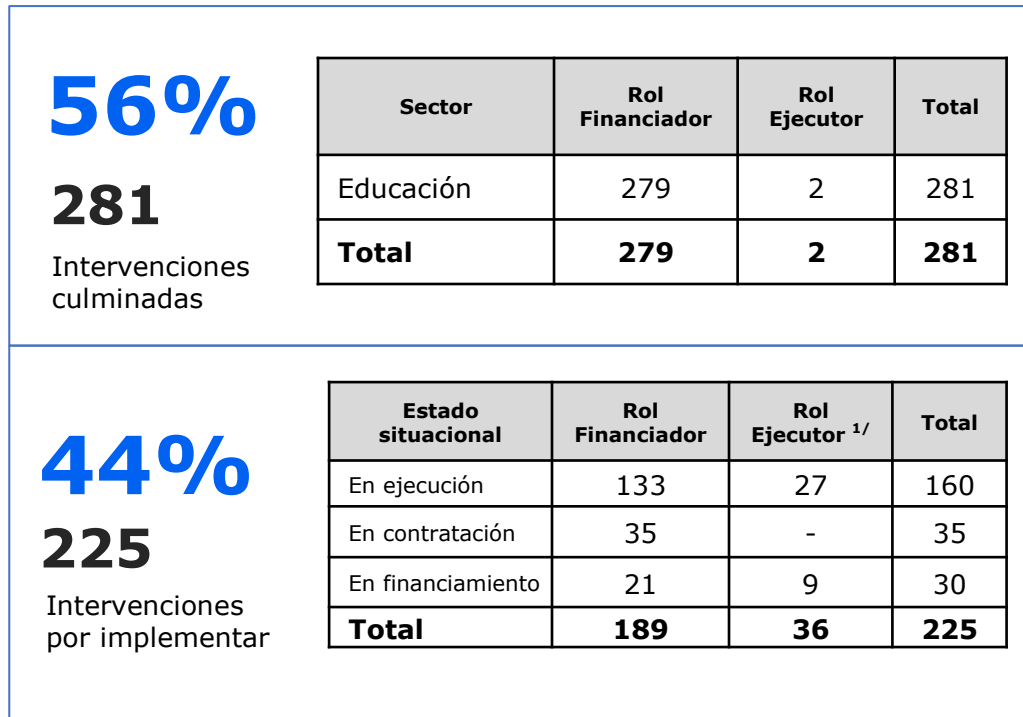


1/ Incluye 9 intervenciones mediante PEC

Estado situacional en el sector Educación a nivel de Entidad Ejecutora

Entidad Ejecutora	Nro. Intervenciones	Costo Actualizado (*)
GOBIERNO NACIONAL	155	1,327,422,545
ARCC	38	1,080,200,477
Otras EE	117	247,222,068
GOBIERNO REGIONAL	7	52,824,263
GOBIERNO LOCAL	344	1,618,647,700
Total	506	2,998,894,508


(*) Corresponde al costo actualizado según Informe N° 04-2023-ARCC/DE/OGP.

Avance Financiero: se ejecutó
74% del monto financiado

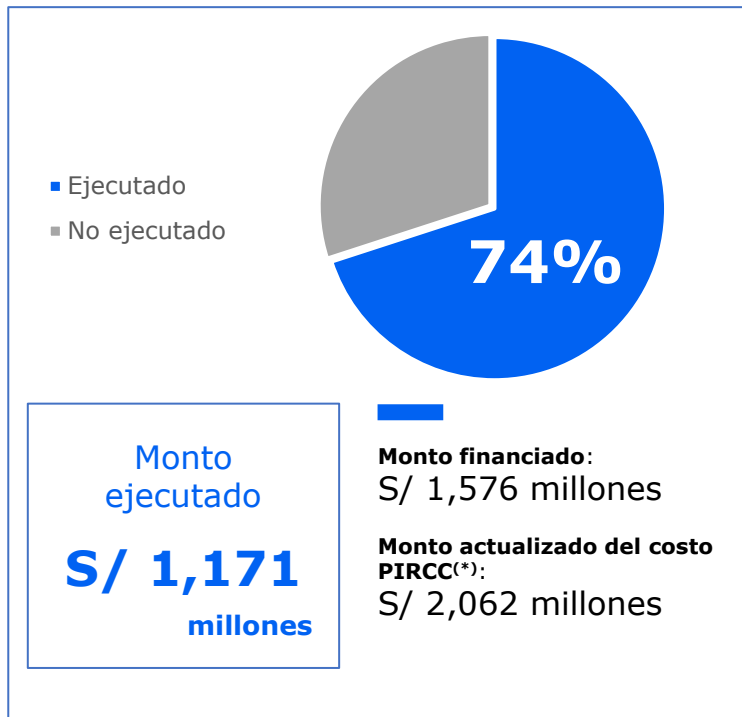

(*) Corresponde al costo actualizado según Informe N° 04-2023-ARCC/DE/OGP.

Avance Físico: **5%** de intervenciones
culminadas de un total de 38

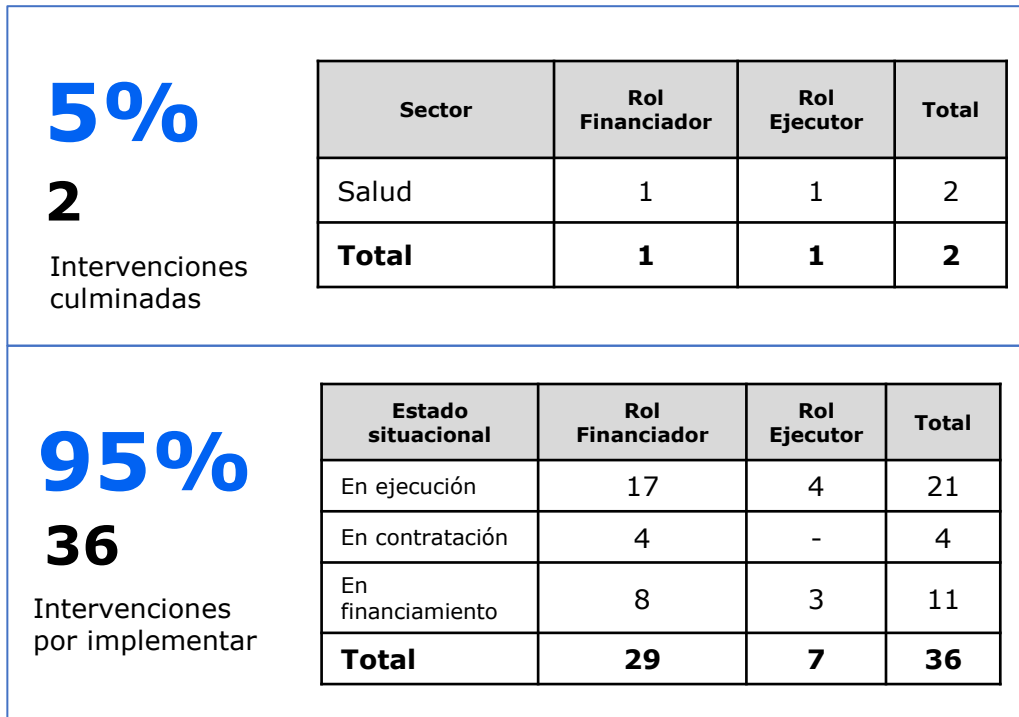

Estado situacional en el sector Salud a nivel de Entidad Ejecutora

Entidad Ejecutora	Nro. Intervenciones	Costo Actualizado (*)
MINISTERIO DE SALUD	10	71,502,153
AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS - RCC	8	1,395,600,704
GOBIERNO REGIONAL DE PIURA	6	373,171,653
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS	1	8,600,000
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALACO	1	48,907,508
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IGNACIO ESCUDERO	1	6,328,050
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JILILI	1	17,790,376
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIGUEL CHECA	1	6,800,887
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACAIPAMPA	1	8,496,177
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAIMAS	1	33,246,673
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SICCHEZ	1	25,007,552
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO GRANDE	1	8,925,785
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCABAMBA	1	10,270,678
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON	1	25,063,603
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA	1	8,600,000
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SECHURA	1	7,037,472
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA	1	6,289,689
Total	38	2,061,638,961

(*) Corresponde al costo actualizado según Informe N° 04-2023-ARCC/DE/OGP.

Fuente: Monitor ARCC y Direcciones Sectoriales – ARCC al 31.01.23 | Elaboración: Oficina de Gestión de Proyectos ARCC

04

Intervenciones con problemas



Al 28 de febrero de 2023, se tiene **16 proyectos** paralizados^{1/} por un monto de inversión que asciende a **S/ 287.5 millones**

Causas de paralización:

Sector	Incumplimiento del contrato	Proceso de arbitraje	Total general
Educación	1	0	1
Caminos	2	1	3
Salud	4	0	4
Saneamiento	8	0	8
Total general	15	1	16

1/ Según Ley N° 31589, se considera obra paralizada aquellas que cuenta con un avance físico mayor o igual al 40% y que no reportan ejecución en los últimos 6 meses.

16 obras paralizadas^{1/} a cargo de los tres niveles de Gobierno, con una inversión de **S/ 287.5 millones**

Sector	Provincia	Distrito	Nivel de Gobierno	Ejecutora	CUI	Nombre de la intervención	Costo FUR (S/)
Saneamiento	Ayabaca	Frias	GOBIERNO NACIONAL	MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	2436483	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA(S) LOCALIDAD(ES) DE SAN ISIDRO	101,827.07
Saneamiento	Ayabaca	Montero	GOBIERNO NACIONAL	MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	2436055	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE CHONTA	86,059.59
Saneamiento	Ayabaca	Montero	GOBIERNO NACIONAL	MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	2436236	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE LOS PALTOS	103,712.25
Saneamiento	Huancabamba	Huarmaca	GOBIERNO NACIONAL	MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	2436071	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA(S) LOCALIDAD(ES) DE PROGRESO KM 65	279,696.88
Saneamiento	Huancabamba	Huarmaca	GOBIERNO NACIONAL	MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	2436074	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA(S) LOCALIDAD(ES) DE HUALAPAMPA	493,314.41
Saneamiento	Huancabamba	Huarmaca	GOBIERNO NACIONAL	MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	2436396	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA	179,913.59
Salud	Morropón	Chulucanas	GOBIERNO NACIONAL	MINISTERIO DE SALUD	2412981	P.S. SAN PEDRO, CON CÓDIGO ÚNICO 00002166	8,359,718.78
Saneamiento	Morropón	San Juan De Bigote	GOBIERNO NACIONAL	MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	2436401	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA	217,010.58
Saneamiento	Morropón	San Juan De Bigote	GOBIERNO NACIONAL	MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	2436475	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN BAJO	178,403.96
Salud	Piura	Veintiseis De Octubre	GOBIERNO NACIONAL	MINISTERIO DE SALUD	2469055	HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU - COREA SANTA ROSA II-2, CON CÓDIGO ÚNICO 00002084	18,114,724.61
Educación	Sullana	Sullana	GOBIERNO NACIONAL	AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS - RCC	2502993	INTERVENCIÓN EN EL LOCAL ESCOLAR 14790 MARIA IGNACIA GARCIA, CON CÓDIGO LOCAL 435390	27,154,590.53
Red Subnacional - Caminos	Ayabaca	Ayabaca	GOBIERNO REGIONAL	GOBIERNO REGIONAL DE PIURA	2450533	RECUPERACIÓN DEL CAMINO VECINAL EN PI-661 EMP PI-655 (AUL) EMP PI-621	7,151,805.55
Salud	Huancabamba	Huancabamba	GOBIERNO REGIONAL	GOBIERNO REGIONAL DE PIURA	2434227	HOSPITAL HUANCABAMBA, CON CÓDIGO ÚNICO 00002250	104,577,197.09
Salud	Huancabamba	Huarmaca	GOBIERNO REGIONAL	GOBIERNO REGIONAL DE PIURA	2434215	HOSPITAL HUARMACA, CON CÓDIGO ÚNICO 00002270	81,927,796.35
Red Subnacional - Caminos	Huancabamba	Huarmaca	GOBIERNO LOCAL	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARMACA	2432464	RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL - 39.312 KM EN TROCHA CARROZABLE TRAMO TIERRA BLANCA - PALO BLANCO	32,182,006.19
Red Subnacional - Caminos	Morropón	Salitral	GOBIERNO LOCAL	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL	2443544	RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL - 10.276 KM EN EMP. PE-2A (SERRAN) - YAMAYACO - HUALAS BAJO	6,442,726.68
Total							287,550,504.11

1/ Según Ley N° 31589, se considera obra paralizada aquellas que cuenta con un avance físico mayor o igual al 40% y que no reportan ejecución en los últimos 6 meses.

Al 28 de febrero de 2023, se tiene **50 proyectos suspendidos** por un monto de inversión que asciende a **S/ 996.0 millones**

Causas de la suspensión:

Sector	Campaña agrícola y Factores climatológicos 1/	Incumplimiento del contrato	Demora en los trámites administrativos y legales 2/	Deficiencias del expediente (diseño y/o estimación de costos)	Conflictos sociales	Controversias en valorizaciones y adicionales 3/	Sin información registrada	Total general
Agricultura	1	0	1	2	0	0	0	4
Educación	3	5	4	1	0	2	6	21
Pistas y Veredas	0	0	0	0	0	0	1	1
Carreteras	1	0	0	0	0	0	0	1
Caminos	8	3	0	0	1	1	4	17
Salud	0	3	0	1	0	0	0	4
Saneamiento	0	1	0	0	0	0	0	1
Soluciones Integrales	0	0	0	0	0	0	1	1
Total	13	12	5	4	1	3	12	50

1/ Comprende: Factores climatológicos (lluvias) y Riego de cultivos por campaña agrícola de los usuarios.

2/ Comprende: Demora en la adecuación de las condiciones físicas y/o administrativas para realizar trabajos de obra, Falta de gestión técnica y legal por parte de la entidad ejecutora, Falta de supervisor y Proceso de arbitraje.

3/ Comprende: Solicitud de adicionales y Valorizaciones impagas.

05


Estado situacional de
la Cartera G2G en
Piura



Inversión:
S/ 5,387 millones*

Cartera:
45 proyectos

Beneficiarios:
2 millones de habitantes

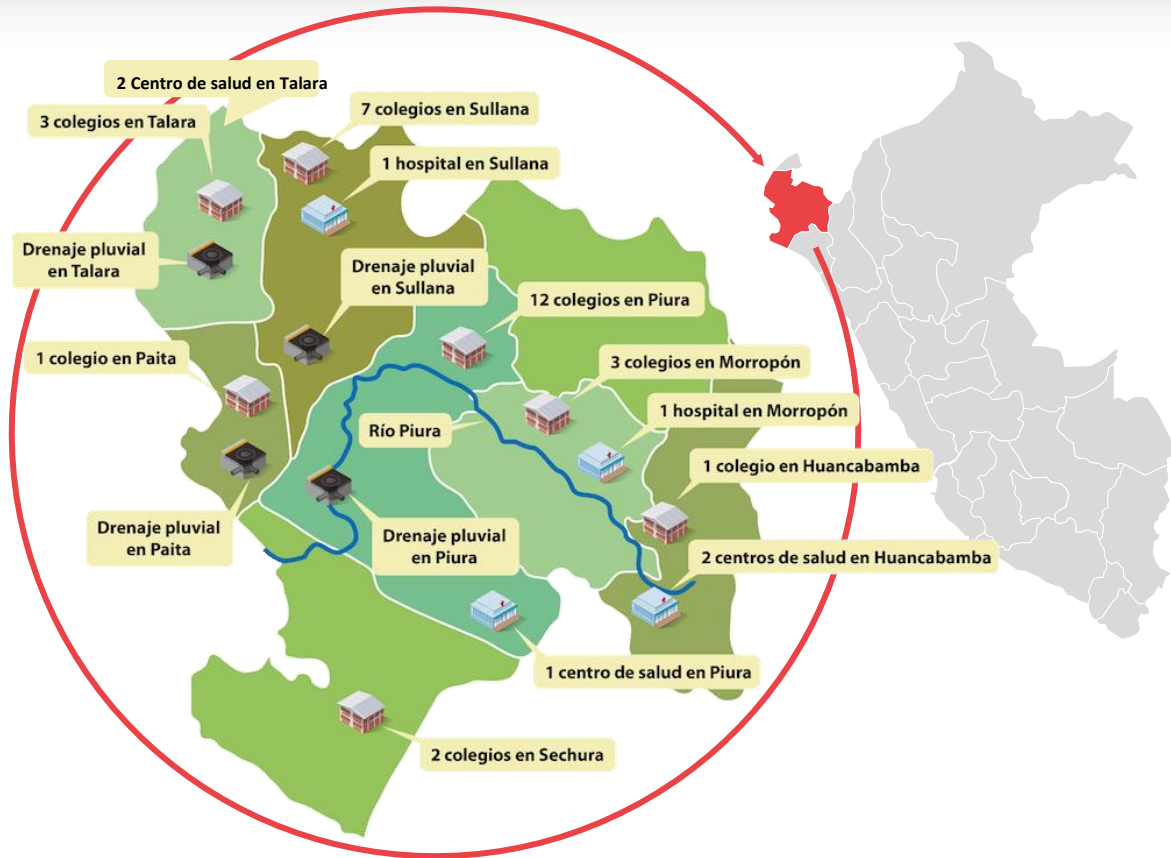

(*) Corresponde al costo actualizado del Banco de Inversiones al 31.01.2023

Soluciones Integrales

Soluciones Integrales:
(8 proyectos)
S/ 2,685 millones

Río Piura
En ejecución:
SAT^{/1} Piura

En asistencia técnica:
Control de inundaciones e
Infraestructura de Presa y Natural
del río Piura

4 Drenajes Pluviales
En ejecución:
Drenajes de Paita, Sullana y Talara

En asistencia técnica:
Drenaje Piura

Sector Educación

29 obras
S/ 1,071 millones

2 Culminadas:
I.E. 14032-Catacaos
Matias Manzanilla-Sullana

Sector Salud

8 obras
S/ 1,630 millones

Culminada:
Centro de Salud de Limón de
Porcuya

En ejecución:
Centros de Salud de Castilla y
de Faique
Hospitales de Chulucanas y
Sullana

En asistencia técnica:
Centros de Salud de Talara,
Mancora y Sechura

Nº	Tipo de solución	Nombre de proyecto	Estado	Hitos a cumplir
1	Soluciones Integrales	Río Piura - Control de inundaciones	En Asistencia Técnica	Culminación de construcción
2	Soluciones Integrales	Río Piura - Sistema de alerta temprana	En ejecución	Culminación de construcción
3	Soluciones Integrales	Río Piura - Infraestructura de presa	En Asistencia Técnica	Culminación de construcción
4	Soluciones Integrales	Río Piura - Infraestructura natural	En Asistencia Técnica	Culminación de construcción
5	Drenajes Pluviales	Drenaje de la ciudad de Piura	En Asistencia Técnica	Culminación de construcción
6	Drenajes Pluviales	Drenaje de la ciudad de Sullana	En ejecución	Culminación de construcción
7	Drenajes Pluviales	Drenaje de la ciudad de Talara	En ejecución	Culminación de construcción
8	Drenajes Pluviales	Drenaje de la ciudad de Paita	En ejecución	Culminación de construcción

Nº	CUI	Nombre de proyecto	Estado	Hitos a cumplir	Fecha del hitos a cumplir ^{1/}	Contingencia ^{2/}	Fecha de entrega de contingencia
1	2428578	I.E. Virgen Del Carmen-Catacaos	En ejecución	Culminaci3n de construcci3n	30/11/2023	Implementaci3n de m3dulos	10/03/2023
2	2428581	I.E. 14065-La Union	En ejecuci3n	Culminaci3n de construcci3n	28/07/2023	Implementaci3n de m3dulos	04/03/2023
3	2428584	I.E. 14858-Miguel Checa	En ejecuci3n	Culminaci3n de construcci3n	15/09/2023	Implementaci3n de m3dulos	20/02/2023
4	2428585	I.E. 14010 Miguel F. Cerro - Vice-Vice	En ejecuci3n	Culminaci3n de construcci3n	31/08/2023	Implementaci3n de m3dulos	04/03/2023
5	2428588	I.E. 14062 Nuestra Se1ora De Las Mercedes-La Union	En ejecuci3n	Culminaci3n de construcci3n	04/12/2023	Alquiler de ambientes e implementaci3n de m3dulos	10/03/2023
6	2428627	I.E. Ricardo Palma-Vichayal	En ejecuci3n	Culminaci3n de construcci3n	27/07/2023	Uso de ambientes de otra I.E.	04/03/2023
7	2428628	I.E. Jose Matias Manzanilla-Sullana	Culminado	Por inaugurar	26/04/2023	Uso de ambientes de otra I.E.	Entregado
8	2428635	I.E. Ignacio Merino-Pari1as	En ejecuci3n	Culminaci3n de construcci3n	22/01/2024	Implementaci3n de m3dulos	20/03/2023
9	2428716	I.E. 14037 Santiago A Requena Castro-Catacaos	En ejecuci3n	Culminaci3n de construcci3n	10/07/2023	Alquiler de ambientes	26/01/2023
10	2428725	I.E. 14594 San Jose-Huarmaca	En ejecuci3n	Culminaci3n de construcci3n	31/12/2023	Alquiler de ambientes	Entregado
11	2502653	I.E. 517-Sullana	En ejecuci3n	Culminaci3n de construcci3n	21/09/2023	Uso de ambientes de otra I.E.	Entregado
12	2502892	I.E. 15508 Domingo Savio-Pari1as	En ejecuci3n	Culminaci3n de construcci3n	09/08/2023	Implementaci3n de m3dulos	Entregado
13	2502993	I.E. 14790 Maria Ignacia Garcia-Sullana	En ejecuci3n	Culminaci3n de construcci3n	16/09/2023	Implementaci3n de m3dulos	03/03/2023
14	2503066	I.E. Coronel Jose Andres Razuri-Cura Mori	En ejecuci3n	Culminaci3n de construcci3n	04/09/2023	Implementaci3n de m3dulos	Entregado
15	2503076	I.E. Jose Jacobo Cruz Villegas-Catacaos	En ejecuci3n	Culminaci3n de construcci3n	13/07/2023	Implementaci3n de m3dulos	20/02/2023
16	2503086	I.E. 14032-Catacaos	Culminado	Por inaugurar	27/03/2023	Uso de ambientes de otra I.E.	Entregado
17	2503124	I.E. 15027 Amauta-Sullana	En ejecuci3n	Culminaci3n de construcci3n	17/07/2023	Implementaci3n de m3dulos	Entregado
18	2503125	I.E. 14924 Daniel Alcides Carrion-Tambo Grande	En ejecuci3n	Culminaci3n de construcci3n	23/10/2023	Implementaci3n de m3dulos	10/03/2023
19	2503176	I.E. 20509 San Jose-Ignacio Escudero	En ejecuci3n	Culminaci3n de construcci3n	22/09/2023	Implementaci3n de m3dulos	10/03/2023
20	2503195	I.E. Genaro Martinez Silva-Catacaos	En ejecuci3n	Culminaci3n de construcci3n	11/10/2023	Implementaci3n de m3dulos	10/03/2023
21	2503213	I.E. 15079-Sullana	En ejecuci3n	Culminaci3n de construcci3n	08/08/2023	Implementaci3n de m3dulos	10/03/2023
22	2503222	I.E. 14064-La Union	En ejecuci3n	Culminaci3n de construcci3n	11/09/2023	Implementaci3n de m3dulos	Entregado
23	2503358	I.E. Colegio Tecnico De Aplicacion-La Arena	En ejecuci3n	Culminaci3n de construcci3n	19/10/2023	Implementaci3n de m3dulos	10/03/2023
24	2503622	I.E. 14641-Buenos Aires	En ejecuci3n	Culminaci3n de construcci3n	24/07/2023	Implementaci3n de m3dulos	10/03/2023
25	2503626	I.E. Jose Cayetano Heredia-Catacaos	En ejecuci3n	Culminaci3n de construcci3n	20/07/2023	Implementaci3n de m3dulos	Entregado
26	2513470	I.E. San Cristo-Cristo Nos Valga	En ejecuci3n	Culminaci3n de construcci3n	02/11/2023	Implementaci3n de m3dulos	10/03/2023
27	2513474	I.E. 14654-Salitra	En ejecuci3n	Culminaci3n de construcci3n	27/07/2023	Implementaci3n de m3dulos	04/03/2023
28	2513475	I.E. Maria Auxiliadora-Chulucanas	En ejecuci3n	Culminaci3n de construcci3n	23/08/2023	Uso de ambientes de otra I.E.	04/03/2023
29	2515563	I.E. La Brea	En ejecuci3n	Culminaci3n de construcci3n	22/09/2023	Uso de ambientes de otra I.E.	Entregado

1/ Si el proyecto ya fue inaugurado se considera fecha de inauguraci3n, en los dem3s casos se considera la fecha de fin de comisionamiento.

2/ Acciones previstas para el inicio oportuno de la clases escolares.

Nº	CUI	Nombre de proyecto	Estado	Hitos a cumplir	Fecha del hitos a cumplir ^{1/}
1	2558584	Centro de Salud de Mancora	En asistencia técnica	Culminación de construcción	Febrero 2025
2	2321591	Hospital Apoyo Chulucanas	En ejecución	Culminación de construcción	31/03/2023
3	2483109	Hospital Apoyo II Sullana	En ejecución	Culminación de construcción	13/05/2024
4	2558582	Centro de Salud de Sechura	En asistencia técnica	Culminación de construcción	Febrero 2025
5	2558585	Centro de Salud de Talara	En asistencia técnica	Culminación de construcción	Febrero 2025
6	2502647	Centro de Salud de Limón	Culminado	Inaugurada	08/07/2022
7	2502864	Centro de Salud de Faique	En ejecución	Culminación de construcción	21/03/2023
8	2502968	Centro de Salud Castilla	En ejecución	Culminación de construcción	01/05/2023

1/ Si el proyecto ya fue inaugurado se considera fecha de inauguración, en los demás casos se considera la fecha de fin de comisionamiento.

06

Prioridades de la gestión



I.

**DESTRABE DE
PROYECTOS**

II.

**ASEGURAR LA
OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO
DE PROYECTOS**

III.

**PRIORIZAR
SOLUCIONES
INTEGRALES DE
MANEJO DE RÍOS
Y CUENCAS**

IV.

**MEJORAS EN GESTIÓN CON ENFASIS EN TRANSPARENCIA Y
LUCHA
CONTRA LA CORRUPCIÓN**

I. Destrabe de Proyectos

- 1 Se reactivarán Mesas Técnicas Regionales y Comités Consultivos para articular con todos los actores las mejoras y soluciones a problemas transversales.
- 2 Acompañamiento y asistencia técnica en campo (en materia legal, contractual, planeamiento, costos, problemas sociales, reportería y control de cambios) a las entidades ejecutoras (gobiernos regionales y locales).
- 3 Fortalecimiento y operatividad de la Unidad Funcional de riesgos para atención y solución de conflictos y destrabe de proyectos, priorizando el trabajo en campo en las intervenciones paralizadas. Implementar una estrategia comunicacional diferenciada por región, sector y público objetivo.
- 4 Desarrollar y fortalecer conocimientos de contratistas, sub-contratistas, proveedores, técnicos de gobiernos subnacionales, generando alianzas con instituciones educativas en las regiones, colegios profesionales, entre otros.

A la fecha se ha reportado 16 obras destrabadas en la región Piura

II. Asegurar la Operación y mantenimiento de proyectos

- 1** Promover el cierre (contable y legal) de las intervenciones culminadas a fin que las EE a cargo de la Operación y Mantenimiento consideren las acciones de mantenimiento.
- 2** Se viene coordinando con el MEF alternativas para asegurar y garantizar la operación y mantenimiento de los proyectos.

III. Priorizar las soluciones integrales

- 1** Optimizar ejecución presupuestal de Entidades Ejecutoras en proyectos de soluciones integrales.
- 2** Trabajo articulado con autoridades locales y Comité Consultivo de Piura, La Libertad, Tumbes y Lambayeque, entre otros megaproyectos, para la implementación de soluciones integrales.
- 3** Se viene trabajando en propuestas de simplificación y reducción de plazos para ejecución de proyectos de soluciones integrales
- 4** Se viene impulsando desde la ARCC medidas de prevención y contingencia inmediatas, así como los planes de acción rápida.

IV. Transparencia y lucha contra la corrupción

- 1** Política de puertas abiertas en la institución para la atención de autoridades y sociedad civil, con las medidas de seguridad adecuadas (salas de reuniones con cámaras en Lima y regiones).
- 2** Implementación de protocolos de obtención de información y seguimiento, de las visitas a las obras que hacen los servidores de la ARCC.
- 3** Identificación de las brechas de integridad y mapa de riesgos, conforme a la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción.
- 4** Se ha dispuesto que todos los procesos internos de la ARCC vinculados a la implementación de la cartera de intervenciones G2G sean incorporados en la renovación de la Certificación con el ISO 37001 - Sistema de Gestión Antisoborno con la que ya cuenta la ARCC.
- 5** Mejorar el seguimiento y monitoreo orientado a la toma de decisiones ante situaciones adversas comunicadas por la Contraloría, dentro de los plazos establecidos en la Directiva de Control Simultáneo y con la subsecuente identificación y determinación de responsabilidad que corresponda.
- 6** Renovación de compromiso de brindar todas las facilidades a las comisiones auditoras de la Contraloría General de la República, a fin de que realicen su labor, transparentando la legalidad de los procesos de negociaciones del convenio de Gobierno a Gobierno (G2G).



PERÚ

Autoridad para la
Reconstrucción con Cambios
