



PERÚ

Autoridad para la  
Reconstrucción con Cambios



# Presentación

**Roxana Paola Euscatigue Lino**  
*Directora de Intervenciones del Sector  
Vivienda, Construcción y Saneamiento*



PERÚ

Autoridad para la  
Reconstrucción con Cambios



# Situación actual del PIRCC – La Libertad

## DIRECCIÓN DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO


**Autoridad para la Reconstrucción con Cambios**  
Lima, 7 de enero de 2022



# DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

## EVOLUCIÓN ANUAL DEL PIRCC - DISVCS

La DISVCS cuenta con una cartera de **6484** intervenciones de los sectores de “saneamiento” y “pistas y veredas”, cuyo avance se muestra a continuación:

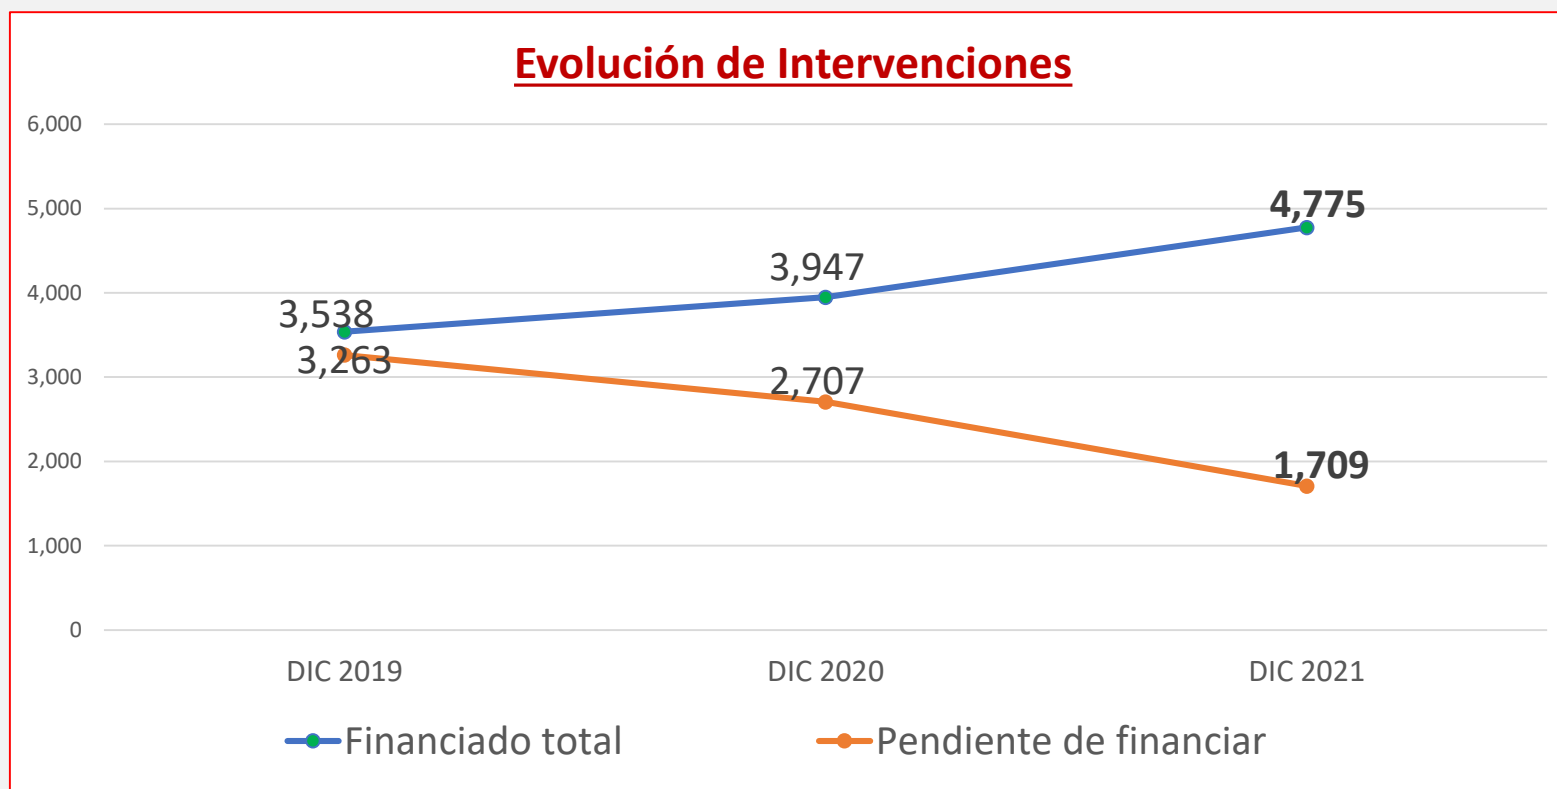

La DISVCS cuenta actualmente con 576 intervenciones en la Región La Libertad, dentro de las cuales el **84%** de intervenciones del PIRCC se encuentran financiadas.

Estado	SANEAMIENTO	%	PISTAS Y VEREDAS	%	Total	% Total
Financiado total	221	38%	261	45%	482	<b>84%</b>
Pendiente de financiar	72	13%	22	4%	94	16%
<b>Total</b>	<b>293</b>	<b>51%</b>	<b>283</b>	<b>49%</b>	<b>576</b>	<b>100%</b>



PERÚ

Autoridad para la  
Reconstrucción con Cambios


(\*) Con fecha de corte al 31/12/2021



# Intervenciones Financiadas – Avance Presupuestal:


## Por Sector

SECTOR	MARCO PRESUPUESTAL 2021	DEVENGADO 2021	% AVANCE 2021
PISTAS Y VEREDAS	23,736,741.00	20,160,890.44	85%
SANEAMIENTO	15,783,325.00	12,128,519.04	77%
<b>Total general</b>	<b>39,520,066.00</b>	<b>32,289,409.48</b>	<b>82%</b>

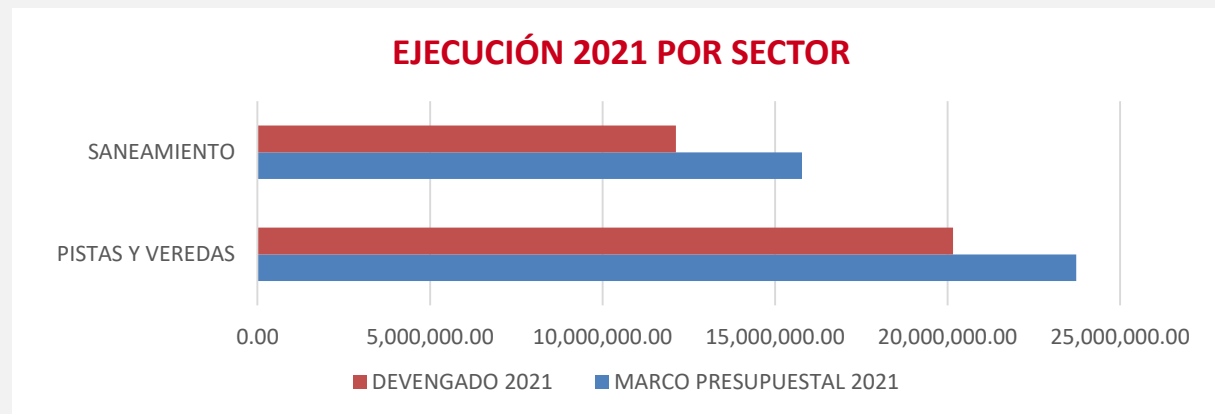


## Por Nivel de Gobierno

SECTOR	MARCO PRESUPUESTAL 2021	DEVENGADO 2021	% AVANCE 2021
1. GOB. NACIONAL	1,878,510.00	1,214,300.49	65%
2. GOB. REGIONAL	3,173,998.00	2,886,746.05	91%
3. GOB. LOCAL	34,467,558.00	28,188,362.94	82%
<b>Total general</b>	<b>39,520,066.00</b>	<b>32,289,409.48</b>	<b>82%</b>

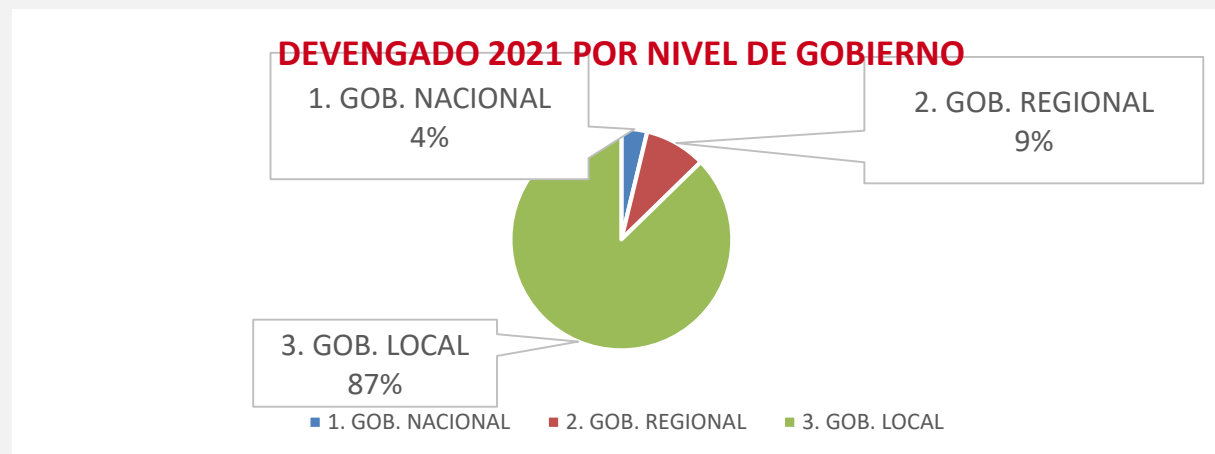

# ESTADO DE INTERVENCIONES FINANCIADAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 POR SECTOR

ESTADO	SANEAMIENTO	%	PISTAS Y VEREDAS	%	TOTAL	%
1. En Proceso	35	16%	2	1%	37	8%
2. En Ejecución	15	7%	9	3%	24	5%
3. Culminado	171	77%	250	96%	421	87%
<b>Total</b>	<b>221</b>	<b>100%</b>	<b>261</b>	<b>100%</b>	<b>482</b>	<b>100%</b>

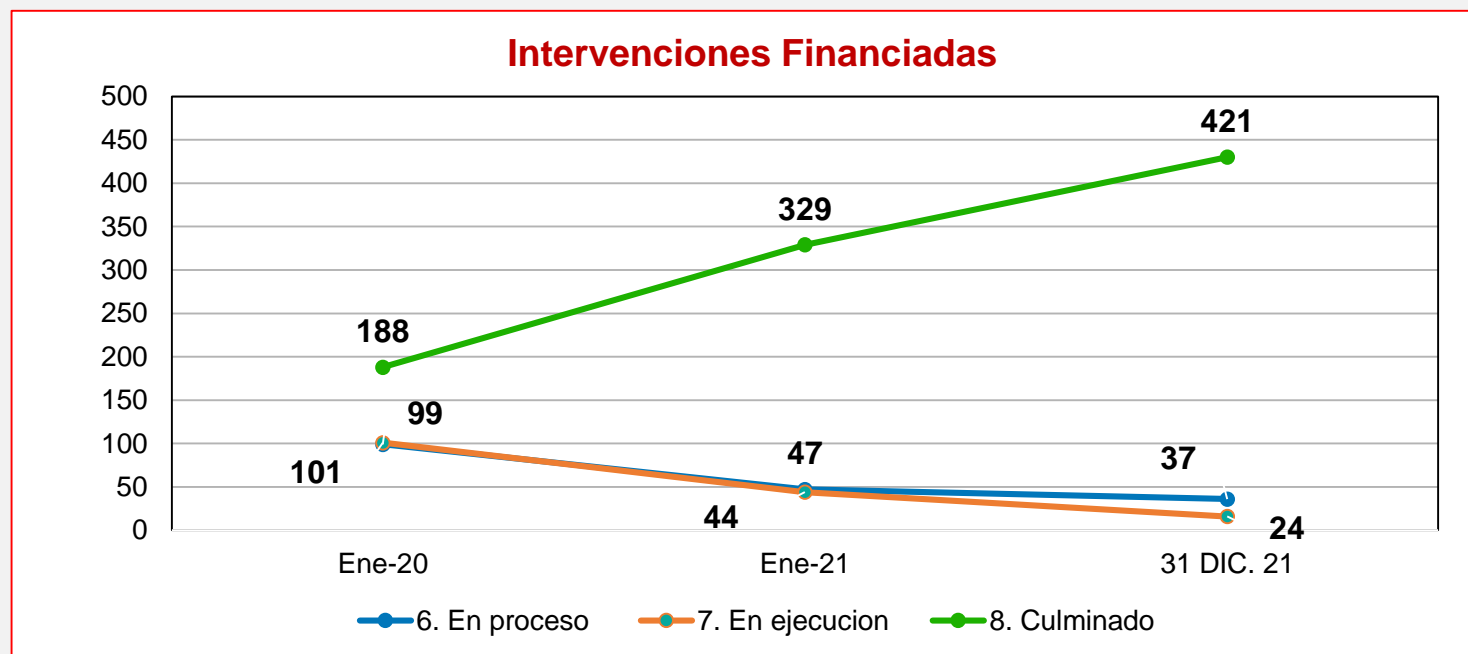

# Intervenciones Financiadas – La Libertad:

## Por Sector

87.34%

Sector	B.1 Sin Inicio de Proceso de Contratación	B.2 En PEC	B.3 Con Contrato Suscrito	B.4 En Ejecución de Obra	B.5 Obra en Controversia	B.6 Obra Ejecutada	TOTAL
PISTAS Y VEREDAS		2		8	1	250	261
SANEAMIENTO	2	11	22	9	6	171	221
<b>Total general</b>	<b>2</b>	<b>13</b>	<b>22</b>	<b>17</b>	<b>7</b>	<b>421</b>	<b>482</b>

## Por Nivel de Gobierno

81.33%

Sector	B.1 Sin Inicio de Proceso de Contratación	B.2 En PEC	B.3 Con Contrato Suscrito	B.4 En Ejecución de Obra	B.5 Obra en Controversia	B.6 Obra Ejecutada	TOTAL
GOB. LOCAL	2	13	1	10	2	364	392
GOB. NACIONAL			21	6	5	53	85
GOB. REGIONAL				1		4	5
<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>13</b>	<b>22</b>	<b>17</b>	<b>7</b>	<b>421</b>	<b>482</b>



PERÚ

Autoridad para la  
Reconstrucción con Cambios



# EN EJECUCIÓN:

- **2471674: RECONSTRUCCION DE LA AV. LOS PAUJILES TRAMO AV. JUAN PABLO II Y AV. VICTOR LARCO HERRERA, DISTRITO DE TRUJILLO - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD**



Monto financiado: S/ 2,194,957.00 – a cargo del Gobierno Regional de la Libertad

Diciembre 2021:



Avance físico 99%



Avance financiero 94%

- **2468749: MEJORAMIENTO DE LAS PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES: PEDRO CACERES, SIMON BOLIVAR, SAN MARTIN, TRES MANGOS, AYACUCHO Y GUADALUPE Y LAS AVENIDAS EZEQUIEL G. CACEDA – DISTRITO DE CHEPEN – PROVINCIA DE CHEPEN – DEPARTAMENTO LA LIBERTAD**



Monto financiado: S/ 8,020,564.00 – a cargo de la Municipalidad Provincial de Chepén

Diciembre 2021:



Avance físico 99%



Avance financiero 99%

- **2410967: REPARACIÓN DE COLECTOR PRIMARIO Y COLECTOR SECUNDARIO; EN EL(LA) SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD TRUJILLO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD**



Monto financiado: S/ 3,496,567.00 – a cargo del MVCS

Diciembre 2021:



Avance físico 99 %



Avance financiero 64 %



PERÚ

Autoridad para la  
Reconstrucción con Cambios



- **2474782: Rehabilitación del sistema de saneamiento básico de la localidad el Pancal, distrito de Razuri, provincia de Ascope, departamento de La Libertad**



Monto financiado: S/ 163,193.00 – a cargo de la Municipalidad Distrital de Razuri

Diciembre 2021:



Avance físico 15.32%



Avance financiero 0%

- **2424303: Renovación de captación de agua de manantial y red principal; reparación de línea de conducción y reservorios; en el(la) sistema de agua potable en la localidad Chugur, distrito de Marmot, provincia Gran Chimú, departamento La Libertad**



Monto financiado: S/ 138,552.00 – a cargo de la Municipalidad Distrital de Marmot

Diciembre 2021:



Avance físico 16.21%



Avance financiero 16.6%

- **2502399: Rehabilitación del servicio de agua potable y disposición sanitaria de excretas en la localidad Cruz Blanca del distrito de Simbal, provincia Trujillo, departamento La Libertad**



Monto financiado: S/ 283,264.00 – a cargo de la Municipalidad Distrital de Simbal

Diciembre 2021:



Avance físico 29.63 %



Avance financiero 49.8 %



PERÚ

Autoridad para la  
Reconstrucción con Cambios

# OBRAS SUSPENDIDAS

## Entidad Ejecutora – MVCS (NER)

- 2438717 Rehabilitación del servicio de agua potable en la localidad Corralpampa, distrito Parcoy, provincia Pataz, departamento de La Libertad.
- 2436176 Rehabilitación del servicio de agua potable en la localidad Huachacual, distrito Lucma, provincia Gran Chimú, departamento La Libertad.
- 2436223 Rehabilitación del servicio de agua potable en la localidad Llahuit, distrito Lucma, provincia Gran Chimú, departamento La Libertad.
- 2436227 Rehabilitación del servicio de agua potable en la localidad Piedra de Gente, distrito Lucma, provincia Gran Chimú, departamento La Libertad.

Suspendida por modificación del Expediente técnico.

Suspendida por fallecimiento de supervisor.

## Entidad Ejecutora – MVCS (PNSR)

- 2425087 Renovación de captación de agua de manantial, línea de conducción y red principal; reparación de reservorios; en el(la) sistema de agua potable en la localidad el Arquito, distrito de Poroto, provincia Trujillo, departamento La Libertad

Suspendida por problemas con la disponibilidad de terreno.

# OBRAS SUSPENDIDAS

## Entidad Ejecutora – Municipalidad Distrital de Pataz

- 2485642 Reconstrucción de la calle principal Patacito desde la municipalidad distrital de Pataz hasta el acceso al estadio del distrito de Pataz - provincia de Pataz - departamento de La Libertad.

Suspendida por resolución de contrato del supervisor.

## Entidad Ejecutora – Municipalidad Provincial de Ascope

- 2465133 Mejoramiento del sistema de conducción de agua potable del cauce del río Chicama, planta de tratamiento de agua potable, distrito de Ascope, La Libertad

Suspendida debido a la falta de autorización del pase de la línea de conducción en terreno de propiedad de la junta de usuarios.




PERÚ

Autoridad para la  
Reconstrucción con Cambios

# ESTADO DE INTERVENCIONES NO FINANCIADAS

ESTADO	SANEAMIENTO	%	PISTAS Y VEREDAS	%	TOTAL	TOTAL %
1. Pendientes	2	2%	0	0%	2	2%
2. Estudios Financiados	0	0%	0	0%	0	0%
3. Asistencia Técnica	44	47%	8	9%	52	55%
4. Evaluación(*)	7	7%	2	2%	9	10%
5. Opinión Favorable	11	12%	6	6%	17	18%
6. Por excluir del PIRCC	8	9%	6	6%	14	15%
<b>Total</b>	<b>72</b>	<b>77%</b>	<b>22</b>	<b>23%</b>	<b>94</b>	<b>100%</b>

(\*) Todas estas intervenciones fueron observadas y comunicadas a las EE

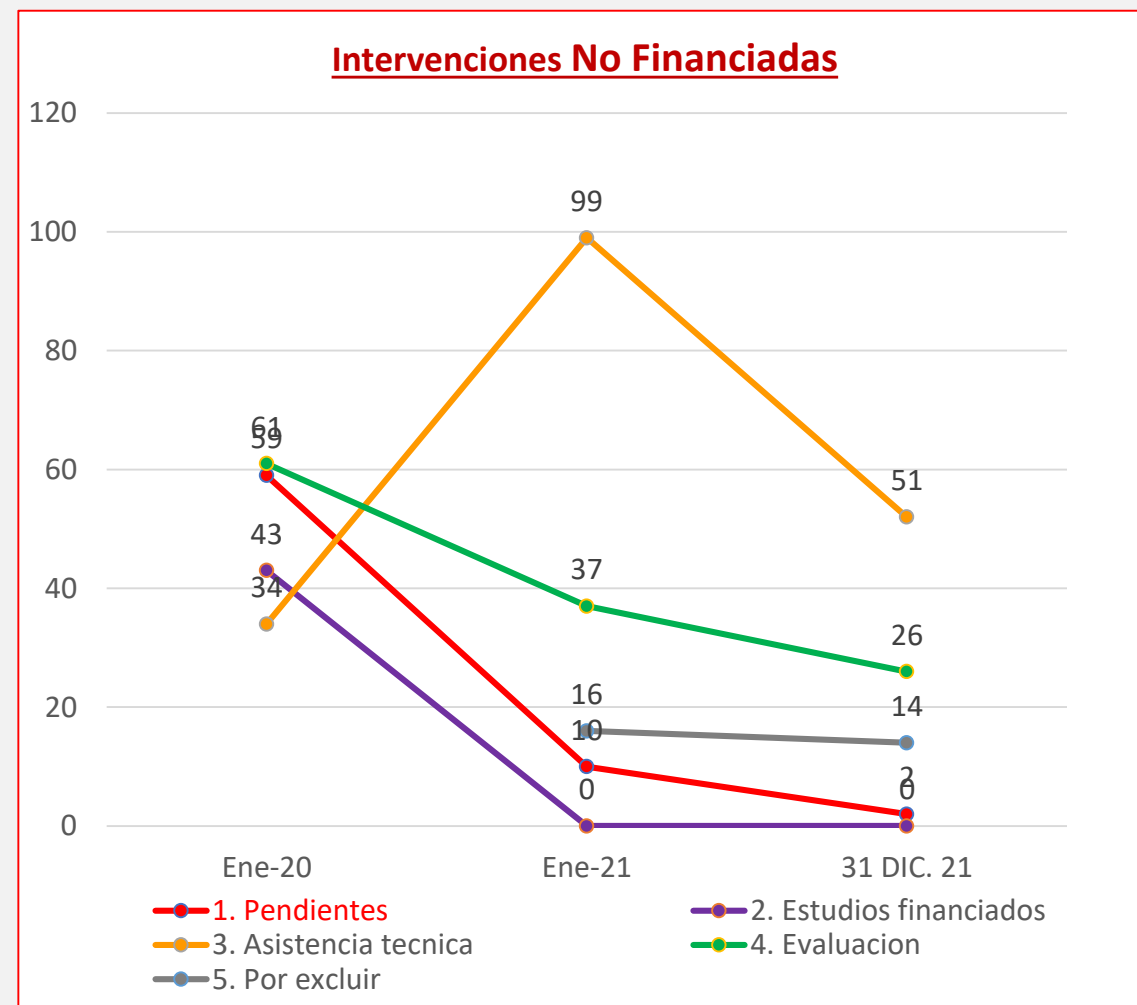

PERÚ

Autoridad para la  
Reconstrucción con Cambios



# ESTADO DE INTERVENCIONES NO FINANCIADAS

## Por Sector

Sector	A.1. Pendientes	A.2. Por excluir del PIRCC	A.3. Gestión de cambios PIRCC	A.5. Asistencia Técnica	A.7. Solicitudes Observadas	A.8. Informe Técnico Favorable	A.9. Priorización 2022	TOTAL
PISTAS Y VEREDAS		6		8	2	4	2	22
SANEAMIENTO	2	8	8	36	7	4	7	72
<b>Total general</b>	<b>2</b>	<b>14</b>	<b>8</b>	<b>44</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>94</b>

## Por Nivel de Gobierno

Nivel de gobierno	A.1. Pendientes	A.2. Por excluir del PIRCC	A.3. Gestión de cambios PIRCC	A.5. Asistencia Técnica	A.7. Solicitudes Observadas	A.8. Informe Técnico Favorable	A.9. Priorización 2022	TOTAL
GOB. NACIONAL	2		1					3
GOB. LOCAL		14	7	44	9	8	9	91
<b>Total general</b>	<b>2</b>	<b>14</b>	<b>8</b>	<b>44</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>94</b>



PERÚ

Autoridad para la  
Reconstrucción con Cambios

# AVANCES

- Incremento al 84% las intervenciones financiadas.
- Mejora de los canales de comunicación: 16 Mesas Técnicas Virtuales, para articular con 300 entidades ejecutoras. Se realizaron 2 mesas para un total de 23 entidades en La Libertad.
- Trabajo cercano con la EE, reforzando la confianza, colaboración, trabajo en conjunto. Ej. Caso Chillia



RESERVORIOS



CAPTACIÓN



LÍNEAS DE CONDUCCIÓN

# AVANCES

Teniendo en cuenta el Ranking de pobreza del Perú, se han identificado 16 municipalidades de La Libertad que se encuentran entre los primeros 200 puestos de dicho Ranking. Estas Entidades Ejecutoras han logrado **obtener el financiamiento de 92** de 101 intervenciones de saneamiento y pistas y veredas, a su cargo, culminando el 70% de ellas.

Provincia	Distrito	Ejecutor final - ACTUAL	Posición EE según Ranking Pobreza Distrital	Total Financiado	Pendiente de financiar	Total general
PATAZ	CHILLIA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILLIA	31	17		17
SANCHEZ CARRION	CHUGAY	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUGAY	50	8		8
BOLIVAR	CONDORMARCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONDORMARCA	58	2		2
SANCHEZ CARRION	MARCABAL	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCABAL	61	2		2
OTUZCO	SINSICAP	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SINSICAP	64	5		5
BOLIVAR	BAMBAMARCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BAMBAMARCA	68	3	5	8
SANCHEZ CARRION	SANAGORAN	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN	77	3		3
SANCHEZ CARRION	SARTIMBAMBA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SARTIMBAMBA	78	5		5
SANCHEZ CARRION	SARIN	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SARIN	90	18		18
SANTIAGO DE CHUCO	SITABAMBA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SITABAMBA	93	7		7
OTUZCO	PARANDAY	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARANDAY	122	2		2
JULCAN	HUASO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUASO	133	3		3
PATAZ	ONGON	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ONGON	134	10		10
PATAZ	HUANCASPATA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCASPATA	153	5	1	6
GRAN CHIMU	SAYAPULLO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYAPULLO	167	2		2
OTUZCO	LA CUESTA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA CUESTA	168		3	3
<b>TOTAL DE INTERVENCIONES</b>				<b>92</b>	<b>9</b>	<b>101</b>




PERÚ

Autoridad para la  
Reconstrucción con Cambios



## Distribución según estados – Región La Libertad:

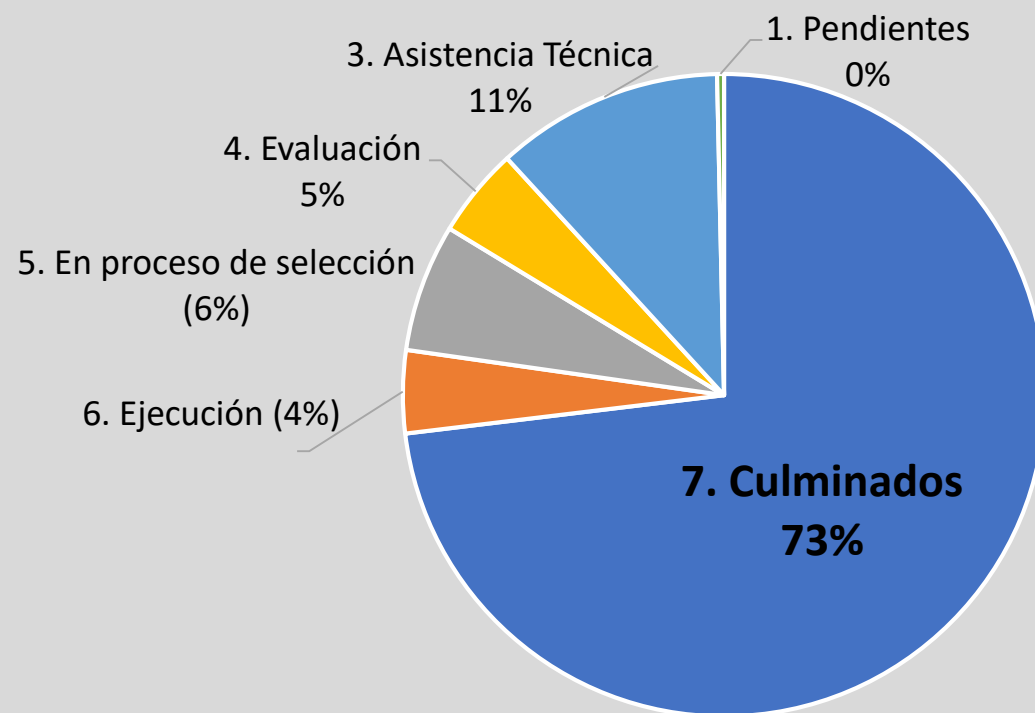

Sector	7. Culminados	6. Ejecución	5. En proceso de selección	4. Evaluación	3. Asistencia Técnica	1. Pendientes	TOTAL
PISTAS Y VEREDAS	250	9	2	8	14		283
SANEAMIENTO	171	15	35	18	52	2	293
<b>TOTAL</b>	<b>421</b>	<b>24</b>	<b>37</b>	<b>26</b>	<b>66</b>	<b>2</b>	<b>576</b>



PERÚ

Autoridad para la  
Reconstrucción con Cambios



# ¿Cuáles son los retos?

- ✓ Contar con cuatrocientos noventa y cinco (495) intervenciones culminadas del Plan de la Reconstrucción con Cambios en los sectores de Saneamiento y Pistas y Veredas.
- ✓ Culminar el financiamiento del 100% de las intervenciones en saneamiento y pistas y veredas de las región LA LIBERTAD, en donde se incluyen proyectos como:
  - REHABILITACION DE LA RED COLECTORA Y BUZONES EN LOS DISTRITOS DE EL PORVENIR, FLORENCIA DE MORA, LA ESPERANZA, EL MILAGRO, VICTOR LARCO Y TRUJILLO, CASO URBANO DE TRUJILLO - LA LIBERTAD
  - REHABILITACION DE 7500 M2 DE PISTAS Y 2500M 2 DE VEREDAS DEL CASCO URBANO, VIRU, LA LIBERTAD
- ✓ Culminar la atención de las 200 intervenciones de saneamiento y pistas y veredas de las Entidades Ejecutoras que se ubican entre los doscientos (200).





PERÚ

Autoridad para la  
Reconstrucción con Cambios



**Siempre**  
con el **pueblo**
