



PERÚ

Autoridad para la
Reconstrucción con Cambios



Presentación para la Comisión Reconstrucción del Congreso de la República

Reconstrucción con Cambios

Junio 2022



1. Avance físico al 2022

- **Avance general:** 58% de intervenciones culminadas en 13 regiones, pero quedan 42% por implementar.

10,727 Intervenciones

58%

6,273

Interv. **culminadas**

- 690 centros educativos
- 1,830 obras de saneamiento
- 2,076 en pistas y veredas
- 1,113 obras de agricultura
- 40 carreteras
- 398 caminos
- 120 puentes
- 2 establecimientos de salud
- 4 obras en el Ejército Peruano

42%

4,454

Interv. **por implementar**

- **1,468** Interv. en ejecución
- **748** Interv. en proceso de contratación
- **1,984** Interv. en proceso de financiamiento
- **254** Interv. pendientes

- **ROL ejecutor ARCC en 9 regiones (G2G)**

- Se gestiona una **cartera de 128 proyectos**, de los cuales **8 ya se culminaron** (7 colegios y 1 C. Salud)
- **En EJECUCIÓN**, se tienen **120 proyectos**, cuyo monto de inversión asciende a **S/ 9,868 millones**
- **En proceso de CONTRATACIÓN**, se tienen **15 PROYECTOS** de soluciones integrales, cuyo monto de inversión asciende a **S/ 2,995 millones**
- **Con estudio de preinversión**, se tienen **13 PROYECTOS** de soluciones integrales, cuyo monto de inversión asciende a **S/ 5,204 millones**

Aspectos relevantes a considerar:

- **74** Instituciones Educativas (**En ejecución**)
- **15** Establecimientos de Salud (**En ejecución**)
- Soluciones Integrales: (**39 en ejecución**)
 - **17** ríos (Control de Inundaciones, sistemas de alerta temprana - SAT, defensas ribereñas, etc.)
 - **5** Quebradas
 - Ciudades con drenajes pluviales

Periodo de ejecución

- ➔ **1 a 2 años**
- ➔ **2 a 3 años**
- ➔ **3 a 5 años**



PERÚ

Autoridad para la
Reconstrucción con Cambios

Fuente: Monitor ARCC al 30.04.22

Elaboración: Oficina de Gestión de Proyectos



2. Avance presupuestal del SIAF – FONDES 2022

PRESUPUESTO ARCC:
S/ 4,570 MM



PRESUPUESTO EE:
S/ 3,771 MM



PRESUPUESTO TOTAL FONDES
S/ 8,341 MM


TIPO	PIA	PIM	CERTIFICADO		COMPROMISO		EJECUTADO	
			S/	%	S/	%	S/	%
OPERATIVIDAD ARCC	126,181,913	145,990,500	116,235,526	80%	114,075,968	78%	38,224,505	26%
CARTERA G2G	5,079,341,641	3,926,670,313	2,202,914,176	56%	2,079,098,840	53%	1,164,886,262	30%
ASISTENCIA G2G	243,802,732	243,802,732	44,632,003	18%	44,238,926	18%	34,648,330	14%
TRANSFERENCIAS	211,748,435	253,942,535	-	0%	-	0%	-	0%
TOTAL ARCC	5,661,074,721	4,570,406,080	2,363,781,705	52%	2,237,413,733	49%	1,237,759,097	27%
LEY N° 31365	2,433,335,002	1,413,105,601	923,929,609	55%	590,587,626	42%	323,008,885	19%
TRANSF. A FAVOR DE EE	-	2,110,898,042	1,526,501,937	72%	921,722,463	44%	506,355,413	24%
SALDO DE BALANCE	-	246,996,357	137,843,766	56%	77,408,063	31%	64,317,531	26%
TOTAL GN/GR/GL	2,433,335,002	3,771,000,000	2,588,275,311	69%	1,589,718,151	42%	893,681,829	24%
TOTAL FONDES 2022	8,094,409,723	8,341,406,080	4,952,057,016	59%	3,827,131,884	91%	2,131,440,926	26%



3.1 Ejecución a cargo de los tres niveles de gobierno – Año 2022

MINISTERIOS

(En millones de soles)

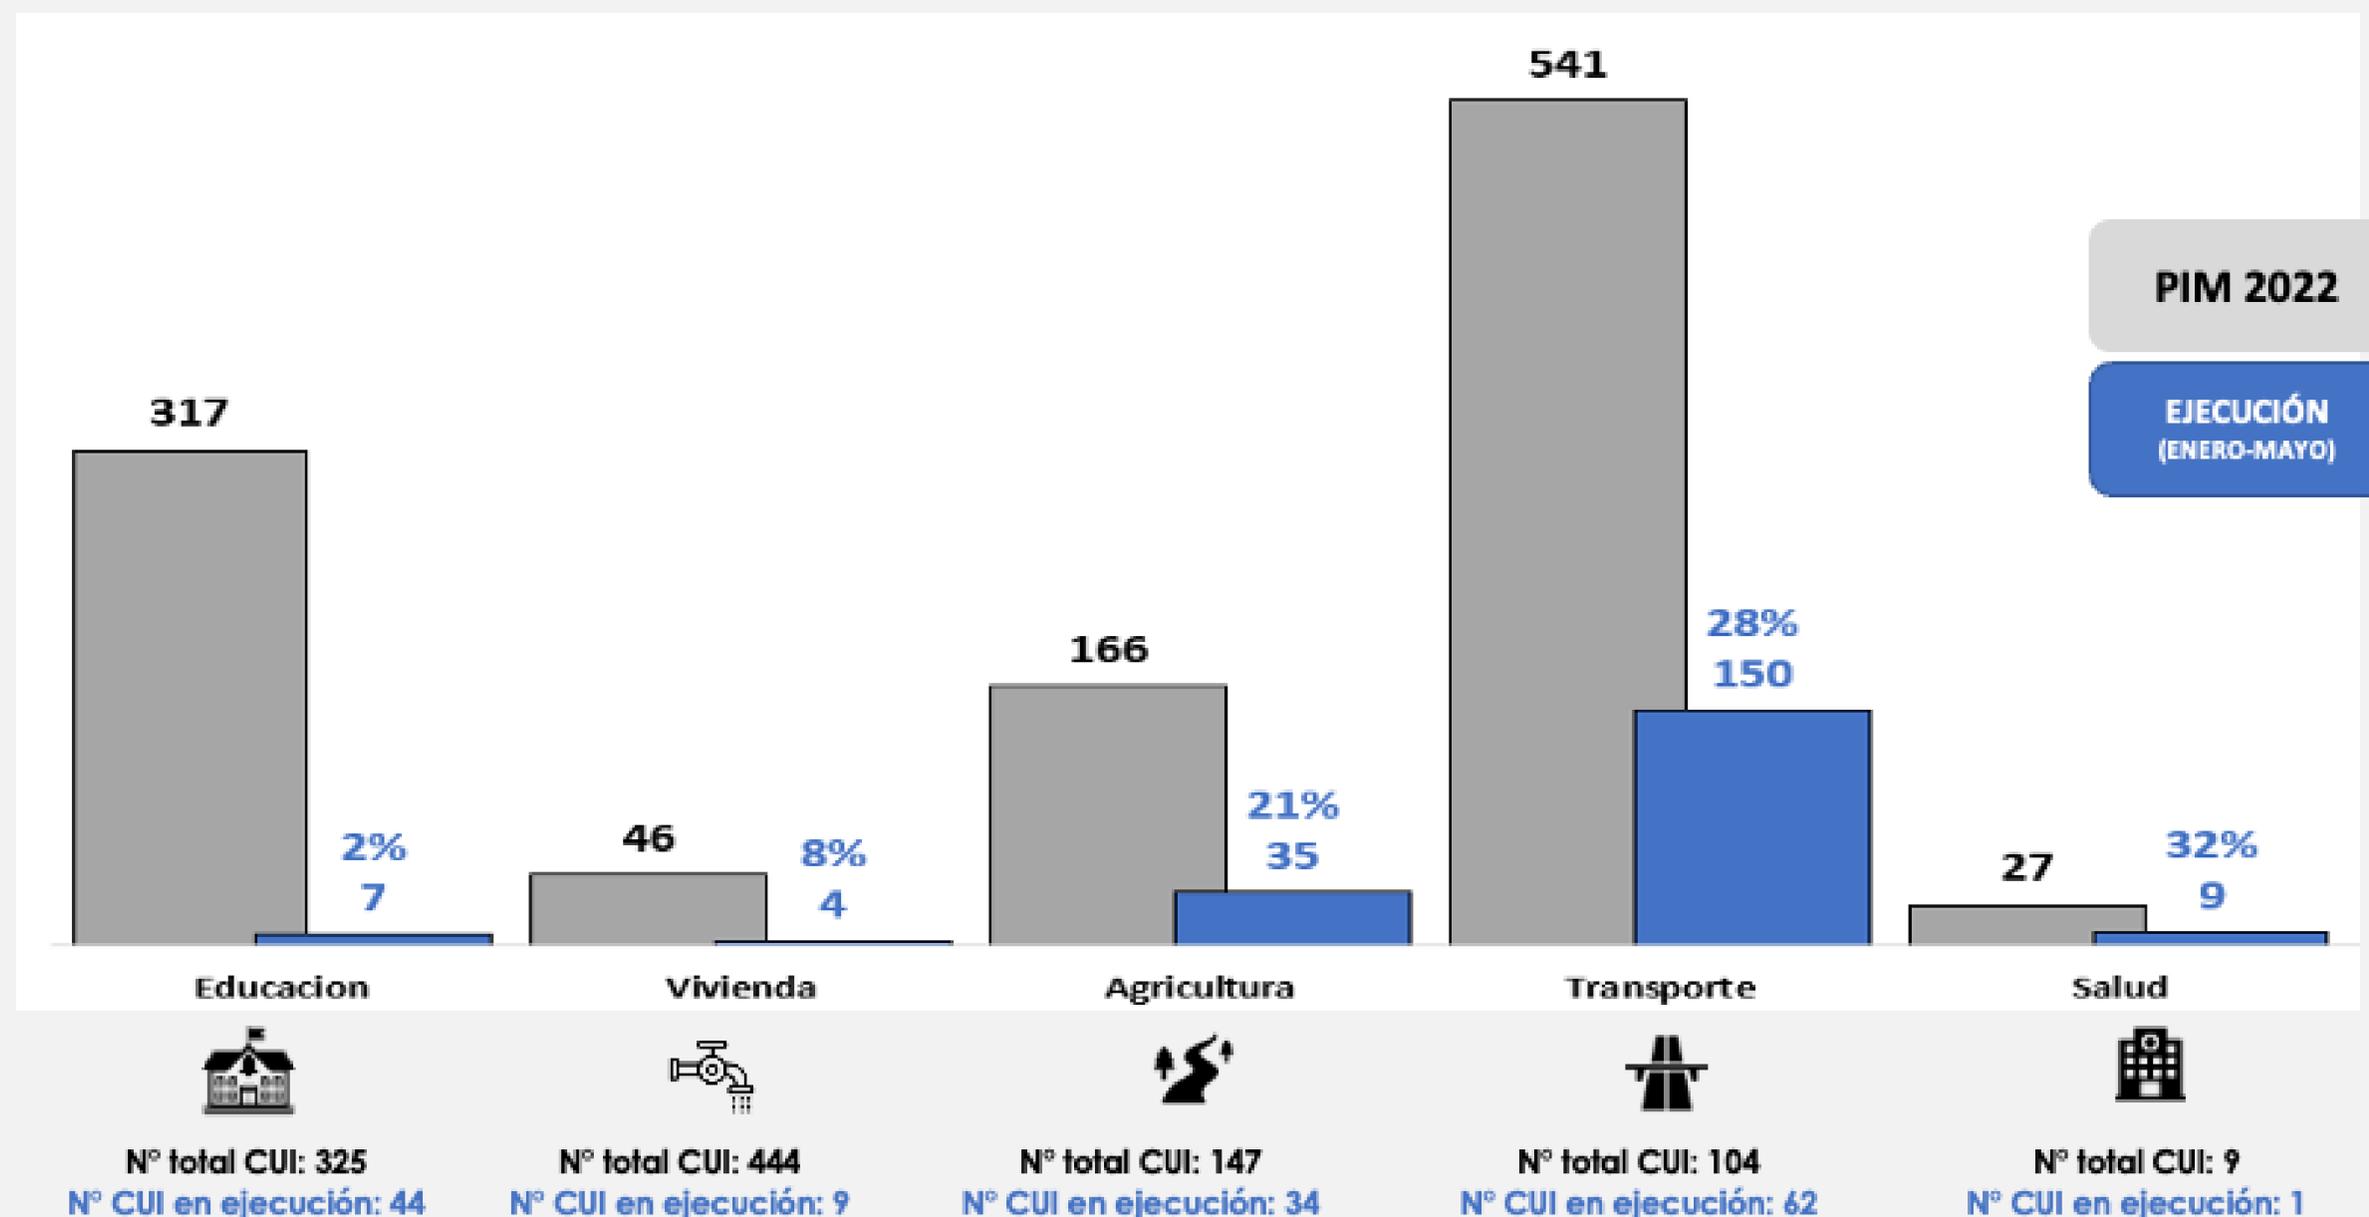

PERÚ


Autoridad para la
Reconstrucción con Cambios



3.2 Ejecución a cargo de los tres niveles de gobierno – Año 2022

Total por Sector

(En millones de soles)

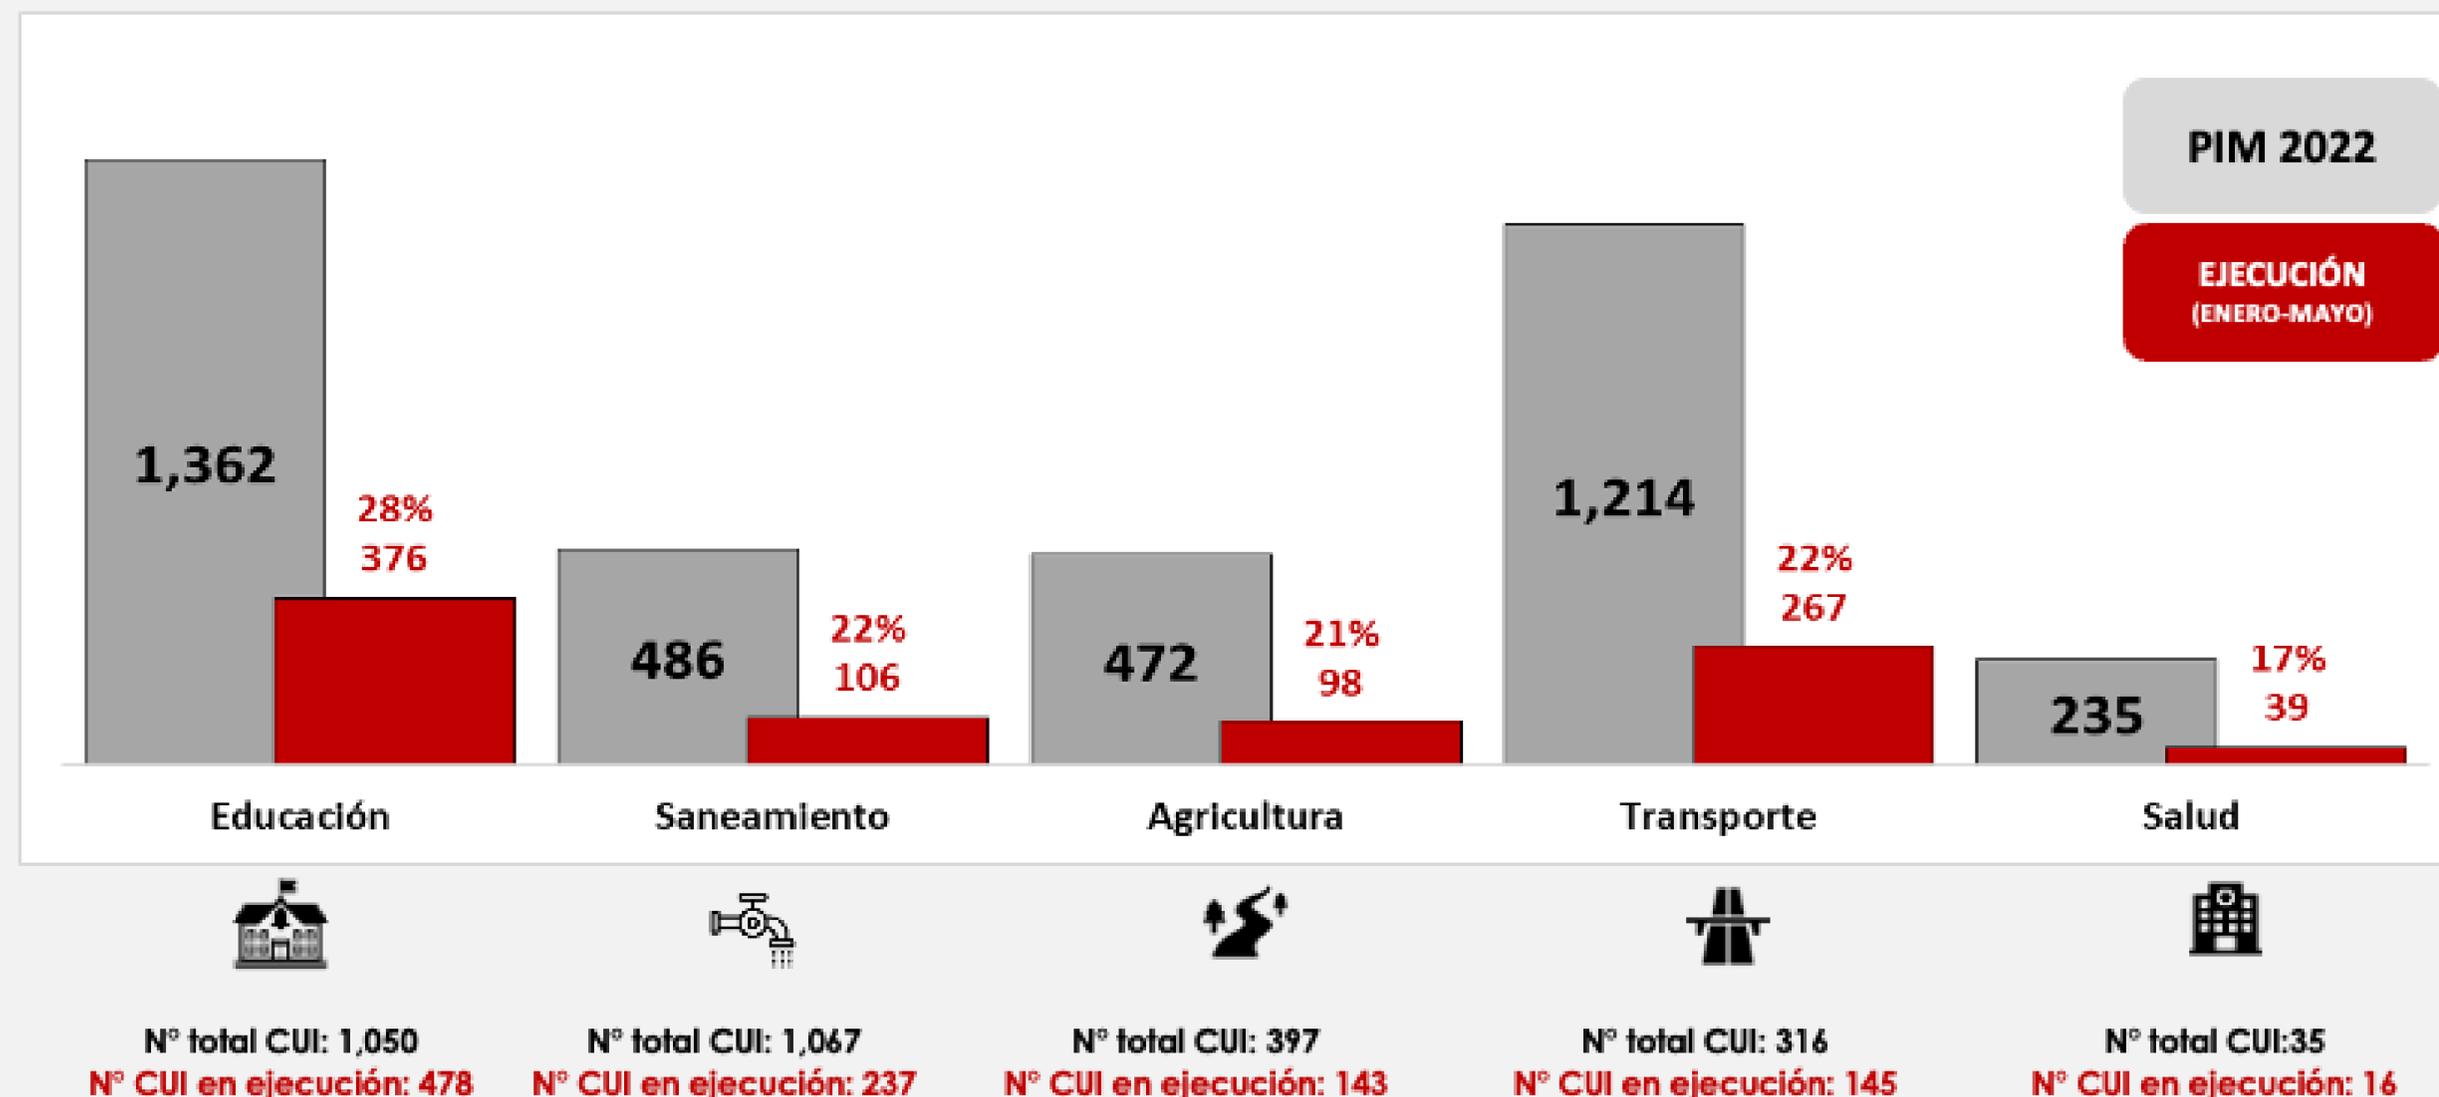

PERÚ


Autoridad para la Reconstrucción con Cambios



4. Evolución de la programación mensualizada (Ene – Dic)

Transferencias a las Entidades Ejecutoras del PIRCC

(En millones de soles)

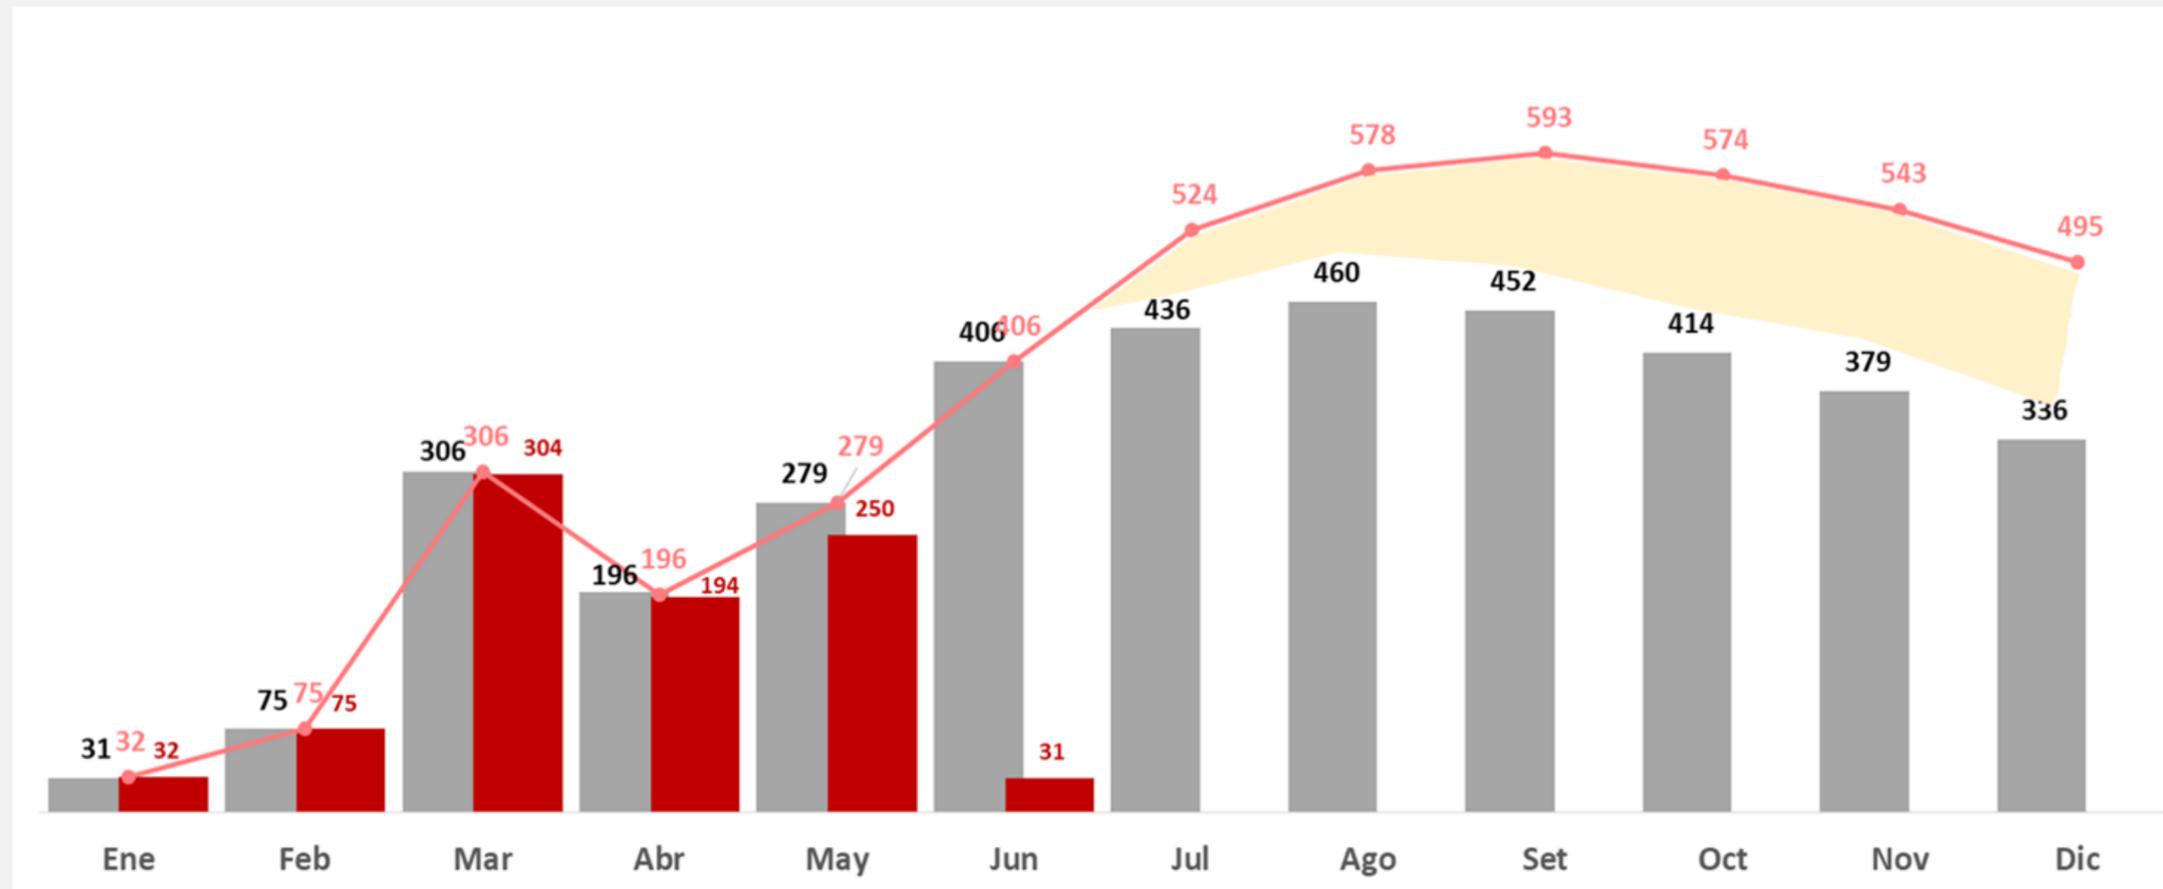

PROG. LINEAS AJUSTADA
S/ 4,600

PIM 2022
S/ 3,771

EJECUCIÓN
S/ 886

DEFICIT DE CONTINUIDAD
S/ 830

Se ha gestionado 6 extornos por el monto de **S/ 1,045 MM**, los cuales han sido reasignados a las diferentes EE para la atención de la continuidad.

5. Evolución de la programación mensualizada (Ene – Dic)

Programación de intervenciones G2G

(En millones de soles)



META MEF
S/ 3,981

PIM 2022
S/ 4,170

EJECUCIÓN
S/ 1,173

6.1 Necesidad de financiamiento año 2022

Deficit 2022

(En millones de soles)

REGIÓN	MONTO FINANCIADO	MONTO PROGRAMADO	DÉFICIT		
			NUEVOS FINANCIAMIEN	CONTINUIDAD	TOTAL DÉFICIT
ANCASH	540	794	136	119	254
AREQUIPA	200	263	42	20	62
AYACUCHO	42	49	6	1	7
CAJAMARCA	94	115	4	18	22
HUANCAVELICA	117	135	5	13	18
ICA	156	199	12	31	43
JUNIN	4	10	5	0	5
LA LIBERTAD	562	821	61	197	258
LAMBAYEQUE	366	554	124	64	188
LIMA	252	367	85	31	115
LORETO	9	9		0	0
PIURA	1,262	1,844	300	282	582
TUMBES	167	224	3	54	57
TOTAL	3,771	5,384	783	830	1,613



PERÚ

Autoridad para la
Reconstrucción con Cambios



6.2 Nuevos financiamientos aprobados por la ARCC

Nuevas intervenciones



REGIÓN	AGRICULTURA	EDUCACIÓN	SALUD	TRANSPORT	VIVIENDA	TOTAL	TOTAL	TOTAL
	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	FINANCIAMIENTO
ANCASH	16,289,929	56,388,187	20,225,759	8,683,392	33,938,508	135,525,775	87,281,820	222,807,595
AREQUIPA		1,131,441		40,915,168	269,248	42,315,857	19,085,242	61,401,100
AYACUCHO					5,938,948	5,938,948	-	5,938,948
CAJAMARCA					4,011,411	4,011,411	-	4,011,411
HUANCAVELICA	1,955,067				2,778,034	4,733,101	-	4,733,101
ICA	3,491,709	4,489,743		1,321,547	2,297,219	11,600,219	6,146,877	17,747,095
JUNIN		5,401,519				5,401,519	3,437,112	8,838,631
LA LIBERTAD	21,921,746	18,091,776	5,288,459	11,141,104	4,901,684	61,344,769	48,112,624	109,457,393
LAMBAYEQUE	24,952,161	57,770,615	8,087,757	3,322,067	29,490,493	123,623,092	94,028,567	217,651,659
LIMA	31,132,616	17,588,649	6,877,557		29,064,829	84,663,651	21,192,633	105,856,284
PIURA	32,873,143	139,858,864	40,539,441	66,317,483	20,762,927	300,351,859	252,357,676	552,709,534
TUMBES		2,353,159	894,719			3,247,879	4,631,791	7,879,669
TOTAL	132,616,371	303,073,954	81,913,693	131,700,762	133,453,301	782,758,079	536,274,342	1,319,032,421



PERÚ

Autoridad para la
Reconstrucción con Cambios



6.3 Déficit de continuidad por región y sector

Continuidad de intervenciones



REGIÓN	AGRICULTURA	EDUCACIÓN	SALUD	TRANSPORTES	VIVIENDA	TOTAL
ANCASH	- 3,646,939	- 67,052,051	- 3,224,031	- 36,229,368	- 8,633,055	- 118,785,444
AREQUIPA	-	- 7,490,190	-	- 10,478,275	- 2,123,106	- 20,091,571
AYACUCHO	-	- 500,251	-	-	- 418,769	- 919,020
CAJAMARCA	-	- 2,972,889	- 3,938,982	-	- 10,897,849	- 17,809,720
HUANCAVELICA	-	- 1,627,533	-	- 11,152,443	- 304,835	- 13,084,811
ICA	- 91,754	-	-	- 30,937,029	-	- 31,028,783
LA LIBERTAD	- 14,139,665	- 26,505,043	- 18,437,072	- 125,654,282	- 12,247,513	- 196,983,575
LAMBAYEQUE	- 1,755,450	- 25,271,435	- 24,972,195	- 10,261,873	- 1,861,911	- 64,122,863
LIMA	- 1,739,246	- 7,013,202	- 1,519,100	- 14,983,106	- 5,485,681	- 30,740,336
LORETO	-	-	-	-	- 51,080	- 51,080
PIURA	- 1,470,612	- 84,278,399	- 35,231,446	- 140,122,916	- 21,040,537	- 282,143,911
TUMBES	- 19,689,068	- 3,551,755	-	- 28,306,234	- 2,468,547	- 54,015,605
Total general	- 42,532,734	- 226,262,749	- 87,322,827	- 408,125,526	- 65,532,884	- 829,776,719



PERÚ

Autoridad para la
Reconstrucción con Cambios



10. Propuestas


- Concluir lo faltante del componente de reconstrucción del PIRCC, que asciende a 2,238 intervenciones. Para ello, es necesario ampliar la vigencia de la ARCC (propuesta normativa).
- Implementar un equipo técnico para la atención y prevención de conflictos sociales presentados en obras del G2G y obras a cargo de Ministerios, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.
- Propuesta normativa (PL) para reactivar las obras paralizadas e intensificar la asistencia técnica para destrabar las 357 obras paralizadas (S/ 3,452 millones) en los sectores de agricultura, transporte, saneamiento, defensa salud, educación, pistas y veredas.
- Priorizar intervenciones emblemáticas, de mayor urgencia e impacto como las soluciones integrales: obras en ríos, quebradas, drenajes, infraestructura natural y sistemas de alerta temprana.

11.1. En el NORTE: intervenciones a inaugurar en junio y julio 2022

Tumbes	
01 Colegio	Principal obra: -IE N° 110 Celsa Flores Gonzales (Papayal). S/ 5.9 MM y 254 beneficiarios.
S/ 6 MM	

Lambayeque	
24 Colegios	Principales obras: -Carretera Autopista el Sol - Sector 2, Río Olmos y La Niña (Lambayeque Piura). S/ 353.8 MM y 48,209 beneficiarios. -Carretera Autopista el Sol- Sector 1, Río La Leche -Morrope (Lambayeque -Piura). S/ 307 MM y 1,142 beneficiarios. -Institución Educativa N° 10065 (Kañaris). S/ 8.6 MM y 164 beneficiarios.
S/ 743 MM	

La Libertad	
18 Colegios	Principales obras: -Carretera Autopista el Sol- Sector puente Moche (Tujillo-Sullana). S/ 54.1 MM y 478 beneficiarios. -Puente Virú - Red vial N°4 (Virú). S/ 34.2 MM y 46,484 beneficiarios.
S/ 179 MM	

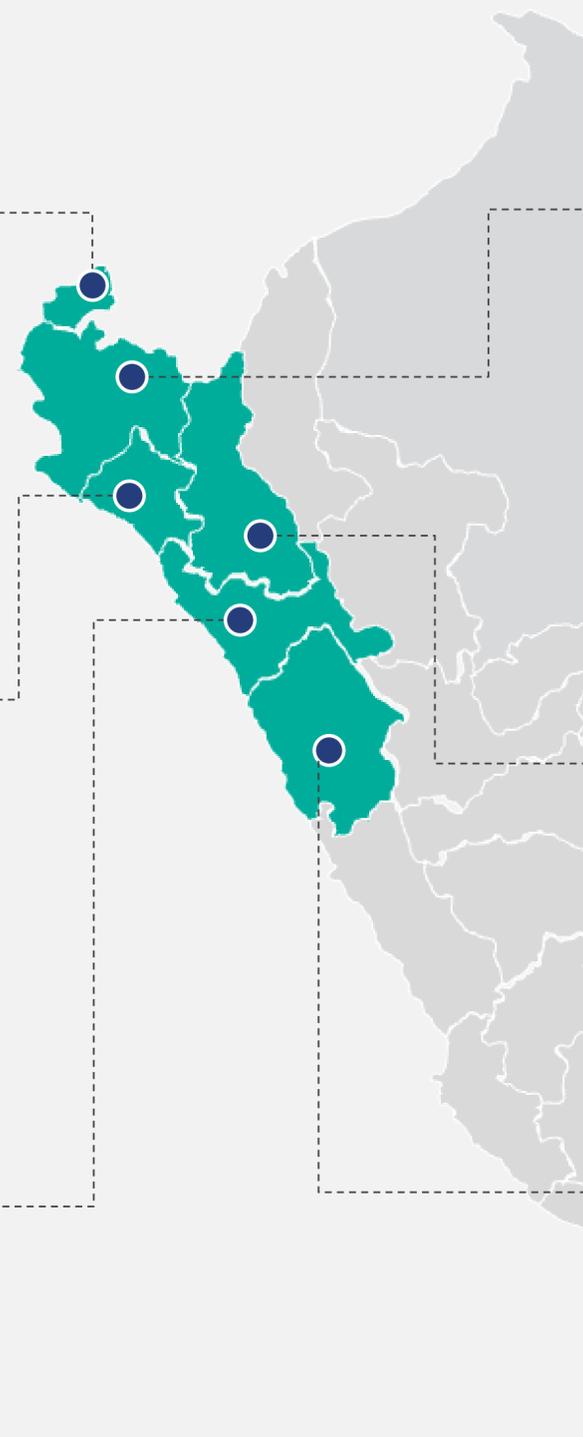

Piura	
64 Colegios	Principales obras: -Camino vecinal Puente Mocho-Casa Grande (La Arena). S/ 9.4 MM y 38,734 beneficiarios. -Camino vecinal Villa Pedregal -Cuncungara - Cura Mori- Chato Chico (Nuevo San Pedro). S/ 5.7 MM y 18,311 beneficiarios. -Centro de Salud Limón de Porcuya (Huarmaca). S/ 38.5 MM y 4,182 beneficiarios.
S/ 218 MM	

Cajamarca	
03 Colegios	Principales obras: -Estación de bombeo de agua - Tunel Conchano (Chota). S/ 4.8 MM y 12,808 beneficiarios. -Saneamiento básico de la localidad de Gallito Ciego (Yonan). S/ 0.2 MM y 125 beneficiarios.
S/ 5 MM	


Áncash	
16 Colegios	Principales obras: -IE N° 88034 Pedro Ruiz Gallo (Chimbote). S/ 20.9 MM y 238 beneficiarios. -IE N° 88037 Antenor Sanchez (Chimbote). S/ 40.5 MM y 740 beneficiarios.
S/ 77 MM	

11.2. En el SUR: intervenciones a inaugurar en junio y julio 2022

Lima	
04 Interv.	Principales obras: -Institución Educativa N° 20174 - Distrito Pacarán (Cañete). S/ 4.5 MM y 148 beneficiarios.
S/ 17 MM	-Puente El Molino (Supe). S/ 3.7 MM y 24,318 beneficiarios.

Ica	
01 Interv.	Principal obra: -Institución Educativa N° 155 (Palpa). S/ 1 MM y 47 Beneficiarios.
S/ 1 MM	

Arequipa	
3 Interv.	Principales obras: -Camino vecinal Aguada de la Zorra-Chugui. S/ 2.9 MM y 3,431 Beneficiarios.
S/ 8 MM	-Rehabilitación de las calles de la localidad de Cabanaconde (Cabanaconde). S/ 2.9 MM y 1,200 Beneficiarios.

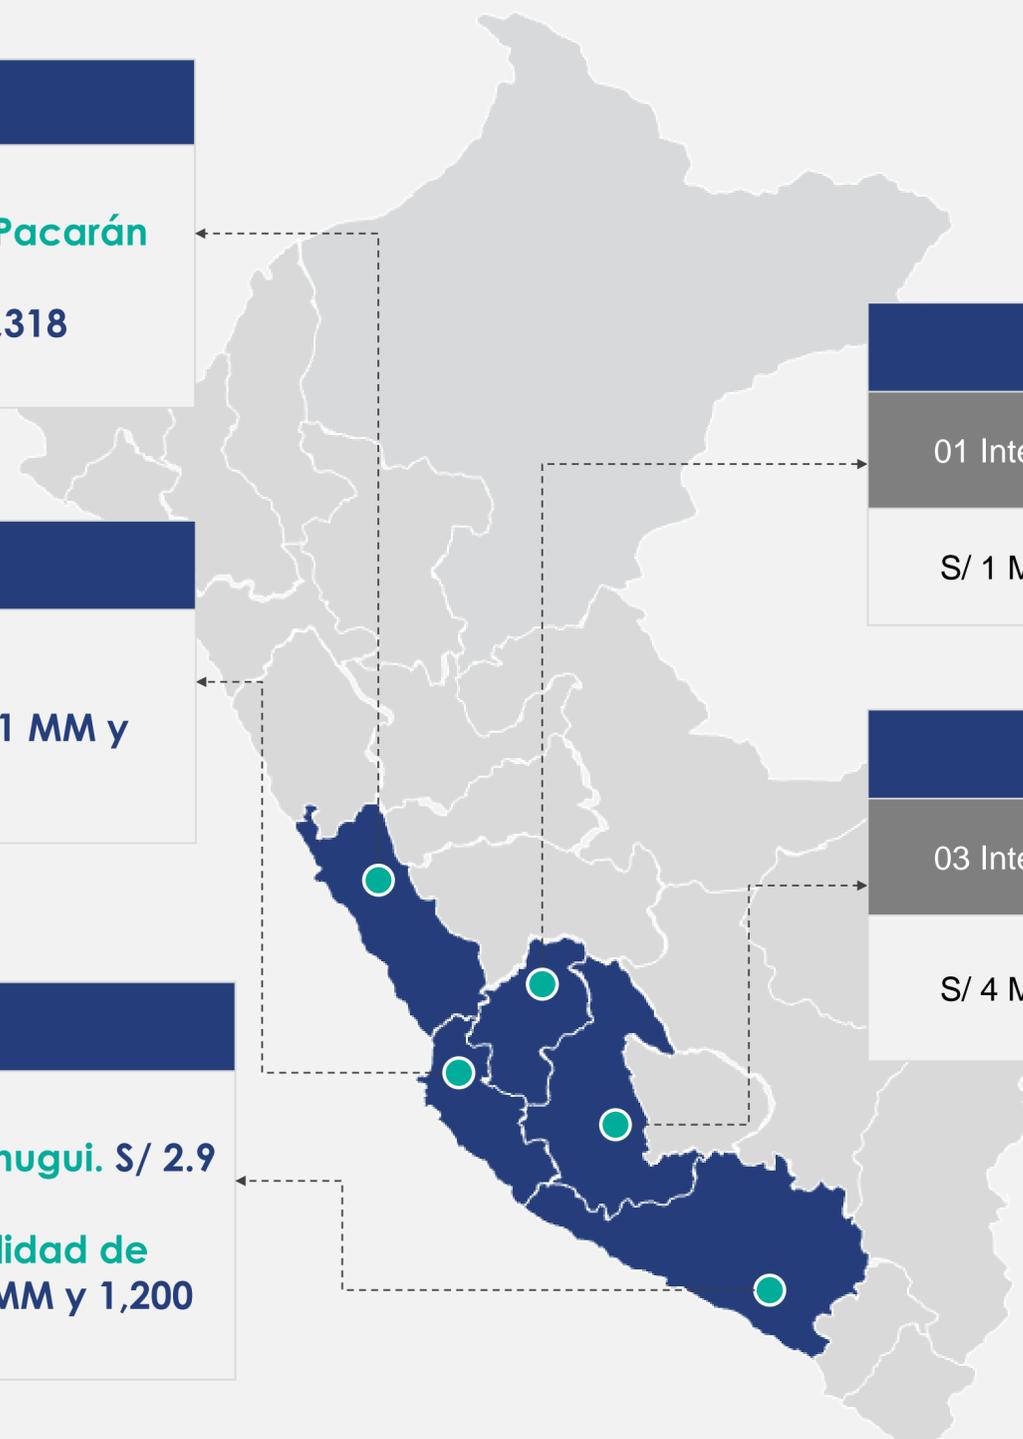

Huancavelica	
01 Interv.	Principal obra: -Canal de riego Acomachay-Paria (Aurahua). S/ 1.1 MM y 78 beneficiarios.
S/ 1 MM	

Ayacucho	
03 Interv.	Principales obras: -Institución Educativa Inicial N° 412 (Paras). S/ 3.4 MM y 45 beneficiarios.
S/ 4 MM	-Saneamiento básico de la localidad de Oyolo (Oyolo). S/ 0.1 MM y 49 beneficiarios.



PERÚ

Autoridad para la
Reconstrucción con Cambios



Siempre
con el pueblo
