

PRONIED - UGRD


Unidad Gerencial de Reconstrucción frente a Desastres



PRONIED – MINEDU
MARZO 2022

ESTADO DE LAS INTERVENCIONES A CARGO DE PRONIED

El Plan Integral de Reconstrucción con Cambios (PIRCC) comprendía una **cartera de 1,621 intervenciones correspondientes al Sector Educación**, cartera que sufrió una serie de modificaciones, habiéndose excluido 98 intervenciones, **quedando a la fecha un total de 1,523 intervenciones**. El Ministerio de Educación a través del PRONIED **tiene a su cargo la ejecución de 428 intervenciones**.

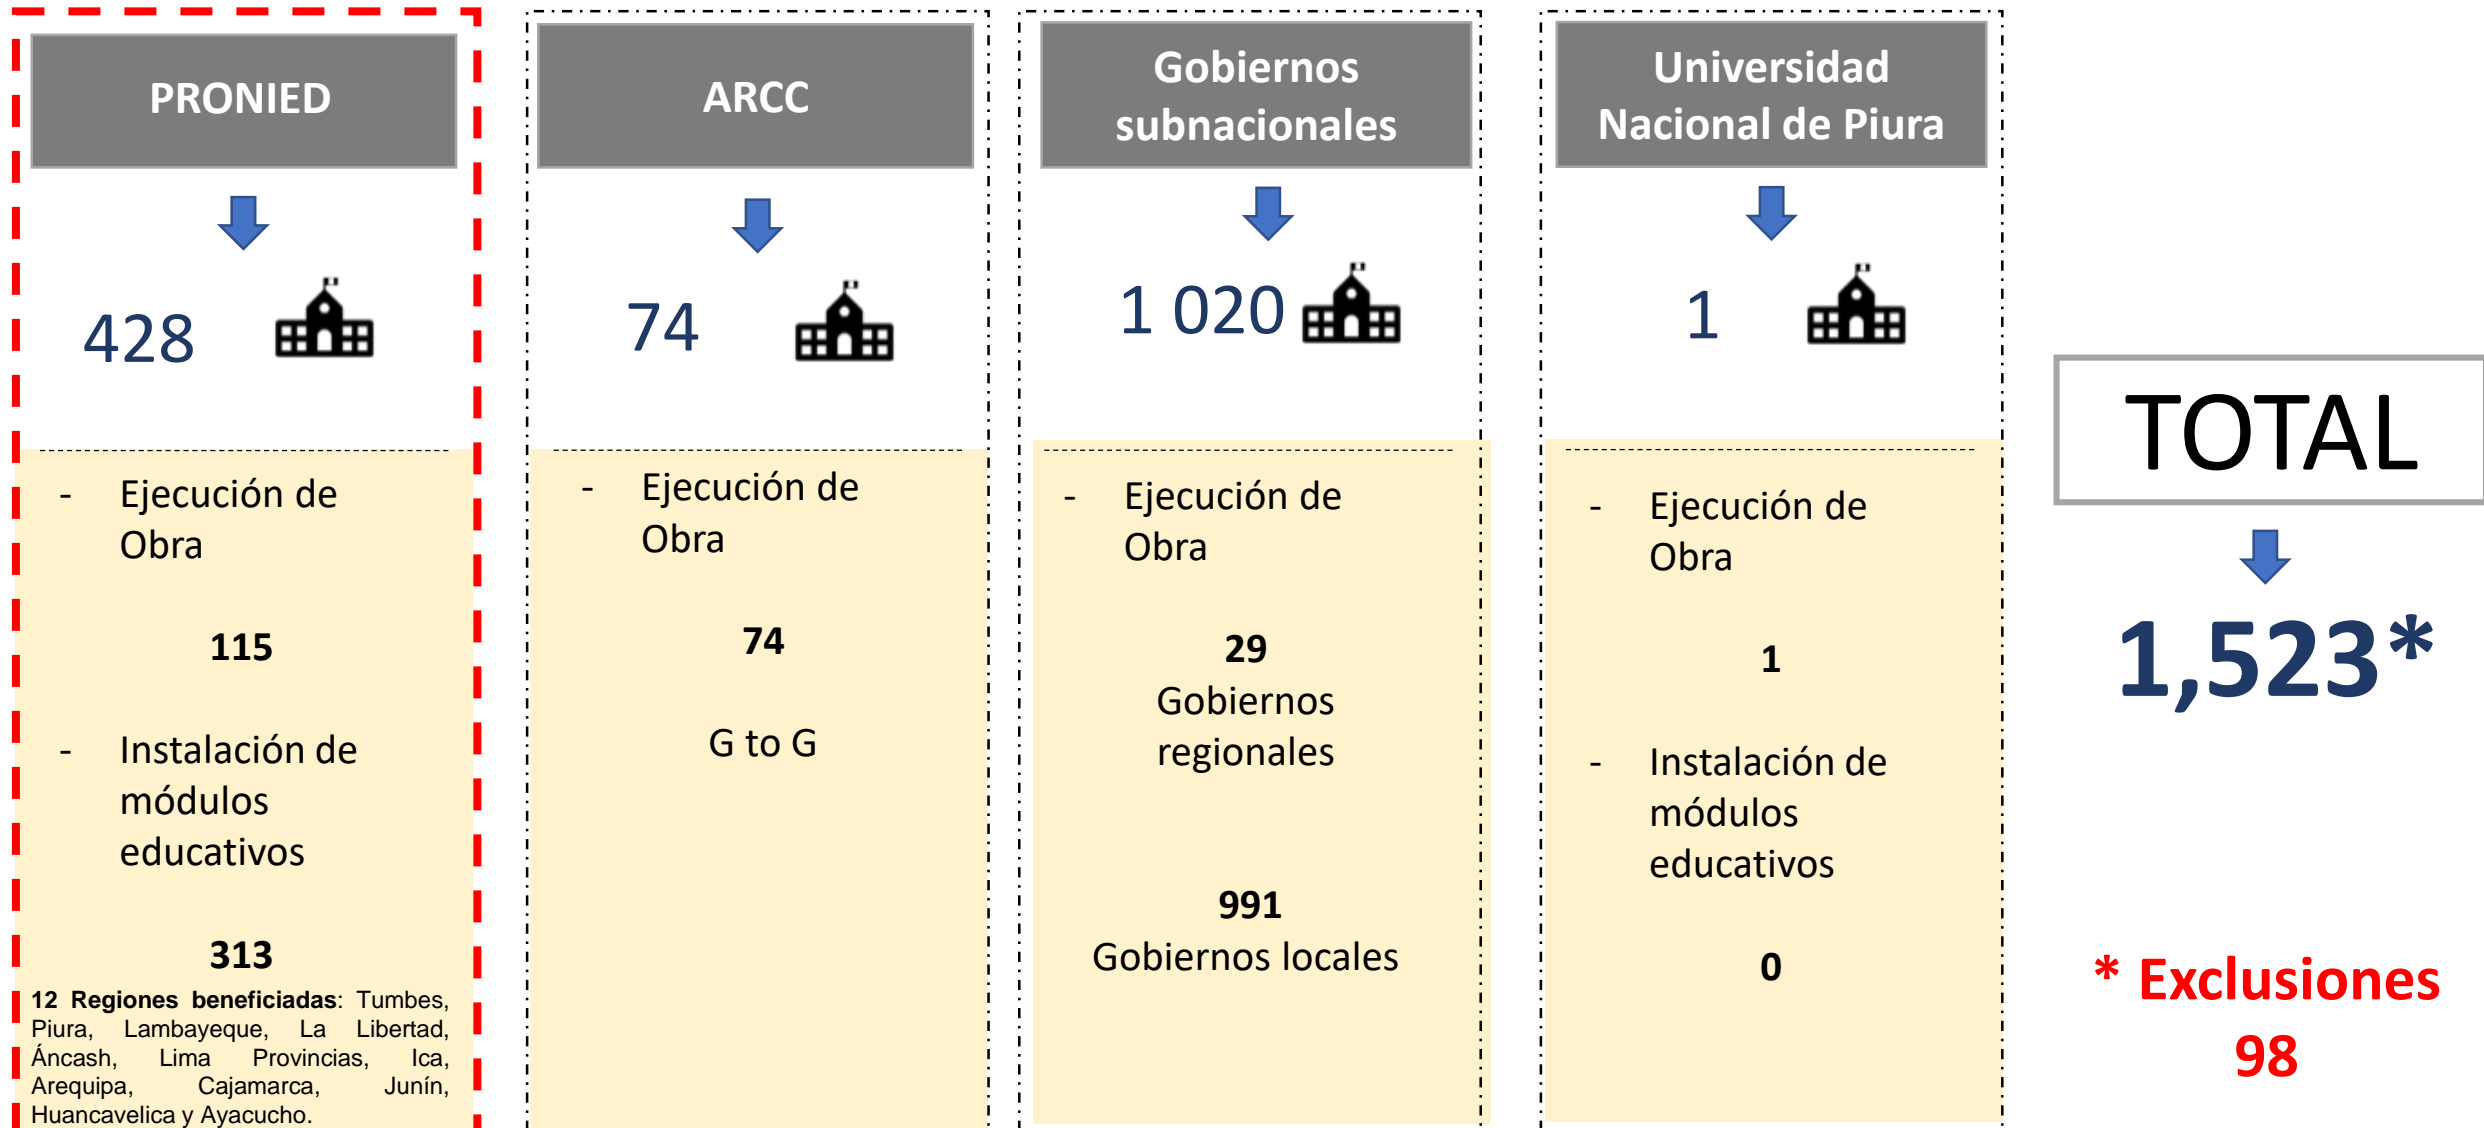


Módulos básicos de reconstrucción - MBR

N°	ESTADO SITUACIONAL	CANTIDAD DE I.E.
1	Obra culminada	2
2	En Ejecución (Exp. Tec. + Obra)	10
3	Con contrato resuelto	1
4	Actos previos a la convocatoria	2
1	Con Buena Pro	4
2	Intervención convocada	11
3	Expresión de interés	34
4	EIB en proceso de conformidad	9
5	EIB en etapa de revisión	26
6	EIB en proceso de formulación	16
TOTAL		115


Culminadas en el 2021

2




Proyectadas a culminar en el primer semestre del 2022

16




Proyectadas a culminar en el segundo semestre del 2022

58



Proyectadas a culminar en el primer trimestre del 2023

39




Módulos educativos - ME

ESTADO SITUACIONAL	AULA	BAÑO	CERCO	PARARRAYO	MOBILIARIO	LOSA
META FISICA 2018-2023	272	221	274	104	286	243
Culminados /atendidos	234	44	70	85	238	
En Ejecución			1			
Con Financiamiento Ley Ppto 2022	31	93	15	11	29	
Por iniciar obra		27	2			
En Elab. Exp. Tec.		13	1	8		
Entrega de terreno		8				
Falta desarrollar "El Otro Estudio para Determinar VR"	7	26	172		19	243
Actos preparatorios		5	8			
En proceso de selección		5	3			
En tramite de firma de Contrato			2			
No requiere	41	92	39	209	27	70
TOTAL	313	313	313	313	313	313

Culminados en el 2019- 2021:

234 Aulas
44 Baños
70 Cercos
85 Pararrayos
238 Mobiliario



Proyectadas a culminar en el año 2022: Total 253

58 baños y 16 Cercos (continuidad)
31 aulas
93 baños
15 cercos
11 pararrayos
29 mobiliarios



Proyectadas a culminar en el año 2023: Total 274 IIE

07 aulas
08 pararrayos
26 Baños
19 Mobiliarios
172 cercos perimétricos
243 Losas de recreación

Problemática en la ejecución de las intervenciones 2020-2021

A lo largo del 2021, la UGRD – PRONIED recibió el financiamiento para ejecutar las 15 obras por módulos básicos de reconstrucción, quedando pendiente el financiamiento por parte de la ARCC para las 100 intervenciones restantes el 2022.



Limitados recursos para el fortalecimiento de capacidades, contrato administrativo de servicios y órdenes de servicio:

Falta de recursos para el Fortalecimiento de Capacidades y la prohibición de la contratación de personal CAS y OS no permitieron la correcta ejecución de las intervenciones a cargo de la UGRD-PRONIED en el 2021.



Pandemia por COVID-19:



Debido a las medidas de contención del COVID-19 se estableció periodos de cuarentena y trabajo remoto lo que perjudico el desenvolvimiento de las actividades de la dirección y ralentizo la contratación de consultores.






Ley de Presupuesto N° 31084 no estipuló la continuidad de las inversiones para el año 2021, situación que retrasó el inicio de los proyectos.



Estado situacional, proyección de culminación, ejecución física y financiera de las intervenciones a cargo de PRONIED

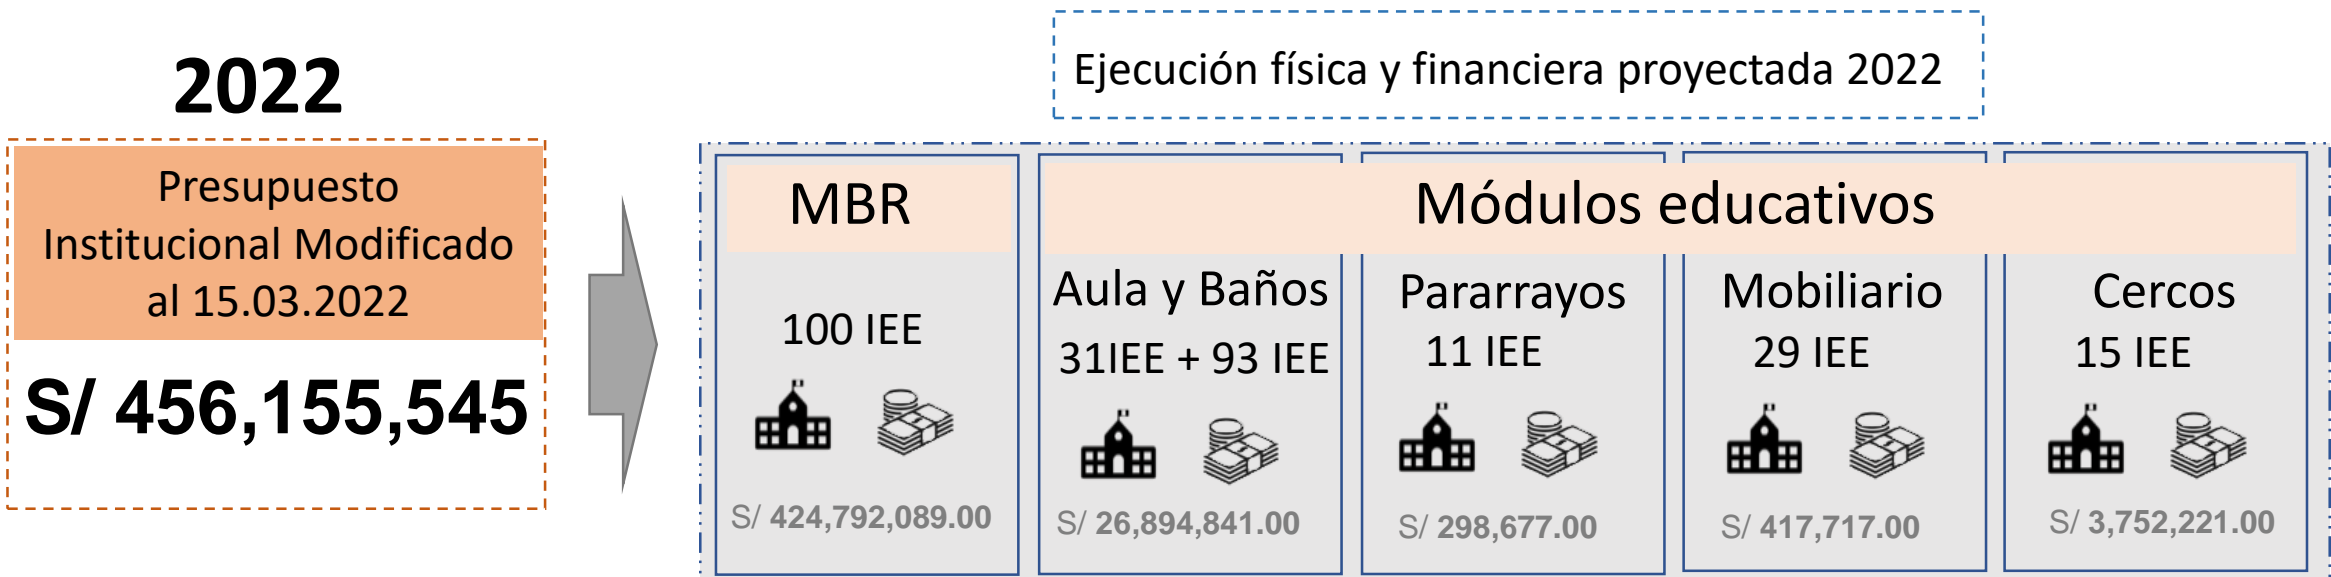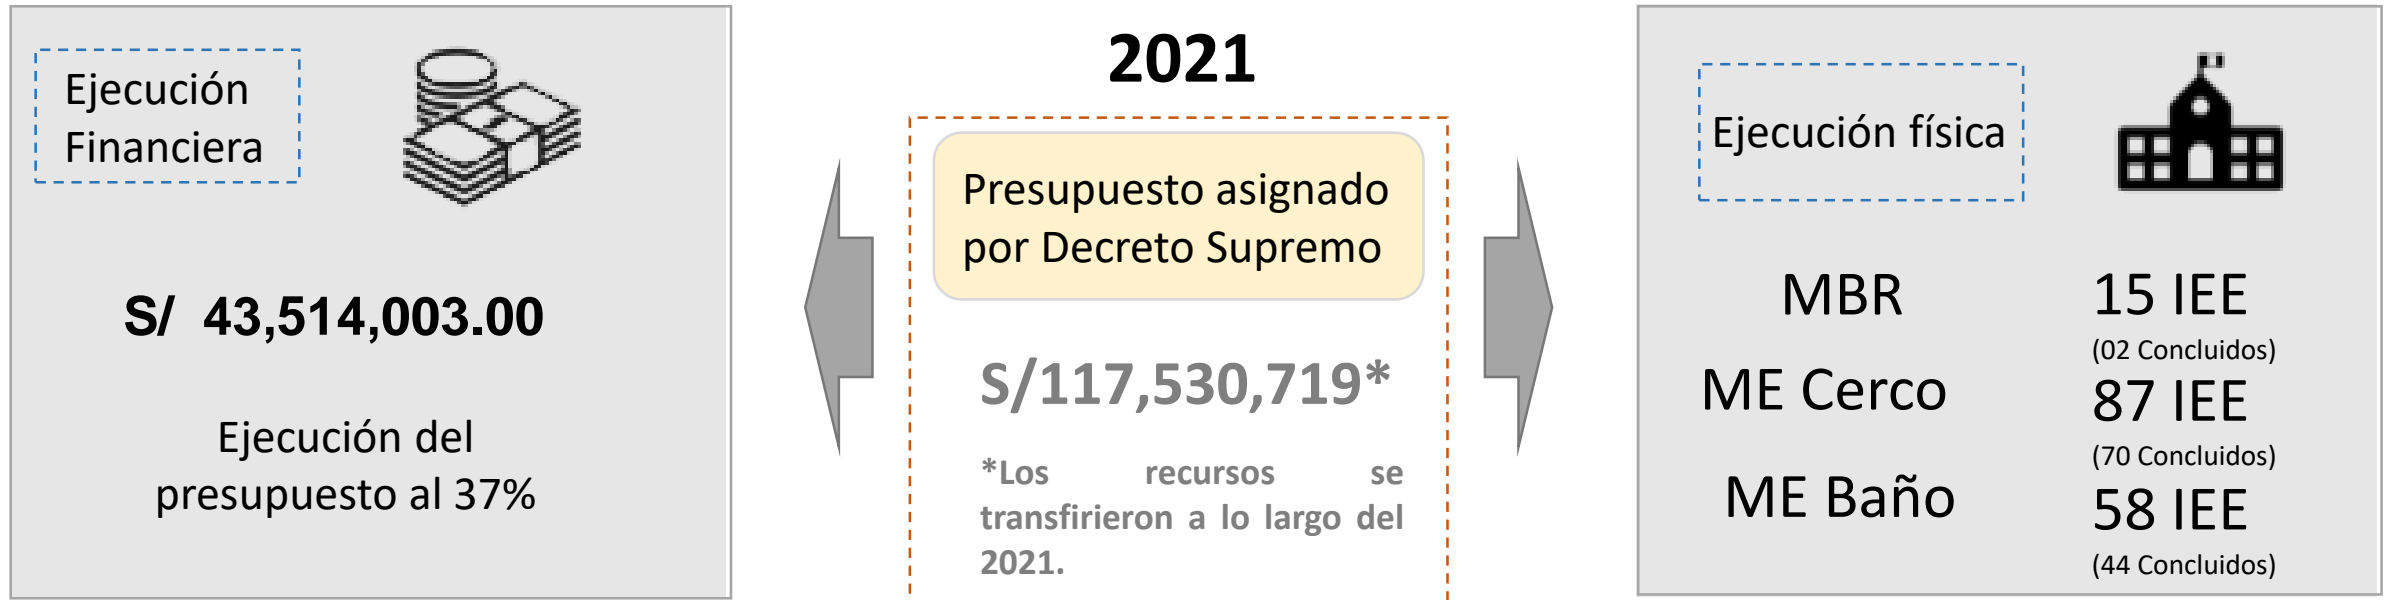

Propuestas o alternativas planteadas para mejorar la eficiencia y eficacia en las intervenciones a cargo de PRONIED en la reconstrucción de infraestructura afectada el 2022

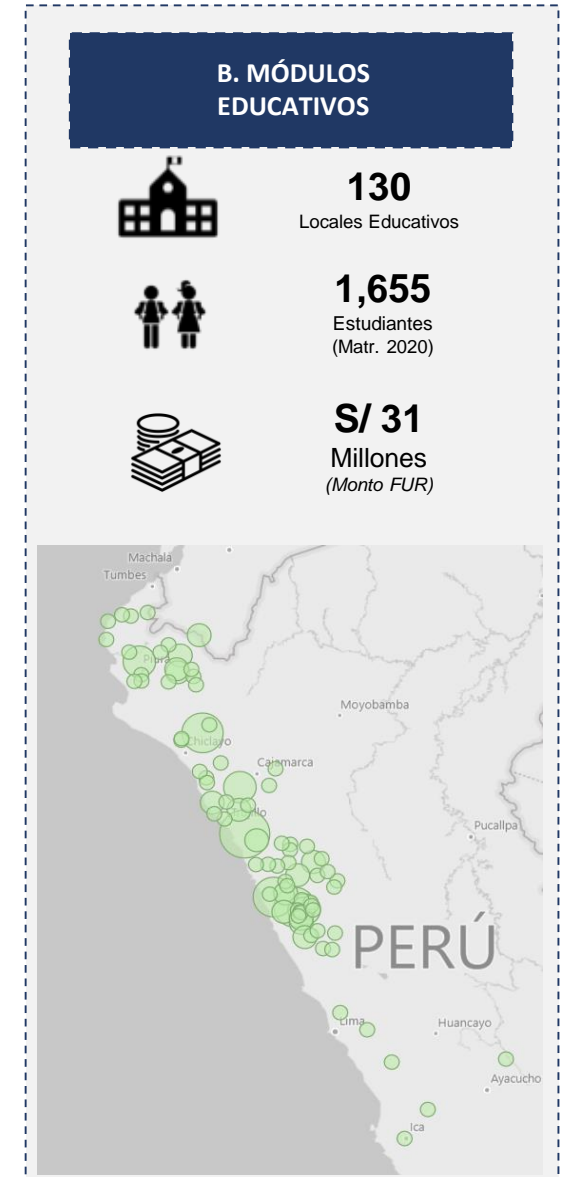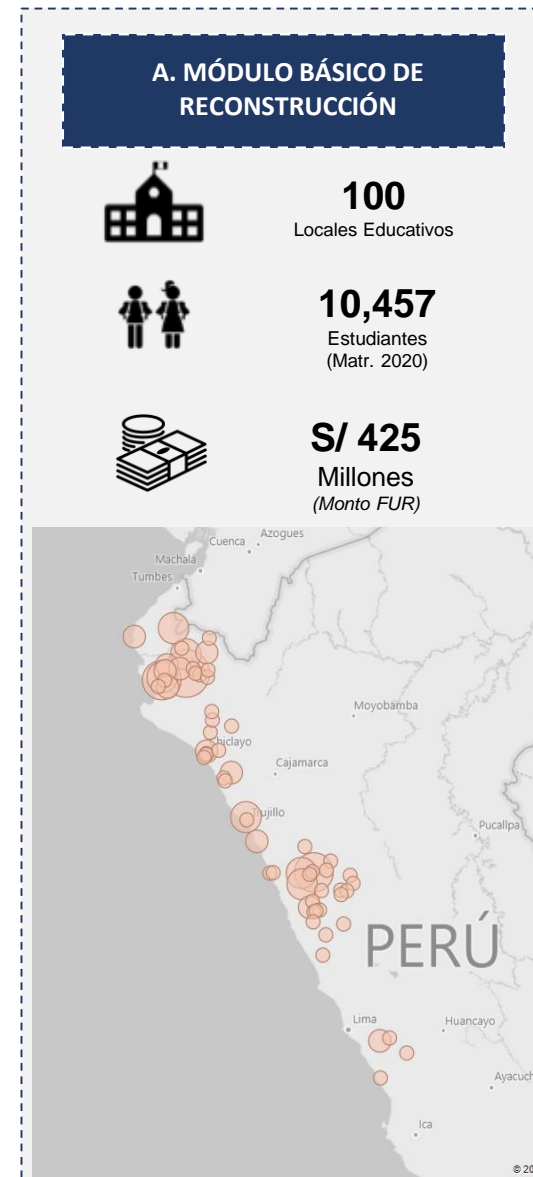

* Monto asignado al PRONIED – MINEDU en el Proyecto de la Ley de Presupuesto para el 2022.

Propuestas o alternativas planteadas para mejorar la eficiencia y eficacia en las intervenciones a cargo de PRONIED en la reconstrucción de infraestructura afectada el 2022

Propuesta legislativa

Que autoriza al Ministerio de Educación a efectuar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático durante el Año Fiscal 2022, y únicamente entre Intervenciones de Reconstrucción mediante Inversiones (IRI), con cargo a los saldos disponibles a consecuencia de la proyección al cierre del Año Fiscal 2022 de los créditos presupuestarios aprobados del FONDES.

Objeto: La aprobación de este proyecto normativo permitirá que el MINEDU pueda realizar las modificaciones presupuestales, de tal manera que los recursos de un proyecto, provenientes del FONDES, que no puedan ser ejecutado en su totalidad el año 2022, se traslade a otro proyecto que lo requiera.

Conclusiones y recomendaciones

1. En 2021:
 - ✓ En MBR se han aprobado 12 expedientes técnicos de obra y 3 se encuentran en proceso de aprobación, asimismo, se han iniciado la ejecución de 10 obras, de las cuales 2 se culminaron.
 - ✓ En ME componente cerco perimétrico, a la fecha, se logró una ejecución física de 64 intervenciones y en ME componente SSHH se logró la suscripción de 50 contratos y 8 se encuentran próximos a suscribir.
2. Respecto de los 15 MBR (continuidad 2021), 02 culminados, 7 culminarán en primer semestre 2022 y 6 en el segundo; mientras que los 100 MBR contemplados en la ley de presupuesto 2022, 9 culminarán en el primer semestre 2022, 52 en el segundo y 39 en el primero del 2023.
3. Respecto de los 313 ME, 50 culminarán en primer semestre 2022; 163 en segundo semestre 2022 y 100 en primer semestre 2023.
4. Se recomienda asignar recursos para el fortalecimiento de capacidades hacia las unidades ejecutoras pertenecientes al marco de la Ley de Reconstrucción, Ley N° 30556 a fin de dar cumplimiento a las metas establecidas.

PRONIED - UGRD

Unidad Gerencial de Reconstrucción frente a Desastres

