



Programación de Inversiones en Tacna 2024

27 de febrero de 2024



Templo Burgos



Ferrocarril Tacna



Lago Yarinacocho



Casa de la Capitulación



Lamas barrio Kechwa


Objetivo de Plan COPESCO Nacional y Brecha de Infraestructura Turística

Objetivo de Plan COPESCO Nacional¹

Ejecutar proyectos de inversión pública para el **acondicionamiento turístico** en coordinación con sectores de Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales e instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales.

Brecha de infraestructura turística²

1,392 recursos turísticos priorizados, de los cuales se han intervenido en **38**, que representa el **2.73%**.



¹ RM 265-2015-MINCETUR (28.09.2015) que aprueba el Manual de Operaciones de PCN.

² RM N° 061-2023-MINCETUR (24.02.2023) que aprueba la Programación Multianual de Inversiones del Sector Comercio Exterior y Turismo.

Componentes de Intervención



Articulación con las Políticas Públicas

| | | | | |
|--|--|---|---|--|
| 1. POLÍTICAS DE ESTADO | Acuerdo Nacional ³ | 3ER OBJETIVO ➤ Competitividad del país  | Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050 ⁴ | OBJETIVO NACIONAL: ➤ Elevar los niveles de competitividad y productividad con empleo decente y en base al provechamiento sostenible de los recursos. El capital humano, el uso intensivo de la ciencia y tecnología, y la transformación digital del país. |
| 2. POLÍTICA GENERAL DE GOBIERNO | Política General del Gobierno 2021-2026 ⁵ | PGG EJE 4: ➤ Reactivación económica.  | | PPG 4.5: ➤ Implementar medidas, con énfasis , turismo, cultura, ambiente.  |
| 3. POLÍTICA SECTORIAL | PENTUR 2025 ⁶ | PILAR 2: ➤ Diversificación y consolidación de la oferta.  | COMPONENTE 2.3 ➤ Inversión focalizada y sostenible. | LÍNEA DE ACCIÓN 2.3.1: ➤ Identificación y priorización de necesidades de inversión en destinos y productos especializados y prioritarios. |
| | Estrategia Nacional de Reactivación del Sector Turismo 2022-2025 ⁷ | OBJETIVO ESPECÍFICO 3: ➤ Fortalecer e impulsar la oferta de productos y experiencias turísticas en base a escenarios de reactivación. | LÍNEA DE ACCIÓN 3: ➤ Impulsar el incremento del gasto público en turismo. | LÍNEA DE ACCIÓN A: ➤ Promover la ejecución de proyectos de inversión pública. |

INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA PÚBLICA

- **1,392 Recursos turísticos priorizados a nivel nacional.**
- **Brecha actual de Infraestructura Turística: 97.27%**

³ 35 Políticas de estado del acuerdo nacional (feb-2019)

⁴ Actualizado mediante D.S. N° 103-2023-PCM (14.09.2023)

⁵ D.S. N° 042-2023-PCM (25.03.2023)

⁶ RM N° 231-2016-MINCETUR (23.07.2016)

⁷ R.M. N° 138-2022-MINCETUR (16.05.2022)

Criterios de priorización del sector⁸

CRITERIOS

GENERALES

1. Criterio de cierre de brechas

- Prioriza las inversiones que intervendrán en alguno de los 1,392 recursos turísticos.



2. Criterio de alineamiento al planeamiento estratégico

- Prioriza las inversiones en función a su vinculación con los Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales y con la Política General de Gobierno.



CRITERIOS

SECTORIALES

3. Criterio de actualización de la ficha del recurso turístico

- Priorizar la información contenida en las fichas de registro de los recursos turísticos, deben ser revisados y actualizados no mayor a un periodo de 03 años de vigencia.



4. Criterio de Jerarquía del recurso turístico

- Prioriza las inversiones a los recursos turísticos tangibles, cuyas categorías corresponden:

- 1) Sitios naturales.
- 2) Manifestaciones culturales.
- 3) Realizaciones científicas, técnicas o artísticas contemporáneas.



5. Criterio de zona de desarrollo turístico

- Prioriza las inversiones de aquellas áreas que poseen una oferta turística (atractivos, corredores, rutas, circuitos, productos, destinos, plantas y servicios turísticos complementarios).

6. Destino Turístico priorizado

- Prioriza las inversiones cuyo ámbito geográfico de intervención se ubique en alguno de los 58 destinos turísticos priorizados por el sector.



⁸ RM N° 61-2023-MINCETUR (24.02.2023)

Evaluación de Inversiones en Turismo

Gobiernos Regionales y Municipalidades


- Solicitudes de financiamiento vinculados a:
- Idea de proyecto o IOARR
 - Estudios de Preinversión
 - Expediente Técnico



Criterios de priorización del sector
RM N°61-2023-MINCETUR

1 DGET

CRITERIOS ESPECÍFICOS (CIERRE DE BRECHA)

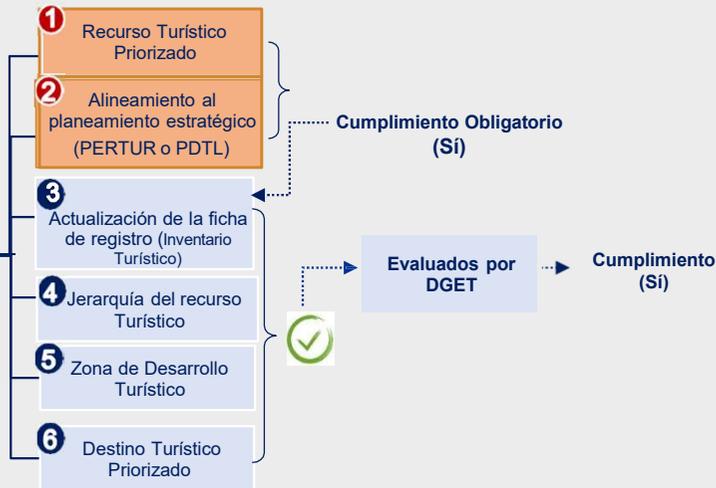

2 PLAN COPESCO NACIONAL

EVALUACIÓN TÉCNICA DE INVERSIÓN

- Recurso Turístico Priorizado cierre de Brecha
- Evaluación del Planteamiento técnico sobre activo estratégicos aprobados por el sector (Idea/ Perfil y/o Exp.Tec)
- Existencia de duplicidad de intervenciones en el Banco de Inversiones
- Evaluación de los indicadores económicos sociales
- Saneamiento físico legal y/o Arreglos Institucionales

Cumplimiento (Sí / No)

3 OPMI MINCETUR (*)

EVALUACIÓN TÉCNICA (CUMPLIMIENTO DE CIERRE DE BRECHA Y PLANTEAMIENTO TÉCNICO)

- Evaluación del Recurso Turístico Priorizado contribuya al cierre de brecha
- Evaluación de la concepción técnica de la inversión y/o idea de proyecto (este bajo la función turismo)
- Revisión de la evaluación técnica de DGET y Plan COPESCO Nacional


Si cumple, se considera en la programación de inversiones de PLAN COPESCO NACIONAL

DGET: Dirección General de Estrategia Turística
OPMI: Oficina de Programación Multianual de Inversiones

(*) Artículo 10 del D.L N° 1252: Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversión, aprobado D.S N°284-2018-EF/63.01, y rectificado D.S. 74-2023-EF/63.01.

Presupuesto PCN (2019 – 2024)

Todo Gasto - en Millones de Soles(*)

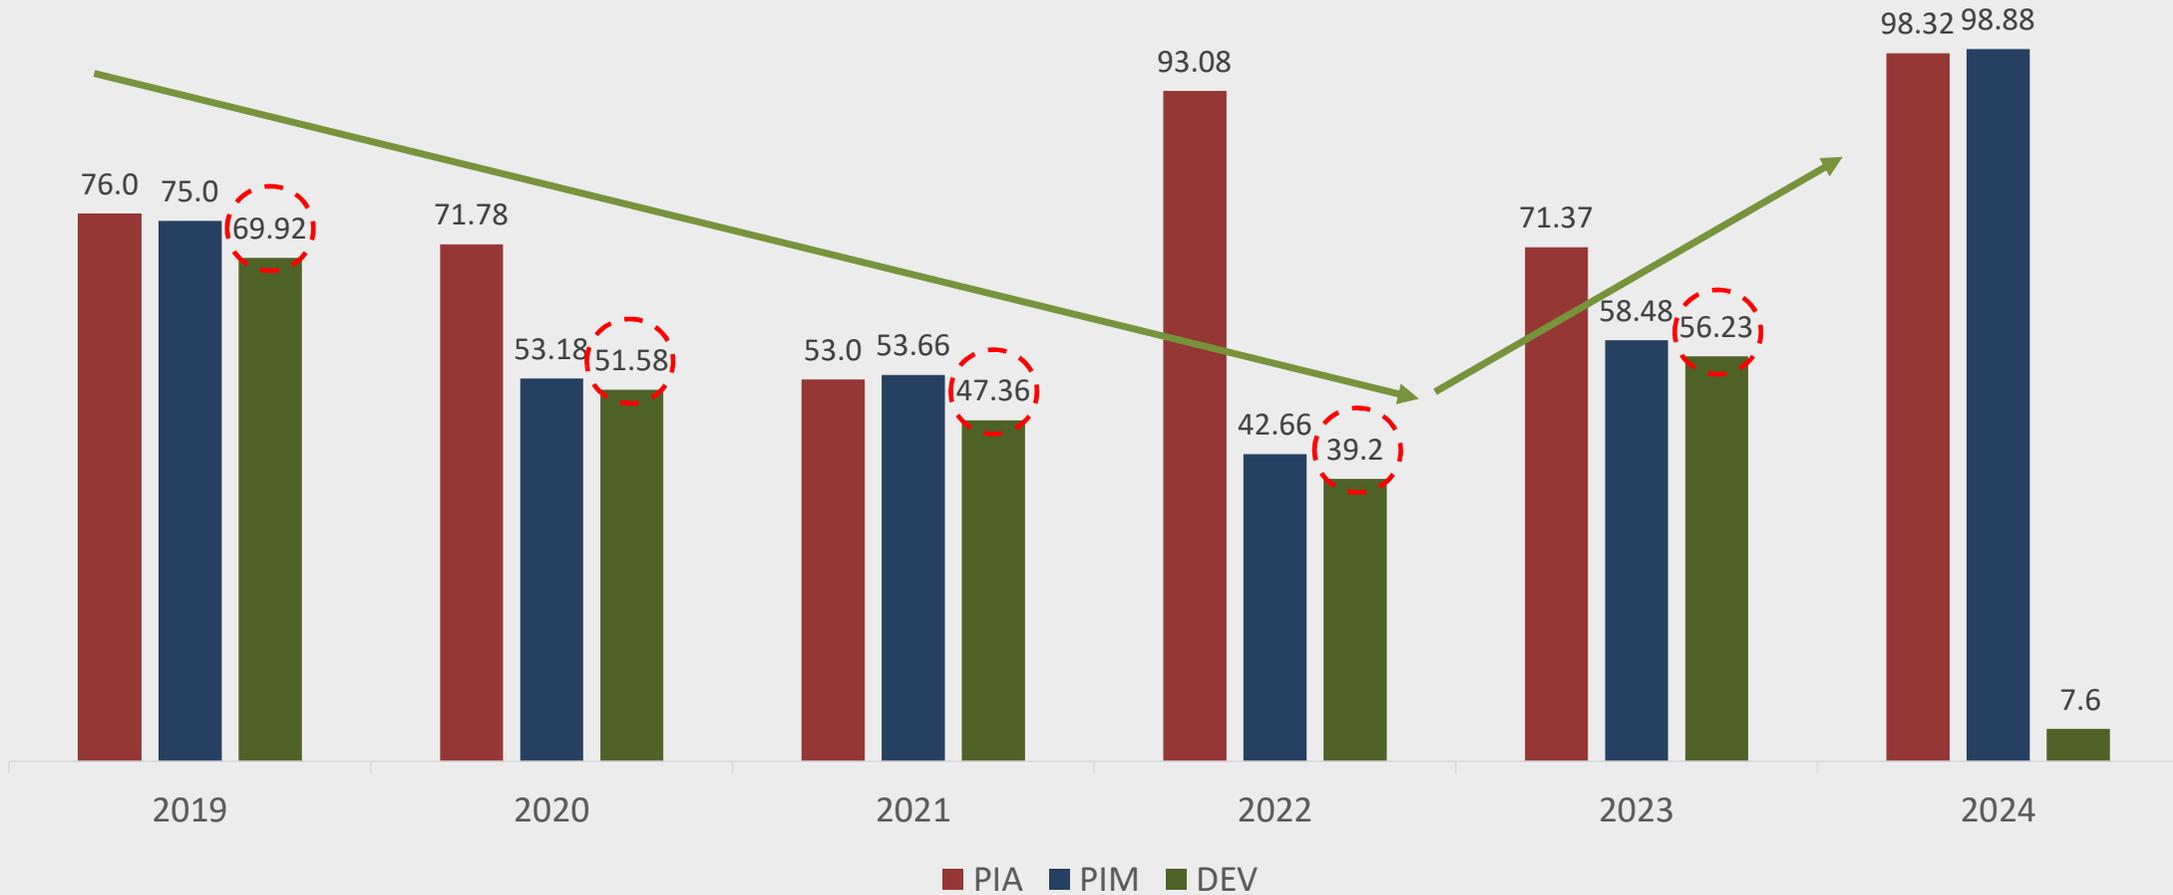


(*) Ejecución Consulta Amigable al 26.02.2024

OBRAS CULMINADAS EN 2023

En el 2023 el presupuesto total fue de S/ **58,483,062** con un nivel de ejecución de un **96.2%**

| # | CUI | REGIÓN | INVERSIÓN | Monto de Inversión S/ | Fecha Culminado | |
|--------------|---------|-------------------|---|-----------------------|-----------------------|------------------|
| 1 | 2189844 | Ayacucho | Casa de la Capitulación Quinua (Museografía) | 25.5 M | Marzo 2023 | CULMINADO |
| 2 | 2135288 | San Martín | Laguna Sauce (Sector Sauce) | 26.3 M | Marzo 2023 | CULMINADO |
| 3 | 2197828 | | Localidad de Lamas y el Barrio Kechwa | 24.7 M | Abril 2023 | CULMINADO |
| 4 | 2257728 | Tacna | Ferrocarril Tacna Arica (Museografía) | 20.4 M | Mayo 2023 | CULMINADO |
| 5 | 2345258 | Amazonas | Localidad de Tingo (Accesos) | 14.6 M | Agosto 2023 | CULMINADO |
| 6 | 2134075 | Ucayali | Acondicionamiento Turístico de Lago Yarinacocha | 144.4 M | Diciembre 2023 | CULMINADO |
| 7 | 2307454 | Cajamarca | Complejo Turístico Baños del Inca (Saldo de Obra) | 29.5 M | Octubre 2023 | CULMINADO |
| 8 | 2300618 | Junín | Santuario Señor de Muruhuay (Infraestructura) | 11.7 M | Diciembre 2023 | CULMINADO |
| TOTAL | | | | 297.1 M | | |

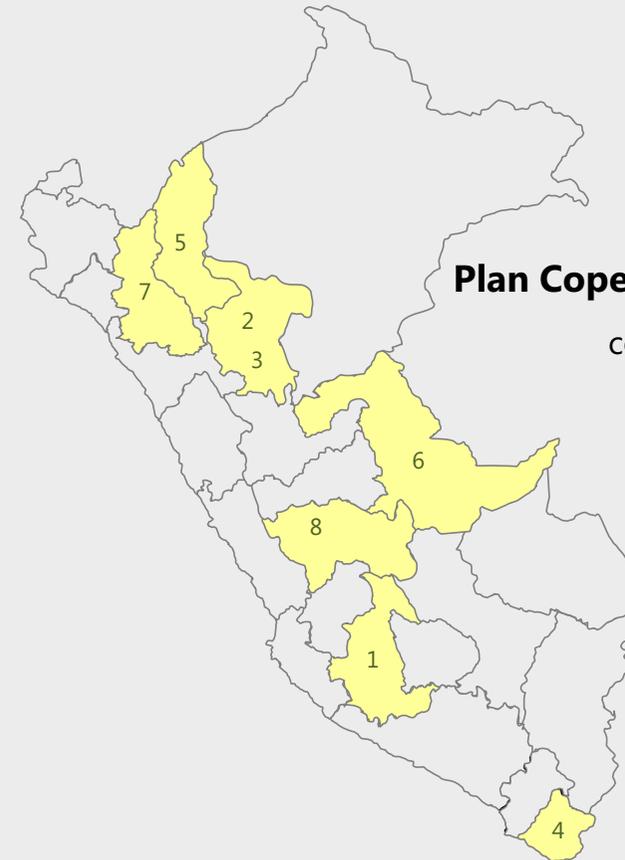

Plan Copesco Nacional Intervino

con el destrabe de

8 OBRAS

por un Monto de inversión total de

S/ 297,1 M

PRESUPUESTO 2024(*)

S/ 98,8 millones

| Concepto | Tesoro | Fondo | TOTAL |
|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Inversiones | 63,291,797 | 22,335,081 | 86,185,342 |
| Expedientes Técnicos | 10,771,409 | - | 10,771,409 |
| Obras | 53,078,852 | (**) 22,335,081 | 75,413,933 |
| Gestión Institucional | 12,692,308 | - | 12,692,308 |
| Total | 75,984,105 | 22,335,081 | 98,877,650 |

(*) PIM según Consulta amigable 26.02.2024

(**) Recursos provenientes del Fondo de Promoción y Desarrollo Turístico S/ 22,335,081: Quinta Presa S/ 12,177,581; Malecón Grau Pacasmayo S/ 4,434,632; Embarcadero Llachón S/ 3,988,035; Cañón del Colca Cabanaconde S/ 1,180,214; Líneas Nazca S/ 554,619.



PERÚ

Ministerio
de Comercio Exterior
y Turismo

PRESUPUESTO 2024 EXPEDIENTES TÉCNICOS



| N° | REGIÓN | N° DE INVERSIONES POR REGIÓN | PIM 2024 (*) S/ | FONDO S/ |
|-----------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|------------------|
| 1 | <u>Ayacucho</u> | 1 | 466,600 | - |
| 2 | <u>Amazonas</u> | 2 | 967,976 | - |
| 3 | <u>Ancash</u> | 3 | - | 578,306 |
| 4 | <u>Arequipa</u> | 3 | 709,250 | - |
| 5 | <u>Cajamarca</u> | 3 | - | 312,623 |
| 6 | <u>Cusco</u> | 4 | 644,801 | 300,000 |
| 7 | <u>Huánuco</u> | 2 | -- | 83,017 |
| 8 | <u>Ica</u> | 2 | 551,226 | - |
| 9 | <u>Junín</u> | 1 | 411,303 | - |
| 10 | <u>La Libertad</u> | 2 | 2,002,052 | - |
| 11 | <u>Lambayeque</u> | 1 | 276,700 | 198,878 |
| 12 | <u>Lima</u> | 6 | 1,908,863 | 213,000 |
| 13 | <u>Loreto</u> | 2 | 558,464 | 360,000 |
| 14 | <u>Moquegua</u> | 1 | - | 300,000 |
| 15 | <u>Madre de Dios</u> | 1 | - | 320,000 |
| 16 | <u>Puno</u> | 2 | 1,036,892 | - |
| 17 | <u>Piura</u> | 1 | 565,000 | - |
| 18 | <u>Tumbes</u> | 1 | 672,282 | - |
| TOTAL EXPEDIENTES TÉCNICOS | | 38(*) | 10,771,409 | 2,665,824 |
| | | | S/ 13,437,233 | |

(*) Plan COPESCO Nacional cuenta con un total de 27 expedientes técnicos, de las cuales 4 inversiones IOAAR no cuentan con presupuesto de las cuales son : Líneas de Nasca , Cueva de las Lechuzas , Cuarto del Rescate, Laguna 69 y 11 inversiones que serán financiadas con la Ley N° 27889 y modificatorias "Ley del Fondo de Promoción y Desarrollo Turístico" con un total 2,665,824 haciendo un total de 38 expediente técnico en 18 regiones

EXPEDIENTES TÉCNICOS A CULMINAR 2024 Y CONTINUIDAD

| N° | REGION | CUI | INVERSIÓN | MONTO DE INVERSIÓN (S/ MILLONES) | PIM 2024(*) (S/ MILLONES) | APROBACIÓN DEL ET |
|-----------------------------------|--------------------|---------|--|----------------------------------|---------------------------|-------------------|
| 1 | Cajamarca | 2598112 | Cuarto del Rescate | 1.1 | - | Feb - 20224 |
| 2 | Puno | 2133719 | Embarcadero Llachón | 12.9 | 0.1 | Feb - 2024 |
| 3 | | 2411305 | Embarcadero de Puno | 21.9 | 0.8 | Set - 2024 |
| 4 | Loreto | 2170742 | Cite Maynas | 6.4 | 0.5 | Mar - 2024 |
| 5 | La Libertad | 2490023 | Malecón Grau - Pacasmayo | 31.5 | 0.5 | Mar - 2024 |
| 6 | | 2571631 | Islas de Guañape | 21.9 | 1.5 | Abr - 2025 |
| 7 | Amazonas | 2150108 | Catarata Gocta | 7.5 | 0.4 | Abr - 2024 |
| 8 | | 2250898 | Pueblo Alfarero de Huancas | 22.3 | 0.5 | Ago - 2025 |
| 9 | Arequipa | 2411306 | Castillo Forga | 8.4 | 0.3 | Abr - 2024 |
| 10 | Ica | 2507809 | Muelle Pisco | 37.3 | 0.5 | Jun - 2024 |
| 11 | Junín | 2325549 | Zona Monumental de Jauja (Plazas) | 6.2 | 0.4 | Jul - 2024 |
| 12 | Tumbes | 2201328 | Manglares de Tumbes | 13.1 | 0.6 | Set - 2024 |
| 12 | Lambayeque | 2150106 | Huaca Rajada (Centro Poblado Huaca Rajada) | 0.7 | 0.2 | Oct - 2024 |
| 14 | Cusco | 2382467 | Ruta 1 Y 2 - Caminos Inca (Museografía) | 43.7 | 0.07 | Oct - 2024 |
| 15 | | 2470933 | Inkaraqay (Andenes Orientales) | 3.2 | 0.2 | Set -2025 |
| 16 | Piura | 2571910 | Playa Cabo Blanco | 9.2 | 0.5 | Abril - 2025 |
| 17 | Lima | 2304659 | Quinta Presa (Infraestructura) | 22.2 | 0.6 | Feb - 2024 |
| 18 | | 2474823 | Zona Monumental del Rímac | 54.2 | 1.3 | Dic - 2025 |
| TOTAL EXPEDIENTES TÉCNICOS | | | | 322.6 | 8.97 | |

(*) PIM según Consulta amigable 26.02.2024



PERÚ

Ministerio
de Comercio Exterior
y Turismo

PRESUPUESTO 2024 OBRAS



| N° | REGIÓN | N° DE OBRAS POR REGIÓN | PIM 2024 (*) S/ |
|--------------------------------------|---|---------------------------|--------------------|
| 1 | <u>Ayacucho</u> | 1 | 2,598,145 |
| 2 | <u>Amazonas</u> | 3 | 6,359,053 |
| 3 | <u>Arequipa</u> | 2 | 4,861,073 |
| 4 | <u>Ancash</u> | 1 | 2,771,897 |
| 5 | <u>Cusco</u> | 3 | 5,731,163 |
| 6 | <u>Huánuco</u> | 1 | 258,224 |
| 7 | <u>Ica</u> | 1 | 554,619 |
| 8 | <u>Junín</u> | 1 | 3,143,190 |
| 9 | <u>Lambayeque</u> | 1 | 9,119,513 |
| 10 | <u>La Libertad</u> | 3 | 17,148,582 |
| 11 | <u>Lima</u> | 1 | 12,177,581 |
| 12 | <u>Puno</u> | 1 | 9,669,690 |
| TOTAL, OBRAS EN EJECUCIÓN | | 19 | 74,392,730 |
| - | Obras en liquidación, arbitraje, seguimiento | 14 | 1,021,203 |
| TOTAL OBRAS | | 33 | 75,413,933 |

(*) PIM según Consulta amigable 26.02.2024

OBRAS A CULMINAR 2024

| N° | REGIÓN | CUI | DESCRIPCIÓN(*) | MONTO DE INVERSIÓN (S/ MILLONES) | PIM 2024(**) (S/ MILLONES) | |
|--------------------|-------------|---------|---|----------------------------------|----------------------------|----------|
| 1 | Ancash | 2272652 | Campo Santo Yungay | 25.6 | 2.7 | Feb-2024 |
| 2 | Amazonas | 2345258 | Localidad de Tingo (Iglesia Matriz) | 7.5 | 0.9 | Mar-2024 |
| 3 | La Libertad | 2411303 | NIK AN Chan Chan | 13.8 | 7.2 | May-2024 |
| 4 | Ayacucho | 2189844 | Pueblo de Quinua (Redes de Media Tensión) | 2.6 | 2.5 | May-2024 |
| 5 | Junín | 2325549 | 1.Zona Monumental Jauja | 7.6 | 2.9 | Feb-2024 |
| | | | • Centro de Interpretación - Infraestructura (S/ 6.9 M) | | | Ago-2024 |
| | | 2300618 | 2.Santuario Señor de Muruhuay | 0.8 | 0.1 | Ago-2024 |
| | | | • Museografía (S/ 0.7 M) | | | |
| | | | • Museografía (S/ 0.8M) | | | |
| 8 | Arequipa | 2235746 | Valle del Colca - Chivay (Restauración del templo Chivay) | 6.0 | 3.8 | Ago-2024 |
| 9 | Ayacucho | 2116978 | Cite Quinua | 7.6 | 0.4 | Set-2024 |
| 10 | Lambayeque | 2150106 | Huaca Rajada - Centro Poblado de Sipán | 9.6 | 9.1 | Ago-2024 |
| 11 | Cusco | 2573436 | Llaqta | 8.8 | 5.7 | Set-2024 |
| | | | 1. Video vigilancia (S/ 2.36 M) | | | Set-2024 |
| | | | 2. Señalización (S/0.79 M) | | | Dic-2024 |
| | | | 3. Senderos (S/4.7 M) | | | |
| TOTAL OBRAS | | | | 89.9 | 35.3 | |

(*) Se incorporarán 3 inversiones IOAAR que culminarán en el 2024 con las siguientes fechas fin de obra ;**Cueva de Lechuzas** en julio 2024; **Cuarto de Rescate** en junio 2024; **Líneas y Geoglifos de Nasca** en diciembre 2024 ; Con un PPTO total de S/ 812,843 y un proyecto de inversión **Plaza Mayor Chachapoyas** y **la Plazuela** con inicio de ejecución en mayo 2024 con un PPO 1,757,067

(**) PIM según Consulta amigable 26.02.2024



PERÚ

Ministerio
de Comercio Exterior
y Turismo



INVERSIONES EN TACNA



27 de febrero de 2024



MACRO REGIÓN SUR DEL PERÚ

AGRUPA LOS DEPARTAMENTOS DE:

1. Moquegua
2. Arequipa
3. Cusco
4. Puno
5. Madre de Dios
6. Tacna



Plan Copesco Nacional intervine en **6** regiones de la Macro Región Sur

Por un monto de inversión total de

S/ 155.4 M

| N° | REGIÓN | CUI | INVERSIÓN | MONTO DE INVERSIÓN (S/ MILLONES) |
|--------------|---------------|---------|---|----------------------------------|
| 1 | Moquegua | 2572343 | E.T: Punta de Coles | 21,5 M |
| 2 | Arequipa | 2411306 | ET: Castillo Forga | 8.2 M |
| | | 2235746 | Obra Valle del Colca - Chivay | 4.2 M |
| | | 2578504 | ET: IOAAR: Cañón del Colca | 1.3 M |
| 3 | Cusco | 2382467 | ET: Ruta 1 Y 2 - Caminos Inca (Museografía) | 42.9 M |
| | | 2470933 | ET: Inkaraqay (Andenes Orientales) | 22.4 M |
| | | 2573436 | ET: Llaqta - MachuPicchu | 8.6 M |
| 4 | Puno | 2133719 | ET: Embarcadero Llachón | 2.9 M |
| | | 2411305 | ET :Embarcadero de Puno | 21.4 ,M |
| 5 | Madre de Dios | 2304659 | ET: Lago Sandoval | 24.2 M |
| TOTAL | | | | 114.7 M |

| N° | REGIÓN | CUI | INVERSIÓN | MONTO DE INVERSIÓN (S/ MILLONES) |
|--------------|--------|---------|---|----------------------------------|
| 6 | Tacna | 2133719 | Obra: Museo Ferroviario Tacna-Arica | 20.3 M |
| | | 2411305 | Preinversión: Estación Ferrocarril Tacna - Arica (Sector Arica) | 20.4 M |
| TOTAL | | | | 40.7 M |

INTERVENCIONES Y POR INTERVENIR EN LA REGIÓN TACNA

1. Obra: Museo Ferroviario Tacna-Arica

Plan COPESCO Nacional en el 2023 intervino en la infraestructura, restauración, museografía y equipamiento del museo Ferroviario Tacna - Arica, con una inversión de **20,377,005**


VIDEO DE PRESENTACIÓN



2. Estación Ferrocarril Tacna – Arica (Sector Arica)

Por la cual en el año 2024-2025 se pondrá en valor la estación ferrocarril Tacna - Arica (Sector Arica) busca mejorar los servicios turísticos públicos para los visitantes de la estación del Ferrocarril Tacna Arica (Sector Arica) ya que están recibiendo inadecuados e insuficientes servicios turísticos públicos.

ESTADO ACTUAL

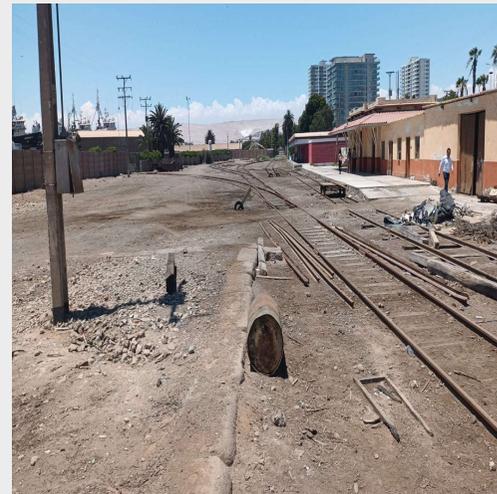

Obra: Museo Ferroviario Tacna-Arica

MONTO DE INVERSIÓN: S/ 20,377,005



OBRA CULMINADA E INAUGURADA
Mayo 2023

VIDEO INAUGURACIÓN

DESCRIPCIÓN

1. Acondicionamiento y equipamiento de 10 ambientes.
2. Infografías de modelos ferroviarios.
3. Videos documentales (incluye intérprete de lengua de señas y subtítulos en inglés).
4. Vitrinas y pedestales
5. Documentos históricos.
6. Pisos podotáctiles.
7. Paneles con sistema braille.



Estación Ferrocarril Tacna – Arica (Sector Arica)

MONTO ESTIMADA DE INVERSIÓN: S/ 20,400,000
COSTO ESTIMADO PARA LA FORMULACIÓN: S/350,000



SITUACIÓN ACTUAL

- **Recurso turístico en proceso de revisión y validación por OPMI y DGET.**
- (El Recurso Turístico como "ESTACION FERROCARRIL TACNA ARICA (SECTOR ARICA)" esta pendiente ser priorizado por el sector)
- **Modalidad de la formulación:** Por contrata
- **Tiempo de Formulación (07 meses)**
- 05 meses de Formulación
- 02 meses de gestión para aprobación de PI.
- 01 día de Aprobación del PI.

DESCRIPCIÓN PARA LA IDEA DE PROYECTO

- Mejoramiento de la Estación
- Mejoramiento de la boletería
- Mejoramiento de senderos
- Construcción de las zonas de descanso
- Implementación de paneles interpretativos tecnológicos (interactivos)
- Implementación de señalización
- Implementación de estacionamientos

| Pre inversión | | Expediente técnico | |
|---------------|----------------|--------------------|----------------|
| Fecha Inicio | Fecha Fin | Fecha Inicio | Fecha Fin |
| Mayo 2024 | Diciembre 2024 | Febrero 2025 | Diciembre 2025 |



REGIÓN AYACUCHO

| N° | DESCRIPCIÓN | PIM 2024 (*) S/ | SITUACIÓN ACTUAL |
|----|--------------------|--------------------|--|
| 1 | Cite Quinoa | 466,600 | Expediente aprobado administrativamente con Resolución Directoral - Febrero 2024 |

(*) PIM según Consulta amigable 19.02.2024



REGIÓN AMAZONAS

| N° | DESCRIPCIÓN | PIM 2024 (*) S/ | SITUACIÓN ACTUAL |
|--------------|-----------------------------------|--------------------|--|
| 1 | Catarata Gocta | 408,976 | En desarrollo de la Segunda Etapa del expediente técnico (2/3) , Se estima su aprobación en Abril 2024 |
| 2 | Pueblo Alfarero de Huancas | 559,000 | En actos previos de proceso de convocatoria para la formulación del expediente técnico |
| TOTAL | | 967,976 | |

(*) PIM según Consulta amigable 19.02.2024



REGIÓN ANCASH

| N° | DESCRIPCIÓN | FONDO S/ (*) | SITUACIÓN ACTUAL |
|--------------|---------------------------------|----------------|---|
| 1 | IOAAR: Chavín de Huántar | 168,306 | Por iniciar , se estima su inicio en julio 2024 y su culminación en marzo 2025 |
| 2 | Playa Tortugas | 410,000 | Por iniciar, se estima su inicio en junio 2024 y su culminación en octubre 2025 |
| 3 | IOAAR: Laguna 69 (**) | - | En desarrollo, se estima su inicio en culminación en Agosto 2024 |
| TOTAL | | 578,306 | |

(*) Ley N° 27889 y modificatorias “Ley del Fondo de Promoción y Desarrollo Turístico”.

(**) Se asignaran recursos para la continuidad del expediente técnico con un total de 115,760



REGIÓN AREQUIPA

| N° | DESCRIPCIÓN | PIM 2024 (*) S/ | SITUACIÓN ACTUAL |
|--------------|---------------------------------|--------------------|--|
| 1 | Castillo Forga | 373,014 | Expediente técnico en revisión de la cuarta etapa (4/5) del expediente técnico , se estima su culminación en abril 2024. |
| 2 | Valle del Colca – Chivay | 149,620 | Aprobado por Resolución Directoral , se encuentra en etapa de ejecución de la obra |
| 3 | IOAAR: Cañón del Colca | 186,616 | En proceso de perfeccionamiento de contrato para el inicio de la consultoría. |
| TOTAL | | 709,250 | |

(*) PIM según Consulta amigable 19.02.2024



REGIÓN CAJAMARCA

| N° | DESCRIPCIÓN | FONDO(*) S/ | SITUACIÓN ACTUAL |
|--------------|--------------------------------------|----------------|---|
| 1 | IOAAR: Cuarto del Rescate(**) | - | Infraestructura: En acciones pertinentes para la aprobación del expediente técnico – Febrero 2024 Museografía y Señalización: Se tiene programado el inicio del en abril 2024 con fecha de culminación agosto 2024 |
| 2 | IOAAR: Ventanillas de Otuzco | 82,623 | Financiada por el fondo, se estima su inicio en marzo 2024 y su culminación en noviembre 2024 |
| 3 | Pacopampa | 230,000 | Financiada por el fondo, se estima su inicio en marzo 2024 y su culminación en noviembre 2024 |
| TOTAL | | 312,623 | |

(*) Ley N° 27889 y modificatorias “Ley del Fondo de Promoción y Desarrollo Turístico”.

(**) Se asignaran recursos para iniciar el componente museográfico con un monto de S/ 92,220



REGIÓN CUSCO

| N° | DESCRIPCIÓN | PIM 2024 (*) S/ | SITUACIÓN ACTUAL |
|--------------|--|--------------------|---|
| 1 | Inkaraqay | 217,840 | En actos previos para la contratación del servicio de topografía para determinar las poligonales de intervención del proyecto. |
| 2 | Ruta 01 y Ruta 02 – Caminos Inka | 76,240 | En actos previos para la contratación del servicio de consultoría del componente Museográfico. |
| 3 | Llaqta - Machupicchu a) Video vigilancia b) Señalización c) Senderos | 350,721 | Videocámaras: Se viene desarrollando la segunda etapa (2/2) del estudio definitivo. Señaléticas: Se viene desarrollando la segunda etapa (2/2) del expediente técnico. Senderos: Se viene desarrollando la segunda etapa (2/2) del expediente técnico. |
| TOTAL | | 644,801 | |

(*) PIM según Consulta amigable 19.02.2024



REGIÓN HUÁNUCO

| N° | DESCRIPCIÓN | FONDO S/(*) | SITUACIÓN ACTUAL |
|--------------|--|---------------|---|
| 1 | IOAAR: Z.A Monumental de Kotosh | 83,017 | Financiada por el fondo, se estima su inicio en julio 2024 y su culminación en marzo 2025 |
| 2 | IOAAR: Cueva de las Lechuzas | - | En acciones pertinentes para la aprobación del expediente técnico – Febrero 2024 |
| TOTAL | | 83,017 | |

(*) Ley N° 27889 y modificatorias “Ley del Fondo de Promoción y Desarrollo Turístico”.



REGIÓN ICA

| N° | DESCRIPCIÓN | PIM 2024 (*) S/ | SITUACIÓN ACTUAL |
|--------------|-------------------------------|--------------------|---|
| 1 | Muelle Pisco | 551,226 | En desarrollo de la tercera etapa (3/5) del expediente técnico , se estima su culminación en junio 2024 |
| 2 | IOAAR: Líneas de Nasca | - | En acciones pertinentes para la aprobación del expediente técnico – Marzo 2024 |
| TOTAL | | 551,226 | |

(*) PIM según Consulta amigable 19.02.2024



REGIÓN JUNÍN

| N° | DESCRIPCIÓN | PIM 2024 (*) S/ | SITUACIÓN ACTUAL |
|----|--|--------------------|--|
| 1 | Zona Monumental de Jauja (Plazas) | 411,303 | En desarrollo de la segunda etapa del expediente técnico (2/4) , se estima su culminación en julio 2024 |

(*) PIM según Consulta amigable 19.02.2024



REGIÓN LA LIBERTAD

| N° | DESCRIPCIÓN | PIM 2024 (*) S/ | SITUACIÓN ACTUAL |
|--------------|---------------------------------|--------------------|---|
| 1 | Islas de Guañape | 1,500,842 | En proceso de convocatoria de la consultoría para la elaboración del expediente técnico , se tiene estimado el otorgamiento de la buena pro en marzo 2024 |
| 2 | Malecón Grau – Pacasmayo | 501,210 | En desarrollo de la quinta etapa (5/5) del expediente técnico, se estima su culminación en marzo 2024 |
| TOTAL | | 2,2002,052 | |

(*) PIM según Consulta amigable 19.02.2024



REGIÓN LAMBAYEQUE

| N° | DESCRIPCIÓN | PIM 2024 (*) S/ | FONDO(**) | SITUACIÓN ACTUAL |
|--------------|-------------------------------------|--------------------|-----------|---|
| 1 | Centro Poblado Huaca Rajada | 276,700 | - | En proceso de contratación de la consultoría para la formulación del expediente técnico, se estima su culminación en octubre 2024 |
| 2 | Santuario H. Bosque de Pómac | - | 198,878 | Financiada por el fondo, se estima su inicio en agosto 2024 y su culminación en diciembre 2024 |
| TOTAL | | 475,578 | | |

(*) PIM según Consulta amigable 19.02.2024

(**) Ley N° 27889 y modificatorias “Ley del Fondo de Promoción y Desarrollo Turístico”.



REGIÓN LIMA

| N° | DESCRIPCIÓN | PIM 2024 (*) S/ | SITUACIÓN ACTUAL |
|--------------|------------------------------|--------------------|---|
| 1 | Quinta Presa | 606,363 | En acciones pertinentes para la aprobación del expediente técnico – Febrero 2024 |
| 2 | Zona Monumental Rímac | 1,302,500 | En proceso de contratación un geógrafo para el Saneamiento Físico Legal del área de intervención del proyecto |
| TOTAL | | 1,908,863 | |

(*) PIM según Consulta amigable 19.02.2024



REGIÓN LORETO

| N° | DESCRIPCIÓN | PIM 2024 (*) S/ | FONDO(**) S/ | SITUACIÓN ACTUAL |
|--------------|---------------------------|--------------------|-----------------|--|
| 1 | Cite Maynas | 558,464 | - | En desarrollo , se estima su culminación en Marzo 2024 |
| 2 | Allpahuayo Mishana | - | 360,000 | Financiada por el fondo, se estima su continuidad en junio 2024 y su culminación en setiembre 2025 |
| TOTAL | | 918,464 | | |

(*) PIM según Consulta amigable 19.02.2024

(**) Ley N° 27889 y modificatorias “Ley del Fondo de Promoción y Desarrollo Turístico”.



REGIÓN MOQUEGUA

| N° | DESCRIPCIÓN | FONDO(*) | SITUACIÓN ACTUAL |
|----|-----------------------|----------|---|
| 1 | Punta de Coles | 300,000 | Financiada por el fondo, se estima su inicio en junio 2024 y su culminación en diciembre 2025 |

(*) Ley N° 27889 y modificatorias “Ley del Fondo de Promoción y Desarrollo Turístico”.



REGIÓN MADRE DE DIOS

| N° | DESCRIPCIÓN | FONDO(*) | SITUACIÓN ACTUAL |
|----|---------------|----------|---|
| 1 | Lago Sandoval | 320,000 | Financiada por el fondo, se estima su inicio en junio 2024 y su culminación en diciembre 2025 |

(*) Ley N° 27889 y modificatorias “Ley del Fondo de Promoción y Desarrollo Turístico”.



REGIÓN PUNO

| N° | DESCRIPCIÓN | PIM 2024 (*) S/ | SITUACIÓN ACTUAL |
|--------------|----------------------------|--------------------|---|
| 1 | Embarcadero de Puno | 854,244 | En desarrollo de la tercera etapa(3/5) del expediente técnico , se estima su culminación en setiembre 2024 |
| 2 | Embarcadero Llachón | 182,648 | Se encuentra en la quinta etapa (5 de 5) del desarrollo del expediente técnico , se estima su culminación en Febrero 2024 |
| TOTAL | | 1,036,892 | |

(*) PIM según Consulta amigable 19.02.2024



REGIÓN PIURA

| N° | DESCRIPCIÓN | PIM 2024 (*) S/ | SITUACIÓN ACTUAL |
|----|--------------------------|--------------------|---|
| 1 | Playa cabo blanco | 565,000 | Se realizó la entrega del terreno al consultor , por el cual se dio el inicio el expediente técnico en Enero 2024 |

(*) PIM según Consulta amigable 19.02.2024



REGIÓN TUMBES

| N° | DESCRIPCIÓN | PIM 2024 (*) S/ | SITUACIÓN ACTUAL |
|----|----------------------------|--------------------|--|
| 1 | Manglares de Tumbes | 672,282 | Se encuentra en desarrollo de la tercera etapa (3/5) del expediente técnico , se estima su culminación en setiembre 2024 |

(*) PIM según Consulta amigable 19.02.2024



REGIÓN AYACUCHO

| N° | DESCRIPCIÓN | PIM 2024 (*) S/ | SITUACIÓN ACTUAL |
|----|--|--------------------|---|
| 1 | Pueblo de Quinoa(Media Tensión) | 2,598,145 | Proyecta su culminación para el mes de mayo del 2024. |

(*) PIM según Consulta amigable 19.02.2024

REGIÓN AMAZONAS

| N° | DESCRIPCIÓN | PIM 2024 (*) S/ | SITUACIÓN ACTUAL |
|--------------|--------------------------------|--------------------|--|
| 1 | Plazuela de Chachapoyas | 1,757,067 | Se culminaron 3 expedientes de mantenimiento, los cuales comprenden las siguientes acciones: 1. Mantenimiento de Sistema Pluvial y Mobiliario Urbano. (culminado) 2. Mantenimiento de Sistema Eléctrico. (Inicio de ejecución en mayo 2024) 3. Mantenimiento de Agua Potable y Alcantarillado. (Inicio de ejecución en mayo 2024) |
| 2 | Catarata de Gocta | 3,680,244 | Aprobación del expediente técnico en abril 2024. Inicio de ejecución en agosto 2024 y culminación marzo 2025 |
| 3 | Iglesia Matriz Tingo | 921,742 | En ejecución, cuenta con un avance físico acumulado de 84.00% y proyecta su culminación para el mes de marzo del 2024. |
| TOTAL | | 6,359,053 | |

(*) PIM según Consulta amigable 19.02.2024

REGIÓN AREQUIPA

| N° | DESCRIPCIÓN | PIM 2024 (*) S/ | SITUACIÓN ACTUAL |
|--------------|--------------------------|--------------------|---|
| 1 | Valle del Colca , Chivay | 3,867,475 | El 01.02.2024 se ha inicio la ejecución del saldo de obra y proyecta su culminación para el mes de agosto del 2024. |
| 2 | Cañón del Colca | 993,598 | Aprobación del expediente técnico en agosto 2024. Inicio de ejecución en diciembre 2024 y culminación agosto 2025 |
| TOTAL | | 4,861,073 | |

(*) PIM según Consulta amigable 19.02.2024

REGIÓN ANCASH

| N° | DESCRIPCIÓN | PIM 2024 (*) S/ | SITUACIÓN ACTUAL |
|----|------------------------------|--------------------|--|
| 1 | Campo Santo de Yungay | 2,771,897 | Avance físico acumulado de 92.50% y proyecta su culminación para el mes de febrero del 2024. |

(*) PIM según Consulta amigable 19.02.2024

REGIÓN CUSCO

| N° | DESCRIPCIÓN | PIM 2024 (*) S/ | SITUACIÓN ACTUAL |
|----|----------------------------|--------------------|--|
| 1 | Llaqta Machu Picchu | 5,731,163 | <p>Videocámaras: Aprobación del estudio definitivo en Febrero 2024. Inicio de ejecución en junio 2024 y culminación setiembre 2024.</p> <p>Señaléticas: Aprobación del estudio definitivo en abril 2024 Inicio de ejecución en junio 2024 y culminación setiembre 2024.</p> <p>Senderos: Aprobación del estudio definitivo en abril 2024 Inicio de ejecución en agosto 2024 y culminación diciembre 2024.</p> |

(*) PIM según Consulta amigable 19.02.2024

REGIÓN HÚANUCO

| N° | DESCRIPCIÓN | PIM 2024 (*) S/ | SITUACIÓN ACTUAL |
|----|-----------------------|--------------------|--|
| 1 | Cueva Lechuzas | 258,224 | Aprobación del expediente técnico de la IOAAR en febrero 2024 Inicio de ejecución en abril 2024 y culminación julio 2024. |

(*) PIM según Consulta amigable 19.02.2024

REGIÓN ICA

| N° | DESCRIPCIÓN | PIM 2024 (*) S/ | SITUACIÓN ACTUAL |
|----|------------------------|--------------------|--|
| 1 | Líneas de Nazca | 554,619 | Aprobación del expediente técnico de la IOAAR en marzo 2024. Inicio de ejecución en julio 2024 y culminación diciembre 2024 |

(*) PIM según Consulta amigable 19.02.2024

REGIÓN JUNÍN

| N° | DESCRIPCIÓN | PIM 2024 (*) S/ | SITUACIÓN ACTUAL |
|--------------|--|--------------------|---|
| 1 | Santuario Señor de Muruay (Infraestructura y Museografía) | 150,000 | Infraestructura: culminada en diciembre del 2023, actualmente se encuentra en proceso de recepción de obra. Museografía: En actos previos para inicio de procedimiento de selección para su ejecución. |
| 2 | Zona Monumental de Jauja (Infraestructura Museografía y plazas) | 2,993,190 | Infraestructura: En ejecución, cuenta con un avance físico acumulado de 92.00% y proyecta su culminación para el mes de febrero del 2024. Museografía: En actos previos para inicio de procedimiento de selección para su ejecución. |
| TOTAL | | 3,143,190 | |

(*) PIM según Consulta amigable 19.02.2024

REGIÓN LAMBAYEQUE

| N° | DESCRIPCIÓN | PIM 2024 (*) S/ | SITUACIÓN ACTUAL |
|----|--|--------------------|--|
| 1 | Huaca Rajada (Centro Poblado Sipán) | 9,119,513 | En de ejecución de obra desde el 20.01.2024 se proyecta su culminación para el mes de agosto del 2024. |

(*) PIM según Consulta amigable 19.02.2024

REGIÓN LA LIBERTAD

| N° | DESCRIPCIÓN | PIM 2024 (*) S/ | SITUACIÓN ACTUAL |
|--------------|---------------------------------|--------------------|--|
| 1 | NIK AN – Chan Chan | 7,274,242 | En proceso de ejecución, cuenta con un avance físico acumulado de 45.20% y proyecta su culminación para el mes de mayo del 2024. |
| 2 | Malecón Grau – Pacasmayo | 8,633,046 | Aprobación del expediente técnico en marzo 2024. Inicio de ejecución en julio 2024 y culminación agosto 2025 |
| 3 | Islas de Guañape | 1,241,294 | Aprobación del expediente técnico en abril 2025. Inicio de ejecución en agosto 2025 y culminación julio 2026 |
| TOTAL | | 17,148,582 | |

(*) PIM según Consulta amigable 19.02.2024

REGIÓN LIMA

| N° | DESCRIPCIÓN | PIM 2024 (*) S/ | SITUACIÓN ACTUAL |
|----|---------------------------------------|--------------------|--|
| 1 | Quinta Presa (Infraestructura) | 12,177,581 | Aprobación del expediente técnico en febrero 2024. Inicio de ejecución en junio 2024 y culminación noviembre 2025 |

(*) PIM según Consulta amigable 19.02.2024

REGIÓN PUNO

| N° | DESCRIPCIÓN | PIM 2024 (*) S/ | SITUACIÓN ACTUAL |
|----|----------------------------|--------------------|--|
| 1 | Embarcadero Llachón | 9,669,690 | Aprobación del expediente técnico en febrero 2024. Inicio de ejecución en junio 2024 y culminación marzo 2025 |

(*) PIM según Consulta amigable 19.02.2024



PERÚ

Ministerio de Cultura



BICENTENARIO
PERÚ 2021

SITUACIÓN Y AVANCES PARA LA RECUPERACIÓN Y FOMENTO DE LOS RECURSOS CULTURALES EN LA REGIÓN TACNA

Ministerio de Cultura del Perú
(Febrero de 2024)



PATRIMONIO CULTURAL

299

BIENES INMUEBLES PREHISPÁNICOS
DECLARADOS

60

BIENES INMUEBLES PREHISPÁNICOS
IDENTIFICADOS

67

PATRIMONIO HISTÓRICO COLONIAL Y
REPUBLICANO DECLARADO

05

PATRIMONIO INMATERIAL DECLARADO



1. PATRIMONIO CULTURAL EXISTENTE EN LA REGIÓN TACNA

1.2. PATRIMONIO CULTURAL HISTÓRICO (COLONIAL O REPUBLICANO)

SITIOS REPRESENTATIVOS

TEATRO MUNICIPAL
DE TACNA



IGLESIA DE TARUCACHI



FUENTE ORNAMENTAL



PREFECTURA REGIONAL



1.1. PATRIMONIO CULTURAL PREHISPÁNICO



Sitio Arqueológico Cerro San Antonio

SITIOS REPRESENTATIVOS



Cuevas de Toquepala



Paisaje Cultural Arqueológico Complejo Miculla Pachía
sectores A, B, C y D

1.3. PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL



PROVINCIA TACNA

RDN 1191/INC 2009
Procesión de la Bandera



PROVINCIA CANDARAVE

RDN 558/INC 2009
Anaco de Camilaca



PROVINCIA JORGE BASADRE

RVM 060-2015-VMPCIC-MC
Festividad del Señor de Locumba



PROVINCIA TARATA

RVM 110-2019-VMPCIC-MC
Carnaval de la provincia de Tarata



PROVINCIA CANDARAVE

RVM 052-2018-VMPCIC-MC
Anata de Camilaca



2. INTERVENCIONES EN MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN FÍSICA DE BIENES CULTURALES

INTERVENCIONES EN PATRIMONIO HISTÓRICO
CON PUNCHE 2

El Ministerio de Cultura ha invertido S/ 1,091,273.35 en acciones a favor del patrimonio histórico de Tacna

INTERVENCIONES EN PATRIMONIO HISTÓRICO CON PUNCHE 2 – HOSPITAL SAN RAMÓN

TAREAS REALIZADAS

- Limpieza de escombros en áreas circundantes.
- Liberación de ambientes en el primer y segundo nivel.
- Limpieza del entablonado de madera.
- Reposición de piezas de madera faltantes en galerías.
- Apuntalamiento de entrepisos y techos de inmueble.
- Fumigación de insectos.
- Desmontaje de coberturas.
- Reforzamiento estructuras de madera.
- Restitución sistema de drenaje pluvial.
- Mantenimiento de coberturas de eplancha onduladas y cumbreras.
- Instalación de malla metálica en segundo nivel.
- Instalación de sistema de iluminación para seguridad del inmueble.



INTERVENCIONES EN PATRIMONIO HISTÓRICO

CON PUNCHE 2 - ANTIGUA CASONA UNIVERSIDAD

TAREAS REALIZADAS


- Limpieza de escombros en áreas circundantes e interior de inmueble.
- Liberación de ambientes.
- Desmontaje de coberturas (techos).
- Reforzamiento estructuras de madera.
- Apuntalamiento estructural.
- Restitución sistema de drenaje pluvial.
- Mantenimiento de coberturas de plancha ondulada y cumbreras.
- Instalación de sistema de iluminación para brindar seguridad al inmueble.



INTERVENCIONES EN PATRIMONIO HISTÓRICO CON PUNCHE 2 – LOCAL DE LA CÁRCEL PÚBLICA

TAREAS REALIZADAS

- Limpieza de escombros en áreas circundantes.
- Liberación de ambientes en el primer y segundo nivel.
- Liberación de torta de barro.
- Desmontaje de coberturas (techos).
- Reforzamiento estructuras de madera.
- Apuntalamiento estructural primer y segundo nivel.
- Restitución sistema de drenaje pluvial.
- Mantenimiento de coberturas de plancha ondulada y cumbres.
- Instalación de sistema de iluminación para brindar seguridad al inmueble.

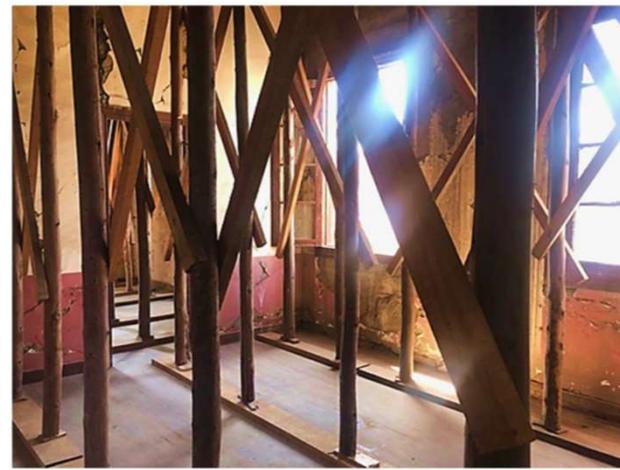

INTERVENCIONES EN PATRIMONIO HISTÓRICO **CON PUNCHE 2 – EESPP JOSÉ JIMÉNEZ BORJA**

TAREAS POR REALIZAR EN MARZO DEL 2024

- Limpieza de escombros en áreas circundantes e interiores.
- Liberación de ambientes en el primer y segundo nivel.
- Desmontaje de coberturas (techos).
- Reforzamiento estructuras de madera.
- Apuntalamiento estructural.
- Restitución sistema de drenaje pluvial.
- Mantenimiento de coberturas de plancha ondulada y cumbreras.



INTERVENCIONES EN PATRIMONIO HISTÓRICO CON PUNCHE 2 – LOCAL DE LA COMISARÍA



TAREAS POR REALIZAR EN MARZO DEL 2024

- Limpieza de escombros en áreas circundantes e interiores.
- Liberación de ambientes en el primer y segundo nivel.
- Desmontaje de coberturas (techos).
- Reforzamiento estructuras de madera.
- Apuntalamiento estructural.
- Restitución sistema de drenaje pluvial.
- Mantenimiento de coberturas de plancha ondulada y cumbreras.

INTERVENCIONES EN PATRIMONIO HISTÓRICO EN ARTICULACIÓN CON LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA

En el 2023 la Municipalidad Provincial de Tacna, en coordinación con la Dirección Desconcentrada de Cultura de Tacna, ejecutaron acciones para el mantenimiento de bienes culturales.

**COMPLEJO
MONUMENTAL
ALTO DE LA
ALIANZA**



CASA ZELA

**TEATRO
MUNICIPAL DE
TACNA**



PASEO CIVICO

INTERVENCIONES EN EL PATRIMONIO HISTÓRICO EN ARTICULACIÓN CON EL GOBIERNO REGIONAL DE TACNA


- **PREFECTURA REGIONAL DE TACNA**

Las acciones de emergencia para prevenir el colapso del inmueble fueron determinadas por la DDC TACNA, sin embargo, el trabajo articulado entre ambas instituciones (DDC y GORE) permitió su ejecución tan esperada por la población. El presupuesto corresponde en su totalidad al GORE TACNA.



INTERVENCIONES EN PATRIMONIO HISTÓRICO

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE TACNA (EX SEDE DE LA CSJT)

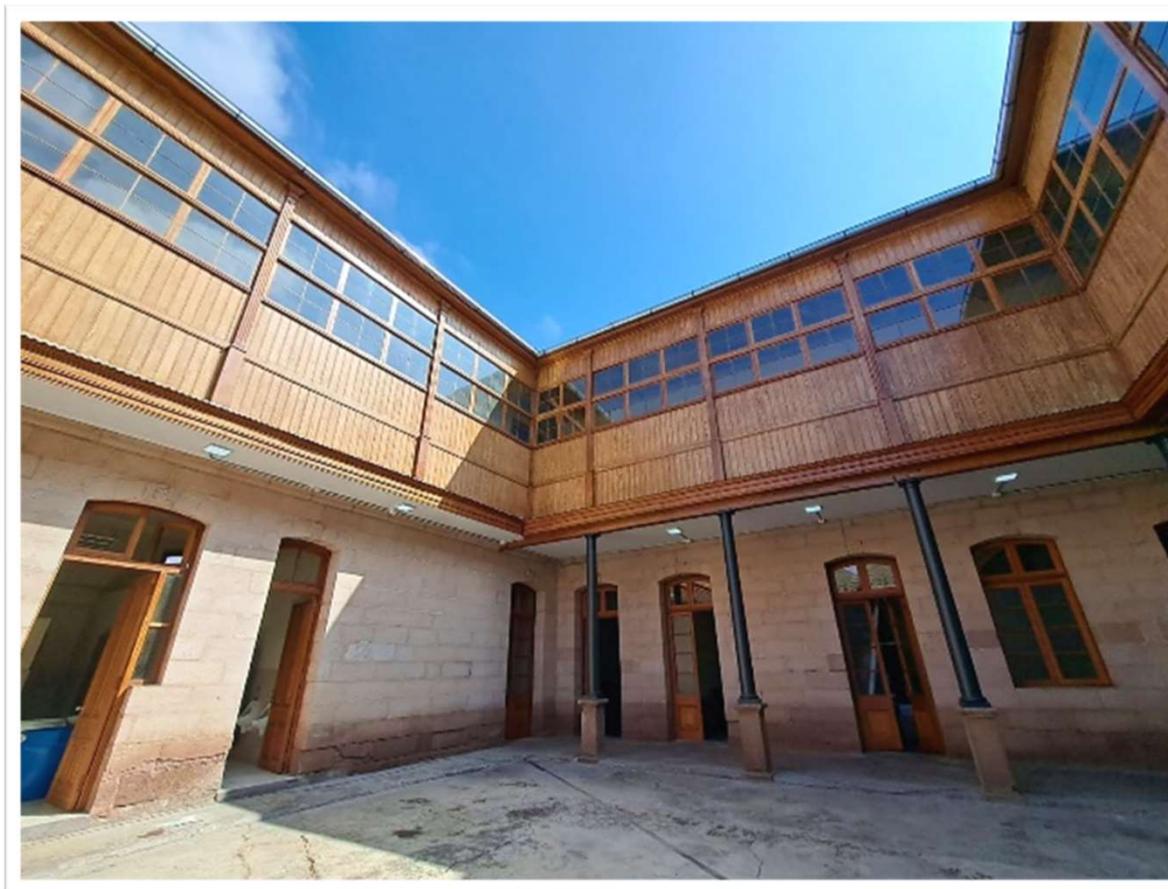

ACCIONES REALIZADAS

1. Mejoramiento y acciones de emergencia
2. Mantenimiento de fachada
3. Mantenimiento y liberación de ambientes.

En el 2023 producto de las coordinaciones entre la Dirección Desconcentrada de Cultura de Tacna y la Corte Superior de Justicia de Tacna, se ejecutó el mantenimiento de la Ex sede de la CSJT bajo su administración.


ACCIONES A FAVOR DEL PATRIMONIO HISTÓRICO EN ARTICULACIÓN CON EL GOBIERNO REGIONAL DE TACNA

En el 2023 se logró la suscripción de convenios marco y específicos mediante los cuales el Gore Tacna, con la asistencia técnica del Ministerio de Cultura, pondrá en valor de los siguientes bienes culturales emblemáticos de la región:

PREFECTURA
REGIONAL
DE TACNA



CATEDRAL
DE TACNA

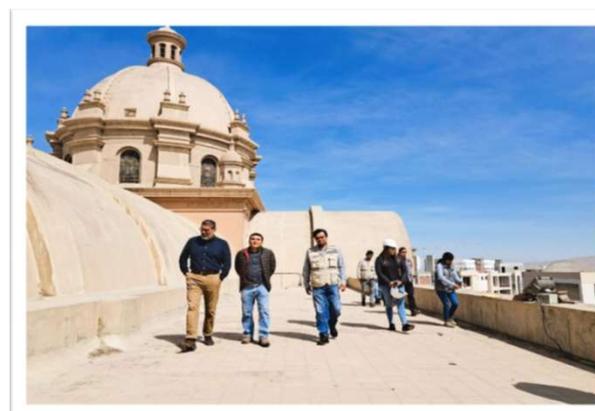

IGLESIA DE
TARUCACHI



FUENTE
ORNAMENTAL
DE TACNA



INTERVENCIONES EN PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

El Ministerio de Cultura ha invertido S/ 225,351.00 en acciones a favor del patrimonio histórico de Tacna

INTERVENCIONES EN PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO CON PUNCHE 2


En el 2023 la Dirección Desconcentrada de Cultura de Tacna a través del programa Punche 2 realizó acciones para el acondicionamiento de bienes arqueológicos



CAMINO INCA - CANDARAVE



BIEN INMUEBLE PREHISPÁNICO PARAMARCA

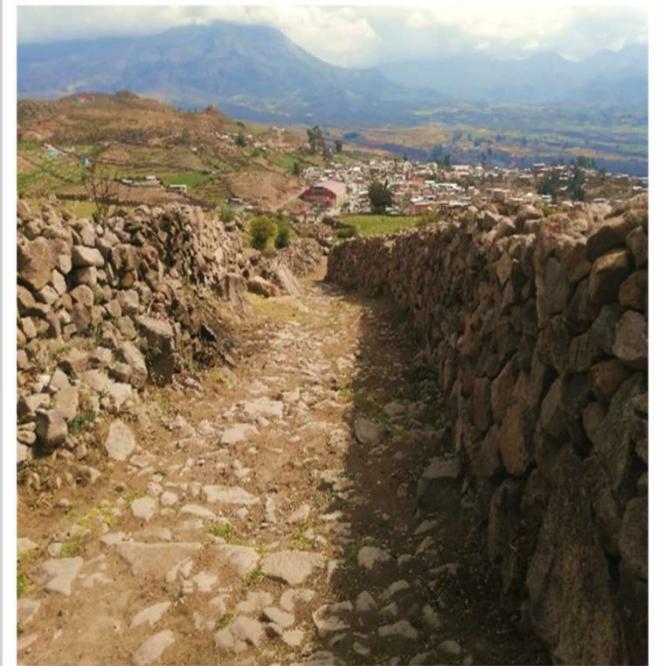

**CAMINO INCA SUBTRAMO
TARATA - TICACO**

INTERVENCIONES EN PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

DDC TACNA




Geoglifo en Miculla



Cuevas de Toquepala

La Dirección Desconcentrada de Cultura de Tacna financió 02 servicios que permitieron: 1) Identificar un geoglifo en el Complejo Arqueológico Miculla – Pachía, 2) realizar inventario de petroglifos en el sector C del Complejo Arqueológico Miculla – Pachía y 3) Ejecutar acciones de conservación y puesta en valor del Sitio Arqueológico Las Cuevas y Pinturas Rupestres de Toquepala

INTERVENCIONES EN PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO EN ARTICULACIÓN CON EL GOBIERNO REGIONAL TACNA

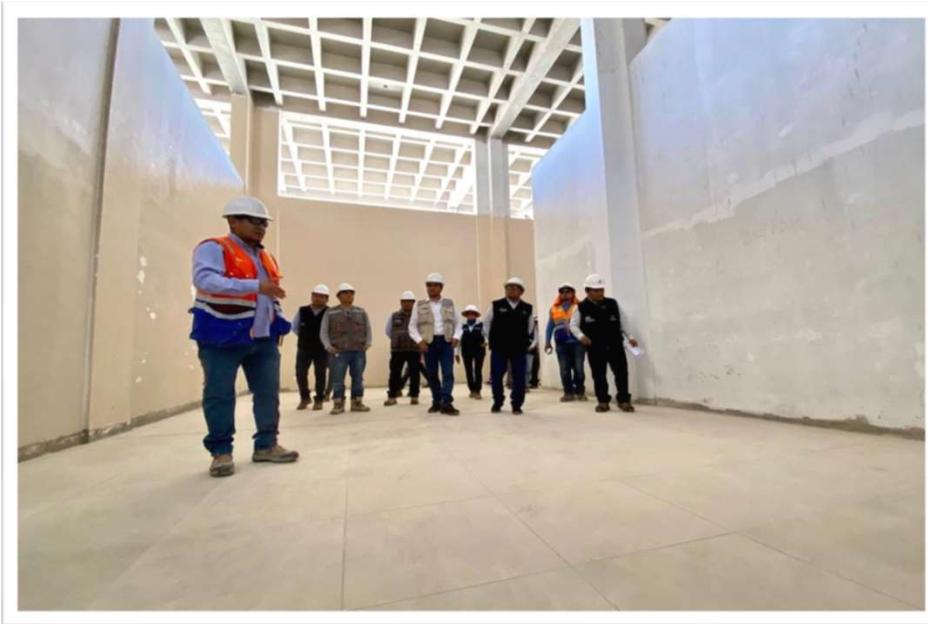

CENTRO DE INTERPRETACIÓN MICULLA – S/ 14 millones



MUSEO DE SITIO PEAÑAS - S/ 800 mil

En el 2023 la Dirección Desconcentrada de Cultura de Tacna articuló permanentemente con el GORE Tacna con el objetivo de coadyuvar en la ejecución de ambos proyectos.



3. INDUSTRIAS CULTURALES Y ARTES

EN ALIANZA CON EL SECTOR PRIVADO



FIESTA DEL LIBRO Y LA CULTURA TACNA 2023



FESTIVAL DE TEATRO DE TACNA – FESTA 2023

En el 2023 la Dirección Desconcentrada de Cultura de Tacna articuló con la empresa Southern Perú para hacer realidad por primera vez en Tacna una Feria del Libro y un Festival de Teatro organizados por la DDC y la empresa minera.

OTRAS ACCIONES PARA EL FOMENTO DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y ARTES EN LA REGIÓN



FESTIVAL DE LA ZAMPOÑA METÁLICA DE TACNA



PLAN DE FOMENTO DEL LIBRO Y LA LECTURA



FESTIVAL PERU LEE TACNA



APERTURA DE ESPACIOS DE LECTURA EN LOS TAMBOS



PLAN RESCATARTE



DIA DE LA CULTURA AFROPERUANA



4. INTERCULTURALIDAD

IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS Y ATENCIONES CON PERTINENCIA CULTURAL Y LINGÜÍSTICA



Como resultado de las coordinaciones entre la Dirección Desconcentrada de Cultura de Tacna y la Corte Superior de Justicia se implementó desde fines del 2022 la señalética intercultural en todas las sedes de la Corte en la región Tacna.



5. PROYECTOS PLANIFICADOS 2024 PARA LA REGIÓN TACNA

PROYECTOS PLANIFICADOS PARA EL 2024

EN PATRIMONIO HISTÓRICO

- **Puesta en valor financiada por el GORE con asistencia técnica del Ministerio de Cultura de monumentos emblemáticos:**
 - Prefectura de Tacna
 - Catedral de Tacna
 - Iglesia de Tarucachi
 - Fuente Ornamental
- **Teatro Municipal:** Próxima firma de convenio específico para la puesta en valor financiada por la MPT o alianza estratégica. El Ministerio de Cultura brinda asistencia técnica.
- **Zona Monumental:** Para el primer semestre se culminará el mantenimiento en la zona monumental ejecutado por la MPT con la asistencia técnica de la DDC TACNA.
- **AUM Plaza Colón:** A la fecha el Ministerio de Cultura brinda asistencia técnica a la MPT para el desarrollo del expediente a nivel de perfil.
- **E.E.S.P.P. José Jiménez Borja:** La DDC ejecutará acciones de emergencia por lluvias en marzo del presente.
- **Local de la Comisaría:** La DDC ejecutará acciones de emergencia por lluvias en marzo del presente..

PROYECTOS PLANIFICADOS PARA EL 2024

EN PATRIMONIO PREHISPÁNICO

- **Sitio Arqueológico Cerro San Antonio:** Estamos próximos a la firma de convenio específico con la Municipalidad Provincial de Jorge Basadre para la puesta en valor del sitio.
- **Declaración del Sitio Arqueológico Paramarca:** A la fecha la DDC TACNA ha realizado labores de reconocimiento del potencial del sitio para su declaración en coordinación con la Municipalidad de Ticaco.
- **Proyecto Moqui:** Puesta en valor del sitio arqueológico Moqui que será ejecutado por el Gobierno Regional de Tacna, a la fecha hemos retomado coordinaciones para articular esfuerzos y viabilizar el inicio del proyecto.

PROYECTOS PLANIFICADOS PARA EL 2024

EN PATRIMONIO INMATERIAL

- **Declaración Tarkada de Candarave:** La DDC TACNA ha articulado con la Municipalidad Provincial de Candarave para iniciar la elaboración del expediente desde marzo próximo.
- **Usos y prácticas de la zampoña metálica de Tacna:** La DDC TACNA viene articulando con la Asociación de Conjuntos de Zampoñas Metálicas de Tacna para la elaboración del expediente de declaratoria.
- **Declaración del Carnaval de Huanuara:** Luego de levantar las observaciones en una labor conjunta entre la población de Huanuara, la Municipalidad Distrital de Huanuara y la DDC TACNA, el expediente ya se encuentra en la etapa de evaluación final en la Dirección de Patrimonio Inmaterial.
- **Declaración de Estampas Tacneñas de Luis Cavagnaro:** Esta labor será desarrollada por la DDC TACNA para lo cual realizará las coordinaciones con los miembros y organizadores de las Estampas creación del ilustre tacneño don Luis Cavagnaro Orellana, Personalidad Meritoria de la Cultura.

PROYECTOS PLANIFICADOS PARA EL 2024

INDUSTRIAS CULTURALES Y ARTES

- **Festival de Teatro de Tacna 2024:** La DDC TACNA en articulación con el sector privado realizarán por segundo año consecutivo el Festival de Teatro Tacna 2024 con la finalidad de fortalecer los derechos culturales de la población ligado a las expresiones artísticas.
- **Fiesta del Libro y la Cultura 2024:** La DDC TACNA en articulación con el sector privado realizarán por segundo año consecutivo la Fiesta del Libro y la Cultura 2024 con el objetivo de fomentar el hábito de la lectura.
- **Plan de Fomento de Libro y la Lectura 2024:** Se implementará el Plan de Fomento de Libro y la Lectura 2024 a fin de generar espacios lectores para las infancias.



PERÚ

Ministerio de Cultura



BICENTENARIO
PERÚ 2021

¡Paysuma (aimara), aroge (nomatsigenga), pasonki (ashaninka), aichu (sharanahua),
maaketai (achuar), irake (shipibo), añay (q. chanka), nadiara (urarina), pagrachu (kichwa),
poyagnu (yine), asabi (kakataibo),
jilatxi (jaqaru), see (awajún), utsurpaki (kukama kukamiria), chibai (majiki),
parasyos (yanesha), uspainek' etchen (shiwilu), foonjún xonaá (ocaina),
gracias!
