



GOBIERNO REGIONAL DE
LAMBAYEQUE

ACCIONES DE INTERVENCIÓN Y PREVENCIÓN REALIZADAS FRENTE AL FENÓMENO DEL NIÑO (FEN)


Jorge Luis Pérez Flores
Gobernador Regional

a tu servicio

FENÓMENO DEL NIÑO - FEN

INTERVENCIONES PROGRAMADAS EN EL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE


UNIDADES EJECUTORAS	N° INTERVENCIONES	TOTAL S/.
ANA - MIDAGRI	90	S/ 190´397,347.25
PSI - MIDAGRI	17	S/ 5´314,137.24
GORE LAMBAYEQUE	10	S/ 23´304,915.27
ARCC	6	S/ 2´499,034.00
TOTAL	123	S/ 221´515,433.76

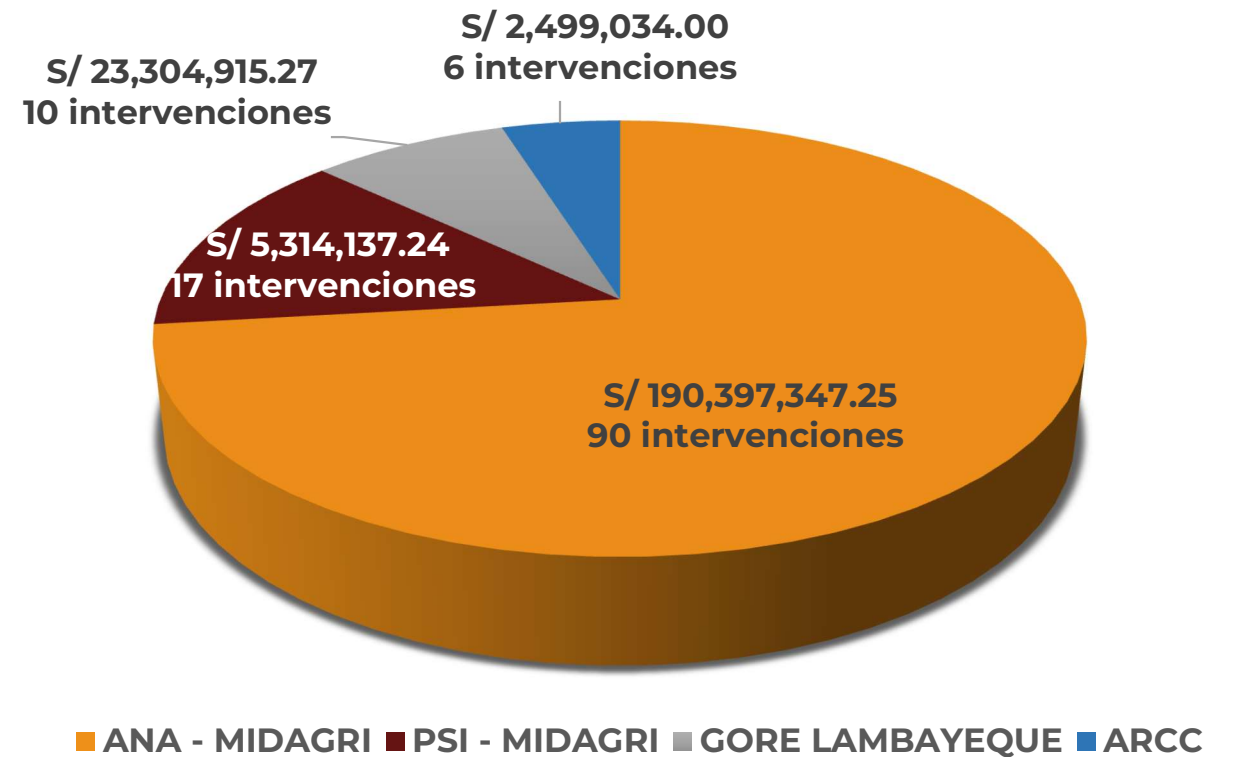

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - NACIONAL

EJECUCIÓN EMERGENCIA - FEN DEL SECTOR AGRARIO Y DE RIEGO Pliego 164: AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA

PLIEGO	MARCO PRESUPUESTAL	CERTIFICACIÓN	%	COMPROMISO	DEVENGADO	AVANCE
PIURA	81' 687,999	65' 850,418	80.6%	30' 354,474	24' 108,380	29.5%
LA LIBERTAD	97' 095,577	44' 976,857	46.3%	19' 773,389	15' 894,682	16.4%
LIMA	424' 167,211	289' 706,518	68.3%	228' 254,491	38' 543,913	9.1%
TUMBES	43' 316,699	32' 756,335	75.6%	7' 547,614	3' 347,139	7.7%
ANCASH	71' 258,102	30' 033,564	42.1%	5' 684,901	4' 877,236	6.8%
PUNO	17' 151,246	14' 401,020	84.0%	11' 838,976	860,858	5.0%
LAMBAYEQUE	191' 837,347	139' 821,608	72.9%	2' 705,535	1' 883,958	1.0%
ICA	66' 488,344	58' 767,693	88.4%	640,656	105,621	0.2%
TOTAL	993' 002,525	676' 314,013	68.1%	306' 800,036	89' 621,787	9.0%

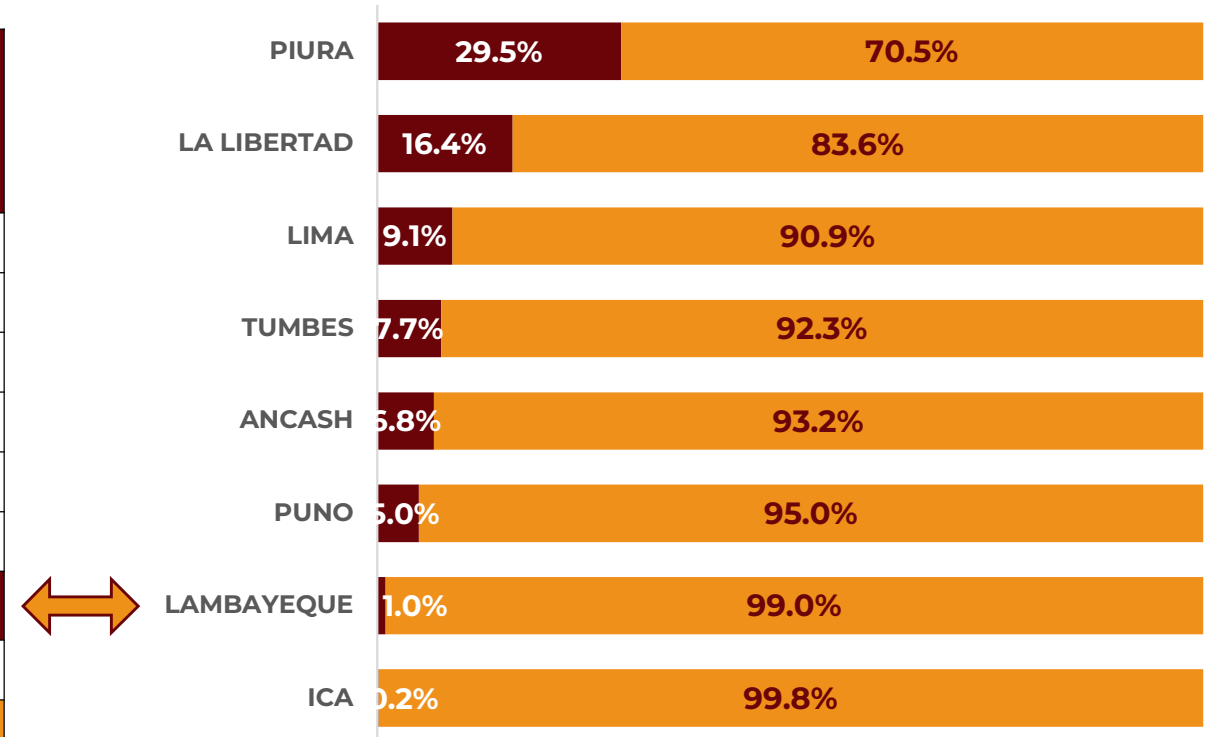

Por toda Fuente de Financiamiento
en Gasto Corriente e Inversiones

LEYENDA

- DEVENGADO
- POR DEVENGAR

Fuente: SIAF - Operaciones en Línea - MEF - <https://apps4.mineco.gob.pe/siafadmapp>
Fecha Consulta : 15 Octubre del 2023

ACCIONES EJECUTADAS DE EMERGENCIA

Plan específico en Gestión del Riesgo de Desastres

- Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres – PPRRD 2023-2030.
- Plan de Educación Comunitaria en Gestión del Riesgo de Desastres .
- Plan de Contingencia ante Lluvias Intensas 2023-2024.

13 Almacenes adelantados

Ubicados en puntos estratégicos, abastecidos con bienes de ayuda humanitaria no alimentaria:

- Kañaris,
- Incahuasi,
- Ciudad Eten,
- Cayalti,
- Lagunas, Chongoyape,
- Morrope,
- Illimo,
- Motupe,
- Pitipo,
- Olmos,
- Oyotun y
- Zaña

Ejecución de Simulacros y Simulaciones

De acuerdo a lo estipulado en la Resolución Ministerial N° 013-2022-PCM, se desarrolla simulacros y se prepara a la población y se fortalece a las autoridades en la toma de decisiones.

Se cuenta con 92 motobombas disponibles para atender las emergencias a nivel regional.

Compra regular de Bienes de Ayuda Humanitaria no Alimentaria

- 400 unidades de Cama plegable 3/4 plaza.
- 400 unidades de colchón de espuma 3/4 plaza.

Adquisición de bienes

- Compra de 10,000 galones de Combustible Diesel B5, que serán destinados a la operatividad de la maquinaria pesada de la Sede Regional que prestará apoyo por treinta (30) días en diferentes puntos de intervención.
- Compra de 4,000 galones de Diesel B5 y de 1,000 galones de Gasolina 90 octanos para motobombas.
- Compra de mangas y mangueras para motobombas.

REPARTIDOR LA PUNTILLA

PEOT



✓ NOS PREPARAMOS PARA ENFRENTAR AL
**"Fenómeno
el Niño"**

INSTALAMOS **1170**
Geobolsas
EN EL DIQUE
"La Puntilla"

100% DE AVANCE
INVERSIÓN
S/. 1'836,950

**¡GESTIÓN CON
RESULTADOS!**

La conformación de esta estructura permite direccionar normalmente el flujo del agua hacia el Repartidor La Puntilla, asegurando la captación de recurso hídrico para uso poblacional y garantizar el inicio de la campaña agrícola 2023-2024 en el valle Chancay Lambayeque.

LOGROS

Eliminación de palizada en compuerta de Río y Captación.

Construcción de Dique provisional para restablecer el Servicio de Agua para uso Poblacional y Agrícola.

EN COORDINACIÓN CON LA ARCC SE TRABAJÓ LOS EXPEDIENTES LOGRANDO EL FINANCIAMIENTO Y EJECUCIÓN DE LA BOCATOMA RACARRUMI

Conformación de un Dique enrocado de 250m de longitud a margen derecha, aguas arriba de la bocatoma Racarrumi, con la finalidad de proteger la carretera de penetración que une la ciudad de Chota con la ciudad de Chiclayo.



INVERSIÓN

7.5 millones de soles



INICIO DE TRABAJO:

09 de septiembre



PLAZO DE EJECUCIÓN:

120 días calendario

Encauzamiento del cauce del río, en la margen izquierda, hasta por 1000 metros, inmediatamente aguas arriba de la estructura.

Conformación de un dique enrocado, margen izquierda, aguas debajo de bocatoma para asegurar la estructura de los desvíos de corrientes.

Reacomodo de roca aguas abajo del aliviadero, para proteger de la caída del agua.

Ampliación por 80 metros adicionales de la poza disipadora, correspondiente a las compuertas de río, que constantemente es erosionada por el material de arrastre.



REHABILITACIÓN, PROTECCIÓN Y ENCAUZAMIENTO DEL REPARTIDOR LA PUNTILLA, PARTIDOR DESAGUADERO Y DESARENADOR, FINANCIADA POR LA ARCC

Rehabilitación, protección y encauzamiento del Repartidor La Puntilla, Partidor Desaguadero y Desarenador, que conforman las estructuras de distribución del sistema hidráulico Tinajones.



INVERSIÓN
8.8 millones de soles



INICIO DE TRABAJO:
26 de septiembre



PLAZO DE EJECUCIÓN:
120 días calendarios

La obra consiste en el encauzamiento de 500 metros aguas abajo del Repartidor la Puntilla, así como 500 metros aguas arriba, en los que se construirá un dique de 240 metros con enrocado en la margen izquierda.

ACCIONES EJECUTADAS DE EMERGENCIA EN SISTEMA DE RIEGO

NOMBRE DE INTERVENCIÓN	MAQUINARIA PEOT	MAQUINARIA ALQUILADA / CONVENIO	UBICACIÓN	PPTO	AVANCE	ESTADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
ACCIONES DE EMERGENCIA EN SISTEMA DE RIEGO PERIODO 2023							
1	TRABAJOS DE EMERGENCIA REHABILITACION DE DIQUE AGUAS ARRIBA REPARTIDOR LA PUNTILLA, DISTRITO DE CHONGOYAPE, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.	-01 EXCAVADORA HIDRAULICA KOMATSU PC-300 LC 8 - 014	- 01 TRACTOR CAT D8T - 01 EXCAVADORA HIDRÁULICA CAT 336 D2L	CHONGOYAPE	S/ 1,836,949.01	100%	EJECUTADO
2	REHABILITACIÓN DE TOMA DIRECTA EL PUEBLO		- 01 EXCAVADORA HIDRÁULICA	CHONGOYAPE	S/ 6,985.00	100%	EJECUTADO
3	REHABILITACIÓN DE TOMA HUANABAL - LA RAMADA		- 01 EXCAVADORA HIDRÁULICA 02 VOLQUETES 15 M3	LLAMA	S/ 34,591.20	100%	EJECUTADO
4	REHABILITACIÓN DE TOMA LA OCULTA - LA RAMADA		- 01 EXCAVADORA HIDRÁULICA	LLAMA	S/ 20,956.80	100%	EJECUTADO
5	REHABILITACIÓN DE TOMA DIRECTA MINAS		- 01 EXCAVADORA HIDRÁULICA	CHONGOYAPE	S/ 4,278.68	100%	EJECUTADO
6	CONSTRUCCIÓN DE CANAL BY PASS - CANAL SIPÁN		- 01 EXCAVADORA HIDRÁULICA	CHONGOYAPE	S/ 6,160.00	100%	EJECUTADO
7	REHABILITACIÓN DE TOMA DIRECTA EL PUEBLO		- 01 EXCAVADORA HIDRÁULICA	CHONGOYAPE	S/ 9,114.00	100%	EJECUTADO
8	REHABILITACIÓN DE TOMA DIRECTA HUACA BLANCA		- 01 EXCAVADORA HIDRÁULICA CAT 320 DL	CHONGOYAPE	S/ 11,648.00	100%	EJECUTADO
9	REHABILITACIÓN DE CANAL SIPAN		- 01 EXCAVADORA HIDRÁULICA - 01 TRACTOR CAT D8T	CHONGOYAPE	S/ 101,412.74	100%	EJECUTADO
10	REHABILITACIÓN DE TOMA DIRECTA MINAS		- 01 EXCAVADORA HIDRÁULICA - 01 TRACTOR CAT D8T	CHONGOYAPE	S/ 38,881.00	100%	EJECUTADO
11	REHABILITACIÓN DE TOMA PAMPAGRANDE	- 01 EXCAVADORA HIDRAULICA BRAZO LARGO CAT 320 CL - 09	- 01 EXCAVADORA HIDRÁULICA CAT 336 DL - 01 TRACTOR CAT D8T	CHONGOYAPE	S/ 114,789.22	100%	EJECUTADO
12	REHABILITACIÓN DE TOMA CUCULI		- 01 EXCAVADORA HIDRÁULICA CAT 336 DL	CHONGOYAPE	S/ 4,620.00	100%	EJECUTADO
13	REHABILITACIÓN DE TOMA HUANABAL - LA RAMADA		- 01 EXCAVADORA HIDRÁULICA CAT 336 DL - 01 TRACTOR CAT D8T	LLAMA	S/ 89,531.32	100%	EJECUTADO
14	REHABILITACIÓN DE TOMA RECUPERACIÓN TINAJONES		- 01 EXCAVADORA HIDRÁULICA CAT 336 DL - 01 TRACTOR CAT D8T	CHONGOYAPE	S/ 56,622.30	100%	EJECUTADO
15	LIMPIEZA DE DRENES DEL RESERVOIRIO TINAJONES	- 01 EXCAVADORA HIDRAULICA BRAZO LARGO CAT 320 CL - 09		CHONGOYAPE		100%	EJECUTADO
16	DESCOLMATACIÓN DE BOCATOMA MONSEFU - REQUE	- 01 EXCAVADORA HIDRAULICA BRAZO LARGO CAT 320 CL - 09		POMALCA		100%	EJECUTADO



ADMINISTRACIÓN DIRECTA



TOTAL **S/. 2' 336,539.27**

ACCIONES EJECUTADAS DE EMERGENCIA EN SISTEMA DE DRENAJE

ITEM	NOMBRE DE INTERVENCIÓN	MAQUINARIA PEOT	MAQUINARIA ALQUILADA / CONVENIO	UBICACIÓN	PPTO	AVANCE	ESTADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
ACCIONES DE PREVENCIÓN EN SISTEMA DE DRENAJE PERIODO 2023								
17	MANTENIMIENTO DREN 1000	- 01 EXCAVADORA HIDRAULICA BRAZO LARGO JOHN DEERE 250 G - 013		LAMBAYEQUE	S/ 287,050.91	100%	EJECUTADO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA
18	MANTENIMIENTO DREN 1400	- 01 EXCAVADORA HIDRAULICA BRAZO LARGO CAT 320 CL - 010		FERREÑAFE	S/ 330,979.63	100%	EJECUTADO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA
19	MANTENIMIENTO DREN 1700	- 01 EXCAVADORA HIDRAULICA BRAZO LARGO CAT 320 CL - 09		FERREÑAFE	S/ 113,628.84	100%	EJECUTADO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA
20	MANTENIMIENTO DREN 2210		- 01 EXCAVADORA HIDRÁULICA VOLVO 330	LAMBAYEQUE	S/ 184,638.35	98%	EJECUTADO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA
21	MANTENIMIENTO DREN 3000	- 01 EXCAVADORA HIDRAULICA BRAZO LARGO CAT 320 CL - 011		PIMENTEL	S/ 219,306.30	100%	EJECUTADO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA
22	MANTENIMIENTO DREN 2000	- 01 EXCAVADORA HIDRAULICA BRAZO LARGO CAT 320 CL - 09	01 VOLQUETE 15 M3	LAMBAYEQUE	S/ 168,349.12	60%	EJECUTADO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA
23	MANTENIMIENTO DREN 3100	- 01 EXCAVADORA HIDRAULICA BRAZO LARGO CAT 320 CL - 011		PIMENTEL	S/ 213,494.83	12%	EJECUTADO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA
24	MANTENIMIENTO DREN 1260	- 01 EXCAVADORA HIDRAULICA BRAZO LARGO CAT 320 CL - 09		MOCHUMI	S/ 84,310.18	100%	EJECUTADO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA

TOTAL  **S/. 1' 601,758.16**

FICHAS PARA SER EJECUTADAS POR EL GORE

LISTADO DE PUNTOS CRITICOS PARA LA LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DE TRAMOS EN RIO PRINCIPAL Y QUEBRADAS - CUENCA CHANCAY LAMBAYEQUE

ITEM	NOMBRE DE ACTIVIDAD	SECTOR	DISTRITO	PROVINCIA	REGION	SITUACION	P.P ESTIMADO	ESTADO
1	LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN, ENCIMADO CON MATERIAL PROPIO Y PROTECCION DE RIBERA CON ROCA AL VOLTEO EN LA QUEBRADA MAJÍN, TRAMO CANAL MAJÍN - BADEN, DISTRITO CHONGOYAPE, PROVINCIA CHICLAYO Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.	MAJIN BADEN	CHONGOYAPE	CHICLAYO	LAMBAYEQUE	APROBADAS	S/ 2´028,105	Buena Pro: 18/10/2023
2	LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN, ENCIMADO CON MATERIAL PROPIO Y PROTECCION DE RIBERA CON ROCA AL VOLTEO EN LA QUEBRADA YAIPON, SECTOR EL MIRADOR - CERRILLOS-RESERVORIO TINAJONES , DISTRITO DE CHONGOYAPE ,PROVINCIA CHICLAYO Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.	MIRADOR- CERRILLOS	CHONGOYAPE	CHICLAYO	LAMBAYEQUE	APROBADAS	S/ 2´159,350	Buena Pro: 20/10/2023
3	LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN, ENCIMADO CON MATERIAL PROPIO Y PROTECCION DE RIBERA CON ROCA AL VOLTEO EN LA QUEBRADA VICHAYAL ,SECTOR VICHAYAL, DISTRITO DE TUMAN , PROVINCIA CHICLAYO Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.	VICHAYAL	CHICLAYO	CHICLAYO	LAMBAYEQUE	APROBADAS	S/ 897,941	Buena Pro: 20/10/2023
4	LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN, ENCIMADO CON MATERIAL PROPIO Y PROTECCION DE RIBERA CON ROCA AL VOLTEO EN LA QUEBRADA RIO LOCO, SECTOR HUANABAL , DISTRITO FERREÑAFE, PROVINCIA DE FERREÑAFE , DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.	HUANABAL	FERREÑAFE	FERREÑAFE	LAMBAYEQUE	APROBADAS	S/ 1´052,158	Buena Pro: 20/10/2023
5	LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN, ENCIMADO CON MATERIAL PROPIO Y PROTECCION DE RIBERA CON ROCA AL VOLTEO EN LA QUEBRADA SENCIE ,EN EL SECTOR SENCIE , DISTRITO DE PITIPO , PROVINCIA DE FERREÑAFE Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.	SENCIE	FERREÑAFE	FERREÑAFE	LAMBAYEQUE	APROBADAS	S/ 2´167,362	Buena Pro: 20/10/2023

TOTAL  **S/. 8' 304, 916**

TRABAJOS POR EJECUTAR - PREVENCIÓN SISTEMA DE RIEGO Y DRENAJE

ITEM	NOMBRE DE INTERVENCIÓN	MAQUINARIA PEOT	MAQUINARIA ALQUILADA / CONVENIO	UBICACIÓN	PPTO	ESTADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	DETALLE
ACCIONES DE PREVENCIÓN EN SISTEMA DE RIEGO								
1	LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DE CANAL TAYMI ANTIGUO	- 01 MOTONIVELADOR A KOMATSU GD-555	- 04 EXCAVADORAS HIDRÁULICAS - 04 VOLQUETES 15 - 02 CARGADOR FRONTAL - 02 TRACTOR SOBRE ORUGAS D6	PATAPO, MESONES MURO, PITIPO	S/ 1' 881,036.32	POR EJECUTAR	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Se ejecuta el 06 de noviembre
2	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS Y ELECTROMECAÓNICAS EN LA BOCATOMA RACA RUMI		- 01 TRACTOR SOBRE ORUGAS D6 - 01 EXCAVADORA HIDRÁULICA	LLAMA	S/ 511,816.23	POR EJECUTAR	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Se ejecuta el 16 de octubre
3	MANTENIMIENTO DEL CANAL LAMBAYEQUE DEL KM 15+00 AL KM 25+00	MAQUINARIA PEOT		TUMAN, POMALCA	S/ 426,385.13	POR EJECUTAR	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Se ejecuta el 06 de noviembre
ACCIONES DE PREVENCIÓN EN SISTEMA DE DRENAJE								
4	MANTENIMIENTO DREN 4000			SANTA ROSA	S/ 338,279.81	POR EJECUTAR	IOARR	Se ejecuta el 16 de octubre
5	MANTENIMIENTO DREN 1520			FERREÑAFE	S/ 271,162.42	POR EJECUTAR	IOARR	Se ejecuta el 06 de noviembre
6	MANTENIMIENTO DREN 1600			FERREÑAFE	S/ 126,422.32	POR EJECUTAR	IOARR	Se ejecuta el 06 de noviembre
7	MANTENIMIENTO DREN 5000 Y DREN 5200			MONSEFU	S/ 262,340.28	POR EJECUTAR	IOARR	Se ejecuta el 06 de noviembre

Se remite las 10 acciones propuestas ha intervenir, verificados por la Administración Local del Agua Chancay, a la DGPP-MEF con Hoja de Ruta 124979-2023.

1 / 28

GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
SEDE CENTRAL
GOBERNACIÓN REGIONAL

Oficina digitalizada por FÓRUM FIDUCIA 2006 LUIS FR 4082881 Inc.
Unidad GOBERNACIÓN REGIONAL
Cajón GOBERNACIÓN REGIONAL DE LAMBAYEQUE
Fecha y hora de generación: 01/08/2023 - 17:02:43

Chiclayo 1 agosto 2023

OFICIO N° 000626-2023-GR.LAMB/GR [4612218 - 141]

Jessica Roxana Camacho Medina
Directora General de Presupuesto Público
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

ASUNTO: SOLICITUD DE RECURSOS PRESUPUESTALES PARA FINANCIAR ACTIVIDADES EN MARCO DEL ARTÍCULO 37 DE DEMANDAS ADICIONALES DE GASTO DE LA DIRECTIVA N° 0005-2022-EF/50.01 POR FENÓMENO DEL NIÑO.

REFERENCIA: a) Memorando N° 000848-2023-GR.LAMB/GGR [4612218 - 135]
b) Oficio N° 000546-2023-GR.LAMB/OFONCS [4612218 - 73]
c) Oficio N° 000480-2023-INDECI/JEF INDECI
d) Informe Situacional N° 000011-2023-INDECI/DIRES
e) Informe N° 01-2023/SENAMHI-DMA-SPC-DHI-SEH
f) Informe N° 34-2023/SENAMHI-DMA-SPC
g) Informe Técnico N° 0005-2023-ANADPDRH/SASS
h) Oficio N° 00415-2023-CENEPRED/DGP-1.0
i) Informe Situacional N° 007-2023-SDSIERD
j) Informe Técnico "Escenarios de riesgos por inundaciones y movimientos en masa por lluvias asociadas al Fenómeno del Niño"
k) Informe Técnico N° A6788

Es grato dirigirme a usted para expresarle el cordial saludo a la vez solicito recursos presupuestales por el importe de S/ 22,304,916.00 (VEINTIDOS MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECISEIS Y 00/100 SOLES) para financiar actividades propuestas en el INFORME TECNICO N° 000051-2023-GR.LAMB/ORPP [4612218 - 140] que se encuentran dentro del marco del artículo 37 de demandas adicionales de gasto de la Directiva N° 005-2022-EF/50.01 por Fenómeno del Niño, pertenecientes a la jurisdicción y competencia del Gobierno Regional de Lambayeque.

Las 10 acciones propuestas ha intervenir han sido verificados por la Administración Local del Agua Chancay Lambayeque mediante el INFORME N° 0101-2023-ANA-AAA.JZ-ALA.CHL y por la Administración Local del Agua Zaña a través del INFORME N° 0012-2023-ANA-AAA.JZ-ALA.Z/AWDA, las cuales no han sido consideradas dentro de los Decretos Supremos 0015 y 0016.

Sobre el particular, se solicita dejar sin efecto el OFICIO N° 000585-2023-GR.LAMB/GR [4612218 - 116] con Hoja de Ruta N° 113934-2023 del día 12 de julio, OFICIO N° 000543-2023-GR.LAMB/GR [4612218 - 98] con Hoja de Ruta N° 108269-2023 del día 03 de julio y OFICIO N° 000589-2023-GR.LAMB/GR [4612218 - 116] con Hoja de Ruta N° 114741-2023 del día 14 de julio del presente año y OFICIO N° 000623-2023-GR.LAMB/GR [4612218 - 138] con Hoja de Ruta N° 124514-2023.

Sin otro particular, es propicia la ocasión para expresarle las muestras de mi especial consideración y estima.

Atentamente;

Fecha de Solicitud: 01/08/2023 05:29:01 p.m.

Fecha de Recepción:

Tipo Documento: OFICIO

Documento entrante: 000626-2023-GR.LAMB/

N° Folios: 202

Asunto: SOLICITUD DE RECURSOS PRESUPUESTALES PARA FINANCIAR ACTIVIDADES EN MARCO DEL ARTÍCULO 37 DE DEMANDAS ADICIONALES DE GASTO DE LA DIRECTIVA N° 0005-2022-EF/50.01 POR FENÓMENO DEL NIÑO

Remitente: GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE

Hoja de Ruta referencia:

Hoja de Ruta: 124979-2023

Organo Destino: 50.01-DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO

Movimientos:

N°	Remite	Unidad Orgánica	Fecha Estado	Estado
Sin ningún otro destino				

05 FICHAS DE INTERVENCIÓN ANTE FENÓMENO DEL NIÑO

Intervención de Emergencia en el Sector Minas Huaca el Toro en el Distrito de Zaña

 **COSTO INVERSIÓN**
S/3' 500,000.00

 **BENEFICIARIOS:**
Más de 350 familias

Intervención de Emergencia en el Sector Virus Espinal - Cruce río en el Distrito de Zaña

 **COSTO INVERSIÓN**
S/4' 500,000.00

 **BENEFICIARIOS:**
Más de 150 familias

Intervención de Emergencia en el Sector Virus Espinal en el Distrito de Zaña

 **COSTO INVERSIÓN**
S/2' 500,000.00

 **BENEFICIARIOS:**
Más de 600 familias

Intervención de Emergencia en el Sector Virus ambas márgenes en el Distrito de Zaña

 **COSTO INVERSIÓN**
S/2' 500,000.00

 **BENEFICIARIOS:**
Más de 250 familias

Intervención de Emergencia en el Sector Potrero, Distrito de Reque

 **COSTO INVERSIÓN**
S/1' 000,000.00

 **BENEFICIARIOS:**
Más de 2,500 familias

FECHA DE INICIO:
31 DE OCTUBRE DEL 2023
PLAZO MÁXIMO DE DURACIÓN:
45 DÍAS CALENDARIOS
INVERSIÓN TOTAL:
S/ 14'000,000




FICHAS DE INTERVENCIÓN ANTE FENÓMENO DEL NIÑO

ITEM	UNID. EJECUTORA	TIPO DE INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	SECTOR	DISTRITO	PRESUPUESTO ESTIMADO	ESTADO
1	001 SEDE CENTRAL	ACTIVIDAD	LIMPIEZA Y DESCOLMATACION, ENCIMADO CON MATERIAL PROPIO Y PROTECCION DE RIBERA CON ROCA AL VOLTEO EN LA QUEDRADA MAJIN, TRAMO CANAL MAJIN – BADEN CHONGOYAPE-PROVINCIA CHICLAYO Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.	MAJIN BADEN	CHONGOYAPE	S./ 2'028,105.00	Buena Pro: 18/10/2023
2	001 SEDE CENTRAL	ACTIVIDAD	LIMPIEZA Y DESCOLMATACION, ENCIMADO CON MATERIAL PROPIO Y PROTECCION DE RIBERA CON ROCA AL VOLTEO EN LA QUEDRADA YAIPON, SECTOR MIRADOR CERRILLOS – RESERVOIRIO TINAJONES. DISTRITO CHONGOYAPE-PROVINCIA CHICLAYO Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.	MIRADOR CERRILLOS	CHONGOYAPE	S./ 2'159,350.00	Buena Pro: 18/10/2023
3	001 SEDE CENTRAL	ACTIVIDAD	LIMPIEZA Y DESCOLMATACION, ENCIMADO CON MATERIAL PROPIO Y PROTECCION DE RIBERA CON ROCA AL VOLTEO EN LA QUEDRADA VICHAYAL, , SECTOR VICHAYAL, DISTRITO DE TUMAN-PROVINCIA CHICLAYO Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.	VICHAYAL	CHICLAYO	S./897,941.00	Buena Pro: 19/10/2023
4	001 SEDE CENTRAL	ACTIVIDAD	LIMPIEZA Y DESCOLMATACION, ENCIMADO CON MATERIAL PROPIO Y PROTECCION DE RIBERA CON ROCA AL VOLTEO EN LA QUEDRADA QUEBRADA RIO LOCO, SECTOR HUANABAL DISTRITO DE FERREÑAFE -PROVINCIA FERREÑAFE Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.	HUANABAL	FERREÑAFE	S./ 1'052,158.00	Buena Pro: 18/10/2023
5	001 SEDE CENTRAL	ACTIVIDAD	LIMPIEZA Y DESCOLMATACION, ENCIMADO CON MATERIAL PROPIO Y PROTECCION DE RIBERA CON ROCA AL VOLTEO EN LA QUEDRADA SENCIE, SECTOR SENCIE, DISTRITO DE PITIPO-PROVINCIA FERREÑAFE Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.	SENCIE	FERREÑAFE	S./ 2'167,362.00	Buena Pro: 19/10/2023
MONTO TOTAL ASIGNADO PARA LA SEDE CENTRAL						S./ 8'304,916	

05 FICHAS DE INTERVENCIÓN ANTE FENÓMENO DEL NIÑO

ESTRUCTURAS PROVISIONALES PROYECTADAS EN AMBAS MARGENES DEL CAUCE DEL RIO

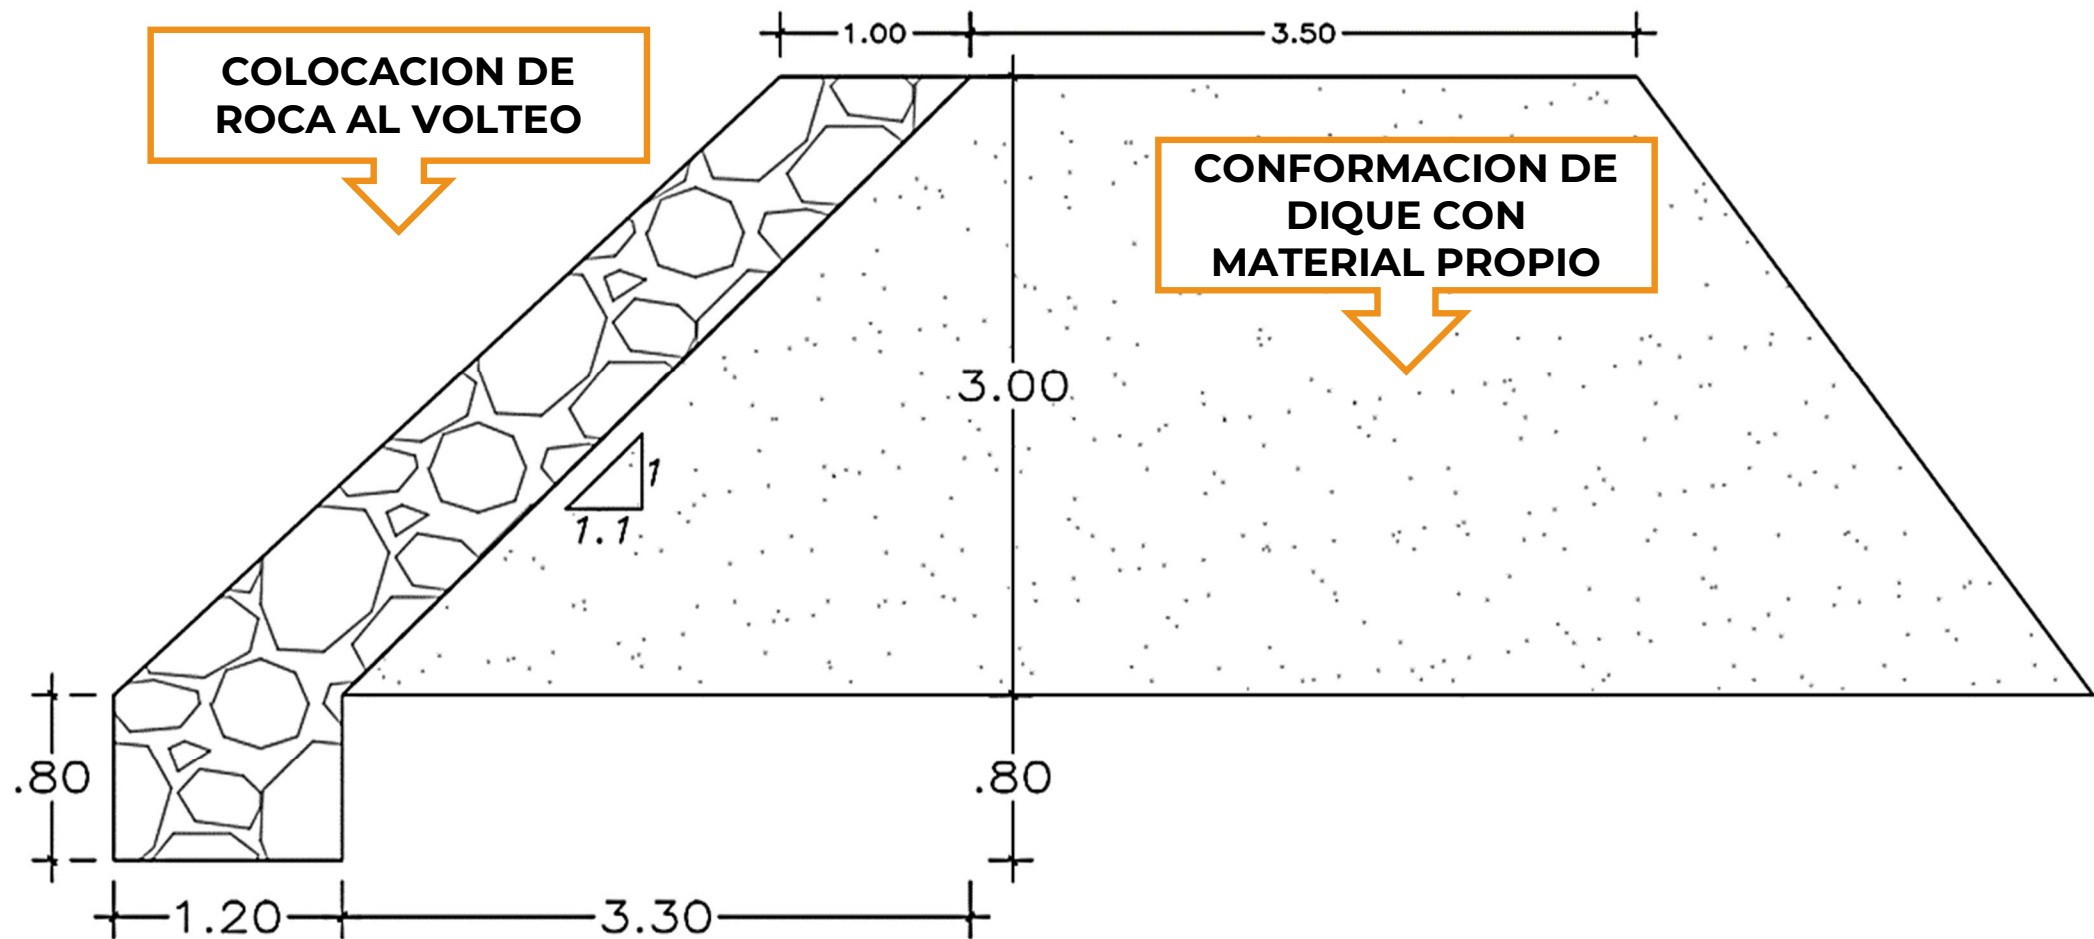

ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS PARA LAS MUNICIPALIDADES DE LA REGIÓN LAMBAYEQUE

ITEM	BIEN	CANT.	TIPO DE PROC.	MONTO	VALOR ESTIMADO
1	CARGADOR FRONTAL SOBRE RUEDAS	19	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA – DECRETO DE URGENCIA N° 032-2023	S/. 21'985,716.99	S/. 103'324,784.82
2	RETROEXCAVADORA FRONTAL SOBRE RUEDAS CON BRAZO EXTENSIBLE	7		S/. 4'018,000.00	
3	CAMION VOLQUETA DE 15 M3	38		S/. 34'664,866.67	
4	MINICARGA DOR FRONTAL SOBRE RUEDAS	8		S/. 2'363,400.00	
5	MOTONIELDORA ARTICULADA	7		S/. 9'376,805.67	
6	CAMION CISTERNA DE 2500 GALONES (10 M3) PARA TRANSPORTE DE AGUA POTABALE	8		S/. 4'438,770.00	
7	RODILLO COMPACTADOR CON TAMBOR LISO VIBRATORIO	6		S/. 3'471,226.99	
8	CAMION COMPACTADOR DE RESIDUOS SÓLIDOS 15 M3	36		S/. 2'190,262.50	
9	MOTOCARGERO O MOTOFURGON	24		S/. 569,736.00	
10	CAMION DE BARANDAS REBATIBLES	2		S/. 536,000.00	

TOTAL



155 UNIDADES DE MAQUINARIA PESADA

MANTENIMIENTOS RUTINARIOS

GRTC

Mantenimiento carretera, tramo: Palo Blanco - Colaya.
(Longitud: 36.680Km)



INVERSIÓN

S/ 264,096



BENEFICIARIOS:

11,500 HAB.



LUGAR

DISTRITOS MOTUPE - SALAS



INVERSIÓN

180,063.20



BENEFICIARIOS:

4,500 HAB.



LUGAR

DISTRITO DE CAÑARIS



EN EJECUCIÓN

FECHA DE FINALIZACIÓN: 30/Oct



MANTENIMIENTOS RUTINARIOS

Mantenimiento carretera, tramo: Chóchope - Kerguer.
 Longitud: 25.090Km



INVERSIÓN
 S/ 160,770.31



BENEFICIARIOS:
 12,000 HAB.



LUGAR
 DISTRITO MOTUPE - SALAS

TRABAJOS CONCLUIDOS AL 100%



IDEA DE PROYECTO

PERFIL

EXPEDIENTE TÉCNICO

ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL





EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

CONVOCATORIA DEL PROCESO

FIRMA DE CONTRATO

EJECUCIÓN DE OBRA

LIQUIDACIÓN Y CIERRE



MANTENIMIENTOS PERIÓDICOS

GRTC

**Mantenimiento carretera
Mórrope – Túcume.
(Longitud: 24.48 km)**



CON BUENA PRO



INVERSIÓN
S/ 1'446,724.95



BENEFICIARIOS:
26,000 HAB.



LUGAR
DISTRITOS MORROPE - TUCUME

**Mantenimiento carretera
Pimentel – Monsefú.
Longitud: 11.24 km)**



EN CONVOCATORIA



INVERSIÓN
S/ 664,360.11



BENEFICIARIOS:
40,500 HAB.



LUGAR
**DISTRITOS PIMENTEL/ STA.
ROSA/ MONSEFÚ**

**Mantenimiento carretera
Mocupe – Lagunas
Longitud: 15.82 km)**



CON BUENA PRO



INVERSIÓN
S/ 934,996.89



BENEFICIARIOS:
15,000 HAB.



LUGAR
DISTRITOS MOCUPE - LAGUNAS

IDEA DE PROYECTO



PERFIL




EXPEDIENTE TÉCNICO



ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL



EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN




CONVOCATORIA DEL PROCESO




FIRMA DE CONTRATO



EJECUCIÓN DE OBRA



LIQUIDACIÓN Y CIERRE



REHABILITACIÓN CARRETERAS DEPARTAMENTALES DESTRUIDAS POR LLUVIAS

GRTC

FRENTES DE TRABAJO : 04
TRAMOS INTERVENIDOS : 07



Explotación de material



Puesta de material

RUTA LA 100: CC.PP. LA ARENA



Antes



Después



INVERSIÓN

S/ 2'407,750

KILOMETROS REHABILITADOS:
150.4 Km de 650.0 Km (23% de la red vial departamental)

TRAMO 1: Salas – Penachí – Uyurpampa

TRAMO 2: Uyurpampa – Incahuasi

TRAMO 3: Palo Blanco – Colaya.

LA - 103: BOSQUE DE PÓMAC



Antes



Después

TRAMO 4: La Zaranda – Bosque de Pómac.

TRAMO 5: Mórrope – Túcume.

TRAMO 6: Monsefú - Ciudad Eten.

RUTA LA - 103: C.P. UYURPAMPA - DV. KONGASHA



Antes



Después

TRAMO 7: C.P. Uyupampa - Dv. Kongacha.



BENEFICIARIOS:

189,295 HAB.



DISTRITOS BENEFICIADOS

SALAS, MOTUPE, ILLIMO, TUCUME, INCAHUASI, KAÑARIS, CHOCHOPE.



KILÓMETROS INTERVENIDOS

GRTC

SOLICITUD DE RECURSOS

TOTAL DE VÍAS INTERVENIDAS EN LA REGIÓN LAMBAYEQUE	
Ítem	Kilómetros
Kilómetros intervenidos (mantenimiento rutinario) - PIA 2023	84
Kilómetros intervenidos (mantenimiento periódicos) - PIA 2023	51.54
Kilómetros intervenidos en Emergencia (PP068)	150.40
Total kilómetros intervenidos 2023	285.94
Total Kilómetros de 20 vías departamentales	650
Porcentaje de intervención de vías en la región:	44.00%

GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
TRANSPORTES LAMBAYEQUE
GERENCIA REGIONAL - GRTC
Id seguridad: 7400471

Firmado digitalmente por CARRASCO BECERRA WILMAN GUILLERMO
RIR 43348578 hard
Unidad: GERENCIA REGIONAL - GRTC
Cargo: GERENTE REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Fecha y hora de proceso:14/06/2023 - 15:03:12

Pimentel 14 junio 2023

OFICIO N° 000593-2023-GR.LAMB/GRTC [4612218 - 63]

JOSE MARIA SONO CABRERA
JEFE DE LA OF. EJEC. DE DEF. NAC., CIVIL Y S.C.
OFIC. EJEC. DE DEFENSA NACIONAL, CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA - SEDE CENTRAL

ASUNTO: INFORME SOBRE DEMANDA ADICIONAL DE RECURSOS AL MEF PARA FINES DE REHABILITACION Y RECONSTRUCCIÓN DE VIAS DEPARTAMENTALES ANTE EL FENÓMENO DE EL NIÑO GLOBAL

REFERENCIA: 1) INFORME N° 00060-2023-GR.LAMB/GRTC/DECA-AROB (4612218-59)
2) INFORME N° 00062-2023-GR.LAMB/GRTC/DECA-AREP (4612218-62)
3) OFICIO MÚLTIPLE N° 00041-2023-GR.LAMB/OFDNCSC (4612218-37)
4) OFICIO N° 000585-2023-GR.LAMB/GRTC [4636576-18]

Es grato dirigirme a Usted para expresarle mi cordial saludo y a la vez adjuntar con el presente los informes de la referencia 1) y 2) de los Coordinadores de Obras y Estudios y Proyectos de la Dirección Ejecutiva de Caminos, mediante los cuales se sustenta información sobre los recursos necesarios para la elaboración del Plan de Preparación para integrar a la Demanda Adicional para afrontar el Fenómeno de "El Niño Global 2023 - 2024", correspondiente a la Unidad Ejecutora 200 Transportes Lambayeque, de acuerdo a lo solicitado en su comunicación 3) de la referencia.

Es necesario precisar que la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones refiere que existen dos fases de la probable intervención ante las lluvias a suscitarse en los próximos meses en la región Lambayeque:

a) Fase 1: Requerir un presupuesto equivalente al ya solicitado bajo el posible escenario que en las zonas críticas identificadas donde actualmente se viene interviniendo bajo el Plan de rehabilitación de vías, dichas zonas se vuelvan a dañar; por lo que sería necesario volver a rehabilitarlas inmediatamente después de las lluvias por un monto estimado ascendente a S/ 2'407,754.00 (dos millones cuatrocientos siete mil setecientos cincuenta y cuatro con 00/100 soles), acorde a la referencia 4.

b) Fase 2: Implica la reconstrucción de las vías departamentales luego de haber sido rehabilitadas. Esto contempla realizar trabajos de prevención en 5 componentes: Socavación de plataforma, Limpieza y descolmatación de cauce, Trabajos en zonas críticas, Construcción de badenes y Habilitación de rutas alternas. Dicho presupuesto estimado asciende a S/ 19,098,602.12 (diecinueve millones noventa y ocho mil seiscientos dos con 12/100 soles), según archivo digital adjunto.

Es propicia la oportunidad para expresarle mi consideración y estima.

Atentamente,



RESUMEN DE PLAN DE RECONSTRUCCIÓN

PROYECTO : PROPUESTA DE PLAN DE RECONSTRUCCIÓN DE RUTAS DEPARTAMENTALES DE LAMBAYEQUE

PREPUESTO DE OBRA			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	TOTAL
01	Emp. PE-1N J (Motupe) - Palo Blanco - Marrison - Huayros - Limón Pampa - Colaya - Corral de Piedra - Huallabamba - El Sauce - Pozuso - Totoras.	GLB	S/ 1,444,217.06
02	RUTA LA 101, Emp. PE-1N J -Chochope - La Ramada - Dv. Salas - kerguer - Penachi - Andamarca -Canchachala -Emp. LA-103 (Uyurpampa)	GLB	S/ 834,601.87
03	RUTA LA 102, Emp. PE-1N J-(El lindero) -Salas - El algarrobo Grande - Emp.LA-101(Dv.Kerguer)	GLB	S/ 2,779,139.34
04	RUTA LA 103, Emp. PE-1N J (Illimo) - La Zaranda - Tambo Real Batán Grande - Papayo - Mochumi Viejo - Laquipampa Moyan - Riopampa - Uyurpampa - Dv. Kongacha - Mamajpampa - Cañaris - Pandachi -Huacacampa (L.D.	GLB	S/ 5,287,314.58
05	RUTA LA 104, Emp. LA-103 - Pagaypuente - Incahuasi - Huasicaj -Sinchwal - War War - Marayhuaca - Emp. LA-103.	GLB	S/ 1,697,328.37
COSTO DIRECTO			S/ 12,042,601.22
GASTOS GENERALES (10%)			S/ 1,204,260.12
UTILIDAD (10%)			S/ 1,204,260.12
SUB TOTAL 1			S/ 14,451,121.46
ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO (5%)			S/ 722,556.07
SUPERVISIÓN (5%)			S/ 722,556.07
CONTROL INTERNO (2%)			S/ 289,022.43
SUB TOTAL 2			S/ 16,185,256.04
IGV (18%)			S/ 2,913,346.09
TOTAL			S/ 19,098,602.12



ACCIONES DE PREVENCIÓN REALIZADAS POR LA GERENCIA DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

ITEM	TIPO DE INTERVENCIÓN	ACCIONES	SECTOR	DISTRITO	PPTO ESTIMADO	ESTADO	ESTADO
1	IOARR/ PROYECTO DE INVERSIÓN	ELABORACIÓN DE IOARR "REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE CRUZ DEL MEDANO, EL ROMERO, POSITOS, LA COLORADA, DEL DISTRITO DE MORROPE PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE" POR PARTE DE LA UNIDAD FORMULADORA- GEVCS, CON CUI 2602043 (ESTADO VIABLE)	SANEAMIENTO	MORROPE	1'079,113.16	VIABLE: 07/07/2023	EJECUCIÓN EN PROCESO
2	IOARR	GESTIÓN CON ENTIDADES PRIVADAS PARA LA ADQUISICIÓN DE PLANTAS POTABILIZADORAS PREVIA ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN Y/O IOARR, POST ANÁLISIS DE PROFESIONAL TÉCNICO CORRESPONDIENTE.	SANEAMIENTO	MORROPE	700,000	EN PROCESO, SEGÚN COMPROMISO DE GERENCIA	En ejecución 5% Culminación Noviembre 2023
3	INTERVENCIÓN INMEDIATA	GESTIÓN DE APOYO PARA LA REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN ZONAS ALTO ANDINAS (CAÑARIS), EN COORDINACIÓN CON LA ONG "AYUDA EN ACCIÓN".	SANEAMIENTO	CAÑARIS	20,000	EN PROCESO, SEGÚN COMPROMISO DE GERENCIA	En ejecución 20% Culminación Noviembre 2023
4	INTERVENCIÓN INMEDIATA	GESTIÓN DE APOYO PARA LA REPARACIÓN Y REHABILITAR BAÑOS DE COLEGIOS, ENTREGA DE KITS DE HIGIENE PARA NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y MUJERES LACTANTES; CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA PARA TANQUE ELEVADO INCLUYENDO TANQUE DE POLIETILENO, EN COORDINACIÓN CON LA ONG "UNICEF"	SANEAMIENTO	MOTUPE, ILLIMO.PACORA	15,000	EN PROCESO, SEGÚN COMPROMISO DE GERENCIA	En ejecución 40% Culminación Noviembre 2023
5	INTERVENCIÓN INMEDIATA	CONFORMACIÓN DE LA MESA WASH LAMBAYEQUE, DONDE PARTICIPAN DIFERENTES ONG, QUIENES APOYARAN DE UNA FORMA RÁPIDA A REHABILITAR LOS SAP AFECTADOS, A LA ENTREGA DE AGUA POR CISTERNAS A LAS FAMILIAS AFECTADAS.	SANEAMIENTO	PACORA, JAYANCA E ILLIMO	18,000	EN PROCESO, SEGÚN COMPROMISO DE GERENCIA	En ejecución 60% Culminación Noviembre 2023
6	INTERVENCIÓN INMEDIATA	GESTIÓN DE APOYO PARA PARA LA INSTALACIÓN DE 130 LETRINAS SECAS, 34 LETRINAS EN LA COMUNIDAD TEPO EN EL DISTRITO DE MOCHUMÍ Y 96 LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN EN EL DISTRITO DE ÍLLIMO EN LA REGIÓN LAMBAYEQUE Y LA INSTALACIÓN DE 17 TANQUES DE AGUA Y SUS ESTRUCTURAS METÁLICAS EN COMUNIDADES Y ALBERGUES EN LOS DISTRITOS DE JAYANCA, PACORA, ÍLLIMO Y PITIPO EN LA REGIÓN LAMBAYEQUE, EN COORDINACIÓN CON LA ONG "SAVE THE CHILDREN"	SANEAMIENTO	MOCHUMI E ILLIMO	920,000	EN PROCESO, SEGÚN COMPROMISO DE GERENCIA	En ejecución 60% Culminación Noviembre 2023

ACTIVIDADES

Categoría Presupuestal	Marco Presupuestal	Dispositivo Legal	Actividad y/o intervención
0017 Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis	S/.2´573,447	D.S. N° 096-2023-EF D.S. N° 186-2023-EF	Compra de bienes e insumos para diagnóstico y tratamiento de enfermedades metaxénicas, promoción de salud y comunicación de riesgo en salud.
0068 Emergencias por Desastres	S/.1´829,399	D.S 057-2023-EF	Adquisición Módulos prefabricados con equipamiento) para 06 Establecimientos de Salud y el Fortalecimiento de la Red de Laboratorio en Salud Pública de nivel regional con RRHH, insumos y mantenimiento.
0131 Salud Mental	S/.1´904,328	D.S 108-2023-EF	Creación e Implementación con Bienes y Servicios de Mantenimiento de 03 Centros de Salud Mental Comunitario con la Contratación de RRHH, bienes y servicios
9002 APNOP	S/.4´590,202	D.S 102-2023-EF	Acciones de mantenimiento correctivo de la infraestructura a 37 establecimientos de salud

Categoría Presupuestal	Marco Presupuestal	Actividad y/o intervención
PP068-RO	S/.846,350.28	Servicios de mantenimiento y adecuación a los EE. SS :C.S J. Chavez, C.S Pimentel ,C.S Mochumí
	S/.76,859.00	Adquisición de 03 motobombas, 02 equipos electrógenos y 05 carpas de Lino y Mobiliario distribuidos a Redes de salud
	S/.1´191,613.00	Acciones de control vectorial, adquisición de insumos médicos, contratación de recursos humanos para UVICLIN y Unidades febriles.
	S/.8´989,612.00	Control de brotes y epidemias, adquisición de insumos, viáticos, RR.HH de médicos, enfermeras, Biólogos y técnicos enfermeros, fumigadores y 185 termonebulizadoras
APNOP	S/.10´088,358.30	IOARR para la construcción de 07 módulos de atención temporal (C.S San Antonio, C.S Jayanca ,C.S Túcume, P.S Monte Hermoso, P.S El Puente,P.S Calera Santa Rosa,P.S Maravillas)

TOTAL



S/ 32´090,168.58

ACTIVIDADES DE PREPARACIÓN

PP068/R.O - D.S 057-2023-EF: INSTALACIÓN DE 06 MÓDULOS BÁSICOS EQUIPADOS PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE LA ATENCIÓN A LA POBLACIÓN

ACTIVIDAD	ESTADO	PRESUPUESTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO	AVANCE DE EJECUCIÓN PTO	EJECUCIÓN AL 100%
Adquisición de Equipamiento básico (Módulos prefabricados con equipamiento) para 06 Establecimientos de Salud: <ul style="list-style-type: none"> • C.S Salas • P.S Las Pampas • C.S Pimentel • C.S Mochumí • P.S La Traposa • C.S Quiñonez 	Devengado: mesas, sillas, camillas, portasuero, lavabo, extintor, oxímetro, oxigenoterapia, coche de curaciones Por devengar: aspirador y módulos. Por emitir orden de compra: coche de paro y Adjudicación Simplificada: equipos electrógenos	S/.1´745,484	S/. 124,920	QUINCENA DE NOVIEMBRE

ACTIVIDADES DE PREPARACIÓN

CONSTRUCCIÓN DE 07 MÓDULOS DE ATENCIÓN TEMPORAL

ITEM	CUI	DENOMINACION	MONTO	ESTADO
1	2585735	Construcción de modulo de atención temporal; adquisición de aspirador de secreciones, electrocardiógrafo y Frontoluz; además de otros activos en el(la) EESS Túcume distrito de Túcume, provincia Lambayeque, departamento Lambayeque	S/ 1´393,660.00	En ejecución 95 % Culminación octubre 2023
2	2597180	Construcción de modulo de atención temporal; en el(la) EESS san Antonio distrito de Chiclayo, provincia Chiclayo, departamento Lambayeque	S/ 2´437,279.71	En ejecución 43 % Culminación Noviembre 2023
3	2593385	Construcción de modulo de atención temporal; en cinco establecimientos de salud I.2, establecimientos de salud I.1 a nivel departamental (Lambayeque) - P.S Monte Hermoso 90% - P.S El Puente 74% - P.S Calera Santa Rosa 60% - P.S Maravillas 50%	S/ 3´566,833.63	En ejecución 65 % Culminación noviembre 2023
4	2597181	Construcción de modulo de atención temporal; en el(la) EESS Jayanca distrito de Jayanca, provincia Lambayeque	S/ 2´690,585	Se inicio la ejecución 19/09/2023

TOTAL ➔ **S/. 10´088,358.34**

SE EJECUTÓ

1. CONTRATACIÓN DIRECTA POR CAUSAL DE ESTADO DE EMERGENCIA

Contratación del Servicio de Mantenimiento de Techo de las Instalaciones de la Unidad de Estadística e Informática y Techo del Servicio de Nutrición y Dietética del Hospital Belén Lambayeque, **este servicio fue ejecutado por el importe de S/ 68,696.42.**

EN PROCESO

OBJETO	SERVICIO
DESCRIPCIÓN	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE SERVICIO DE NUTRICION Y DIETÉTICA DEL HOSPITAL BELEN LAMBAYEQUE
TIPO	POR PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
TIPO DE PROCESO	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA
MODALIDAD	SIN MODALIDAD
VALOR ESTIMADO	S/ 79,552.60
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	RECURSOS DETERMINADOS: FONDO DE COMPENSACIÓN REGIONAL - FONCOR
ESPECIFICA DE GASTO	2.3. 2 4. 2 1

Esta incluida en la aprobación de la “Duodécima modificación al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 402 - Hospital Belén Lambayeque correspondiente al año Fiscal 2023” mediante la RESOLUCION DIRECTORAL N° 000540-2023.

EN PROYECTO

Contratación del servicio de mantenimiento preventivo de techo del pabellón Santa Ana, mantenimiento preventivo de techo del pabellón de medicina, mantenimiento correctivo de techo del servicio de esterilización, mantenimiento correctivo de techo de la unidad de seguros públicos y privados, mantenimiento correctivo de techo del auditorio y mantenimiento correctivo del techo del servicio de laboratorio central.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LOS RECURSOS TRANSFERIDO MEDIANTE D.S. N° 102-2023-EF (FEN)

Cat.Pptal. Prod/Proy. Act	PIM	Certificado	Devengado	% Ejec.
5.005467 MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	1,526,798	1,372,486.40	1,372,486.40	89.89

IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO DEL HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE.


COSTO INVERSIÓN: S/ 1,299,933.00

ESTADO SITUACIONAL: CULMINADO

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE COBERTURA LIVIANA DE LA UNIDAD DE ONCOLOGIA Y REDES DE VAPOR Y AGUA DE LAS UPSS


COSTO INVERSIÓN : S/ 72,553.40

ESTADO SITUACIONAL: CULMINADO

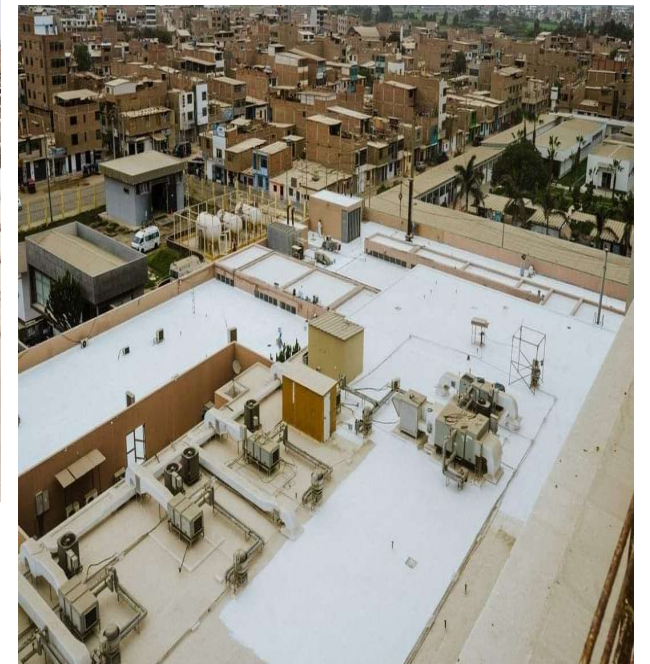

Acción	Presupuesto	Área intervenida	Descripción	Presupuesto	Plazo de la intervención	Orden de servicio/tipo de proceso	Fecha de término de la intervención
PP 068	127,400	Pediatría y rayos X	Mantenimiento de infraestructura en los techos del servicio	58,000	15 días	000404	Culminado
		Servicios públicos	Mantenimiento de infraestructura en los Servicios higiénicos públicos	62,000	35 días	000405	Culminado
		Anestesiología	Mantenimiento de infraestructura en Anestesiología	7,400	4 días	000941	Culminado
FEN	628,000	Traumatología	Mantenimiento de infraestructura en los techos del servicio de traumatología	288,000	30 días	Adjudicación simplificada fecha inicio: 15/10/23	15/11/2023
		-Casa de fuerza -Lavandería -Nutrición -Ginecoobstetricia -Vacunatorio	Mantenimiento de infraestructura en los techos de los servicios	340,000	30 días	Adjudicación simplificada por el DS 032-2023 fecha inicio probable: 22/11/23	22/12/2023

TOTAL ➔ **S/. 755.400**

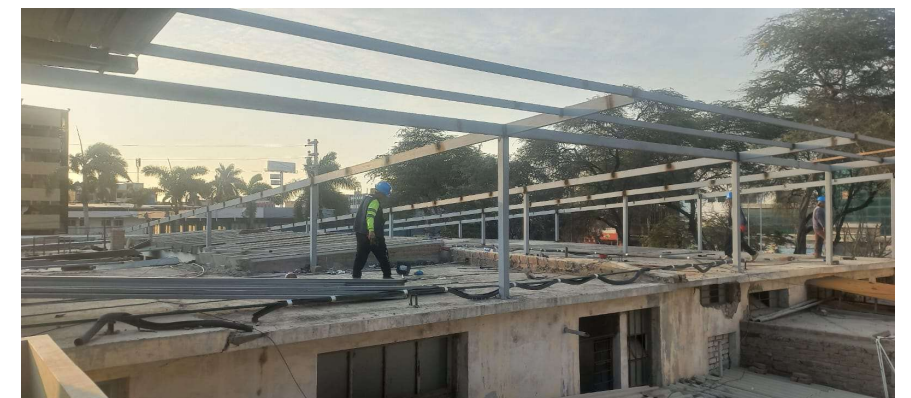

ACCIONES DE PREVENCIÓN MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

TOTAL ➔ **S/. 18´ 691 755**

PROGRAMA “MI MANTENIMIENTO” ➔ **1,239 LOCALES ESCOLARES**



UGEL	ESTUDIANTES	LOCALES	MONTO ASIGNADO S/
UGEL GERENCIA	5,739	14	356,955
UGEL CHICLAYO	132,044	398	8´ 021,820
UGEL FERREÑAFE	29,376	256	2´ 958,564
UGEL LAMBAYEQUE	83,398	571	7´ 354,416
TOTAL	250,557	1,239	18´ 691, 755


SECTOR EDUCACIÓN

Equipo humano capacitado para afrontar algún escenario de riesgo por lluvias e inundaciones de la instituciones educativas mediante el reconocimiento e institucionalización de la comisión integral de Gestión de Riegos y Desastres - COGIREDE.

Plan de contingencia de lluvias e inundaciones de la GRED Lambayeque 2023. Aprobada mediante resolución N° 0510-2023-GR.LAMB/GRED.

Coordinación con la ONG Plan Internacional y UNICEF para programar curso de capacitaciones en GRED donde se ha entregado implementos.

Lanzamiento de la campaña escuela segura limpia y acondicionada en coordinación con salud para ejecutar un plan de limpieza en las instituciones educativas y eliminar los criaderos de zancudos contra el Dengue y las enfermedades metaxénicas.



Propuesta de ejecución de jornadas de prevención e información ante el periodo de lluvias, dirigidas a las autoridades locales, directores y docentes con la finalidad de asegurar adecuadas respuestas de la comunidad educativa frente a una emergencia y/o desastres.

Plan de contingencia de continuidad operativa de la GRED Lambayeque 2023. Aprobada mediante resolución N° 0511-2023-GR.LAMB/GRED.

Se realizará el curso de formación en gestión de riesgos y desastres y adaptación al cambio climático dirigido a 135 instituciones educativas en riesgo de inundaciones.

Difusión de material comunicacional: Tríptico sobre prevención de enfermedades metaxénicas y Manual de Preparación y Respuesta de la II.EE ante el periodo de lluvias y posible ocurrencia del FEN.



La Unión Hace La Fuerza



GOBIERNO REGIONAL DE
LAMBAYEQUE

JORGÉ PÉREZ
GOBERNADOR REGIONAL

a tu servicio
