



# Comisión de Comercio Exterior y Turismo Inversiones

22 de noviembre de 2023



Templo Burgos



Ferrocarril Tacna



Lago Yarinacocha



Casa de la Capitulación



Lamas barrio Kechwa

# Contenido

|                                                                                 | Pág |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1. Objetivo de Plan COPESCO Nacional y Brecha de Infraestructura Turística..... | 03  |
| 2. Componentes de Intervención.....                                             | 04  |
| 3. Articulación con las Políticas Públicas.....                                 | 05  |
| 4. Criterios de Priorización del Sector.....                                    | 06  |
| 5. Evaluación de inversiones en turismo.....                                    | 07  |
| 6. Presupuesto PCN Inversiones (2019 – 2023).....                               | 08  |
| 7. Ejecución Presupuesto.....                                                   | 09  |
| 8. Proyección de Ejecución Inversiones.....                                     | 10  |
| 9. Obras culminadas y por culminar.....                                         | 11  |
| 10. Presupuesto 2024 PCN.....                                                   | 24  |

# 1. Objetivo de Plan COPESCO Nacional y Brecha de Infraestructura Turística


## 🏛️ Objetivo de Plan COPESCO Nacional<sup>1</sup>

Ejecutar proyectos de inversión pública para el **acondicionamiento turístico** en coordinación con sectores de Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales e instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales.

## 🏛️ Brecha de infraestructura turística<sup>2</sup>

**1,392** recursos turísticos priorizados, de los cuales se han intervenido en **38**, que representa el **2.73%**.

2.73%




97.27%

<sup>1</sup> RM 265-2015-MINCETUR (28.09.2015) que aprueba el Manual de Operaciones de PCN.

<sup>2</sup> RM N° 061-2023-MINCETUR (24.02.2023) que aprueba la Programación Multianual de Inversiones del Sector Comercio Exterior y Turismo.

## 2. Componentes de Intervención

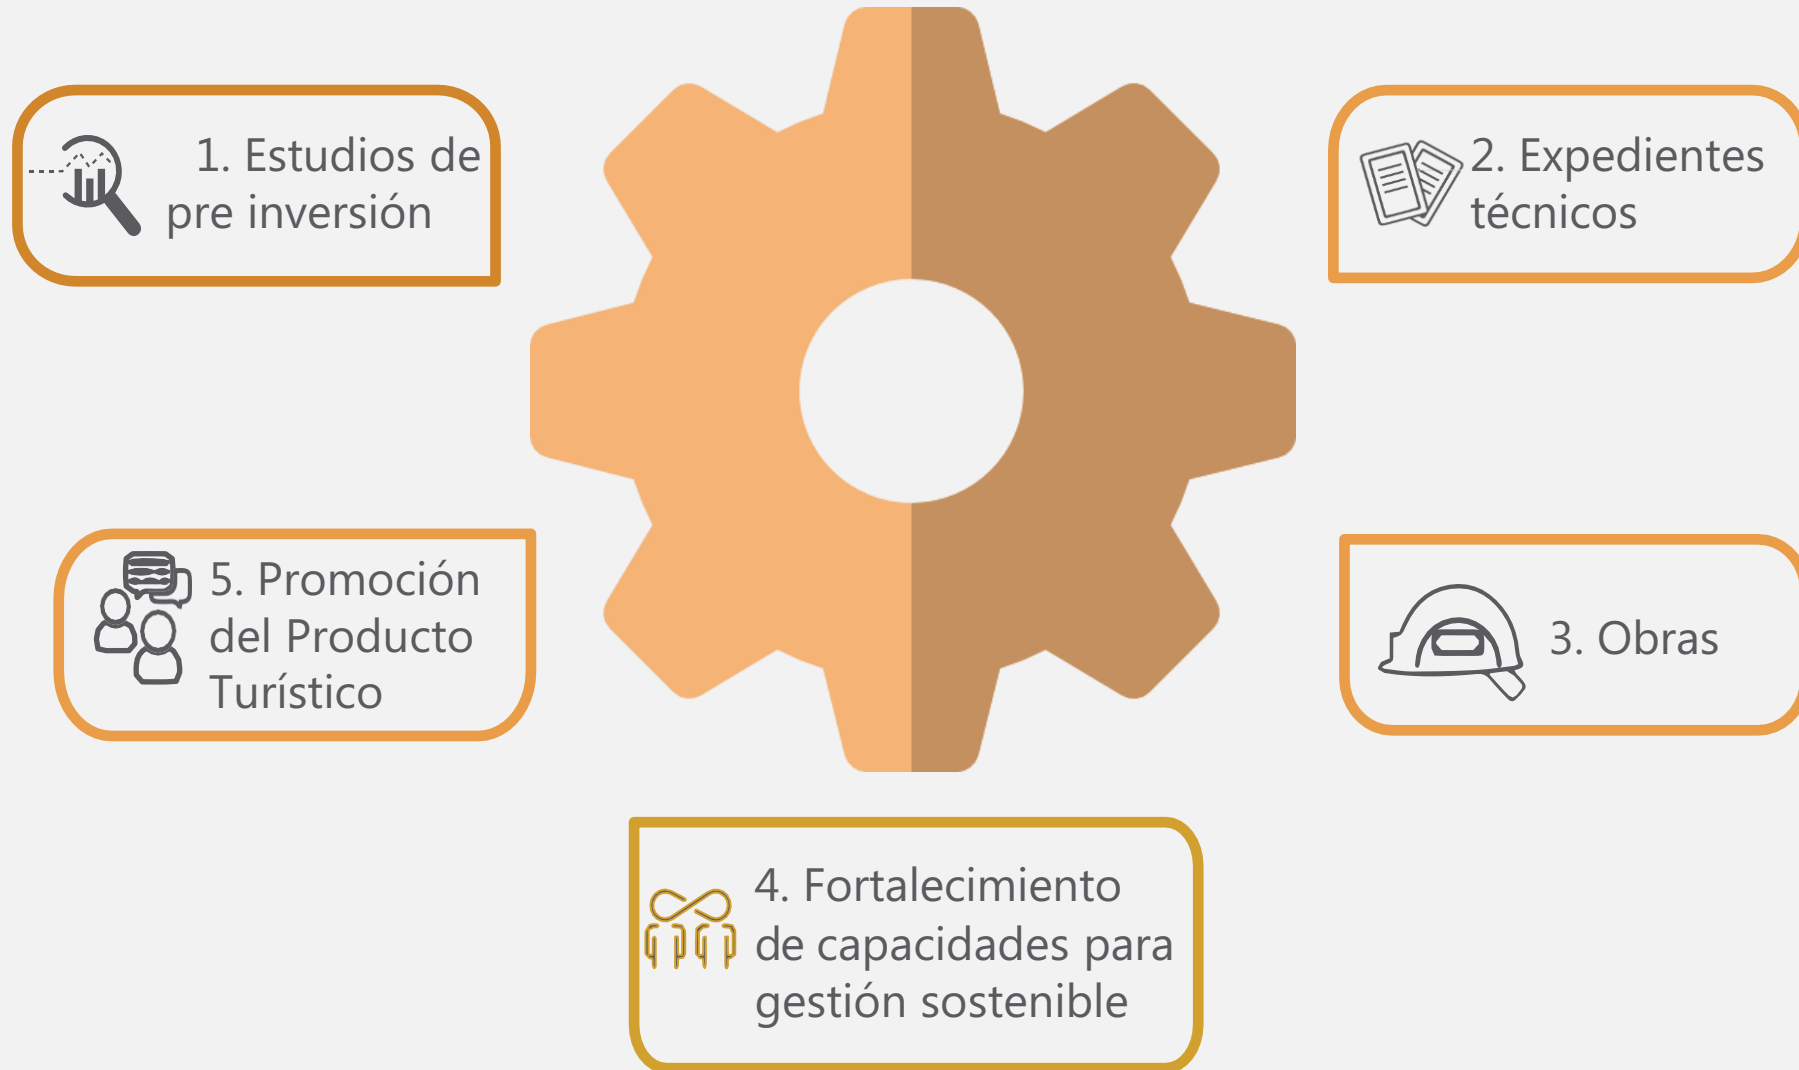

# 3. Articulación con las Políticas Públicas



## INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA PÚBLICA

- **1,392 Recursos turísticos priorizados a nivel nacional.**
- **Brecha actual de Infraestructura Turística: 97.27%**

<sup>3</sup> 35 Políticas de estado del acuerdo nacional (feb-2019)

<sup>4</sup> Actualizado mediante D.S. N° 103-2023-PCM (14.09.2023)

<sup>5</sup> D.S. N° 042-2023-PCM (25.03.2023)

<sup>6</sup> RM N° 231-2016-MINCETUR (23.07.2016)

<sup>7</sup> R.M. N° 138-2022-MINCETUR (16.05.2022)

## 4. Criterios de priorización del sector<sup>8</sup>

### PERÚ CRITERIOS

#### GENERALES

#### 1. Criterio de cierre de brechas

- Prioriza las inversiones que intervendrán en alguno de los 1,392 recursos turísticos.



#### 2. Criterio de alineamiento al planeamiento estratégico

- Prioriza las inversiones en función a su vinculación con los Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales y con la Política General de Gobierno.



### CRITERIOS

#### SECTORIALES

#### 3. Criterio de actualización de la ficha del recurso turístico

- Priorizar la información contenida en las fichas de registro de los recursos turísticos, deben ser revisados y actualizados no mayor a un periodo de 03 años de vigencia.



#### 4. Criterio de Jerarquía del recurso turístico

- Prioriza las inversiones a los recursos turísticos tangibles, cuyas categorías corresponden:

- 1) Sitios naturales.
- 2) Manifestaciones culturales.
- 3) Realizaciones científicas, técnicas o artísticas contemporáneas.



#### 5. Criterio de zona de desarrollo turístico

- Prioriza las inversiones de aquellas áreas que poseen una oferta turística (atractivos, corredores, rutas, circuitos, productos, destinos, plantas y servicios turísticos complementarios).

#### 6. Destino Turístico priorizado

- Prioriza las inversiones cuyo ámbito geográfico de intervención se ubique en alguno de los 58 destinos turísticos priorizados por el sector.



<sup>8</sup> RM N° 61-2023-MINCETUR (24.02.2023)

# 5. Evaluación de Inversiones en Turismo

## Gobiernos Regionales y Municipalidades

- Solicitudes de financiamiento vinculados a:
- Idea de proyecto o IOARR
  - Estudios de Preinversión
  - Expediente Técnico

## VMT

(DGET: Coordinadores Regionales)



Crterios de priorización del sector  
RM N°61-2023-MINCETUR

## 1 DGET

### CRITERIOS ESPECÍFICOS (CIERRE DE BRECHA)

- 1 Recurso Turístico Priorizado
- 2 Alineamiento al planeamiento estratégico (PERTUR o PDLT)
- 3 Actualización de la ficha de registro (Inventario Turístico)
- 4 Jerarquía del recurso Turístico
- 5 Zona de Desarrollo Turístico
- 6 Destino Turístico Priorizado

Cumplimiento Obligatorio (Sí)

Evaluados por DGET

Cumplimiento (Sí)



## 2

### PLAN COPESCO NACIONAL

#### EVALUACIÓN TÉCNICA DE INVERSIÓN

- Recurso Turístico Priorizado cierre de Brecha
- Evaluación del Planteamiento técnico sobre activo estratégicos aprobados por el sector (Idea/ Perfil y/o Exp.Tec)
- Existencia de duplicidad de intervenciones en el Banco de Inversiones
- Evaluación de los indicadores económicos sociales
- Saneamiento físico legal y/o Arreglos Institucionales

Cumplimiento (Sí / No)

## 3

### OPMI MINCETUR (\*)

#### EVALUACIÓN TÉCNICA (CUMPLIMIENTO DE CIERRE DE BRECHA Y PLANTEAMIENTO TÉCNICO)

- Evaluación del Recurso Turístico Priorizado contribuya al cierre de brecha
- Evaluación de la concepción técnica de la inversión y/o idea de proyecto (este bajo la función turismo)
- Revisión de la evaluación técnica de DGET y Plan COPESCO Nacional


Si cumple, se considera en la programación de inversiones de PLAN COPESCO NACIONAL

DGET: Dirección General de Estrategia Turística  
OPMI: Oficina de Programación Multianual de Inversiones

(\*) Artículo 10 del D.L N° 1252: Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversión), aprobado D.S N°284-2018-EF/63.01, y rectificado D.S. 74-2023-EF/63.01.

# 6. Presupuesto PCN Inversiones (2019 – 2023)

En millones de Soles

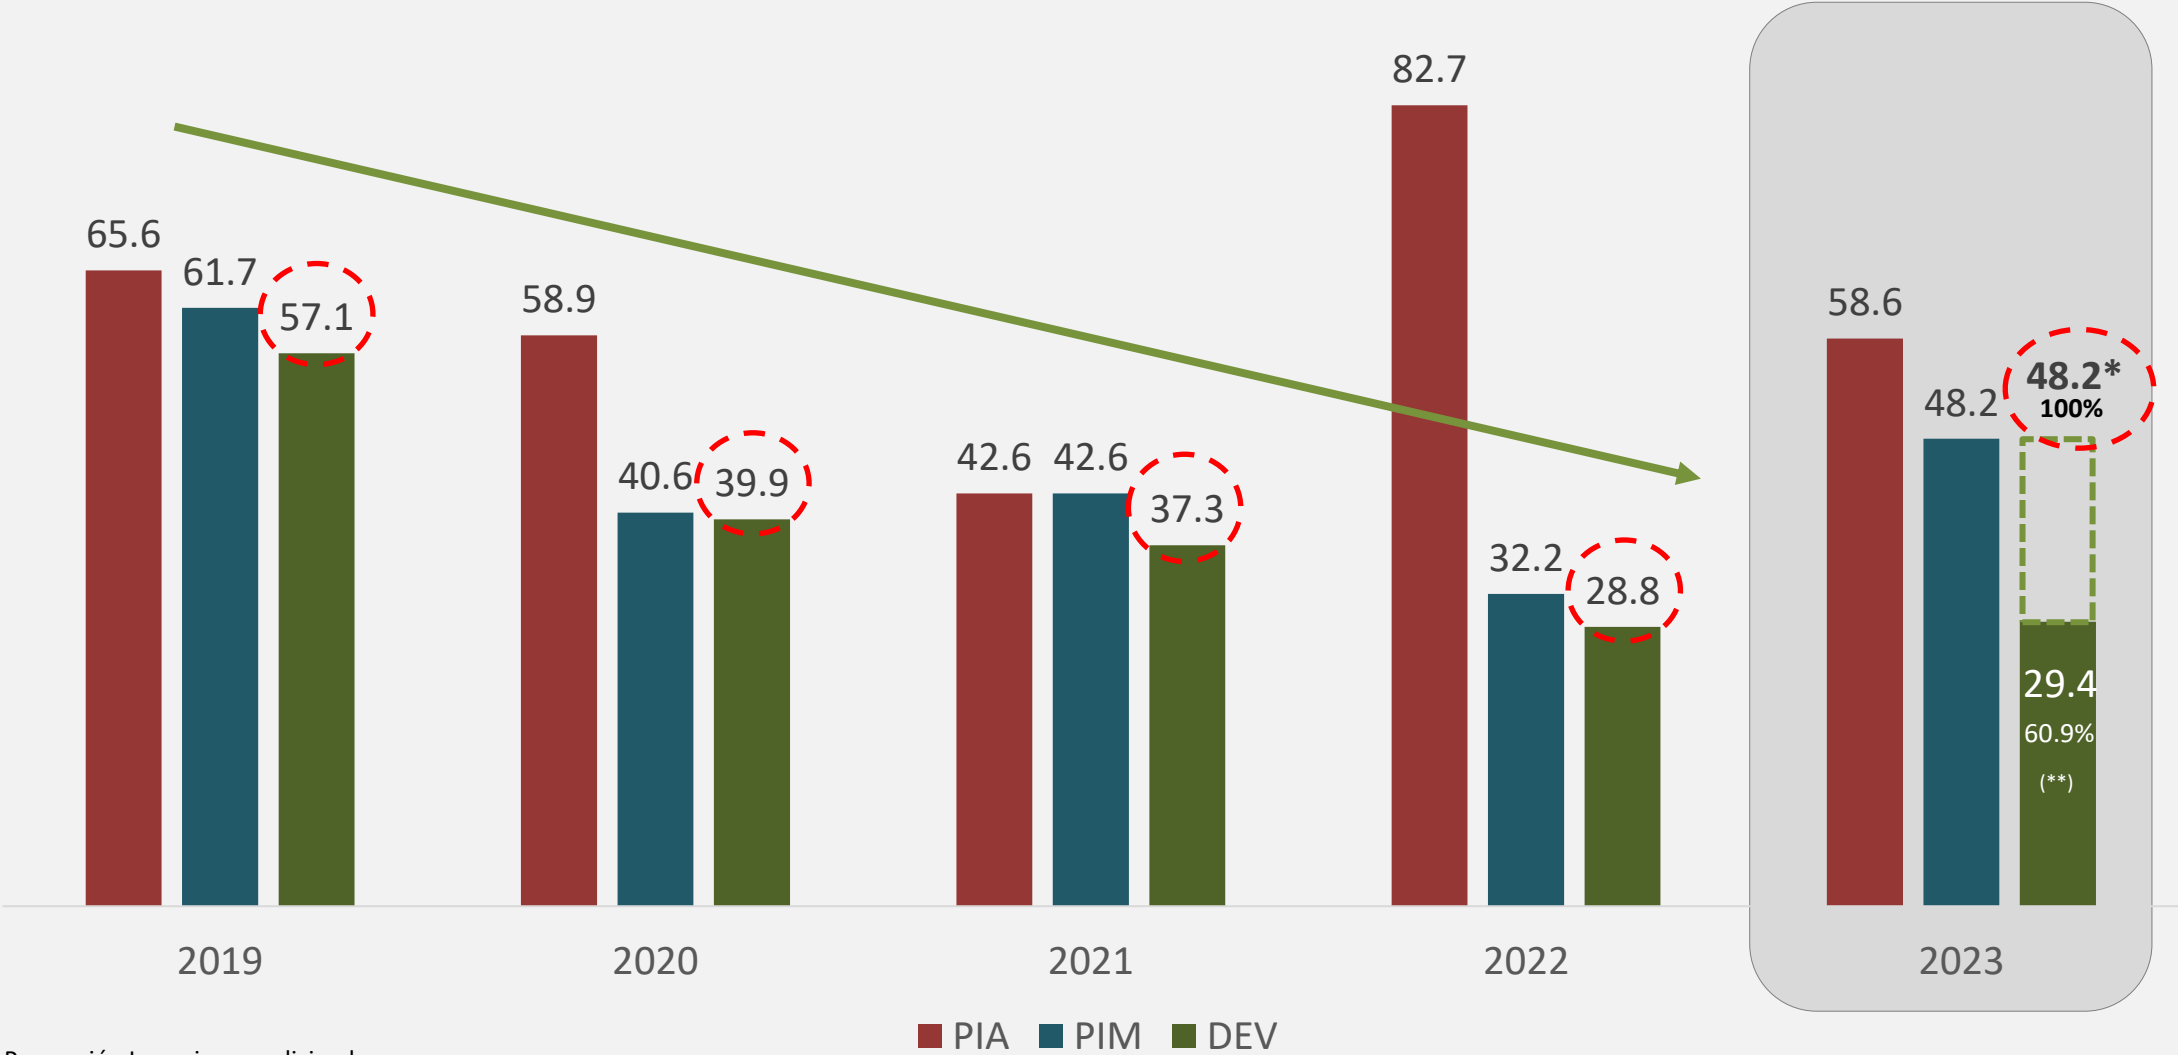

(\*) Proyección Inversiones a diciembre  
(\*\*) Ejecución Consulta Amigable al 21.11.2023





## 7. EJECUCIÓN PRESUPUESTO SECTOR COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO 2023

| Sector / Pliego / UE                 | PIA                | PIM                   | DEV                | %            |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| Pliego MINCETUR                      | 264,856,214        | 277,970,051           | 177,745,228        | 63.9%        |
| UE 001: MINCETUR                     | 132,972,034        | 175,882,695           | 110,676,970        | 62.9%        |
| <b>UE 004: PLAN COPESCO NACIONAL</b> | <b>71,366,030</b>  | <b>61,018,884</b>     | <b>39,359,054</b>  | <b>64.5%</b> |
| Gestión                              | 12,787,503         | 12,787,503            | 9,991,458          | 78.1%        |
| <b>Inversión</b>                     | <b>58,578,527</b>  | <b>(*) 48,231,381</b> | <b>29,367,596</b>  | <b>60.9%</b> |
| Obras                                | 54,127,012         | 40,152,055            | 24,623,360         | 61.3%        |
| Estudios                             | 4,451,515          | 8,079,326             | 4,744,236          | 58.7%        |
| UE 005: VUCE 2.0                     | 60,518,150         | 41,068,472            | 27,709,204         | 67.5%        |
| Pliego CENFOTUR                      | 22,602,553         | 25,291,276            | 17,339,193         | 68.6%        |
| Pliego PROMPERÚ                      | 232,036,494        | 381,104,039           | 224,674,812        | 59.0%        |
| <b>Total Sector</b>                  | <b>519,495,261</b> | <b>684,365,366</b>    | <b>419,759,233</b> | <b>61.3%</b> |


FUENTE: Consulta amigable del MEF al 20.11.2023

**(\*)** Se transfirió S/ 9,4 M al GORE Ucayali. DS 089 -2023-EF para el componente Calles y accesos del Malecón Yarinacocha; se transfirió S/ 1,5 M al Municipalidad Provincial de Islay. D.S. N.º 127-2023-EF para la construcción de malecón, plataformas de circulación, veredas estacionamientos, áreas verdes, instalaciones eléctricas entre otros.

Se incorporaron recursos para desarrollar inversiones en el marco del Plan con Punche Perú S/ 3,3 M (DS 025-2023-EF); se transfirieron recursos de VUCE 2.0 por S/ 0,8 M para 3 inversiones y S/ 0,5 M para el desarrollo de CITE.

Se transfirió S/ 4,1 M a reserva de contingencia por aplicación del DS N° 194-2023-EF. Se incorporaron S/ 75 mil para desarrollo de pre-inversión para Caral.

# 8. Proyección Ejecución Inversiones 2023 Plan COPESCO Nacional (acumulado en millones de Soles)

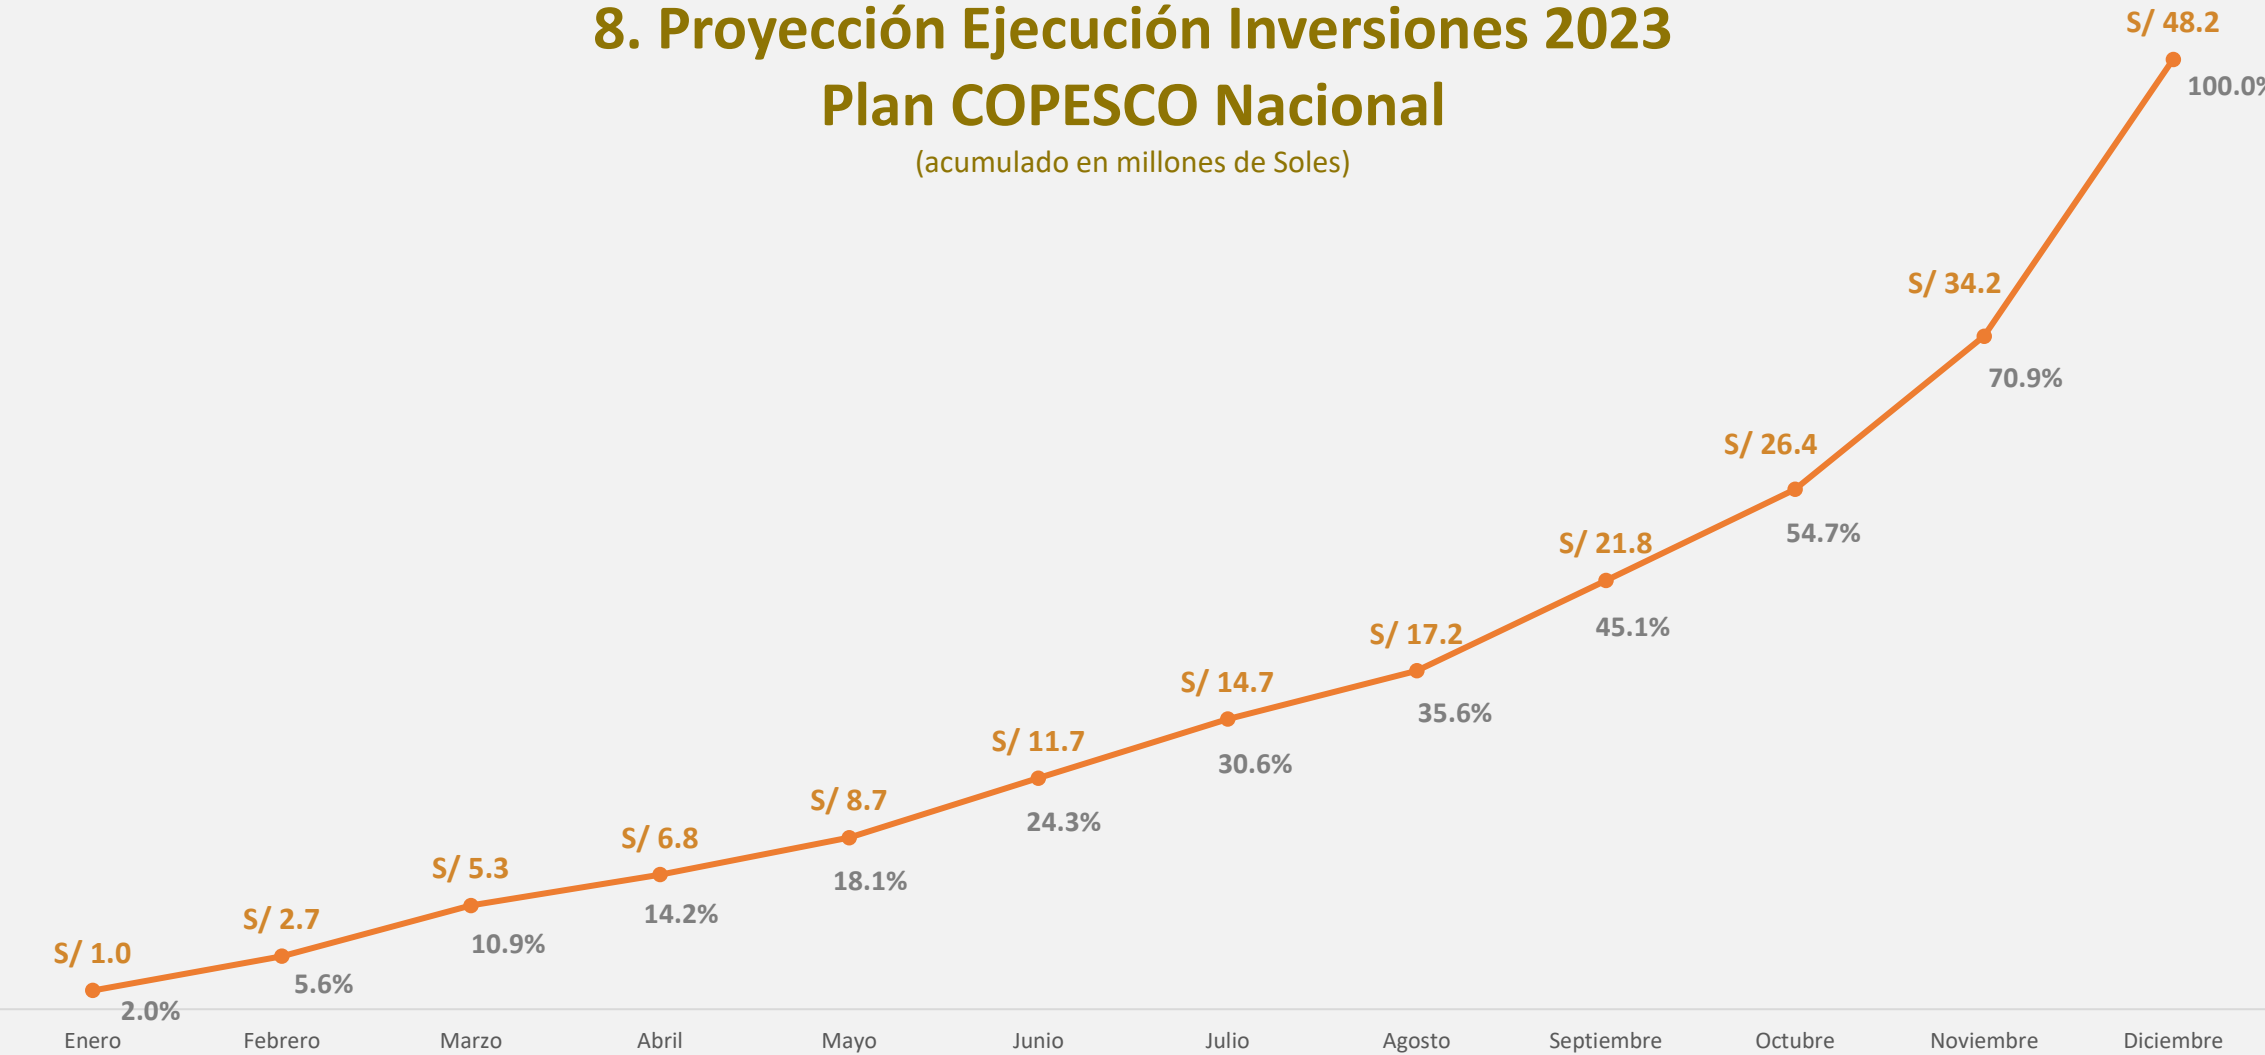

| Devengado | PIM     | Enero  | Febrero | Marzo  | Abril  | Mayo   | Junio   | Julio   | Agosto  | Septiembre | Octubre | Proyectado<br>Noviembre<br>al 30.11.2023 | Proyectado<br>Diciembre<br>al 31.12.2023 |
|-----------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|------------|---------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| Acumulado | S/ 48,2 | S/ 1.0 | S/ 2.7  | S/ 5.3 | S/ 6.8 | S/ 8.7 | S/ 11.7 | S/ 14.7 | S/ 17.2 | S/ 21.8    | S/ 26.4 | S/ 34.2                                  | S/ 48.2                                  |
| % Acum    |         | 2.0%   | 5.6%    | 10.9%  | 14.2%  | 18.1%  | 24.3%   | 30.6%   | 35.6%   | 45.1%      | 54.7%   | 70.9%                                    | 100.0%                                   |
| Mensual   |         | S/ 1.0 | S/ 1.7  | S/ 2.6 | S/ 1.6 | S/ 1.9 | S/ 3.0  | S/ 3.0  | S/ 2.5  | S/ 4.6     | S/ 4.6  | S/ 7.8                                   | S/ 14.1                                  |

## 9. 2023: OBRAS CULMINADAS Y POR CULMINAR

En el

**2023**

Plan COPESCO Nacional ejecutó a noviembre\*


**S/ 26,2 millones**

destrabando

**11 OBRAS**

por un monto de inversión de

**S/ 333,3 M**

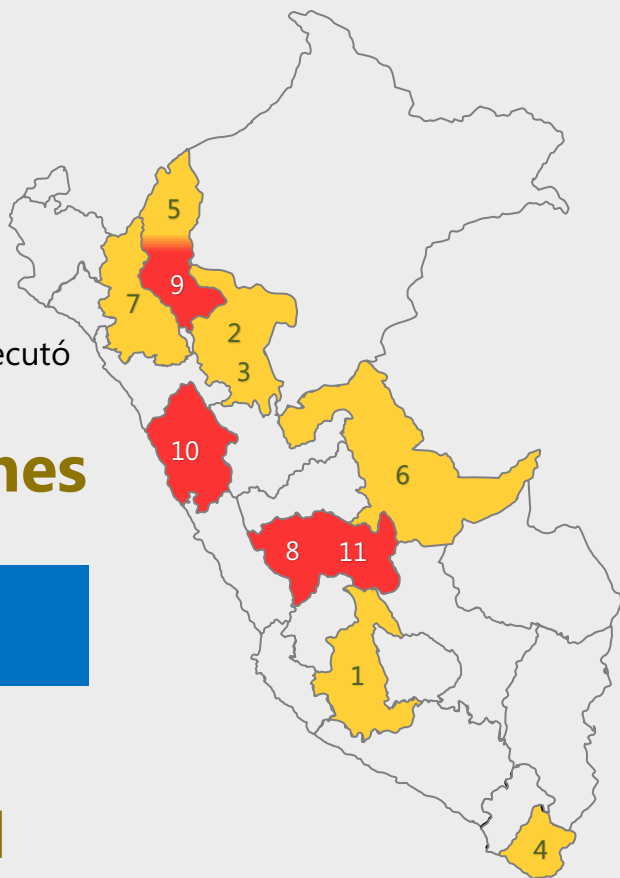

| #            | CUI     | INVERSIÓN                                                     | Monto de Inversión S/ | PIM 2023 S/   |           |
|--------------|---------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------|
| 1            | 2189844 | Ayacucho - Casa de la Capitulación Quinua (Museografía)       | 25,5 M                | 0,1 M         | CULMINADO |
| 2            | 2135288 | San Martín - Laguna Sauce (Sector Sauce)                      | 26,3 M                | 0,3 M         | CULMINADO |
| 3            | 2197828 | San Martín - Localidad de Lamas y el Barrio Kechwa            | 24,7 M                | 0,5 M         | CULMINADO |
| 4            | 2257728 | Tacna - Ferrocarril Tacna Arica (Museografía)                 | 20,4 M                | 1,7 M         | CULMINADO |
| 5            | 2345258 | Amazonas - Localidad de Tingo (Accesos)                       | 14,6 M                | 1,3 M         | CULMINADO |
| 6            | 2134075 | Ucayali - Acondicionamiento Turístico de Lago Yarinacocha     | 144,4 M               | 1,0 M         | CULMINADO |
| 7            | 2307454 | Cajamarca - Complejo Turístico Baños del Inca (Saldo de Obra) | 29,3 M                | 3,1 M         | CULMINADO |
| 8            | 2300618 | Junín - Santuario Señor de Muruhuay (Infraestructura)         | 11,6 M                | 3,8 M         | Nov 2023  |
| 9            | 2345258 | Amazonas - Localidad de Tingo (Iglesia Matriz)                | 4,9 M                 | 3,3 M         | Dic 2023  |
| 10           | 2272652 | Áncash - Campo Santo Yungay (Saldo de Obra)                   | 24,8 M                | 7,2 M         | Dic 2023  |
| 11           | 2325549 | Junín - Zona Monumental Jauja (Centro de Interpretación)      | 6,9 M                 | 3,9 M         | Dic 2023  |
| <b>TOTAL</b> |         |                                                               | <b>333,3 M</b>        | <b>26,2 M</b> |           |

\* FUENTE: Consulta amigable MEF al 20.11.2023.

# CASA DE LA CAPITULACIÓN Y MUSEO DE SITIO DE QUINUA

**MONTO DE INVERSIÓN: S/ 25,450,698**

**Beneficiarios: 207,731 habitantes**

**Obra culminada**  
**Marzo 2023**



**REGIÓN**  
**AYACUCHO**

Con la finalidad de poner en valor a Quinua, considerada la Cuna de la Independencia, MINCETUR intervino la Casa de la Capitulación y Museo de Sitio.

Se trata de una obra integral que comprende el mejoramiento de la infraestructura y museografía con un monto de inversión de S/ 25,5 millones.



**Unidad Receptora:**

**Municipalidad Distrital de Quinua**

## DESCRIPCIÓN

1. Proyección de la Batalla de Ayacucho.
2. Réplicas de murales en alto relieve.
3. Lienzos de personajes relevantes de la Independencia del Perú.
4. Artesanías contemporáneas.
5. Paneles en sistema braille.
6. Ascensores.
7. Rampas.
8. Visores de realidad virtual
9. Vitrinas.

# LAGUNA SAUCE (SECTOR SAUCE)

**MONTO DE INVERSIÓN: S/ 26,302,890**

**Beneficiarios: 10,598 habitantes**

**Obra culminada**

**Marzo 2023**



**REGIÓN**

**SAN MARTÍN**

La belleza de la Laguna Azul o Laguna Sauce se complementa con las obras ejecutadas por Plan COPESCO Nacional que requirieron una inversión de S/ 26,3 millones.

El proyecto de renovación y mejora del puerto turístico dota al distrito de Sauce de un parque temático, centro de interpretación, muelle, alameda, módulos, así como estacionamiento con capacidad para 25 autos.



**Unidad Receptora:**

**Municipalidad Distrital de Sauce**

## DESCRIPCIÓN

1. Malecón turístico.
2. Mirador.
3. Muelle.
4. Anfiteatro.
5. Estacionamiento.
6. Centro de interpretación.
7. Señalización turística.
8. Alumbrado ornamental.
9. Vías vehiculares.
10. Bermas y veredas.



# LOCALIDAD DE LAMAS Y EL BARRIO KECHWA

**MONTO DE INVERSIÓN: S/ 24,671,081**

**Beneficiarios: 579,214 habitantes**

**Obra culminada**  
**Abril 2023**



**REGIÓN**  
**SAN MARTÍN**

Lamas, ganadora de la distinción "*Pueblo con Encanto*", ahora cuenta con el centro Artesanal Waska Waska Warmi Wasi, Centro Cultural de la Etnia Lamista y parador turístico, que en conjunto, suman un área construida de 1,050 m<sup>2</sup>, con un monto de inversión de S/ 24,7 millones.

Asimismo, una plataforma de estacionamiento de 815.80 m<sup>2</sup>. La intervención permitió entregar 21 cuadras rehabilitadas.



**Unidad Receptora:**  
**Municipalidad Provincial de Lamas**

## DESCRIPCIÓN

1. Centro Artesanal Waska Waska Warmi Wasi.
2. Centro Cultural.
3. Parador Turístico.
4. Centro de interpretación.
5. Estacionamiento.
6. Acondicionamiento de áreas de descanso.
7. Acondicionamiento de las calles de la plaza principal y aledaños.

# MUSEO FERROVIARIO TACNA-ARICA

**MONTO DE INVERSIÓN: S/ 20,373,021**

**Beneficiarios: 36,253 habitantes**

**Obra culminada**

**Mayo 2023**

**REGIÓN**

**TACNA**



Comprende infraestructura, restauración, museografía y equipamiento. Es así que se han mejorado 10 ambientes en un área de intervención de 8,300 m<sup>2</sup> con un monto de inversión de S/ 20,4 millones.

Esta obra tiene características inclusivas, ya que cuenta con materiales en sistema braille y en la infraestructura con rampas y pisos podotáctiles.



**Unidad Receptora:**

**Gobierno Regional de Tacna**

## DESCRIPCIÓN

1. Acondicionamiento y equipamiento de 10 ambientes.
2. Infografías de modelos ferroviarios.
3. Videos documentales (incluye intérprete de lengua de señas y subtítulos en inglés).
4. Vitrinas y pedestales
5. Documentos históricos.
6. Pisos podotáctiles.
7. Paneles con sistema braille.



# LOCALIDAD DE TINGO (ACCESOS)

**MONTO DE INVERSIÓN: S/ 14,567,473**

**Beneficiarios: 59,037 habitantes**

**Obra culminada**  
**Agosto 2023**

**REGIÓN**  
**AMAZONAS**



La localidad de Tingo es el punto de partida hacia la Fortaleza de Kuélap. Por ello, se entregaron obras de calles y accesos de este distrito, en la provincia de Luya, en Amazonas.

La intervención cuenta con una inversión de S/ 14,6 millones y comprende un área de intervención de 1,540 metros lineales, que incluye una escalinata de 1,190 peldaños.



**Unidad Receptora:**  
**Municipalidad Distrital de Tingo**

## DESCRIPCIÓN

1. Escalinatas con 1,190 peldaños.
2. Camino a las Ánimas (acceso al Cementerio de Tingo)
3. Mirador turístico.
4. Plazoletas.
5. Iluminación con faroles.
6. Zonas de descanso.
7. Paneles informativos.
8. Servicios higiénicos.



# LAGO YARINACOCHA

**MONTO DE INVERSIÓN: S/ 144,398,514**

**Beneficiarios: 245,980 habitantes**

## Componente 1

### Boulevard

**Monto de inversión:**

**S/ 144,4 millones**

**Obra culminada**

**Unidad Ejecutora: COPESCO Nacional**

**Unidad Receptora:**

**Municipalidad Distrital de Yarinacocha**

### DESCRIPCIÓN

**Área de intervención en el Boulevard:**  
**24,061.66 m<sup>2</sup>**  
**(equivalente a 6 canchas de fútbol)**

1. Muelle artesanal.
2. Edificio de Capitanía de Puerto.
3. Muelle Turístico.
4. Edificio Mirador.
5. Juegos de niños o parque infantil.
6. Plataforma para restaurantes.
7. Baños públicos.
8. Módulos.
9. Información turística.
10. Mobiliario urbano.



## Componente 2

### Vías y accesos

**Monto de inversión:**

**S/ 9,4 millones**

**Obra en ejecución**

**Culmina Feb. 2024**

**Unidad ejecutora: GORE UCAYALI**

### DESCRIPCIÓN

MINCETUR transfirió al GORE el presupuesto para la rehabilitación de las calles y accesos como parte del proyecto de inversión.

En la quincena de diciembre, el GORE culminará los trabajos de en cementado de las calles.

En febrero del 2024 se ha proyectado culminar la obra con el adoquinado.

**Pendiente de inaugurar**  
**(fecha propuesta 15 Dic. 2023).**

# COMPLEJO TURÍSTICO BAÑOS DEL INCA

**MONTO DE INVERSIÓN: S/ 29,332,955**

**Beneficiarios: 450,226 habitantes**

**Obra culminada**  
**Octubre 2023**



**REGIÓN**  
**CAJAMARCA**

Con un monto de S/ 29,3 millones se mejoran los ambientes del Complejo Turístico Baños del Inca, considerado el principal recurso turístico de Cajamarca, por su aguas termales y su trascendencia histórica relacionada al inca Atahualpa.

Esta intervención responde al destrabe de obras de la presente gestión, así como la solicitud de la ciudadanía y autoridades de colocar en funcionamiento el Complejo Turístico que está cerrado parcialmente desde el 2017.



**Unidad Receptora:**

**Municipalidad Distrital Baños del Inca**

## DESCRIPCIÓN

Mejoramiento:

1. Boletería.
2. Oficina de información turística.
3. Equipamiento de los pabellones de turistas Antonio Raimondi y Alexander Von Humboldt.

Construcción:

1. Zona Recreacional "El Remanso".
2. Señalética turística.
3. Tratamiento paisajístico (Complejo Turístico y zona de los Perolitos).



The image shows a modern, angular concrete building with a prominent red staircase and a tall antenna tower. The building is situated on a waterfront, with a body of water and a sunset sky in the background. The sky is a mix of orange, yellow, and blue, with some clouds. The water is calm, reflecting the colors of the sky. In the foreground, there are some trees and a paved area. The overall scene is a mix of modern architecture and natural beauty.

# OBRAS POR CULMINAR

# SANTUARIO DEL SEÑOR DE MURUHUAY

**MONTO DE INVERSIÓN: S/ 11,625,388**

**Beneficiarios: 1,196,109 habitantes**

**Obra culminada:**  
**Diciembre 2023**



**REGIÓN**

**JUNÍN**

Tiene un 97% de avance y cuenta con un monto de inversión de S/ 11,6 millones.

Como es de conocimiento, cada 03 de marzo se celebra el festival del Señor de Muruhuay, y es epicentro de una de las expresiones de fervor religioso de gran envergadura, es por ello que el diseño considera espacios de reunión como un escenario para las exposiciones culturales que se complementan con vestidores, servicios higiénicos y señalización turística.



**Unidad Receptora:**

**Municipalidad Distrital de Acobamba**

## DESCRIPCIÓN

1. Mejoramiento de la vía vehicular y vías peatonales.
2. Construcción de un área para estacionamiento.
3. Construcción de terrazas.
4. Construcción de un escenario para exposición de muestras culturales.
5. Construcción y equipamiento de un centro de interpretación cultural.
6. Implementación de señalización de orientación e información turística.
7. Capacitación en buenas prácticas de calidad turística, gestión turística y cultura turística.
8. Promoción y difusión del Santuario Señor de Muruhuay.



# IGLESIA MATRIZ DE TINGO

**MONTO DE INVERSIÓN: S/ 4,908,491**

**Beneficiarios: 59,037 habitantes**

**Obra culminada:**

**Diciembre 2023**



**REGIÓN**

**AMAZONAS**

Tiene un 70.9% de avance y cuenta con un monto de inversión de S/ 4,9 millones.

Se trata de una obra de restauración que dota de nuevos recursos turísticos al distrito de Tingo, localidad que acoge a la Fortaleza de Kuélap, en Amazonas. Con la culminación del templo, se termina íntegramente el proyecto de acondicionamiento turístico del distrito de Tingo. Cabe mencionar que en agosto se inauguraron las vías de acceso turístico que unen los sectores de Bajo y Alto Tingo, a través de una escalinata que cuenta con 1,190 peldaños.



**Unidad Receptora:**

**Municipalidad Distrital de Tingo**

## DESCRIPCIÓN

Restauración:

1. Nave de feligreses.
2. Presbítero.
3. Sacristía.
4. Salón lateral.
5. Antecoro y coro alto.

Construcción:

1. Torre del campanario.
2. Servicios higiénicos.
3. Acabados de la iglesia.



# CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE JAUJA

**MONTO DE INVERSIÓN: S/ 6,942,532**

**Beneficiarios: 842,807 habitantes**

**Obra culminada:**

**Diciembre 2023**



**REGIÓN**

**JUNÍN**

Tiene un avance del 75% en las obras de restauración y mejoramiento. La obra culminará en diciembre y cuenta con un monto de inversión de S/ 6,9 millones.

Comprende la restauración de una casona antigua, que fuera la Municipalidad Provincial de Jauja muchos años atrás, en la cual se realiza una intervención integral de las fachadas y patios interiores



**Unidad Receptora:**

**Municipalidad Provincial de Jauja**

## DESCRIPCIÓN

**Área de intervención: 19,266 m<sup>2</sup>**

Restauración:

1. Fachada hacia el Jirón Ayacucho
2. Fachada lateral hacia Jirón Bolognesi
3. Patios interiores.

Mejoramiento:

1. Primer nivel (Centro de Interpretación).
2. Segundo nivel (Salas de lectura y biblioteca).



# CAMPO SANTO DE YUNGAY

**MONTO DE INVERSIÓN: S/ 24,750,571**

**Beneficiarios: 101,041 habitantes**

**Obra culminada:**

**Diciembre 2023**



**REGIÓN**

**ÁNCASH**

Tiene un 58% de avance y cuenta con un monto de inversión de S/ 24,8 millones.

La obra primigenia inició en mayo de 2018 y se resolvió en setiembre del 2019. Hasta que la presente gestión se dispuso a destrabarla con su reinicio y próxima inauguración.



**Unidad Receptora:**

**Municipalidad Provincial de Yungay**

## DESCRIPCIÓN

1. Edificio del Centro de Interpretación.
2. Ambientes para servicios generales-maestranza.
3. Área para exposición de muestras artesanales.
4. Módulo de información turística.
5. Mirador turístico con sendero (accesos peatonales).
6. Estacionamiento.

# 10. Presupuesto 2024 PCN: S/ 98,3 millones



| Concepto                           | TOTAL 2024 S/     |
|------------------------------------|-------------------|
| <b>Inversiones</b>                 | <b>85,626,878</b> |
| Exp Técnicos                       | 7,316,892         |
| Obras                              | (*) 78,309,986    |
| <b>Gestión Institucional</b>       | <b>12,692,308</b> |
| <b>Total Plan COPESCO Nacional</b> | <b>98,319,186</b> |

| #  | Inversión - EXPEDIENTE TECNICO               | PPTO<br>2024 S/  |
|----|----------------------------------------------|------------------|
| 1  | AYACUCHO: Cite Quinua                        | 466,600          |
| 2  | AMAZONAS: Catarata de Gocta (Liquidación)    | 30,000           |
| 3  | LIMA: Quinta Presa (Museografía)             | 606,363          |
| 4  | AREQUIPA: Castillo Forga                     | 605,060          |
| 5  | ICA: Muelle Pisco                            | 319,180          |
| 6  | TUMBES: Manglares de Tumbes – Zarumilla      | 672,282          |
| 7  | LA LIBERTAD: Islas de Guañape                | 450,000          |
| 8  | JUNIN: Zona Monumental de Jauja (Plazas)     | 411,303          |
| 9  | PUNO: Embarcadero de Puno                    | 854,244          |
| 10 | PIURA: Playa Cabo Blanco                     | 565,000          |
| 11 | AREQUIPA: Valle Colca - Chivay (Liquidación) | 149,620          |
| 12 | AMAZONAS: Pueblo Alfarero Huancas            | 559,000          |
| 13 | LAMBAYEQUE: Centro Poblado Huaca Rajada      | 31,660           |
| 14 | LIMA: Zona Monumental del Rímac              | 1,302,500        |
| 15 | CUSCO: Inkaraqay                             | 217,840          |
| 16 | CUSCO: Ruta 01 y ruta 02 - Caminos Inka      | 76,240           |
|    | <b>Total Exp Técnicos</b>                    | <b>7,316,892</b> |

| #  | Inversión - OBRA                                  | PPTO<br>2024 S/   |
|----|---------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | AYACUCHO: Pueblo de Quinua (Media Tensión)        | 345,102           |
| 2  | LA LIBERTAD: Nik An – Chan Chan                   | 4,761,751         |
| 3  | HUÁNUCO: Cueva Lechuzas                           | 258,224           |
| 4  | JUNÍN: Zona Monumental de Jauja (Museografía)     | 2,993,190         |
| 5  | ICA: Líneas de Nazca                              | 554,619           |
| 6  | AREQUIPA: Valle del Colca, Chivay (Saldo de obra) | 1,050,658         |
| 7  | LAMBAYEQUE: Huaca Rajada (Centro Poblado Sipán)   | 4,869,637         |
| 8  | AREQUIPA: Cañón del Colca                         | 1,180,214         |
| 9  | CUSCO: Llaqta Machu Picchu                        | 6,081,884         |
| 10 | AMAZONAS: Plz. de Chachapoyas                     | 1,757,067         |
| 11 | AMAZONAS: Catarata de Gocta                       | 4,059,220         |
| 12 | LA LIBERTAD: Malecón Grau                         | 23,783,420        |
| 13 | PUNO: Embarcadero Llachón                         | 9,852,338         |
| 14 | LA LIBERTAD: Islas de Guañape                     | 2,292,136         |
| 15 | LIMA: Quinta Presa, Rímac (Infraestructura)       | 12,177,581        |
| -  | 16 obras en liquidación, arbitraje, seguimiento   | 2,292,945         |
|    | <b>Total Obras</b>                                | <b>78,309,986</b> |

(\*) Recursos provenientes del Fondo de Promoción y Desarrollo Turístico S/ 22,335,081:

S/ 12,177,581 Quinta Presa; S/ 4,434,632 Malecón Grau Pacasmayo; S/ 3,988,035 Embarcadero Llachón; S/ 1,180,214 Cañón del Colca Cabanaconde; S/ 554,619 Líneas Nazca.





**GRACIAS**

