

INFORME DE GESTIÓN

Comisión
Especial
Multipartidaria
del Bicentenario
de la
Independencia
del Perú.

Periodo anual
2024-2025



INTRODUCCIÓN

I. ANTECEDENTES

II. OBJETIVO DEL INFORME

III. OBJETIVOS GENERALES DEL TRABAJO DE LA COMISIÓN

IV. ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA COMISIÓN ESPECIAL MULTIPARTIDARIA BICENTENARIO

4.1 EN EL ÁMBITO DE LA FISCALIZACIÓN

4.2 PEDIDOS DE INFORMACIÓN

4.3 EN EL ÁMBITO INTERNO DEL CONGRESO

V. ACTIVIDADES REALIZADAS.

VI. ANALISIS DEL ESTADO SITUACIONAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSION DE LA AGENDA DE CONMEMORACION DEL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DEL PERU

VII. SESIONES DE LA COMISIÓN

VIII. REGISTRO DE ASISTENCIA A LAS SESIONES DE LA COMISIÓN

IX. ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS

INTRODUCCIÓN

Cumpliendo el encargo del Pleno del Congreso, la Comisión Especial Multipartidaria del Bicentenario de la Independencia del Perú, durante el período parlamentario 2021-2026, ha desarrollado actividades culturales y conmemorativas alusivas a los principales sucesos de nuestra historia republicana y bicentenario del Poder Legislativo, y viene desarrollando acciones de coordinación, seguimiento y monitoreo de la ejecución del listado de proyectos de inversión incorporados en la Agenda de Conmemoración del Bicentenario de la Independencia del Perú¹.

Asimismo, cumpliendo el Acuerdo de Consejo Directivo N° 062-2022-2023/CONSEJO-CR, en el cual se aprobó la propuesta de la Presidencia y la Mesa Directiva para que las comisiones especiales presenten al Consejo Directivo un informe sobre el avance del desarrollo de sus planes de trabajo y objetivos desde el inicio de sus actividades hasta la fecha, a fin de evaluar su continuidad, en atención de dicho acuerdo, presentamos los avances que corresponden al cuarto trimestre del año 2024 (Octubre, Noviembre y Diciembre)

El trabajo realizado por la Comisión Especial Bicentenario representa el compromiso de todos sus miembros para trabajar de forma conjunta, ordenada y oportuna, en los temas en los que coincidimos merecen atención prioritaria para continuar los actos conmemorativos del Bicentenario de la República, destacando en el presente trimestre la conmemoración del Bicentenario de la Batalla de Ayacucho.

Lima, 03 de enero de 2025

¹ Aprobada mediante Decreto Supremo 011-2021-MC.

I. ANTECEDENTES

El 06 de junio del 2018, mediante Decreto Supremo N° 004-2018-MC, se crea el Proyecto Especial Bicentenario de la Independencia del Perú, con el objeto de formular la Agenda de Conmemoración del Bicentenario de la Independencia del Perú y, ejecutar, articular y dar seguimiento a las acciones requeridas para dicha conmemoración, con alto valor simbólico para el ejercicio de una ciudadanía democrática y de fortalecimiento de la identidad nacional, Proyecto Especial, adscrito al Ministerio de Cultura.

Con fecha, 16 de Octubre del 2018, mediante Decreto Supremo N° 009-2018-MC, se aprueba la Agenda de Conmemoración del Bicentenario de la Independencia del Perú, estableciéndose en dicho decreto la naturaleza dinámica de esta agenda, es así, que fue actualiza mediante Decreto Supremo N° 159-2020- PCM; posteriormente, mediante Decreto Supremo N° 011-2021-MC, se aprobó la segunda actualización de la Agenda de Conmemoración del Bicentenario de la Independencia del Perú, que se encuentra vigente hasta la fecha. La Agenda de Conmemoración del Bicentenario de la Independencia del Perú contempla seis (06) programas que se implementan a nivel nacional:

- 1) Programa Cultural y Académico
- 2) Agenda Internacional
- 3) Conmemoración Histórica
- 4) Programa de Valores Bicentenario
- 5) Parques Culturales Bicentenario
- 6) Obra

El 21 de octubre del 2021, durante el periodo parlamentario 2021- 2026, el Pleno del Congreso de la República aprobó las Mociones 440 y 500 para constituir la Comisión Especial Multipartidaria del Bicentenario de la Independencia del Perú, para el Periodo Parlamentario 2021 - 2026, a fin de que, entre otras desarrolle acciones de coordinación, seguimiento y monitoreo a la ejecución de los proyectos de inversión pública incluidos en la Agenda de Conmemoración del Bicentenario de la Independencia del Perú, encargándosele lo siguiente:

1. Desarrollar acciones de coordinación, seguimiento y monitoreo a la ejecución de los proyectos de inversión pública incluidos en la Agenda de Conmemoración del Bicentenario de la Independencia del Perú, aprobada mediante Decreto Supremo N° 011-2021-MC.

2. Realizar actividades conmemorativas a la Batalla de Junín y a la Batalla de Ayacucho, trascendentales gestas para nuestra historia republicana, que culminó con la independencia definitiva del Perú y del continente americano.

El cuadro nominativo de los congresistas que integran la Comisión Especial Multipartidaria del Bicentenario de la Independencia del Perú, durante el período parlamentario 2021-2026 fue aprobado en el pleno del congreso con fecha 25 de noviembre del 2021 y puesto en conocimiento por el Oficial Mayor mediante Oficio 1314-2021-2022/ADP-M-CR de fecha 26 de noviembre del 2021, designándosele al congresista Miguel Ciccía Vásquez, el rol de coordinador de la Junta Preparatoria para el acto eleccionario de la comisión.

Con fecha 13 y 20 de diciembre de 2021, se desarrolló la sesión de elección e instalación de la comisión, donde se eligió, por unanimidad, a los miembros de la Mesa Directiva, quedando conformada de la siguiente manera:

APELLIDOS Y NOMBRES	GRUPO PARLAMENTARIO	CARGO	E-MAIL
 Alegría García Arturo	FUERZA POPULAR	Presidente	aalegria@congreso.gob.pe
 Cavero Alva Alejandro Enrique	AVANZA PAÍS - PARTIDO DE INTEGRACIÓN SOCIAL	VicePresidente	acavero@congreso.gob.pe
 Ciccía Vásquez Miguel Angel	RENOVACIÓN POPULAR	Secretario	mciccia@congreso.gob.pe
 Elías Ávalos José Luis	PODEMOS PERÚ	Titular	jelias@congreso.gob.pe
 Juárez Calle Heidy Lisbeth	ALIANZA PARA EL PROGRESO	Titular	hjuarez@congreso.gob.pe
 Palacios Huamán Margot	PERÚ LIBRE	Titular	mpalaciosh@congreso.gob.pe
 Soto Palacios Wilson	ACCION POPULAR	Titular	wsoto@congreso.gob.pe
 Sánchez Palomino Roberto Helbert	JUNTOS POR EL PERÚ	Titular	rsanchezp@congreso.gob.pe

Fuente. Página Web Congreso de la República.

El congresista Castillo Rivas fue incorporado en la sesión del Pleno del 17 de junio de 2022.

En la sesión del Pleno del Congreso de fecha 4 de mayo de 2023 se hicieron cambios en el cuadro de comisiones y la comisión incorporó en

reemplazo del congresista Luis Arturo Alegría García, a la congresista Leslie Vivian Olivos Martínez, quien fue elegida en el cargo de presidenta en la décimo primera sesión ordinaria de la Comisión Especial Bicentenario realizada el día 9 de mayo de 2023, quedando conformada la mesa directiva de la comisión de la siguiente manera:



Fuente. Página Web Congreso de la República.

En tal sentido, la comisión quedó conformada de la siguiente forma:

Comisión especial multipartidaria conmemorativa del bicentenario de la independencia del Perú				
Periodo Parlamentario 2021-2026				
Integrantes				
	APELLIDOS Y NOMBRES	GRUPO PARLAMENTARIO	CARGO	E-MAIL
	Olivos Martínez Vivian	FUERZA POPULAR	Presidenta	lolivosm@congreso.gob.pe
	Cavero Alva Alejandro Enrique	AVANZA PAÍS - PARTIDO DE INTEGRACIÓN SOCIAL	VicePresidente	acavero@congreso.gob.pe
	Ciccía Vásquez Miguel Angel	RENOVACIÓN POPULAR	Secretario	mciccia@congreso.gob.pe
	Castillo Rivas Eduardo Enrique	FUERZA POPULAR	Titular	ecastillor@congreso.gob.pe
	Elías Ávalos José Luis	NO AGRUPADO	Titular	jelias@congreso.gob.pe
	Palacios Huamán Margot	PERÚ LIBRE	Titular	mpalacios@congreso.gob.pe
	Soto Palacios Wilson	ACCION POPULAR	Titular	wsoto@congreso.gob.pe
	Sánchez Palomino Roberto Helbert	CAMBIO DEMOCRÁTICO - JUNTOS POR EL PERÚ	Titular	rsanchezp@congreso.gob.pe

Fuente. Página Web Congreso de la República

Respecto al Plan de Trabajo, conforme a los procedimientos parlamentarios, este fue aprobado en la primera sesión ordinaria, de fechas 14 de febrero del 2022 y en la décimo segunda sesión ordinaria de fecha 19 de mayo del 2023 se incorporaron algunas actividades al citado plan.

Posteriormente, se hicieron cambios en el cuadro de comisiones, en la sesión del Pleno del Congreso de fecha 17 de agosto del 2023, se retiró el congresista Roberto Helbert Sánchez Palomino y en la sesión del Pleno del Congreso de fecha 7 de setiembre del 2023 se retiró el congresista Wilson Soto Palacios; y puesto en conocimiento por el Oficial Mayor mediante Oficio 395-2021-2023-2024-ADP-D/CR de fecha 18 de agosto del 2023 y Oficio 525-2021-2023-2024-ADP-D/CR de fecha 8 de setiembre del 2023, respectivamente.

Con fecha 04 de octubre del 2023 mediante Oficio N° 083-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR y Oficio N° 084-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR, se solicitó a los voceros de los grupos parlamentarios Acción Popular y Cambio Democrático-Juntos por el Perú, respectivamente, propongan al pleno a los nuevos representantes de sus grupos parlamentarios; es así que, en la sesión del Pleno del 18 de octubre de 2023, fue incorporado el congresista Jorge Luis Flores Ancachi, a propuesta del grupo parlamentario Acción Popular; y puesto en conocimiento por el Oficial Mayor mediante Oficio 878-2023-2024-2024-ADP-D/CR de fecha 19 de octubre del 2023.

Posteriormente, se hicieron cambios en el cuadro de comisiones, en la sesión del Pleno del Congreso de fecha 31 de octubre del 2024, salió el congresista José Luis Elías Ávalos y en su lugar ingresó la congresista Heidy Lisbeth Juárez Calle, a propuesta del grupo parlamentario Podemos Perú; y en la sesión del Pleno del Congreso de fecha 21 de noviembre del 2024 ingresó el congresista José Luis Elías Ávalos, a propuesta del grupo parlamentario Alianza Para el Progreso; y puesto en conocimiento por el Oficial Mayor mediante Oficio 682-2024-2025-ADP-D/CR de fecha 4 de noviembre del 2024 y Oficio 750-2024-2025-ADP-D/CR de fecha 22 de noviembre del 2024, respectivamente. Por último, en la sesión del Pleno del Congreso de fecha 14 de diciembre del 2024, se dieron cambios al cuadro de comisiones, se retiró la congresista Margot Palacios Huamán; y puesto en conocimiento por el Oficial Mayor mediante Oficio 845-2024-2025-ADP-D/CR de fecha 16 de diciembre del 2024.

Actualmente la Comisión está integrada por los siguientes representantes distribuidos entre los Grupos Parlamentarios de la siguiente manera:

GRUPO PARLAMENTARIO	MIEMBRO TITULAR
FUERZA POPULAR	Olivos Martínez, Vivian
AVANZA PAÍS - PARTIDO DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Cavero Alva, Alejandro Enrique

RENOVACIÓN POPULAR	Ciccia Vásquez, Miguel Ángel
FUERZA POPULAR	Castillo Rivas, Eduardo Enrique
ACCION POPULAR	Flores Ancachi, Jorge Luis
PODEMOS PERU	Heidy Lisbeth Juárez Calle
ALIANZA PARA EL PROGRESO	Elías Ávalos, José Luis
CAMBIO DEMOCRATICO – JUNTOS POR EL PERU	No acreditó (reemplazo Congresista Roberto Helbert Sánchez Palomino)
PERÚ LIBRE	No acreditó (reemplazo Congresista Margot Palacios Huamán)

Fuente: Comisión Especial Bicentenario.

INTEGRANTES DE LA COMISION ESPECIAL



Alejandro Enrique Cavero Alva
Vicepresidente



Vivian Olivos Martínez
Presidenta



Miguel Ángel Ciccia Vásquez
Secretario



Eduardo Enrique Castillo Rivas
Titular



Jorge Luis Flores Ancachi
Titular



José Luis Elías Ávalos
Titular



Heidy Lisbeth Juárez Calle
Titular

II. OBJETIVO DEL INFORME

El presente informe tiene como objetivo mostrar el trabajo de la comisión a partir del período anual de sesiones 2021-2022, 2022-2023 y 2023-2024 y la labor realizada dentro del periodo anual de sesiones 2024-2025, entregas trimestrales de los avances del plan de trabajo, a través del informe de gestión, en este caso el correspondiente al cuarto trimestre del 2024 (Octubre, Noviembre y Diciembre), conforme al Oficio Circular 105-2023-2024-ADP-CD/CR, indicando los principales resultados de las acciones de coordinación, seguimiento y monitoreo de la ejecución de lo proyectos de inversión incorporados en la Agenda de Conmemoración del Bicentenario de la Independencia del Perú, sobre las sesiones realizados y las actividades efectuadas; así como, las conclusiones y recomendaciones pertinentes.

III. OBJETIVOS GENERALES DEL TRABAJO DE LA COMISIÓN

- a) Promover la realización de múltiples actividades culturales conmemorativas, publicaciones y conferencias sobre el período histórico de la Independencia y el rol del Poder Legislativo en la construcción de la República.
- b) Promover la identificación, implementación, restauración y conservación del Patrimonio Cultural y Arquitectónico vinculado a estas efemérides.
- c) Promover la participación de toda la población del país a fin de crear conciencia sobre la importancia de celebrar el Bicentenario de la Independencia del Perú y el establecimiento del Primer Congreso Constituyente.
- d) Promover el reconocimiento de la memoria de héroes y mártires que lucharon en el proceso de independencia.
- e) Divulgar la importancia del papel de la mujer en el proceso de la independencia.
- f) Conmemorar a los patriotas que formaron parte del Congreso Constituyente durante la época republicana.

IV. ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA COMISIÓN ESPECIAL MULTIPARTIDARIA BICENTENARIO

4.1 EN EL ÁMBITO DE LA FISCALIZACIÓN

En ejercicio del control político contemplado en la Constitución Política del Perú, esta comprende según el artículo 5 del Reglamento del Congreso de la República “La función del control político comprende la investidura del Consejo de Ministros, el debate, la realización de actos e investigaciones y la aprobación de acuerdos sobre la conducta política del Gobierno, los actos de la administración y de las autoridades del Estado, el ejercicio de la delegación de facultades legislativas, el dictado de decretos de urgencia y la fiscalización sobre el uso y la disposición de bienes y recursos públicos, el cumplimiento por el Presidente de la República del mensaje anual al Congreso de la República y el antejuicio político, cuidando que la Constitución Política y las leyes se cumplan y disponiendo lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad de los infractores”.

En ese sentido, la comisión especial ha promovido las siguientes acciones de control y fiscalización:

- Fiscalización de las obras que tienen a su cargo como Unidades Ejecutoras los tres niveles de gobierno – Ministerios, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, que forman parte y están incluidas en la agenda de Conmemoración del Bicentenario de la República 2022-2024, cuya segunda actualización fuera aprobada por Decreto Supremo 011–2021-MC.
- Seguimiento del Patrimonio arqueológico de la Nación que se encuentra en situación de riesgo permanente.

4.2 PEDIDOS DE INFORMACIÓN

De conformidad con lo establecido en los artículos 96° de la Constitución Política del Perú y 87° del Reglamento del Congreso “Cualquier congresista puede pedir a los ministros, al Jurado Nacional de Elecciones, al contralor general, al Banco Central de Reserva, a la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, a los gobiernos regionales y locales y a todos los demás organismos del sector público, los informes que estime necesarios para el ejercicio de su función”.

En cumplimiento del plan de trabajo y de conformidad con las normas que se han citado, la comisión especial ha requerido información a diversas entidades de los tres niveles de gobierno, conforme al siguiente detalle:

N°	OFICIOS	FECHA	ENTIDAD	ASUNTO
1	N° 003-2022-2023-LVOM-CEMBI/CR	22/05/2023	Director Ejecutivo del Proyecto Especial Bicentenario de la Independencia del Perú	Solicitud de Información, sobre acuerdo aprobado en la décimo segunda sesión ordinaria de la comisión.
2	004-2022-2023-LVOM-CEMBI/CR	22/05/2023	Director Ejecutivo del Proyecto Especial Bicentenario de la Independencia del Perú	Solicitud de información referida a la décimo segunda sesión ordinaria de la comisión
3	N° 006-2022-2023-LVOM-CEMBI/CR	26/05/2023	Congresista Margot Palacios Huamán	Solicitud de información sobre el pedido realizado en la Décimo Segunda Sesión Ordinaria.
4	N° 008-2022-2023-LVOM-CEMBI/CR	31/05/2023	Ministra de Cultura	Solicitud de reunión de trabajo para la restauración del Balcón de Huaura.
5	N° 009-2022-2023-LVOM-CEMBI/CR	31/05/2023	Ministra de Cultura	Solicitud de información sobre los proyectos Histórico Balcón de Huara y Parque Cultural del Bicentenario del distrito de Huacho.
6	N° 010-2022-2023-LVOM-CEMBI/CR	07/06/2023	Alcalde de la Municipalidad Distrital de Huaura	Solicitud de información sobre las acciones que se han realizado para la restauración del Balcón de Huaura.
7	N° 011-2022-2023-LVOM-CEMBI/CR	08/06/2023	Ministra de Cultura	Solicitud de información relacionada a la ejecución de la obra restauración y puesta en valor del Museo del Congreso y de la Inquisición.
8	N° 012-2022-2023-LVOM-CEMBI/CR	08/06/2023	Contralor General de la Republica.	Solicitud de información sobre auditoria de control simultaneo y acciones de cumplimiento de las obras de restauración del Museo del Congreso y de la Inquisición.
9	N° 013-2022-2023-LVOM-CEMBI/CR	07/06/2023	Gobernadora Regional de Lima	Solicitud de información sobre el proyecto Monumento Histórico Asociado al Balcón de Huaura.
10	N° 014-2022-2023-LVOM-CEMBI/CR	08/06/2023	Congresista José Enrique Jeri	Invitación a reunión técnica de trabajo, restauración del histórico Balcón de Huaura.
11	N° 015-2022-2023-LVOM-CEMBI/CR	08/06/2023	Congresista Segundo Héctor Acuña Peralta	Invitación a reunión técnica de trabajo, restauración del histórico Balcón de Huaura.
12	N° 016-2022-2023-LVOM-CEMBI/CR	08/06/2023	Alcalde de la Municipalidad distrital de Huaura	Invitación a reunión técnica de trabajo, restauración del histórico Balcón de Huaura.
13	N° 017-2022-2023-LVOM-CEMBI/CR	08/06/2023	Gobernadora Regional de Lima	Invitación a reunión técnica de trabajo, restauración del histórico Balcón de Huaura.
14	N° 018-2022-2023-LVOM-CEMBI/CR	08/06/2023	Consejera regional por la provincia de Huaura	Invitación a reunión técnica de trabajo, restauración del histórico Balcón de Huaura.
15	N° 019-2022-2023-LVOM-CEMBI/CR	08/06/2023	Congresista Luis Gustavo Cordero Jon Tay.	Invitación a reunión técnica de trabajo, restauración del histórico Balcón de Huaura.

16	N° 020-2022-2023-LVOM-CEMBI/CR	08/06/2023	Congresista Javier Rommel Padilla Romero	Invitación a reunión técnica de trabajo, restauración del histórico Balcón de Huaura.
17	N° 021-2022-2023-LVOM-CEMBI/CR	08/06/2023	Congresista Janet Milagros Rivas Chacara.	Invitación a reunión técnica de trabajo, restauración del histórico Balcón de Huaura.
18	N° 022-2022-2023-LVOM-CEMBI/CR	08/06/2023	Congresista Alejandro Enrique Caverro Alva.	Invitación a reunión técnica de trabajo, restauración del histórico Balcón de Huaura.
19	N° 023-2022-2023-LVOM-CEMBI/CR	08/06/2023	Congresista Miguel Ángel Ciccía Vásquez	Invitación a reunión técnica de trabajo, restauración del histórico Balcón de Huaura.
20	N° 024, N° 025, N° 026, N° 027, y N° 028-2022-2023-LVOM-CEMBI/CR	08/06/2023	Congresistas Eduardo Enrique Catillo Rivas. José Luis Elia Avalos Wilson Soto Palacios Roberto Helbert Sánchez Palomino Margot Palacios Huamán	Invitación a reunión técnica de trabajo, restauración del histórico Balcón de Huaura.
21	N° 037-2022-2023-LVOM-CEMBI/CR	14/06/2023	Gobernadora Regional de Lima	Solicitud de información sobre inspección técnica de la primera parte del museo Balcón de Huaura.
	N° 043-2022-2023-LVOM-CEMBI/CR	21/06/2023	Gobernadora Regional de Lima	Solicitud de información sobre el Proyecto "Mejoramiento y ampliación del servicio de transitabilidad vehicular peatonal del Circuito Bicentenario de la Independencia en 5 distritos de la provincia de Huaura tramo I, II, III y IV.
22	N° 048-2022-2023-LVOM-CEMBI/CR	23/06/2023	Director Ejecutivo del Proyecto Especial Bicentenario.	Solicitud de información sobre las obras que forman parte de la Agenda de Conmemoración del Bicentenario relacionada al departamento de Junín.
23	N° 049-2022-2023-LVOM-CEMBI/CR	05/07/2023	Ministra de Cultura	Reiteración solicitud de información sobre el estado situacional de los proyectos Histórico Balcón de Huaura y Parque Cultural del Bicentenario del distrito de Huacho.
24	N° 054-2022-2023-LVOM-CEMBI/CR	07/07/2023	Contralor General de la Republica	Solicitud de información sobre el estado situacional y acciones de control de la obra intercambio vial bicentenario.
25	N° 055-2022-2023-LVOM-07/07/ 2022-2023CEMBI/CR	13/07/2023	Ministro de Comercio Exterior y Turismo.	Solicitud de información sobre solicitudes para oficializar la Festividad Ritual del Vichama Raymi. (Decreto Supremo N° 004-2002-MINCETUR).
26	N° 001-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	08/08/2023	Gobernadora Regional de Lima.	Solicitud de reunión de trabajo preliminar para organizar mesas técnicas de trabajo relacionado a la Ruta del Libertador.
27	N° 002-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	08/08/2023	Ministra de Cultura	Reiteración solicitud de información sobre proyecto denominado "Creación de Servicios Culturales a través del Parque Cultural Bicentenario en Lima, distrito de Huacho, provincia de Huaura.
28	N° 057-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	21/08/2023	Alcalde de la Municipalidad Distrital de Huaura.	Traslado de Resolución N° 0783-2023/SBN-DGPE-SDAPE, primera inscripción de dominio del inmueble denominado "Balcón de Huaura"

29	N° 062-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	07/09/2023	Presidente del directorio del Banco de Reserva del Perú	Solicitud de información respecto a la actividad "Serie Numismática Alusiva al Bicentenario de la Independencia del Perú"
30	N° 063-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	07/09/2023	Ministra de Cultura	Solicitud de reunión de trabajo respecto a la oficialización como festividad ritual de Identidad Nacional del Vichama Raymi.
31	N° 074-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	07/09/2023	Ministra de Cultura	Solicitud de información sobre hechos históricos que forman parte de la Ruta de la Independencia.
32	N° 078-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	27/09/2023	Ministra de Cultura	Solicitud de Información sobre las 210 obras pendientes de ejecución que forman parte de la Agenda de Conmemoración del Bicentenario de la Independencia del Perú.
33	N°085-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	04/10/2023	Ministra de Desarrollo Agrario y Riego	Solicitud de información sobre los proyectos de inversión a su cargo como unidad ejecutora y que se encuentran paralizados.
34	N° 086-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	04/10/2023	Ministro de Energía y Minas	Solicitud de información sobre los proyectos de inversión a su cargo como unidad ejecutora y que se encuentran paralizados.
35	N° 087-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	04/10/2023	Ministro de Salud	Solicitud de información sobre los proyectos de inversión a su cargo como unidad ejecutora y que se encuentran paralizados.
36	N° 088-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	04/10/2023	Ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento ,	Solicitud de información sobre los proyectos de inversión a su cargo como unidad ejecutora y que se encuentran paralizados.
37	N° 089-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	04/10/2023	Gobernador Regional de Apurímac	Solicitud de información sobre los proyectos de inversión a su cargo como unidad ejecutora y que se encuentran paralizados.
38	N°090-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	04/10/2023	Gobernador Regional de Ayacucho	Solicitud de información sobre los proyectos de inversión a su cargo como unidad ejecutora y que se encuentran paralizados.
39	N° 091-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	04/10/2023	Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión	Solicitud de información sobre los proyectos de inversión a su cargo como unidad ejecutora y que se encuentran paralizados.
40	N° 092-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	04/10/2023	Ministra de la Producción	Solicitud de información sobre los proyectos de inversión a su cargo como unidad ejecutora y que se encuentran paralizados.
41	N° 094-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	04/10/2023	Gobernador Regional de Tacna	Solicitud de información sobre los proyectos de inversión a su cargo como unidad ejecutora y que se encuentran paralizados.
42	N° 095-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	04/10/2023	Ministro de Transportes y Comunicaciones	Solicitud de información sobre los proyectos de inversión a su cargo como unidad ejecutora y que se encuentran paralizados.
43	N° 096-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	04/10/2023	Superintendente Nacional de Bienes Estatales.	Solicitud de información sobre el trámite ante la SUNARP de la Primera Inscripción de Dominio del Balcón de Huaura.
44	N°097, N°098, N°099, N°0100, N°0101, N°0102, y N°0103-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	13/10/2023	Gobernadora Regional de Lima, Ministra de Cultura, Alcaldes: Municipalidad Provincial de Huara. Municipalidad Provincial de Barranca.	Solicitud de reunión de trabajo respecto a la creación de la Dirección Desconcentrada de Cultura para la región Lima.

			Municipalidad Distrital de Chancay. Municipalidad Provincial de Huaral. Director de Punto de Cultura.	
45	N° 0106-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	25/10/2022-2023	Ministra de Cultura.	Solicitud de convocatoria a una mesa técnica de trabajo sobre la creación de la Dirección Desconcentrada de Cultura para Lima Provincias.
46	N° 0109-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	26/10/2023	Gobernador Regional de Huancavelica.	Solicitud de información sobre los proyectos de inversión a su cargo como unidad ejecutora y que se encuentran paralizados.
47	N° 0110-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	26/10/2023	Gobernador Regional de Lambayeque.	Solicitud de información sobre los proyectos de inversión a su cargo como unidad ejecutora y que se encuentran paralizados.
48	N° 0111-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	26/10/2023	Gobernador Regional de Arequipa	Solicitud de información sobre los proyectos de inversión a su cargo como unidad ejecutora y que se encuentran paralizados.
49	N°0113-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	30/10/2023	Contralor General de la República.	Solicitud de información sobre los servicios de control de proyectos de inversión que se encuentran paralizados.
50	N° 0270-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	20/11/2023	Alcalde de la Municipalidad Distrital de Huaura.	Traslado de respuesta de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, respecto a la primera Inscripción de Dominio del terreno que corresponde al Balcón de Huaura.
51	N° 0275-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	22/11/2023	Ministra de Cultura	Solicitud proponiendo reunión de trabajo respecto a la Creación de la Dirección Desconcentrada de Cultura para Lima Provincias.
52	N° 0281-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	11/12/2023	Presidente del Consejo de Ministros	Solicitud de reunión de trabajo respecto a la Creación de la Dirección Desconcentrada de Cultura para Lima Provincias.
53	N° 0282-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	11/12/2023	Ministra de Cultura	Solicitud de información respecto a la actualización del expediente técnico del monumento histórico asociado al Balcón.
54	N° 0283-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	11/12/2023	Superintendente Nacional de Bienes Estatales	Solicitud de información sobre informe legal, a favor de la Municipalidad Distrital de Huaura, respecto al predio de 1,823.46 m2, ubicado en la Avenida San Martin N° 298, que corresponde al Balcón de Huaura.
55	N° 0285-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	19/12/2023	Municipalidad Distrital de Huaura	Traslado de respuesta del Ministerio de Cultura, sobre convenio para que realicen labores conjuntas destinadas a la conservación, protección, puesta en valor, promoción y difusión del patrimonio cultural.
56	N° 0286-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	27/12/2023	Presidente del Directorio del Banco Central de Reserva del Perú	Solicitud de información respecto a la emisión de dos series numismáticas, y propuesta para que se considere en la serie numismática "Constructores de la Republica Bicentenario 1821-2021", a don ANDRÉS REYES y BUITRON.
57	N° 0287-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	09/01/2024	Ministra de Desarrollo Agrario y Riego	Reiteración de solicitud de información sobre los proyectos de inversión a su cargo como unidad ejecutora y que se encuentran paralizados.
58	N° 0288-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	09/01/2024	Ministro de Energía y Minas.	Reiteración de solicitud de información sobre los proyectos de inversión a su cargo como unidad ejecutora y que se encuentran paralizados.
59	N° 0289-2023-2024-	09/01/2024	Ministro de Salud	Reiteración de solicitud de información sobre los

	LVOM-CEMBI/CR			proyectos de inversión a su cargo como unidad ejecutora y que se encuentran paralizados.
60	N° 0290-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	09/01/2024	Ministra Vivienda, Construcción y Saneamiento	Reiteración de solicitud de información sobre los proyectos de inversión a su cargo como unidad ejecutora y que se encuentran paralizados.
61	N° 0291-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	09/01/2024	Gobernador Regional de Apurímac.	Reiteración de solicitud de información sobre los proyectos de inversión a su cargo como unidad ejecutora y que se encuentran paralizados.
62	N° 0292-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	09/01/2024	Alcalde de la Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión.	Reiteración de solicitud de información sobre los proyectos de inversión a su cargo como unidad ejecutora y que se encuentran paralizados.
63	N° 0293-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	09/01/2024	Ministra de Producción.	Reiteración de solicitud de información sobre los proyectos de inversión a su cargo como unidad ejecutora y que se encuentran paralizados.
64	N ° 0294-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	09/01/2024	Gobernador Regional de Tacna.	Reiteración de solicitud de información sobre los proyectos de inversión a su cargo como unidad ejecutora y que se encuentran paralizados.
65	N° 0295-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	09/01/2024	Ministro de Transportes y Comunicaciones.	Reiteración de solicitud de información sobre los proyectos de inversión a su cargo como unidad ejecutora y que se encuentran paralizados.
66	N° 0296-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	09/01/2024	Gobernador Regional de Huancavelica.	Reiteración de solicitud de información sobre los proyectos de inversión a su cargo como unidad ejecutora y que se encuentran paralizados.
67	N° 0297-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	09/01/2024	Contralor General de la República.	Reiteración de solicitud de información sobre los servicios de control de proyectos de inversión que se encuentran paralizados.
68	N° 298-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	10/01/2024	Ministra de Cultura	Solicitud de información sobre las actividades conmemorativas programadas para este año 2024 con relación a la batalla de Ayacucho y la batalla de Junín.
69	N° 299-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	10/01/2024	Gobernador Regional de Junín.	Solicitud de información sobre las actividades conmemorativas programadas para este año 2024 en relación a la batalla de Junín
70	N° 300-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	10/01/2024	Alcalde de la Municipalidad Provincial de Huamanga.	Solicitud de información sobre las actividades conmemorativas programadas para este año 2024 en relación con la batalla de Ayacucho
71	N° 301-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	12/01/2024	Oficial Mayor del Congreso de la República.	Se envió informe trimestral sobre el avance del Plan de Trabajo de la Comisión Especial del Bicentenario, correspondiente al periodo octubre - diciembre del año 2023.
72	N° 302-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	15/01/2024	Presidenta de la Comisión de Constitución y Reglamento	Remitimos información con referencia al oficio N° 0325-2023-2024-CCR/CR, respecto a la opinión del Proyecto de Ley 5836/2023-PE.
73	N° 303-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	17/01/2024	Director General Parlamentario del Congreso de la República.	Se remitió información con referencia al oficio N° 658-1373478-11-2023-2024-DGP-OM-CR, solicitud de acceso a la información pública DDZ240107. (RU 1373478).
74	N° 305-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	12/01/2024	Gobernador Regional de Ayacucho	Solicitud de información sobre las actividades conmemorativas programadas para este año 2024 en relación con la batalla de Ayacucho.
75	N° 306-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	24/01/2024	Director General de la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas.	Solicitud de información sobre transferencia interestatal formulada por la Municipalidad Distrital de Huara, del inmueble que corresponde al Balcón de Huaura.

76	N° 307-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	01/02/2024	Director del Punto de Cultura.	Traslado respuesta del gobierno regional de lima, con referencia a los oficios N° 48-2024-GRL/SG, N° 0279-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR.
77	N° 308-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	05/02/2024	Ministra de Cultura.	Solicitud de Información sobre las 200 obras pendientes de ejecución que forman parte de la Agenda de Conmemoración del Bicentenario de la Independencia del Perú.
78	N° 309-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	02/02/2024	Alcalde de la Municipalidad Distrital de Huaura	Traslada información sobre gestión, referido al oficio N°0276-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR.
79	N° 310-2023-2024-LVOMCEMBI/CR.	09/02/2024	Ministra de Desarrollo Agrario y Riego	Solicitud de información sobre proyectos de inversión del departamento de Junín.
80	N°311-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	09/02/2024	Ministro de Comercio Exterior y Turismo	Solicitud de información sobre proyectos de inversión del departamento de Junín.
81	N° 312-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	09/02/2024	Ministra de Educación	Solicitud de información sobre proyectos de inversión del departamento de Junín.
82	N° 313-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	09/02/2024	Ministra de la Producción	Solicitud de información sobre proyectos de inversión del departamento de Junín.
83	N° 314-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	09/02/2024	Ministro de Transportes y Comunicaciones	Solicitud de información sobre proyectos de inversión del departamento de Junín.
84	N° 315-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	09/02/2024	Ministro del Interior	Solicitud de información sobre proyectos de inversión del departamento de Junín.
85	N° 316-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	09/02/2024	Ministro de Energía y Minas	Solicitud de información sobre proyectos de inversión del departamento de Junín.
86	N° 330-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	05/03/2024	Ministra de Educación	Solicitud de información actualizada de los proyectos de inversión que tienen como Unidad Ejecutora a la UE N° 118: mejoramiento de la calidad de la educación básica y superior, a la UEI 125: proyecto especial de inversión pública escuelas bicentenario y al PRONIED.
87	N° 331-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	15/03/2024	Gobernador Regional de Junín.	Invitación a informar en la Décimo Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión.
88	N° 332-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	15/03/2024	Ministra de Cultura	Invitación a informar en la Décimo Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión.
89	N° 333-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	15/03/2024	Alcalde de la Municipalidad Provincial de Junín	Invitación a informar en la Décimo Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión.
90	N° 0334, N° 0335, N° 0336, N° 0337, N° 0338, y N° 0339-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	20/03/2024	Congresistas: David Julio Jiménez Heredia, Ilich Fredy López Ureña, Edgard Cornelio Reymundo Mercado, Silvana Emperatriz Robles Araujo, Waldemar José Cerrón Rojas, Segundo Héctor Acuña Peralta	Invitación a la Décimo Cuarta Sesión Ordinaria.
91	N° 0340-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	04/04/2024	Ministra de Cultura	Reiteración de solitud de información.
92	N° 0341-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	04/04/2024	Ministra de Comercio Exterior y Turismo	Reiteración de solitud de información.
93	N° 0342-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	04/04/2024	Ministra de la Producción	Reiteración de solitud de información.
94	N° 0343-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	04/04/2024	Ministro de Transporte	Reiteración de solitud de información.
95	N° 0344-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	04/04/2024	Ministro del Interior	Reiteración de solitud de información.
96	N° 0345-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	04/04/2024	Ministro de Energía y Minas	Reiteración de solitud de información.

97	N° 0346-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	11/04/2024	Oficial Mayor del Congreso de la República	Informe de Avance del Plan de Trabajo de la Comisión Especial Multipartidaria Conmemorativa del Bicentenario de la Independencia del Perú.
98	N° 0347, N° 0348 y N° 0349-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	11/04/2024	Congresistas: Alejandro Enrique Cavero Alva, Miguel Ángel Ciccía Vázquez y José Luis Elia Avalos	Remitimos Libros e Insignia Otorgada por el Ministerio de Cultura.
99	N° 0350-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	18/04/2024	Gobernador Regional de Ayacucho	Solicitud de información sobre los proyectos de inversión a su cargo como unidad ejecutora.
100	N° 0351-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	18/04/2024	Ministro de Educación	Reiteración de solicitud de información.
101	N° 0352 y N° 0353-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	19/04/2024	Ministro de Economía y Finanzas Alcalde Municipalidad Distrital de Huaura	Solicitud de reunión de trabajo. sobre la regulación de afectación en uso del monumento histórico “Balcón de Huaura”
102	N° 354-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	25/04/2024	Rector de la Universidad Nacional de Trujillo	Respuesta a invitación.
103	N° 0355, N° 0356, N° 0357 y N° 0358-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	25/04/2024	Ministro de Economía y Finanzas Alcalde Municipalidad Distrital de Huaura Superintendente Nacional de los Registros Públicos Superintendente Nacional de Bienes Estatales	Solicitud de reunión de trabajo. sobre la regulación de afectación en uso del monumento histórico “Balcón de Huaura”
104	N° 0359-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	30/04/2024	Presidente del Congreso	Solicitud de reapertura del uso de la plaza bolívar los sábados y domingos para la ciudadanía.
105	N° 0360-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	30/04/2024	Ministro de Defensa	Solicitud de información sobre el programa de las actividades conmemorativas
106	N° 361-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	30/04/2024	Alcalde de la Municipalidad Provincial de Junín	Respuesta a invitación
107	N° 0362-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	30/04/2024	Ministro de Defensa	Solicitud de información sobre las Instituciones Cívicas Culturales y Patrióticas
108	N° 0363-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	07/05/2024	Oficial Mayor del Congreso	Traslado de pedido de presidente de la “Asociación Cultural Descendientes de los Legendarios Morochucos”.
109	N° 0364, N° 0365 y N° 0366-2023-2024-LVOM CEMBI/CR	07/05/2024	Ministro de Economía y Finanzas Superintendente Nacional de Bienes Estatales Superintendente Nacional de los Registros Públicos	Traslado de compromisos asumidos en la reunión del 02 de mayo del presente año.
110	N° 0367, N° 0368 y N° 0369-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	07/05/2024	Gobernador Regional de Junín Municipalidad Provincial de Junín Ministro de Educación	Invitación a informar a la Tercera Sesión Extraordinaria.
111	N° 0370-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	09/05/2024	Oficial Mayor del Congreso de la República	Traslado pedido y solicitamos área para instalación de réplica de obelisco a los vencedores de la batalla de Junín.
112	N° 0371-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	17/05/2024	Alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Lima	Solicitud de información sobre cerco perimétrico de la iglesia San Francisco.
113	N° 0372-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	17/05/2024	Contralor General de la República	Solicitud de información sobre acciones de control a las Escuelas Bicentenario a cargo del Ministerio de Educación

114	N° 373-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	17/05/2024	Gobernador Regional de Junín	Respuesta a invitación.
115	N° 374-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	06/05/2024	Presidente del Instituto San Martiniano del Perú	Invitación a reconocimiento.
116	N° 375-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	27/05/2024	Director del Proyecto Especial Bicentenario de la Independencia del Perú	Respuesta a invitación.
117	N° 376, N° 377, N° 378 y N° 379-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	30/05/2024	Superintendente Nacional de Bienes Estatales Director General de la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas Superintendente Nacional de los Registros Públicos Alcalde de la Municipalidad Distrital de Huaura	Invitación a exponer en la cuarta Sesión Extraordinaria de la comisión.
118	N° 380, 381, 382 y 383-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	04/06/2024	Superintendente Nacional de Bienes Estatales Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas Superintendente Nacional de los Registros Públicos Alcalde de la Municipalidad Distrital de Huaura	Reprogramación de la Cuarta Sesión Extraordinaria.
119	N° 384-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	05/06/2024	Superintendente Nacional de los Registros Públicos	Invitación a la cuarta Sesión Extraordinaria de la Comisión Especial.
120	N° 385-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	11/06/2024	Jefe de la Autoridad Nacional de Infraestructura	Traslado de documento del Gobierno Regional de Junín y Solicitud de incorporación y priorización de Proyectos de Impacto Macro Regional de Junín.
121	N° 386-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	11/06/2024	Presidente de Consejo de Ministros	Traslado de documento del Gobierno Regional de Junín y Solicitud de incorporación y priorización de Proyectos de Impacto Macro Regional de Junín.
122	N° 387-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	11/06/2024	Ministro de Transportes y Comunicaciones	Traslado de documento del Gobierno Regional de Junín y Solicitud de incorporación y priorización de Proyectos de Impacto Macro Regional de Junín.
123	N° 388-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	11/06/2024	Ministro de Salud	Traslado de documento del Gobierno Regional de Junín y Solicitud de incorporación y priorización de Proyectos de Impacto Macro Regional de Junín.
124	N° 389-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	11/06/2024	Ministro de Educación	Traslado de documento del Gobierno Regional de Junín y Solicitud de incorporación y priorización de Proyectos de Impacto Macro Regional de Junín.
125	N° 390-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	11/06/2024	Ministra de Vivienda Construcción y Saneamiento	Traslado de documento del Gobierno Regional de Junín y Solicitud de incorporación y priorización de Proyectos de Impacto Macro Regional de Junín.
126	N° 391, N° 392, N° 393, N° 394 y N° 395-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	11/06/2024	Superintendente Nacional de Bienes Estatales Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas Superintendente Nacional de los Registros Públicos Municipalidad Distrital de	Reprogramación de la Cuarta Sesión Extraordinaria

			Huaura Director Ejecutivo del Proyecto Especial Bicentenario de la Independencia del Perú	
127	N°396, N°397, N°398, N°399, N°400, N°401, N°402, N°403, N°404, N°405, N°406, N°407, N°408, N°409, N°410, N°411 y N°415-2023-2024- LVOM-CEMBI/CR	11/06/2024	Presidente de la Asociación Batallón Perú Presidente de la Asociación Veteranos Batallón Perú Presidente de la Asociación Benemérita Sociedad Fundadores de la Independencia Vencedores 2 de Mayo 1866 y Defensores Calificados de la Patria Presidente de la Legión de Artillería Presidente de la Legión de Infantería del Perú Presidente de la Asociación de Veteranos de Guerra con Pacificación y Defensores de la Patria y Democracia del Perú Presidente de la Legión de Intendencia Presidente de la Asociación de Ingenieros Militares “José del Carmen Marín” Presidente de la Asociación de la Orden de la Legión Mariscal Cáceres Presidente del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú Presidente del Instituto Libertador Ramón Castilla Presidente de la Campaña Militar de 1941 Presidente de la Asociación de discapacitados en Acción de Armas por la Pacificación Nacional Presidente de la Asociación de comandantes de las Fuerzas Armadas Presidente de la Asociación Nacional de Defensores de la Patria de las Operaciones Militares del Alto Cenepa 95 – ASNADEP Presidente de la Asociación Nacional Pro Marina del Perú	Invitación a las Asociaciones Cívicos y Militares al reconocimiento por su compromiso con la historia de nuestro país y del Bicentenario de la Independencia del Perú
128	N° 412-2023-2024- LVOM-CEMBI/CR	11/06/2024	Comandante General del Ejército del Perú	Solicitud para que se autorice participación de oficial como ponente sobre la Batalla de Ayacucho y Junín
129	N° 413, N° 414, N° 416, N° 417, N° 418 y N° 419-2023-2024-	11/06/2024	Congresista de Republica Alejandro Enrique Cavero Alva, Miguel Ángel Ciccía	Invitación a los congresistas miembros de la comisión, al acto oficial de reconocimiento a las asociaciones cívicos y militares, por su

	LVOM-CEMBI/CR		Vásquez, Eduardo Enrique Castillo Rivas, José Luis Elías Avalos, Jorge Luis Flores Ancachi, Margot Palacios Humana	compromiso con la historia de nuestro país y del bicentenario de la independencia del Perú
130	N° 420-2023-2024- LVOM-CEMBI/CR	14/06/2024	Director del Proyecto Especial Bicentenario de la Independencia del Perú	Respuesta a invitación.
131	N° 421-2023-2024- LVOM-CEMBI/CR	14/06/2024	Director del Proyecto Especial Bicentenario de la Independencia del Perú	Respuesta a invitación.
132	N° 422-2023-2024- LVOM-CEMBI/CR	14/06/2024	Congresista de la República	Invitación al acto oficial de reconocimiento a las asociaciones cívicos y militares, por su compromiso con la historia de nuestro país y del bicentenario de la independencia del Perú
133	N° 423-2023- 2024- LVOM-CEMBI/CR	01/07/2024	Director de la Escuela de Operaciones Psicológicas del Ejército	Agradecimiento y felicitación.
134	N° 424-2023-2024- LVOM-CEMBI/CR	01/07/2024	Superintendente Nacional de Bienes Estatales	invitación para una mesa técnica de trabajo
135	N° 425-2023-2024- LVOM-CEMBI/CR	01/07/2024	Director General de la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas	Invitación para una mesa técnica de trabajo
136	N° 426-2023-2024- LVOM-CEMBI/CR	01/07/2024	Superintendente Nacional de los Registros Públicos	Invitación para una mesa técnica de trabajo
137	N° 427-2023-2024- LVOM-CEMBI/CR	01/07/2024	Alcalde de la Municipalidad Distrital de Huaura	Invitación para una mesa técnica de trabajo
138	N° 428-2023-2024- LVOM-CEMBI/CR	01/07/2024	Director Ejecutivo del Proyecto Especial Bicentenario de la Independencia del Perú	Invitación para una mesa técnica de trabajo
139	N° 429-2023-2024- LVOM-CEMBI/CR	01/07/2024	Director Ejecutivo del Proyecto Especial Bicentenario de la Independencia del Perú	Respuesta a invitación
140	N° 430-2023-2024- LVOM-CEMBI/CR	09/07/2024	Gobernador Regional de Junín	Traslado de documento y Solicitamos Información
141	N° 431-2023-2024- LVOM-CEMBI/CR	09/07/2024	Congresista de la República	Traslado de Documento
142	N° 432-2023-2024- LVOM-CEMBI/CR	09/07/2024	Ministro de Economía y Finanzas	Traslado acuerdo pactado en la mesa técnica de trabajo de fecha 05.jul.24
143	N° 433-2023-2024- LVOM-CEMBI/CR	09/07/2024	Alcalde de la Municipalidad Distrital de Huaura	Traslado acuerdo pactado en la mesa técnica de trabajo de fecha 05.jul.24
144	N° 434-2023-2024- LVOM-CEMBI/CR	12/07/2024	Congresista de la República	Traslado de Documento
145	N° 435-2023-2024-	12/07/2024	Congresista de la República	Traslado de Documento

	LVOM-CEMBI/CR			
146	N° 436-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	12/07/2024	Congresista de la República	Traslado de Documento
147	N° 437-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	12/07/2024	Congresista de la República	Traslado de Documento
148	N° 438-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	12/07/2024	Congresista de la República	Traslado de Documento
149	N° 439-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	12/07/2024	Ministra de Cultura	Solicitamos de información sobre los alcances oficiales de la ruta del libertador.
150	N° 440-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	12/07/2024	Oficial Mayor del Congreso de la República,	Informe de Avance del Plan de Trabajo de la Comisión Especial Multipartidaria Conmemorativa del Bicentenario de la Independencia del Perú
151	N° 441-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	15/07/2024	Director del Proyecto Especial Bicentenario de la Independencia del Perú	Respuesta a invitación
152	N° 442-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	17/07/2024	Presidente de la Legión Coronel Francisco Bolognesi	Respuesta a invitación
153	N° 443-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	17/07/2024	N° 443-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	Traslado de documento.
154	N° 444-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	17/07/2024	Gobernador Regional de Junín	Traslado de documento.
155	N° 445-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	17/07/2024	Ministra de Cultura	Solicitamos cuadros fotográficos históricos sobre la batalla de Junín, para una exposición de fotos
156	N° 446-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	22/07/2024	Ministro de Defensa	Solicitamos cuadros fotográficos históricos sobre la batalla de Junín, para una exposición de fotos
157	N° 447-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	22/07/2024	Comandante General del Comando de Instrucción y Doctrina del Ejército	Solicitamos banda de música del Ejército, para una ceremonia por el bicentenario de la batalla de Junín.
158	N° 448-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	24/07/2024	Comandante de la II División de Ejército Rímac	Solicitamos participación del Regimiento de Caballería "Glorioso Húsares de Junín" N°1 - Libertador del Perú, con su escolta.
159	N° 449, N° 450, N° 451, N° 452, N° 453, N° 454, N° 455, N° 456, N° 457, N° 458 y N° 459 -2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	24/07/2024	Congresista de la Republica José Luis Elías Avalos, Alejandro Enrique Caverio Alva, Miguel Ángel Ciccía Vásquez, Eduardo Enrique Castillo Rivas, Margot Palacios Humana, Jorge Luis Flores Ancachi, Waldemar José Cerrón Rojas, Silvana Robles Araujo, David Jimenez Heredia, Edgar Reymundo	Invitación a la ceremonia conmemorativa por los 200 años la batalla de Junín.

			Mercado, Ilich Fredy López Ureña	
160	N° 460-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	24/07/2024	Ministra de Cultura	Invitación a la ceremonia conmemorativa por los 200 años la batalla de Junín.
161	N° 461-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	24/07/2024	Director del Proyecto Especial Bicentenario de la Independencia del Perú	Invitación a la ceremonia conmemorativa por los 200 años la batalla de Junín.
162	N° 462-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	24/07/2024	Ministro de Defensa	Invitación a la ceremonia conmemorativa por los 200 años la batalla de Junín.
163	N° 463-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	24/07/2024	Comandante General del Ejército del Perú	Invitación a la ceremonia conmemorativa por los 200 años la batalla de Junín.
164	N° 464-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	24/07/2024	Gobernador Regional de Junín	Invitación a la ceremonia conmemorativa por los 200 años la batalla de Junín.
165	N° 465-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	24/07/2024	Alcalde Provincial de Junín	Invitación a la ceremonia conmemorativa por los 200 años la batalla de Junín.
166	N° 466-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	24/07/2024	Directora de la Emblemática Institución Educativa “6 de Agosto”	Invitación de reconocimiento a la institución.
167	N° 467-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	24/07/2024	Directora de la Institución Educativa “La Victoria de Junín”	Invitación de reconocimiento a la institución.
168	468-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	24/07/2024	Director de la Institución Educativa “Libertador Simón Bolívar”	Invitación de reconocimiento a la institución.
169	N° 469-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	24/07/2024	Director de la Institución Educativa Técnica “Húsares de Junín”	Invitación de reconocimiento a la institución.
170	N° 470-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	24/07/2024	Director de la Institución Educativa N° 30570 “Coronel José Andrés Ràzuri”	Invitación de reconocimiento a la institución.
171	N° 471-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	24/07/2024	Director de la Institución Educativa N° 31514 “Vencedores de Junín”	Invitación de reconocimiento a la institución.
172	N° 472-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	24/07/2024	Director de la Institución Educativa Particular “Glorioso Húsares de Junín”	Invitación de reconocimiento a la institución.
173	N°0473-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	24/07/2024	Directora De La Institución Educativa “La Victoria De Junín”	Invitación de reconocimiento a la institución
174	N° 0474-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	24/07/2024	Director de la Institución Educativa N° 31514 “Vencedores de Junín”	Invitación de reconocimiento a la institución

175	N° 475-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	24/07/2024	Director de la Institución Educativa "Simón Bolívar"	Invitación de reconocimiento a la institución.
176	N° 476-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	24/07/2024	Presidente del Comité de Gestión del Santuario Histórico de Chacamarca de la provincia de Junín	Invitación de reconocimiento al comité.
177	N° 477-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	24/07/2024	Alcalde de la Municipalidad Distrital de Ondores	Invitación a reconocimiento
178	N° 478-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	24/07/2024	Alcalde de la Municipalidad Distrital de Carhuamayo	Invitación a reconocimiento
179	N° 479-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	24/07/2024	Alcalde de la Municipalidad Distrital de Ulcumayo	Invitación a reconocimiento
180	N° 480-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	25/07/2024	Comandante General del Ejército del Perú	Solicitamos participación "Glorioso Húsares de Junín" N°1 - Libertador del Perú, con su escolta y un escuadrón.
181	N° 481-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	25/07/2024	Alcalde de la Municipalidad Distrital de Huaura	Traslado resultado de gestión.
182	N°002-2004-2025-LVOM-CEMBI/CR	31/07/2024	Presidente del Congreso de la República	Invitación a la ceremonia conmemorativa por los 200 años la batalla de Junín.
183	N°003-2004-2025-LVOM-CEMBI/CR	31/07/2024	Primera Vicepresidenta del Congreso República	Invitación a la ceremonia conmemorativa por los 200 años la batalla de Junín.
184	N°004-2004-2025-LVOM-CEMBI/CR	31/07/2024	Tercer Vicepresidente del Congreso	Invitación a la ceremonia conmemorativa por los 200 años la batalla de Junín.
185	N°005-2004-2025-LVOM-CEMBI/CR	31/07/2024	Segundo Vicepresidente del Congreso	Segundo Vicepresidente del Congreso
186	N°006-2004-2025-LVOM-CEMBI/CR	31/07/2024	Oficial mayor del congreso de la República	Solicitamos equipo de sonido, bandera, podio, para el izamiento de la bandera en conmemoración por los 200 años del bicentenario de la batalla de Junín.
187	N° 007-2004-2025-LVOM-CEMBI/CR	01/08/2024	Gobernador Regional de Junín	Trasladamos pedido y solicitamos su atención.
188	N° 008-2004-2025-LVOM-CEMBI/CR	07/08/2024	Gobernador Regional de Junín	Remitimos la Moción de Orden del Día N° 12619.
189	N°009-2004-2025-LVOM-CEMBI/CR	15/08/2024	Gobernador Regional de Junín	Trasladamos respuesta de la Autoridad Nacional de Infraestructura.
190	N°010-2004-2025-LVOM-CEMBI/CR	15/08/2024	Alcalde Provincial de Junín	Trasladamos respuesta de la Autoridad Nacional de Infraestructura.
191	N°011-2004-2025-LVOM-CEMBI/CR	15/08/2024	Gobernador Regional de Junín	Trasladamos respuesta del Ministerio de Educación.
192	N°012-2004-2025-	15/08/2024	Alcalde Provincial de Junín	Trasladamos respuesta del Ministerio de

	LVOM-CEMBI/CR			educación.
193	N°013-2004-2025-LVOM-CEMBI/CR	15/08/2024	Gobernador Regional de Junín	Trasladamos respuesta del Presidente de Consejo de Ministros.
194	N°014-2004-2025-LVOM-CEMBI/CR	15/08/2024	Alcalde Provincial de Junín	Trasladamos respuesta del Presidente del Consejo de Ministros.
195	N°015-2004-2025-LVOM-CEMBI/CR	15/08/2024	Superintendente Nacional de los Registros Públicos	Agradecimiento y felicitaciones.
196	N°016-2004-2025-LVOM-CEMBI/CR	15/08/2024	Superintendente Nacional de Bienes Estatales	Agradecimiento y felicitaciones.
197	N°017-2004-2025-LVOM-CEMBI/CR	15/08/2024	Ministra de Cultura	Agradecimiento y felicitaciones.
198	N° 018-2024-2025-LVOM-CEMBI/CR	16/08/2024	Alcalde de la Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión	Mesa técnica de trabajo, con referencia al Oficio N° 020-2024-CBPIJFSC
199	N° 019-2024-2025-LVOM-CEMBI/CR	16/08/2024	Director Ejecutivo del Proyecto Especial Bicentenario de la Independencia del Perú	Mesa técnica de trabajo, con referencia al Oficio N° 020-2024-CBPIJFSC
200	N° 020-2024-2025-LVOM-CEMBI/CR	16/08/2024	Ministra de Cultura	Mesa técnica de trabajo, con referencia al Oficio N° 020-2024-CBPIJFSC
201	N° 021-2024-2025-LVOM-CEMBI/CR	16/08/2024	Secretaría del Consejo de Ministros del Despacho Presidencial	Mesa técnica de trabajo, con referencia al Oficio N° 020-2024-CBPIJFSC
202	N° 022-2024-2025-LVOM-CEMBI/CR	16/08/2024	Alcalde de la Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión	Mesa técnica de trabajo, con referencia al Oficio N° 019-2024-CBPIJFSC
203	N° 023-2024-2025-LVOM-CEMBI/CR	16/08/2024	Director General de la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas	Mesa técnica de trabajo, con referencia al Oficio N° 019-2024-CBPIJFSC
204	N° 024-2024-2025-LVOM-CEMBI/CR	16/08/2024	Superintendente Nacional de Bienes Estatales	Mesa técnica de trabajo, con referencia al Oficio N° 019-2024-CBPIJFSC
205	N° 025-2024-2025-LVOM-CEMBI/CR	16/08/2024	Superintendente Nacional de los Registros Públicos	Mesa técnica de trabajo, con referencia al Oficio N° 019-2024-CBPIJFSC
206	N° 026-2024-2025-LVOM-CEMBI/CR	16/08/2024	Ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento	Mesa técnica de trabajo, con referencia al Oficio N° 019-2024-CBPIJFSC
207	N° 027-2024-2025-LVOM-CEMBI/CR	16/08/2024	Ministra de Cultura, Construcción y Saneamiento	Mesa técnica de trabajo, con referencia al Oficio N° 019-2024-CBPIJFSC
208	N° 028-2024-2025-LVOM-CEMBI/CR	19/08/2024	Presidente del Congreso	Solicitamos medalla de honor del Congreso de la República.
209	N° 029-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	23/08/2024	Gobernador Regional de Junín	Solicitamos información.
210	N° 030-2024-2025-	23/08/2024	Ministro de Defensa	Solicitamos información.

	LVOM-CEMBI/CR			
211	N° 031-2024-2025-LVOM-CEMBI/CR	03/09/2024	Ministra de Cultura	Solicitamos información.
212	N° 032-2024-2025-LVOM-CEMBI/CR	03/09/2024	Ministra de la mujer y poblaciones vulnerables	Solicitamos información sobre las actividades del programa de valores del bicentenario.
213	N° 033-2024-2025-LVOM-CEMBI/CR	03/09/2024	Ministro de Relaciones Exteriores	Solicitamos información.
214	N° 034-2024-2025-LVOM-CEMBI/CR	03/09/2024	Gobernador Regional de Junín	Solicitamos información.
215	N° 035-2024-2025-LVOM-CEMBI/CR	03/09/2024	Gobernador Regional de Ayacucho	Solicitamos información.
216	N° 036-2024-2025-LVOM-CEMBI/CR	09/09/2024	Ministro de Economía y Finanzas	Solicitamos disponga la suscripción de la resolución que aprueba la regularización en afectación en uso sobre el balcón de Huaura, región Lima.
217	N° 037-2024-2025-LVOM-CEMBI/CR	09/09/2024	Ministro de Cultura	Solicitamos evalué la posibilidad de patrocinar el IV concurso pictórico de historia militar “Juan Lepiani Toledo”, realizada por el Ejército del Perú.
218	N° 038-2024-2025-LVOM-CEMBI/CR	19/09/2024	Presidente de Consejos de Ministros	Trasladamos documento.
219	N° 039-2024-2025-LVOM-CEMBI/CR	19/09/2024	Gobernador Regional de Junín	Remitimos la Moción de Orden del Día N°13202
220	N° 040-2024-2025-LVOM-CEMBI/CR	19/09/2024	Ministro de Vivienda Construcción y Saneamiento	Trasladamos de documento.
221	oficio N° 041-2024-2025-LVOM-CEMBI/CR	19/09/2024	Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego	Trasladamos documento.
222	N° 042-2024-2025-LVOM-CEMBI/CR	19/09/2024	Ministro de Transportes y Comunicaciones	Trasladamos documento.
223	N° 043-2024-2025-LVOM-CEMBI/CR	19/09/2024	Ministro de Educación	Trasladamos documento.
224	N° 044-2024-2025-LVOM-CEMBI/CR	19/09/2024	Ministro de la Producción	Trasladamos documento.
225	N° 045-2024-2025-LVOM-CEMBI/CR	19/09/2024	Ministro de Cultura	Trasladamos documento.
226	N° 046-2024-2025-LVOM-CEMBI/CR	19/09/2024	Ministro de Salud	Trasladamos documento.
227	N° 047-2024-2025-LVOM-CEMBI/CR	19/09/2024	Jefe de la Autoridad Nacional de Infraestructura	Trasladamos documento.

228	N° 048-2024-2025-LVOM-CEMBI/CR	24/09/2024	Alcalde de la Municipalidad Distrital de Huaura	Trasladamos documento.
229	N° 049-2024-2025-LVOM-CEMBI/CR	24/09/2024	Ministro de Educación	Solicitamos información, con referencia al oficio N° 631-2024-MINEDU/DM.

En cumplimiento del plan de trabajo, en el cuarto trimestre del año 2024 (Octubre, Noviembre y Diciembre), nuestra Comisión Especial ha continuado requiriendo información a diversas entidades de los tres niveles de gobierno, conforme al siguiente detalle:

230. Se envió el oficio N° 050-2024-2025-LVOM-CEMBI/CR con fecha 04 de octubre del año 2024 al Ministro de Ministro de Cultura, Sr. FABRICIO ALFREDO VALENCIA GIBAJA, donde solicitamos actualizada a la fecha sobre el estado situacional de las 196 obras que aún quedan pendientes de ejecución que forman parte de la Agenda de Conmemoración del Bicentenario de la Independencia del Perú.
231. Se envió el oficio N° 051-2024-2025-LVOM-CEMBI/CR con fecha 10 de octubre del año 2024 al Oficial Mayor del Congreso de la República, Sr. GIOVANNI FORNO FLÓREZ, sobre la referencia al Oficio N° 105-2023-2024-ADP-CD/CR.
232. Se envió el oficio N° 052-2024-2025-LVOM-CEMBI/CR con fecha 11 de octubre del año 2024 al Gobernador Regional de Junín, Sr. ZOSIMO CARDENAS MUJE, invitándole para una mesa técnica de trabajo, sobre Proyecto de Ley: que declara de interés nacional y necesidad pública el cierre de brechas de infraestructura de servicios básicos en el departamento de Junín, con motivo de conmemorarse los 200 años de la batalla de Junín.
233. Se envió el oficio N° 053-2024-2025-LVOM-CEMBI/CR con fecha 11 de octubre del año 2024 al Alcalde Provincial de Junín, Sr. ELIO MUNZÓN ZEVALLO, invitándole para una mesa técnica de trabajo, sobre Proyecto de Ley: que declara de interés nacional y necesidad pública el cierre de brechas de infraestructura de servicios básicos en el departamento de Junín, con motivo de conmemorarse los 200 años de la batalla de Junín.
234. Se envió el oficio N° 054-2024-2025-LVOM-CEMBI/CR con fecha 11 de octubre del año 2024 al Alcalde de la Municipalidad Distrital de Carhuamayo, Sr. ABDEL EDGARDO VEGA HUARANGA, invitándole para una mesa técnica de trabajo, sobre Proyecto de Ley: que declara de interés nacional y

necesidad pública el cierre de brechas de infraestructura de servicios básicos en el departamento de Junín, con motivo de conmemorarse los 200 años de la batalla de Junín.

235. Se envió el oficio N° 055-2024-2025-LVOM-CEMBI/CR con fecha 11 de octubre del año 2024 al Alcalde de la Municipalidad Distrital de Ondores, Sr. ORLANDO BETO LAUREANO BLANCO, invitándole para una mesa técnica de trabajo, sobre Proyecto de Ley: que declara de interés nacional y necesidad pública el cierre de brechas de infraestructura de servicios básicos en el departamento de Junín, con motivo de conmemorarse los 200 años de la batalla de Junín.
236. Se envió el oficio N° 056-2024-2025-LVOM-CEMBI/CR con fecha 11 de octubre del año 2024 al Alcalde de la Municipalidad Distrital de Ulcumayo, Sr. HOOVER ALFREDO VASQUEZ ARREDONDO, invitándole para una mesa técnica de trabajo, sobre Proyecto de Ley: que declara de interés nacional y necesidad pública el cierre de brechas de infraestructura de servicios básicos en el departamento de Junín, con motivo de conmemorarse los 200 años de la batalla de Junín.
237. Se envió el oficio N° 057-2024-2025-LVOM-CEMBI/CR con fecha 18 de octubre del año 2024 a la Decana Nacional del Colegio Profesional de Historiadores del Perú, Sra. DRA. RAQUEL ARAGÓN MAMANI, invitándole para una mesa técnica de trabajo, sobre “definición y alcances de la ruta del libertador para su oficialización.
238. Se envió el oficio N° 058-2024-2025-LVOM-CEMBI/CR con fecha 18 de octubre del año 2024 al Ministro de Cultura, Sr. FABRICIO VALENCIA GIBAJA, invitándole para una mesa técnica de trabajo, sobre “definición y alcances de la ruta del libertador para su oficialización.
239. Se envió el oficio N° 059-2024-2025-LVOM-CEMBI/CR con fecha 18 de octubre del año 2024 al Director de la Escuela Profesional de Historia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos., DR. JOSÉ VALDIZAN AYALA., invitándole para una mesa técnica de trabajo, sobre “definición y alcances de la ruta del libertador para su oficialización.
240. Se envió el oficio N° 060-2024-2025-LVOM-CEMBI/CR con fecha 18 de octubre del año 2024 al Presidente del Centro de Estudios Histórico Militares del Perú, Gral. BRIG. JUAN URBANO REVILLA, invitándole para una mesa técnica de trabajo, sobre “definición y alcances de la ruta del libertador para su oficialización.

241. Se envió el oficio N° 061-2024-2025-LVOM-CEMBI/CR con fecha 18 de octubre del año 2024 al Director de la Escuela de Historia de la Universidad Nacional Federico Villarreal, Sr. DR. AUGUSTO RUIZ ZEVALLOS, invitándole para una mesa técnica de trabajo, sobre “definición y alcances de la ruta del libertador para su oficialización.
242. Se envió el oficio N° 062-2024-2025-LVOM-CEMBI/CR con fecha 21 de octubre del año 2024 al Alcalde de la Municipalidad Distrital de Quinua, Sr. RUPERT LIMACO AVENDAÑO, invitándole a informar en la Cuarta Sesión Extraordinaria.
243. Se envió el oficio N° 063-2024-2025-LVOM-CEMBI/CR con fecha 21 de octubre del año 2024 al Alcalde de la Municipalidad Provincial de Huamanga, Sr. JUAN CARLOS ARANGO CLAUDIO, invitándole a informar en la Cuarta Sesión Extraordinaria.
244. Se envió el oficio N° 064-2024-2025-LVOM-CEMBI/CR con fecha 21 de octubre del año 2024 al Gobernador Regional de Ayacucho, Sr. WILFREDO OSCORIMA NÚÑEZ, invitándole a informar en la Cuarta Sesión Extraordinaria.
245. Se envió el oficio N° 065-2024-2025-LVOM-CEMBI/CR con fecha 21 de octubre del año 2024 al Ministro de Cultura, Sr. Sr. FABRICIO VALENCIA GIBAJA, invitándole a informar en la Cuarta Sesión Extraordinaria.
246. Se envió el oficio N° 066-2024-2025-LVOM-CEMBI/CR con fecha 24 de octubre del año 2024 Decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, DR. CRISTÓBAL ALJOVÍN DE LOSADA, invitándole para una mesa técnica de trabajo, sobre “definición y alcances de la ruta del libertador para su oficialización.
247. Se envió el oficio N° 067-2024-2025-LVOM-CEMBI/CR con fecha 24 de octubre del año 2024 a la Directora de la Maestría de Historia de la Pontifica Universidad Católica del Perú, DRA. CLAUDIA ROSAS LAURO, invitándole para una mesa técnica de trabajo, sobre “definición y alcances de la ruta del libertador para su oficialización.
248. Se envió el oficio N° 068-2024-2025-LVOM-CEMBI/CR con fecha 24 de octubre del año 2024 a la Presidenta de la Academia Nacional de la Historia, DRA. MARGARITA GUERRA MARTINIERE, invitándole para una mesa técnica de trabajo, sobre “definición y alcances de la ruta del libertador para su oficialización.
249. Se envió el oficio N° 069-2024-2025-LVOM-CEMBI/CR con fecha 24 de octubre del año 2024 al Docente de la Universidad

Nacional Mayor de San Marcos, DR. ALEX LOAYZA PÉREZ, invitándole para una mesa técnica de trabajo, sobre “definición y alcances de la ruta del libertador para su oficialización.

250. Se envió el oficio N° 070 -2024-2025-LVOM-CEMBI/CR con fecha 24 de octubre del año 2024 a Docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, DR. DAVID VELÁSQUEZ SILVA, invitándole para una mesa técnica de trabajo, sobre “definición y alcances de la ruta del libertador para su oficialización.
251. Se envió el oficio N° 071-2024-2025-LVOM-CEMBI/CR con fecha 24 de octubre del año 2024 a la Docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú, DRA. SCARLETT O’PHELAN GODOY, invitándole para una mesa técnica de trabajo, sobre “definición y alcances de la ruta del libertador para su oficialización.
252. Se envió el oficio N° 072-2024-2025-LVOM-CEMBI/CR con fecha 24 de octubre del año 2024 al Docente de la Universidad de Piura, DRA. ELIZABETH HERNANDEZ GARCIA, invitándole para una mesa técnica de trabajo, sobre “definición y alcances de la ruta del libertador para su oficialización.
253. Se envió el oficio N° 073-2024-2025-LVOM-CEMBI/CR con fecha 24 de octubre del año 2024 a la Historiadora, DRA. NATALIA SOBREVILLA PEREA, invitándole para una mesa técnica de trabajo, sobre “definición y alcances de la ruta del libertador para su oficialización.
254. Se envió el oficio N° 074-2024-2025-LVOM-CEMBI/CR con fecha 31 de octubre del año 2024 al Gobernador Regional de Junín Sr. ZOSIMO CARDENAS MUJE, invitándole para una mesa técnica de trabajo, sobre Análisis y Evaluación del Proyecto de Ley: que declara de interés nacional y necesidad pública el cierre de brechas de infraestructura de servicios básicos en los departamentos de Junín y Ayacucho, con motivo de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho.
255. Se envió el oficio N° 074-2024-2025-LVOM-CEMBI/CR con fecha 31 de octubre del año 2024 al Gobernador Regional de Junín Sr. ZOSIMO CARDENAS MUJE, invitándole para una mesa técnica de trabajo, sobre Análisis y Evaluación del Proyecto de Ley: que declara de interés nacional y necesidad pública el cierre de brechas de infraestructura de servicios básicos en los departamentos de Junín y Ayacucho, con motivo de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho.

256. Se envió el oficio N° 075-2024-2025-LVOM-CEMBI/CR con fecha 31 de octubre del año 2024 Alcalde Provincial de Junín Sr. ELIO MUNZÓN ZEVALLO, invitándole para una mesa técnica de trabajo, sobre Análisis y Evaluación del Proyecto de Ley: que declara de interés nacional y necesidad pública el cierre de brechas de infraestructura de servicios básicos en los departamentos de Junín y Ayacucho, con motivo de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho.
257. Se envió el oficio N° 076-2024-2025-LVOM-CEMBI/CR con fecha 31 de octubre del año 2024 al Alcalde de la Municipalidad Distrital de Carhuamayo Sr. ABDEL EDGARDO VEGA HUARANGA, invitándole para una mesa técnica de trabajo, sobre Análisis y Evaluación del Proyecto de Ley: que declara de interés nacional y necesidad pública el cierre de brechas de infraestructura de servicios básicos en los departamentos de Junín y Ayacucho, con motivo de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho.
258. Se envió el oficio N° 077-2024-2025-LVOM-CEMBI/CR con fecha 31 de octubre del año 2024 al Alcalde de la Municipalidad Distrital de Ulcumayo Sr. HOOVER ALFREDO VASQUEZ ARREDONDO, invitándole para una mesa técnica de trabajo, sobre Análisis y Evaluación del Proyecto de Ley: que declara de interés nacional y necesidad pública el cierre de brechas de infraestructura de servicios básicos en los departamentos de Junín y Ayacucho, con motivo de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho.
259. Se envió el oficio N° 078-2024-2025-LVOM-CEMBI/CR con fecha 31 de octubre del año 2024 al Alcalde de la Municipalidad Distrital de Ondores Sr. ORLANDO BETO LAUREANO BLANCO, invitándole para una mesa técnica de trabajo, sobre Análisis y Evaluación del Proyecto de Ley: que declara de interés nacional y necesidad pública el cierre de brechas de infraestructura de servicios básicos en los departamentos de Junín y Ayacucho, con motivo de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho.
260. Se envió el oficio N° 079-2024-2025-LVOM-CEMBI/CR con fecha 31 de octubre del año 2024 al Gobernador Regional de Junín Sr. ZOSIMO CARDENAS MUJE, invitándole para una mesa técnica de trabajo, sobre Análisis y Evaluación del Proyecto de Ley: que declara de interés nacional y necesidad pública el cierre de brechas de infraestructura de servicios básicos en los departamentos de Junín y Ayacucho, con motivo

de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho.

261. Se envió el oficio N° 080-2024-2025-LVOM-CEMBI/CR con fecha 31 de octubre del año 2024 al Alcalde de la Municipalidad Provincial de Huamanga Sr. JUAN CARLOS ARANGO CLAUDIO, invitándole para una mesa técnica de trabajo, sobre Análisis y Evaluación del Proyecto de Ley: que declara de interés nacional y necesidad pública el cierre de brechas de infraestructura de servicios básicos en los departamentos de Junín y Ayacucho, con motivo de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho.
262. Se envió el oficio N° 081-2024-2025-LVOM-CEMBI/CR con fecha 04 de octubre del año 2024 al Alcalde de la Municipalidad Distrital de Quinua Sr. RUPERT LIMACO AVENDAÑO, invitándole para una mesa técnica de trabajo, sobre Análisis y Evaluación del Proyecto de Ley: que declara de interés nacional y necesidad pública el cierre de brechas de infraestructura de servicios básicos en los departamentos de Junín y Ayacucho, con motivo de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho.
263. Se envió el oficio N° 082-2024-2025-LVOM-CEMBI/CR con fecha 04 de noviembre del año 2024 al Contralor General de la República, Sr. CESAR ENRIQUE AGUILAR SURICHAQUI, invitándole a informar en la Décimo Quinta Sesión Ordinaria.
264. Se envió el oficio N° 083-2024-2025-LVOM-CEMBI/CR con fecha 20 de noviembre del año 2024 a la Presidenta del Club Provincial "Heroica Ciudad de Junín, MG. ILIANA JUANA GUERE SOTELO, sobre respuesta a solicitud de la referencia del Oficio N°203-2024-CPHCJ-LIMA.
265. Se envió el oficio N° 084-2024-2025-LVOM-CEMBI/CR con fecha 20 de noviembre del año 2024 al Presidente de la Asociación de Ex Combatientes del Conflicto de la Cordillera del Cóndor 1981, GENERAL DE BRIGADA (R) PEDRO KULJEVAN GARCÍA, sobre respuesta a solicitud de la referencia del Oficio N° 508-2024-DEFENSORES DE LA PATRIA DEL PERU/PRESIDENCIA.
266. Se envió el oficio N° 085-2024-2025-LVOM-CEMBI/CR con fecha 20 de noviembre del año 2024 al Alcalde de la Municipalidad distrital de Quinua, Sr. RUPERT LIMACO AVENDAÑO, sobre respuesta del Ministerio de Educación de la referencia de los Oficios N° 3217-2024-MINEDU/DM y N° 043-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR.

267. Se envió el oficio N° 086-2024-2025-LVOM-CEMBI/CR con fecha 20 de noviembre del año 2024 al Presidente del Centro de Estudios Históricos Militares, Sr. GRAL.BRIG. JUAN URBANO REVILLA, solicitando cuadros fotográficos por la conmemoración de los 200 años de la batalla de Ayacucho.
268. Se envió el oficio N° 087-2024-2025-LVOM-CEMBI/CR con fecha 20 de noviembre del año 2024 al Presidente del Centro de Estudios Históricos Militares, Sr. GRAL.BRIG. JUAN URBANO REVILLA, invitándole a participar en la exposición de fotos, por la conmemoración del bicentenario de la batalla de Ayacucho.
269. Se envió el oficio N° 088-2024-2025-LVOM-CEMBI/CR con fecha 20 de noviembre del año 2024 al Presidente del Congreso, Sr. EDUARDO SALHUANA CAVIDES, invitándole a participar en la exposición de fotos, por la conmemoración del bicentenario de la batalla de Ayacucho.
270. Se envió el oficio N° 089-2024-2025-LVOM-CEMBI/CR con fecha 20 de noviembre del año 2024 a la Primera Vicepresidenta del Congreso, Sr. CARMEN PATRICIA JUÁREZ GALLEGOS, Invitándole a participar en la exposición de fotos, por la conmemoración del bicentenario de la batalla de Ayacucho.
271. Se envió el oficio N° 090-2024-2025-LVOM-CEMBI/CR con fecha 20 de noviembre del año 2024 al Segundo Vicepresidente del Congreso, Sr. WALDEMAR JOSÉ CERRÓN ROJAS, invitándole a participar en la exposición de fotos, por la conmemoración del bicentenario de la batalla de Ayacucho.
272. Se envió el oficio N° 091-2024-2025-LVOM-CEMBI/CR con fecha 20 de noviembre del año 2024 al Tercer Vicepresidente del Congreso, Sr. ALEJANDRO ENRIQUE CAVERO ALVA, invitándole a participar en la exposición de fotos, por la conmemoración del bicentenario de la batalla de Ayacucho.
273. Se envió el oficio N° 092-2024-2025-LVOM-CEMBI/CR con fecha 20 de noviembre del año 2024 al Congresista de la República, Sr. CICCIA VÁSQUEZ MIGUEL ÁNGEL, invitándole a participar en la exposición de fotos, por la conmemoración del bicentenario de la batalla de Ayacucho.
274. Se envió el oficio N° 093-2024-2025-LVOM-CEMBI/CR con fecha 20 de noviembre del año 2024 al Congresista de la República, Sr. CASTILLO RIVAS EDUARDO ENRIQUE, invitándole a participar en la exposición de fotos, por la conmemoración del bicentenario de la batalla de Ayacucho.
275. Se envió el oficio N° 094-2024-2025-LVOM-CEMBI/CR con fecha 20 de noviembre del año 2024 al Congresista de la República, Sra. PALACIOS HUAMÁN MARGOT, invitándole a

participar en la exposición de fotos, por la conmemoración del bicentenario de la batalla de Ayacucho.

276. Se envió el oficio N° 095-2024-2025-LVOM-CEMBI/CR con fecha 20 de noviembre del año 2024 al Congresista de la República, Sr. JORGE LUIS FLORES ANCACHI, invitándole a participar en la exposición de fotos, por la conmemoración del bicentenario de la batalla de Ayacucho.
277. Se envió el oficio N° 096-2024-2025-LVOM-CEMBI/CR con fecha 20 de noviembre del año 2024 al Congresista de la República, Sra. HEIDY LIBETH JUÁREZ CALLE, invitándole a participar en la exposición de fotos, por la conmemoración del bicentenario de la batalla de Ayacucho.
278. Se envió el oficio N° 097-2024-2025-LVOM-CEMBI/CR con fecha 20 de noviembre del año 2024 al Ministro de Cultura, Sr. FABRICIO VALENCIA GIBAJA, invitándole a participar en la exposición de fotos, por la conmemoración del bicentenario de la batalla de Ayacucho.
279. Se envió el oficio N° 098-2024-2025-LVOM-CEMBI/CR con fecha 20 de noviembre del año 2024 al Ministro de Defensa, Sr. WALTER ENRIQUE ASTUDILLO CHAVEZ, invitándole a participar en la exposición de fotos, por la conmemoración del bicentenario de la batalla de Ayacucho.
280. Se envió el oficio N° 099-2024-2025-LVOM-CEMBI/CR con fecha 20 de noviembre del año 2024 al Director Ejecutivo del Proyecto Especial Bicentenario de la Independencia del Perú., Sr. PERCY YHAIR BARRANZUELA BOMBILLA, invitándole a participar en la exposición de fotos, por la conmemoración del bicentenario de la batalla de Ayacucho.
281. Se envió el oficio N° 100-2024-2025-LVOM-CEMBI/CR con fecha 20 de noviembre del año 2024 al Alcalde de la Municipalidad de Miraflores, Sr. CARLOS CANALES ANCHORENA, sobre traslado de documento y solicitamos se sirva evaluar un espacio público en la municipalidad de Miraflores para que puedan desarrollar una feria las “MYPES productoras” con referencia al oficio N° 1149-2024-MPH/A.
282. Se envió el oficio N°101-2024-2025-LVOM-CEMBI/CR con fecha 20 de noviembre del año 2024 al Congresista de la República, Sr. CASTILLO RIVAS EDUARDO ENRIQUE, Invitándole a participar en la presentación del libro de oro, en conmemoración al bicentenario de la batalla de Junín.
283. Se envió el oficio N°102-2024-2025-LVOM-CEMBI/CR con fecha 20 de noviembre del año 2024 al Congresista de la República, Sr. CICCIA VÁSQUEZ MIGUEL ÁNGEL, Invitándole a

participar en la presentación del libro de oro, en conmemoración del bicentenario de la batalla de Junín.

284. Se envió el oficio N°103-2024-2025-LVOM-CEMBI/CR con fecha 20 de noviembre del año 2024 al Congresista de la República, Sr. ALEJANDRO ENRIQUE CAVERO ALVA, Invitándole a participar en la presentación del libro de oro, en conmemoración del bicentenario de la batalla de Junín.
285. Se envió el oficio N°104-2024-2025-LVOM-CEMBI/CR con fecha 20 de noviembre del año 2024 al Congresista de la República, Sr. JORGE LUIS FLORES ANCACHI, Invitándole a participar en la presentación del libro de oro, en conmemoración del bicentenario de la batalla de Junín.
286. Se envió el oficio N°105-2024-2025-LVOM-CEMBI/CR con fecha 20 de noviembre del año 2024 a la Congresista de la República, Sra. PALACIOS HUAMÁN MARGOT, Invitándole a participar en la presentación del libro de oro, en conmemoración del bicentenario de la batalla de Junín.
287. Se envió el oficio N°106-2024-2025-LVOM-CEMBI/CR con fecha 20 de noviembre del año 2024 a la Congresista de la República, Sra. HEIDY LIBETH JUÁREZ CALLE, Invitándole a participar en la presentación del libro de oro, en conmemoración del bicentenario de la batalla de Junín.
288. Se envió el oficio N°107-2024-2025-LVOM-CEMBI/CR con fecha 21 de noviembre del año 2024 a la Congresista de la República, Sra. HEIDY LIBETH JUÁREZ CALLE, Invitándole a participar en la participación en la develación del monumento a los vencedores de la batalla de Junín.
289. Se envió el oficio N°108-2024-2025-LVOM-CEMBI/CR con fecha 21 de noviembre del año 2024 a la Congresista de la República, Sra. HEIDY LIBETH JUÁREZ CALLE, Invitándole a participar en la develación del monumento a los vencedores de la batalla de Junín.
290. Se envió el oficio N°109-2024-2025-LVOM-CEMBI/CR con fecha 21 de noviembre del año 2024 a la Congresista de la República, Sr. CASTILLO RIVAS EDUARDO ENRIQUE, Invitándole a participar en la develación del monumento a los vencedores de la batalla de Junín.
291. Se envió el oficio N°110-2024-2025-LVOM-CEMBI/CR con fecha 21 de noviembre del año 2024 a la Congresista de la República, Sr. CICCIA VÁSQUEZ MIGUEL ÁNGEL, Invitándole a participar en la develación del monumento a los vencedores de la batalla de Junín.

292. Se envió el oficio N°110-2024-2025-LVOM-CEMBI/CR con fecha 21 de noviembre del año 2024 a la Congresista de la República, Sr. ALEJANDRO ENRIQUE CAVERO ALVA, Invitándole a participar en la develación del monumento a los vencedores de la batalla de Junín.
293. Se envió el oficio N°111-2024-2025-LVOM-CEMBI/CR con fecha 21 de noviembre del año 2024 al Congresista de la República, Sr. ALEJANDRO ENRIQUE CAVERO ALVA, Invitándole a participar en la develación del monumento a los vencedores de la batalla de Junín.
294. Se envió el oficio N°112-2024-2025-LVOM-CEMBI/CR con fecha 21 de noviembre del año 2024 al Congresista de la República, Sr. JORGE LUIS FLORES ANCACHI, Invitándole a participar en la develación del monumento a los vencedores de la batalla de Junín.
295. Se envió el oficio N°113-2024-2025-LVOM-CEMBI/CR con fecha 21 de noviembre del año 2024 al Congresista de la República, Sr. JORGE LUIS FLORES ANCACHI, Invitándole a participar en la develación del monumento a los vencedores de la batalla de Junín.
296. Se envió el oficio N°114-2024-2025-LVOM-CEMBI/CR con fecha 21 de noviembre del año 2024 a la Primera Vicepresidenta del Congreso, Sra. CARMEN PATRICIA JUÁREZ GALLEGOS, Invitándole a participar en la develación del monumento a los vencedores de la batalla de Junín.
297. Se envió el oficio N°115-2024-2025-LVOM-CEMBI/CR con fecha 21 de noviembre del año 2024 al Segundo Vicepresidente del Congreso, Sr. WALDEMAR JOSÉ CERRÓN ROJAS, Invitándole a participar en la develación del monumento a los vencedores de la batalla de Junín.
298. Se envió el oficio N°116-2024-2025-LVOM-CEMBI/CR con fecha 21 de noviembre del año 2024 al Tercer Vicepresidente del Congreso, Sr. ALEJANDRO ENRIQUE CAVERO ALVA, Invitándole a participar en la develación del monumento a los vencedores de la batalla de Junín.
299. Se envió el oficio N°117-2024-2025-LVOM-CEMBI/CR con fecha 21 de noviembre del año 2024 al Gobernador Regional de Junín, Sr. ZÓSIMO CÁRDENAS MUJE, informándole la fecha de la instalación y develación del monumento a los vencedores de la batalla de Junín.
300. Se envió el oficio N°118-2024-2025-LVOM-CEMBI/CR con fecha 22 de noviembre del año 2024 al Oficial Mayor del Congreso de la República, Sr. GIOVANNI FORNO FLÓREZ, solicitándole

equipo de sonido, podio, alfombra, maestro de ceremonia, prensa y fotógrafo para la develación del monumento a los vencedores de la batalla de Junín.

301. Se envió el oficio N°119-2024-2025-LVOM-CEMBI/CR con fecha 22 de noviembre del año 2024 al Director de la Escuela Superior de Guerra del Ejército Presente, GRAL. BRIG JUAN VALVERDE VIRHUEZ, solicitándole se autorice participación de oficial del EP como ponente.
302. Se envió el oficio N°120-2024-2025-LVOM-CEMBI/CR con fecha 22 de noviembre del año 2024 al Congresista de la República, Sr. CICCIA VÁSQUEZ MIGUEL ÁNGEL, Invitándole a participar a la ceremonia de reconocimiento y conmemoración del bicentenario de la batalla de Ayacucho.
303. Se envió el oficio N°121-2024-2025-LVOM-CEMBI/CR con fecha 22 de noviembre del año 2024 al Congresista de la República, Sr. ALEJANDRO ENRIQUE CAVERO ALVA, Invitándole a participar a la ceremonia de reconocimiento y conmemoración del bicentenario de la batalla de Ayacucho.
304. Se envió el oficio N°123-2024-2025-LVOM-CEMBI/CR con fecha 22 de noviembre del año 2024 al Congresista de la República, Sr. CASTILLO RIVAS EDUARDO ENRIQUE, Invitándole a participar a la ceremonia de reconocimiento y conmemoración del bicentenario de la batalla de Ayacucho.
305. Se envió el oficio N°124-2024-2025-LVOM-CEMBI/CR con fecha 25 de noviembre del año 2024 al Alcalde de la Municipalidad del Distrito de Quinua, Sr. RUPERT LÍMACO AVENDAÑO, Invitándole a participar en la exposición de fotos, por la conmemoración del bicentenario de la batalla de Ayacucho.
306. Se envió el oficio N°125-2024-2025-LVOM-CEMBI/CR con fecha 27 de noviembre del año 2024 al Vocero de Fuerza Popular, Sr. LUIS ARTURO ALEGRIA GARCIA, trasladándole sobre la solicitud del alcalde de la municipalidad distrital de quinua – Ayacucho, referencia al oficio N° 843 - 2024-MDQ/A.
307. Se envió el oficio N°126-2024-2025-LVOM-CEMBI/CR con fecha 27 de noviembre del año 2024 al Director de la comisión Permanente de Historia del Ejército del Perú, Sr. JOSE LUIS HURTADO TERRANOVA sobre respuesta a invitación con referencia al oficio N° 570/CPHEP/RR.PP/07.00.
308. Se envió el oficio N°127-2024-2025-LVOM-CEMBI/CR con fecha 27 de noviembre del año 2024 al Gobernador Regional de Ayacucho, Sr. WILFREDO OSCORIMA NÚÑEZ, Invitándole a participar a la ceremonia de reconocimiento y conmemoración del bicentenario de la batalla de Ayacucho.

309. Se envió el oficio N°128-2024-2025-LVOM-CEMBI/CR con fecha 27 de noviembre del año 2024 al Director del Proyecto Especial Bicentenario de la Independencia del Perú, Sr PERCY YHAIR BARRANZUELA BOMBILLA, Invitándole a participar a la ceremonia de reconocimiento y conmemoración del bicentenario de la batalla de Ayacucho.
310. Se envió el oficio N°129-2024-2025-LVOM-CEMBI/CR con fecha 27 de noviembre del año 2024 al Ministro de Defensa, Sr. WALTER ENRIQUE ASTUDILLO CHAVEZ, Invitándole a participar a la ceremonia de reconocimiento y conmemoración del bicentenario de la batalla de Ayacucho.
311. Se envió el oficio N°130-2024-2025-LVOM-CEMBI/CR con fecha 27 de noviembre del año 2024 al Ministro de Cultura, Sr. FABRICIO VALENCIA GIBAJA, Invitándole a participar a la ceremonia de reconocimiento y conmemoración del bicentenario de la batalla de Ayacucho.
312. Se envió el oficio N°131-2024-2025-LVOM-CEMBI/CR con fecha 27 de noviembre del año 2024 al Presidente del Congreso, Sr. EDUARDO SALHUANA CAVIDES, Invitándole a participar a la ceremonia de reconocimiento y conmemoración del bicentenario de la batalla de Ayacucho.
313. Se envió el oficio N°132-2024-2025-LVOM-CEMBI/CR con fecha 27 de noviembre del año 2024 al Segundo Vicepresidente del Congreso, Sr. WALDEMAR JOSÉ CERRÓN ROJAS, Invitándole a participar a la ceremonia de reconocimiento y conmemoración del bicentenario de la batalla de Ayacucho.
314. Se envió el oficio N°133-2024-2025-LVOM-CEMBI/CR con fecha 27 de noviembre del año 2024 al Tercer Vicepresidente del Congreso, Sr. ALEJANDRO ENRIQUE CAVERO ALVA, Invitándole a participar a la ceremonia de reconocimiento y conmemoración del bicentenario de la batalla de Ayacucho.
315. Se envió el oficio N°134-2024-2025-LVOM-CEMBI/CR con fecha 27 de noviembre del año 2024 a la Primera Vicepresidenta del Congreso, Sra. CARMEN PATRICIA JUÁREZ GALLEGOS, Invitándole a participar a la ceremonia de reconocimiento y conmemoración del bicentenario de la batalla de Ayacucho.
316. Se envió el oficio N°135-2024-2025-LVOM-CEMBI/CR con fecha 27 de noviembre del año 2024 a la Congresista de la República, Sra. HEIDY LIBETH JUÁREZ CALLE, Invitándole a participar a la ceremonia de reconocimiento y conmemoración del bicentenario de la batalla de Ayacucho.
317. Se envió el oficio N°136-2024-2025-LVOM-CEMBI/CR con fecha 27 de noviembre del año 2024 a la Congresista de la República,

Sra. PALACIOS HUAMÁN MARGOT, Invitándole a participar a la ceremonia de reconocimiento y conmemoración del bicentenario de la batalla de Ayacucho.

318. Se envió el oficio N°137-2024-2025-LVOM-CEMBI/CR con fecha 27 de noviembre del año 2024 al Director del Proyecto Especial Bicentenario de la Independencia del Perú, Sr. PERCY YHAIR BARRANZUELA BOMBILLA, Invitándole a participar en la develación del monumento a los vencedores de la batalla de Junín.
319. Se envió el oficio N°138-2024-2025-LVOM-CEMBI/CR con fecha 27 de noviembre del año 2024 al Ministro de Cultura, Sr. FABRICIO VALENCIA GIBAJA, Invitándole a participar en la develación del monumento a los vencedores de la batalla de Junín.
320. Se envió el oficio N°139-2024-2025-LVOM-CEMBI/CR con fecha 27 de noviembre del año 2024 al Ministro de Defensa, Sr. WALTER ENRIQUE ASTUDILLO CHAVEZ, Invitándole a participar en la develación del monumento a los vencedores de la batalla de Junín.
321. Se envió el oficio N°140-2024-2025-LVOM-CEMBI/CR con fecha 27 de noviembre del año 2024 al Alcalde de la Municipalidad del Distrito de Quinua, Sr. RUPERT LÍMACO AVENDAÑO, Invitándole a participar a la ceremonia de reconocimiento y conmemoración del bicentenario de la batalla de Ayacucho.
322. Se envió el oficio N°141-2024-2025-LVOM-CEMBI/CR con fecha 28 de noviembre al Sr. JESÚS ABEL MEJÍA MARCACUZCO, Invitándole a participar a la ceremonia de reconocimiento y conmemoración del bicentenario de la batalla de Ayacucho.
323. Se envió el oficio N°142-2024-2025-LVOM-CEMBI/CR con fecha 28 de noviembre al Sr. RAFAEL DUMETT, Invitándole a participar a la ceremonia de reconocimiento y conmemoración del bicentenario de la batalla de Ayacucho.
324. Se envió el oficio N°143-2024-2025-LVOM-CEMBI/CR con fecha 28 de noviembre al Sr. RANULFO AMADOR FUENTES ROJAS, Invitándole a participar a la ceremonia de reconocimiento y conmemoración del bicentenario de la batalla de Ayacucho.
325. Se envió el oficio N°144-2024-2025-LVOM-CEMBI/CR con fecha 28 de noviembre al Sr. RICARDO DOLORIER URBANO, Invitándole a participar a la ceremonia de reconocimiento y conmemoración del bicentenario de la batalla de Ayacucho.
326. Se envió el oficio N°145-2024-2025-LVOM-CEMBI/CR con fecha 28 de noviembre al Sr. JOSE CARLOS LUMBRERAS RÍOS,

Invitándole a participar a la ceremonia de reconocimiento y conmemoración del bicentenario de la batalla de Ayacucho.

327. Se envió el oficio N°146-2024-2025-LVOM-CEMBI/CR con fecha 28 de noviembre al Alcalde de la Municipalidad del Distrito Ninabamba-Ayacucho, Sr. MIGUEL ÁNGEL MEDINA ARGUMEDO, Invitándole a participar a la ceremonia de reconocimiento y conmemoración del bicentenario de la batalla de Ayacucho.
328. Se envió el oficio N°147-2024-2025-LVOM-CEMBI/CR con fecha 28 de noviembre al Sr. JULIO MARTÍNEZ ASURZA, Invitándole a participar a la ceremonia de reconocimiento y conmemoración del bicentenario de la batalla de Ayacucho.
329. Se envió el oficio N°148-2024-2025-LVOM-CEMBI/CR con fecha 28 de noviembre al Sr. RUBÉN PELAYO NEYRA MOREIRA, Invitándole a participar a la ceremonia de reconocimiento y conmemoración del bicentenario de la batalla de Ayacucho.
330. Se envió el oficio N°149-2024-2025-LVOM-CEMBI/CR con fecha 28 de noviembre al Sr. JUAN REYNALDO CASTAÑEDA CHAMANA, Invitándole a participar a la ceremonia de reconocimiento y conmemoración del bicentenario de la batalla de Ayacucho.
331. Se envió el oficio N°150-2024-2025-LVOM-CEMBI/CR con fecha 28 de noviembre al Sr. MANUEL JESÚS MAYORGA, Invitándole a participar a la ceremonia de reconocimiento y conmemoración del bicentenario de la batalla de Ayacucho.
332. Se envió el oficio N°151-2024-2025-LVOM-CEMBI/CR con fecha 28 de noviembre al Sr. YURI ALBERTO GUTIÉRREZ, Invitándole a participar a la ceremonia de reconocimiento y conmemoración del bicentenario de la batalla de Ayacucho.
333. Se envió el oficio N°152-2024-2025-LVOM-CEMBI/CR con fecha 28 de noviembre al Sr. MARIO SOLFÍO QUINTANILLA ZEA, Invitándole a participar a la ceremonia de reconocimiento y conmemoración del bicentenario de la batalla de Ayacucho.
334. Se envió el oficio N°153-2024-2025-LVOM-CEMBI/CR con fecha 28 de noviembre al Sr. GONZALO FRANCO PRADO, Invitándole a participar a la ceremonia de reconocimiento y conmemoración del bicentenario de la batalla de Ayacucho.
335. Se envió el oficio N°154-2024-2025-LVOM-CEMBI/CR con fecha 28 de noviembre al Sr. DURMAN ÍTALO VILLAVERDE HUAITA, Invitándole a participar a la ceremonia de reconocimiento y conmemoración del bicentenario de la batalla de Ayacucho.

336. Se envió el oficio N°155-2024-2025-LVOM-CEMBI/CR con fecha 28 de noviembre a la ASOCIACIÓN CULTURAL Y SOCIAL ACUARELA HUAMANGUINA, Invitándole a participar a la ceremonia de reconocimiento y conmemoración del bicentenario de la batalla de Ayacucho.
337. Se envió el oficio N°156-2024-2025-LVOM-CEMBI/CR con fecha 28 de noviembre al Sr. EDWIN TENORIO AUQUI, Invitándole a participar a la ceremonia de reconocimiento y conmemoración del bicentenario de la batalla de Ayacucho.
338. Se envió el oficio N°157-2024-2025-LVOM-CEMBI/CR con fecha 28 de noviembre al Sr. SATURNINO NAVARRO ALVARADO, Invitándole a participar a la ceremonia de reconocimiento y conmemoración del bicentenario de la batalla de Ayacucho.
339. Se envió el oficio N°158-2024-2025-LVOM-CEMBI/CR con fecha 28 de noviembre al Sr. MARIANO PALOMINO MUÑOZ, Invitándole a participar a la ceremonia de reconocimiento y conmemoración del bicentenario de la batalla de Ayacucho.
340. Se envió el oficio N°159-2024-2025-LVOM-CEMBI/CR con fecha 28 de noviembre a la Sra. MARICELA CHÁVEZ FALCONI, Invitándola a participar a la ceremonia de reconocimiento y conmemoración del bicentenario de la batalla de Ayacucho.
341. Se envió el oficio N°160-2024-2025-LVOM-CEMBI/CR con fecha 28 de noviembre al Sr. SOTO TENORIO, EDILBERT, Invitándole a participar a la ceremonia de reconocimiento y conmemoración del bicentenario de la batalla de Ayacucho.
342. Se envió el oficio N°161-2024-2025-LVOM-CEMBI/CR con fecha 28 de noviembre a la Sra. GLORIA CACERES VARGAS, Invitándola a participar a la ceremonia de reconocimiento y conmemoración del bicentenario de la batalla de Ayacucho.
343. Se envió el oficio N°162-2024-2025-LVOM-CEMBI/CR con fecha 28 de noviembre al Sr. DURMAN ITALO VILLAVERDE HUAITA, Invitándole a participar a la ceremonia de reconocimiento y conmemoración del bicentenario de la batalla de Ayacucho.
344. Se envió el oficio N°163-2024-2025-LVOM-CEMBI/CR con fecha 28 de noviembre al Sr. RÓMULO HUAMANI JANAMPA, Invitándole a participar a la ceremonia de reconocimiento y conmemoración del bicentenario de la batalla de Ayacucho.
345. Se envió el oficio N°164-2024-2025-LVOM-CEMBI/CR con fecha 28 de noviembre a la Presidenta de la Asociación de micro y pequeños empresarios-SMYPE, Sra. AUGUSTA VILA MONTAÑO, Invitándola a participar a la ceremonia de

reconocimiento y conmemoración del bicentenario de la batalla de Ayacucho.

346. Se envió el oficio N°165-2024-2025-LVOM-CEMBI/CR con fecha 28 de noviembre a la Presidenta de la comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República Sra. LADY MERCEDES CAMONES SORIANO, Trasladándole sobre la solicitud del alcalde de la municipalidad distrital de quinua – Ayacucho, con Referencia al oficio N° 853 - 2024-MDQ/A.
347. Se envió el oficio N°166-2024-2025-LVOM-CEMBI/CR con fecha 28 de noviembre al Presidente del Centro de Estudios Históricos Militares, GRAL.BRIG. JUAN URBANO REVILLA, Invitándole a participar a la ceremonia de reconocimiento y conmemoración del bicentenario de la batalla de Ayacucho.
348. Se envió el oficio N°167-2024-2025-LVOM-CEMBI/CR con fecha 28 de noviembre a la Presidenta de la comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República Sra. LADY MERCEDES CAMONES SORIANO, Trasladándole sobre la solicitud del alcalde de la municipalidad provincial de fajardo – Ayacucho, con Referencia al oficio N°850-2024-MPF-H/A.
349. Se envió el oficio N°168-2024-2025-LVOM-CEMBI/CR con fecha 28 de noviembre a la Presidenta de la comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República Sra. LADY MERCEDES CAMONES SORIANO, Trasladándole sobre la solicitud del alcalde de la municipalidad DISTRITAL DE SANCOS – Ayacucho, con Referencia al oficio N°850-2024-MPF-H/A.
350. Se envió el oficio N°169-2024-2025-LVOM-CEMBI/CR con fecha 28 de noviembre al Congresista de la República, Sr. FLORES RAMÍREZ ALEX RANDU, Invitándole a participar a la ceremonia de reconocimiento y conmemoración del bicentenario de la batalla de Ayacucho.
351. Se envió el oficio N°170-2024-2025-LVOM-CEMBI/CR con fecha 28 de noviembre al Congresista de la República, Sr. TACURI VALDIVIA GERMÁN ADOLFO, Invitándole a participar a la ceremonia de reconocimiento y conmemoración del bicentenario de la batalla de Ayacucho.
352. Se envió el oficio N°171-2024-2025-LVOM-CEMBI/CR con fecha 29 de noviembre al Presidente del Centro de Estudios Históricos Militares, Sr. GRAL.BRIG. JUAN URBANO REVILLA, sobre respuesta a invitación con referencia al oficio N° 1031-P-CEHMP-24.
353. Se envió el oficio N°172-2024-2025-LVOM-CEMBI/CR con fecha 29 de noviembre al Ministro de Defensa, Sr. WALTER ENRIQUE ASTUDILLO CHAVEZ, sobre suspensión de

actividad de la develación del monumento a los vencedores de la batalla de Junín de fecha 30.11.24, con referencia al oficio N°139-2024-2025-LVOM-CEMBI/CR.

4.3 EN EL ÁMBITO INTERNO DEL CONGRESO

Se comunicó a la Presidencia del Congreso y a la Oficialía Mayor, la realización de diversas actividades institucionales relacionadas a la celebración de los 200 años del primer Congreso Constituyente, las cuales han sido propuestas por las principales oficinas administrativas del Congreso de la República y que se detallan a continuación:

Se solicitó a la Oficina de Comunicaciones

- Conferencia de Prensa para el lanzamiento de actividades.
- Concurso de Logo del Bicentenario.
- Diseño e implementación de Branding e iluminación en los edificios del Congreso.
- Difusión de saludos por los 200 años del Congreso.
- Microprogramas para Congreso TV.
- Podcast para Radio.
- Elaboración de contenido multiplataforma (incluye video 3D)
- Develación de Estampilla por el Bicentenario del Primer Congreso Constituyente del Perú y Primeras Mujeres Parlamentarias del Perú, esta última incluye postales alusivas a Irene Silva de Santolalla, Manuela Billinghurst López, Alicia Blanco Montesinos y María Colina de Gotuzzo.
- Presentación de la Moneda de Plata Conmemorativa de los 200 años de la instalación del Congreso Constituyente, actividad gestionada
- Exposiciones Fotográficas e itinerantes (Día de la Mujer, Constituciones Políticas, Mujeres Parlamentarias, principales constituyentes).

Se solicitó a la Alta Dirección

- Develación de pinturas con personajes representativos para la historia del Congreso.
- Mantenimiento de la infraestructura general del Congreso.
- Organización de la Sesión Solemne del Bicentenario.
- Coordinar la presentación de la Orquesta Sinfónica Nacional.

Se solicitó al Fondo Editorial

- Publicaciones de la colección Bicentenario propuestas por el Fondo Editorial y aprobadas por la Mesa Directiva.

Se solicitó a la Oficina de Participación Ciudadana

- El desarrollo de conferencias asociadas a la Agenda Bicentenario en el programa Martes Democrático.
- Desarrollo de Plenarios Bicentenarios del programa Parlamento Joven, Parlamento Universitario y Parlamento Escolar.
- Concurso de Pintura.
- Concurso de Ensayo Literario.
- Visitas Guiadas al Palacio Legislativo.
- Teatro de Títeres.
- Tour Bicentenario.

Asimismo, se han desarrollado actividades propias de la Comisión Especial Multipartidaria Bicentenario de la independencia del Perú, durante el período parlamentario 2021-2026 y que se describen a continuación

- Sesiones y/o programas de actividades conmemorativas en las localidades de: Paracas – Ica, Lambayeque, Ayacucho y Piura considerando su trascendencia histórica y cultural.
- Mesas de Trabajo Interinstitucional que brinden la solución técnica a la problemática de restauración integral, mantenimiento y puesta en valor del Museo del Congreso; así como otros museos de relevancia nacional.
- Requerimiento de información que impulse la culminación del proceso de elaboración de microformas con valor legal del Patrimonio Parlamentario Histórico del Congreso de la República.
- Impulso del convenio del Congreso con la MML para la implementación de programas, proyectos, mecanismos y toda herramienta que coadyuve al saneamiento, construcción, ampliación remodelación, refacción, acondicionamiento, puesta en valor, restauración de los inmuebles que son de propiedad y que administra el Congreso de la República en el Centro Histórico de Lima.
- Participación en el Grupo de Trabajo "Consejo Bicentenario"

V. ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS POR EL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DEL PERU

5.1 ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA COMISIÓN

N°	FECHA	INSTITUCION	ACTIVIDAD
1	13/06/2023	Congreso de la Republica.	Reunión con la Ministra de Cultura, Viceministra de Patrimonio, Director Bicentenario y funcionarios de Huaura para abordar la problemática del Monumento Histórico Balcón de Huaura.
2	13/06/2023	Congreso de la Republica.	Inspección en las obras de restauración del Centro Histórico de nuestra capital, esto a fin de dar seguimiento y cumplimiento de las obras de restauración de la iglesia y convento de Santo Domingo, de la Plazuela de la Buena Muerte y del Antiguo Hospital de San Andrés.
3	12/07/2023	Congreso de la Republica.	Reconocimiento a la ex Policía Forestal - Guardia Civil, por su lucha contra el terrorismo (1980 - 2000) y por su contribución en la defensa de nuestros recursos naturales.
4	26/07/2023	Municipalidad distrital de Huaura.	Participación en el 426 Aniversario de la fundación española de Huaura, antigua Villa Carrión de Velasco.
5	24/08/2023	Congreso de la Republica.	Reconocimiento a la agrupación de danza "Antonio Raimondi" de Peralvillo del distrito de Chancay, provincia de Huara.
6	01/09/2023	Congreso de la Republica.	Concierto didáctico sinfónico Pukallay, con la academia de música Oyola Flores bajo el lema "formar mejores ciudadanos a través de las artes"
7	18/09/2023	Congreso de la Republica.	Conmemoración del 201° Aniversario del Parlamento Nacional, se realizó la apertura de la exposición fotográfica de historia y personajes ilustres de la Constitución, y un homenaje a los contribuyentes de la primera democracia.
8	25/09/2023	Congreso de la Republica.	Reconocimiento como defensores de la Democracia y la Pacificación Nacional, que participaron en los conflictos armados en defensa de la soberanía nacional y en el proceso de pacificación nacional.
9	20/10/2023	Congreso de la Republica.	Reunión con los funcionarios del Ministerio de Cultura, del Gobierno Regional de Lima, Municipalidades Provinciales de Huaral, Barranca y Huaura y las Municipalidades Distritales de Huaura y Vegueta, el director del Punto del Punto de Cultura 380 y representante de la sociedad civil, sobre el procedimiento y viabilidad de la creación de la

			Dirección Desconcentrada de Cultura para la Región Lima Provincias.
10	21/10/2023	Congreso de la Republica.	Reunión con el Sr Carlos Tenicela - Coordinador General del equipo impulsor del PL 05836/2023-PE, Ley de los Símbolos de la Patria, Símbolos del Estado y Emblemas Nacionales, iniciativa ciudadana que tiene como objetivo establecer y poner en valor los símbolos patrios como base de nuestra identidad nacional.
11	25/09/2023	Congreso de la Republica.	Reconocimiento a los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional que participaron en los conflictos armados en defensa de la soberanía nacional y en el proceso de pacificación nacional.
12	17/11/2023	Congreso de la Republica.	Reconocimiento a los (64) Licenciados Batallón de servicios N° 2 "Los Cabitos"- Ayacucho. Por su contribución al proceso de pacificación nacional, en la lucha contra el terrorismo y en la defensa de la democracia.
13	20/11/2023	Congreso de la Republica.	Reunión con el Alcalde de la Municipalidad Distrital de Quinua, respecto a la conmemoración del Bicentenario de la Batalla de Ayacucho.
14	21/11/2023	Congreso de la Republica.	Conferencia de prensa por los 203 años del Primer Grito de Libertad del Perú en el distrito de Huaura; con el objetivo dar a conocer las actividades sociales, culturales y conmemorativas programadas para esta importante fecha festiva para el distrito de Huaura.
15	22/11/2023	Congreso de la Republica.	Reunión con el Gobernador Regional de Junín y del Alcalde de la Municipalidad Provincial de Junín, respecto a la conmemoración del Bicentenario de la Batalla de Junín.
16	28/02/2024	Congreso de la Republica.	Primer Encuentro Internacional de historiadores, Profesionales y Estudiantes de Latinoamericana: Junín Bicentenario. A 200 Años del grito de la libertad americana, acto académico que se realizará el 28 de febrero del presente año. Evento realizado de manera conjunta con el Gobierno Regional de Junín.
17	18/03/2024	Congreso de la Republica.	Reunión con el alcalde de la provincia de Junín Sr. Elio Monzón Zevallos Meza con el objetivo dar a conocer, los avances sobre los proyectos de inversión que vienen priorizando como gobierno local y el estado situacional de los proyectos de inversión que forman parte de la agenda de conmemoración del Bicentenario de la Independencia del Perú.
18	17/04/2024	Ministerio de Cultura y Municipalidad provincial de Junín	Participación en el lanzamiento de la danza la chonguinada de la provincia de Junín 2024.

19	18/04/2024	Congreso de la república	Participación en una reunión con el presidente de la Corte Superior de Justicia de la Libertad, Dr. Víctor Alberto Martín Burgos Mariños, con respecto a las actividades conmemorativas por los 200 años de la creación de la corte de justicia.
20	19/04/2024	Congreso de la república	Participación en una conferencia magistral: Don José Francisco de San Martín y Matorrasel Estrategia Militar y Libertador del Perú, fundador de la Legión peruana de la guardia, organizado por el Congresista José Luis Elías Ávalos.
21	22/04/2024	Ministerio de Defensa	Participación en una reunión de coordinación en la Comandancia General del Ejército, por la conmemoración del bicentenario de las Batallas de Junín y Ayacucho
22	17/06/2024	Congreso de la república	Reconocimiento a las Asociaciones Cívicas y Militares, por su compromiso con la historia y del Bicentenario de la Independencia del Perú.
23	05/07/2024	Congreso de la república	Mesa Técnica de Trabajo con la participación del equipo de la comisión, sobre el Saneamiento físico legal del inmueble del Monumento Histórico Balcón de Huaura.
24	02/08/2024	Congreso de la república	Participación en la ceremonia de izamiento de la bandera del departamento de Junín, con motivo de la conmemoración de los 200 años de la heroica batalla de Junín.
25	02/08/2024	Congreso de la república	Participación en la ceremonia conmemorativa por los 200 años de la heroica batalla de Junín y reconocimiento a las Instituciones Educativas que llevan el nombre en honor a la Batalla de Junín.
26	06/08/2024	Departamento de Junín.	Participación en las actividades centrales por el bicentenario de la heroica batalla de Junín.
27	21/08/2024	Congreso de la república	Mesa Técnica de Trabajo con la participación del equipo de la comisión, sobre la Denominación del año 2025 como Año del Bicentenario del paso a la inmortalidad de José Faustino Sánchez Carrión y la Defensa de la República
28	22/08/2024	Congreso de la república	Mesa Técnica de Trabajo con la participación del equipo de la comisión, sobre la Ley que declara de interés nacional la reestructuración, conservación, exhibición y difusión del monumento histórico casa donde nació el Prócer de la independencia y tribuno de la República Doctor José Faustino Sánchez Carrión

En cumplimiento del plan de trabajo, en el cuarto trimestre del año 2024 (octubre, noviembre y diciembre), nuestra Comisión Especial ha continuado realizando actividades, que a continuación detallamos:

29. Mesa técnica de trabajo con la participación del equipo de la comisión sobre el Proyecto de Ley: que declara de interés nacional y necesidad pública el cierre de brechas de infraestructura de servicios básicos en el departamento de Junín, con motivo de conmemorarse los 200 años de la batalla de Junín realizada el 15 de octubre del presente año en el Congreso de la Republica.
30. Mesa técnica de trabajo con la participación del equipo de la comisión, Sobre los alcances oficiales de la Ruta del Libertador para su oficialización, realizada el 29 de octubre del presente año en el Congreso de la Republica.
31. Mesa Técnica de Trabajo con la participación del equipo de la comisión, sobre, Análisis y Evaluación del Proyecto de Ley: que declara de interés nacional y necesidad pública el cierre de brechas de infraestructura de servicios básicos en los departamentos de Junín y Ayacucho, con motivo de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho, realizada el 05 de noviembre del presente año en el Congreso de la Republica.
32. Participación en la presentación del libro de oro, en conmemoración al bicentenario de la batalla de Junín, realizada el 26 de noviembre del presente año en el Congreso de la Republica.
33. Participación en la exposición de fotos por los 200 años de la Heroica Batalla de Ayacucho, realizada el 26 de noviembre del presente año en el Congreso de la Republica.
34. Participación en la ceremonia de reconocimiento y conmemoración del bicentenario de la batalla de Ayacucho, realizada el 02 de diciembre del presente año en el Congreso de la Republica.

5.2 SEGUIMIENTO DEL AVANCE DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS DEL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DEL PERU

De acuerdo al Decreto Supremo N° 011-2021 y Tomando en cuenta el IV componente de la agenda de conmemoración del bicentenario de la independencia del Perú, con el objetivo de la consolidación del Perú como un país del siglo XXI que lo convierte en un caso ejemplar de uso de la historia en la construcción del futuro de un país, y que cuenta con una serie de proyectos culturales a gran escala y patrimonio recuperado, como evidencia activa de la conmemoración, se contempló en la agenda 06 programas (programa cultural y académico, agenda internacional, conmemoración histórica, programa de valores bicentenario, parques culturales y obra) que se implementarán a nivel nacional, y para el cumplimiento de los objetivos de la agenda se designó a las entidades responsables a ejecutar, articular, e impulsar la implementación y cumplimiento de las actividades conmemorativas del bicentenario de la independencia del Perú.

De lo mencionado, en cumplimiento de nuestras obligaciones de seguimiento y fiscalización nuestra comisión ha solicitado información actualizada a las instituciones responsables sobre las actividades de la Agenda de Conmemoración del Bicentenario de la Independencia del Perú de la siguiente manera:

MINISTERIO DE CULTURA – PROYECTO ESPECIAL BICENTENARIO

Con fecha 03 de septiembre del 2024 solicitamos información actualizada sobre las actividades (festivales, certámenes, concursos, pasacalles, conferencias, exposiciones, ceremonias, conciertos, y otros eventos análogos) a nivel nacional que forman parte de la Agenda de Conmemoración del bicentenario de la batalla de Junín y la batalla de Ayacucho, con el siguiente detalle:

Departamento

Nombre de la actividad	Lugar donde se desarrolló la actividad	Fecha	Costo Actualizado (soles)	Proveedor	Objetivo (detalle del cumplimiento de la actividad)
------------------------	--	-------	---------------------------	-----------	---

Así mismo hemos solicitado la siguiente información:

Nº	Requerimiento
1	Información actualizada y detallada del 4.1.3 programa expositivo (página 9, 10), a cargo de la Unidad Ejecutora 008-Proyectos Especiales del Ministerio de Cultura, que tienen alcance nacional e internacional; precisando si se han cumplido con las actividades; sobre las exposiciones virtuales e itinerantes que tienen alcance nacional e internacional, exposición nacional/ Perú bicentenario, y exposiciones regionales, cuyos plazos vencen en el mes de diciembre del 2024.
2	Información actualizada y detallada sobre el 4.1.4 concursos, festivales. eventos especiales y reconocimientos (página 12, 13,23 y 32), a cargo de la Unidad Ejecutora 008-Proyectos Especiales del Ministerio de Cultura, que tienen alcance nacional; precisando si se han cumplido con las actividades; programación TV Perú, experiencia bicentenario en la escuela, congreso internacional las independencias americanas, cuyos plazos vencen en el mes de diciembre del 2024.
3	Información actualizada y detallada sobre el 4.1.4 concursos, festivales, eventos especiales y reconocimientos (página 47), a cargo de la Unidad Ejecutora 008-Proyectos Especiales y del Ministerio de Cultura, que tienen alcance nacional; precisando si se han cumplidos con las actividades, sobre la gobernanza cultural del bicentenario: consolidación del pacto por la cultura en alianza con la UNESCO, cuya actividad inició en el año 2021 y vence en el año 2030.
4	Información actualizada y detallada 4.1.4 concursos, festivales, eventos especiales y reconocimientos (página 48), a cargo de del Ministerio de Cultura, que tienen alcance nacional; precisando si se han cumplidos con las actividades, sobre la postulación de las prácticas y significados asociados a la preparación y consumo de ceviche, expresión de la cocina tradicional; cuyos plazos vencen en el mes de diciembre del 2024.
5	Información actualizada y detallada 4.1.4 concursos, festivales, eventos especiales y reconocimientos (página 55),a cargo de la Unidad Ejecutora 008- Proyectos Especiales del Ministerio de Cultura, que tienen alcance nacional; precisando si se han cumplido con la actividad, sobre el reconocimiento simbólico por el bicentenario de la independencia del Perú; sobre todo especificando reconocimientos a personalidades e hitos más representativos por el bicentenario de la heroica batalla de Junín y Ayacucho, cuyos plazos vencen en el mes de diciembre del 2024.
6	Información actualizada y detallada 4.1.4 concursos, festivales. eventos especiales y reconocimientos (página 64),a cargo de la Unidad Ejecutora 008- Proyectos Especiales del Ministerio de Cultura, que tiene alcance nacional; precisando si se han cumplido con la actividad, de la plataforma interactiva de la independencia; sobre todo especificando en qué lugares de nuestro país se brindó información histórica a la ciudadanía, en especial a los estudiantes de manera didáctica y audiovisual, con referencia al bicentenario de la heroica el batalla de Junín y Ayacucho, cuyos plazos vencen en el mes de diciembre del 2024.
7	Información actualizada y detallada del 4.1.4 concursos, festivales, eventos especiales y reconocimientos (página 65),a cargo de la Unidad Ejecutora 008- Proyectos Especiales del Ministerio de Cultura, que tiene alcance internacional; precisando si se han cumplido con la actividad, exposición internacional; y en qué partes del mundo se promovió las alianzas estratégicas del turismo cultural, sobre todo especificando si se fomentó en el exterior la conmemoración de las heroicas batalla de Junín y Ayacucho por su bicentenario, cuyos plazos vencen en el mes de diciembre del 2024.

Con fecha 28 de diciembre del 2024, el ministerio de Cultura nos remitió el oficio N° 001971-2024-DM/M con referencia al oficio solicitada por nuestra comisión N° 031-2024-2025-LVOM-CEMBI/CR sobre las actividades de la Agenda de Conmemoración del Bicentenario de la Independencia del Perú de la siguiente manera:

RESUMEN SOBRE LOS FESTIVALES, CERTÁMENES, CONCURSOS, PASACALLES, CONFERENCIAS, EXPOSICIONES, CEREMONIAS, CONCIERTOS, Y OTROS EVENTOS ANÁLOGOS REALIZADOS EN JUNÍN Y AYACUCHO EN EL MARCO DE LA AGENDA DE CONMEMORACIÓN DEL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DEL PERÚ

1) Cuadro 1: Actividades desarrolladas en Ayacucho y Junín:

Nombre de la actividad	Lugar de la actividad	Fecha	Costo actualizado o (soles)	Proveedor	Objetivo (detalle de cumplimiento de la actividad)
Ciclo de conversatorios "Rumbo al congreso internacional bicentenario: las independencias americanas"	Ayacucho, Ayacucho	30/04/2024	0.00	Ninguno	El PEB, en coordinación con la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga realizaron el Conversatorio "Huamanga, Huanta y Cangallo y la batalla de Ayacucho", para motivar la discusión histórica sobre el proceso de la independencia y promover el "Congreso Internacional de Historia Las Independencias Americanas".
Presentación del libro Rebeldes y Leales: Huamanga en la independencia del Perú (1795-1824)	Ayacucho, Ayacucho	30/05/2024	0.00	Ninguno	El libro "Rebeldes y leales: Huamanga en la Independencia del Perú (1795-1824)" del historiador David Quichua, perteneciente a la serie Lecturas de la Independencia de la Biblioteca Bicentenario, fue presentado en el Cine teatro de la municipalidad provincial de Huamanga, y contó con la participación del autor del libro y los comentarios del historiador Jaime Urrutia y de Agustín Panizo, en representación de la Biblioteca Bicentenario del Proyecto Bicentenario.

Ceremonia de homenaje póstumo en memoria al gran mariscal de Ayacucho, Gral. Antonio José de Sucre	Quinua, Ayacucho	04/06/2024	4,700	Sonidos Contreras E.I.R.L. Llallahui Quispe Sonia	Esta actividad tuvo como objetivo reconocer y honrar el legado histórico del Gran Mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre en el distrito de Quinua, como actos preliminares del inicio de las actividades cívico culturales en conmemoración del Bicentenario de la Batalla de Ayacucho.
Noche de gala bicentenario Junín 2024 en el Gran Teatro Nacional de Lima	Lima	05/08/2024	324,052	Vanguardia Eventos BTL S.A.C. Classis Corp. S.R.L Gómez Cristóbal Saul Elías D'Primera Eventos SAC Anabel Roció Sanabria Núñez Despierta Galería SAC Merchandising y Publicidad Perú S.A.C Baglietto Kniep Luis Ángel Gómez Cristóbal Saul Elías Martínez Soto Freddy Ronal Avi Multimedios E.I.R.	En el Gran Teatro Nacional, se llevó a cabo una destacada actividad conmemorativa para celebrar el Bicentenario de la Batalla de Junín. La ceremonia contó con la presencia de las principales autoridades nacionales, regionales y locales, así como de distinguidos invitados de las misiones diplomáticas acreditadas en el Perú.
Cena de gala bicentenario Junín 2024				El Ministerio de Cultura ofreció una cena de gala como parte de las actividades conmemorativas por el Bicentenario de la Batalla de Junín. Contó con la asistencia de las principales autoridades nacionales, regionales y locales, así como de distinguidos invitados de las misiones diplomáticas acreditadas en el Perú	
Desfile cívico escolar por el bicentenario de la batalla de Junín	Junín, Junín	04/08/2024	675,192.04	Vanguardia Eventos BTL S.A.C.	Para conmemorar este importante acontecimiento nacional, el Santuario Histórico de Chacamarca fue el escenario de diversas actividades cívico-militares, que contaron con la participación de las principales autoridades nacionales, regionales y locales, representantes de los países amigos, así como de la ciudadanía.
		06/08/202		Guiza Construcciones E.I.R.L	
				Turismo y Servicios JY	

		4		E.I.R.L. Suburbia Producciones S.A	
		06/08/2024			
Ceremonia conmemorativa por el bicentenario de la batalla de Junín					
Encendido del monumento a los vencedores de Junín					
Concierto por el 200 aniversario de la batalla de Junín	Junín, Junín	06/08/2024	192,243.24	Vanguardia Eventos BTL S.A.C.	Actividad realizada en el marco del bicentenario de la batalla de Junín. Esta iniciativa buscó resaltar el valor cultural y artístico de las tradiciones musicales de la región.
Exposición temporal “zona bicentenario”	Junín, Ayacucho, San Martín, Loreto, Lima, Cusco	Sept-Dic 2024	20,000	Imprenta-Textiles & Artículos a full Sose Grafics E.I.R.L.	Exposición infográfica que presenta contenidos históricos de manera didáctica resaltando los hitos más importantes en el proceso de la consolidación de nuestra independencia mediante las batallas de Junín y Ayacucho. Diseñada para implementarse en un espacio físico dentro de museos y centros culturales en seis regiones del país, quienes solicitaron interés en su aplicación a inicios del presente año.

CUADRO N° 01 RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO Y JUNIN AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2024

Fuente: Informe 000007-2024-UAPI-PEB-JCD/MC. Actualizado al 28 de diciembre del 2024
Elaboración: Comisión Especial Multipartidaria del Bicentenario de la Independencia del Perú

RESUMEN SOBRE LAS ACTIVIDADES “EDICIÓN BICENTENARIO” REALIZADAS EN EL MARCO DEL DECRETO SUPREMO N° 001-2024-MC

2) Cuadro 2: Actividades desarrolladas en Ayacucho y Junín

Nombre de la actividad	Lugar de la actividad	Fecha	Costo actualizado (soles)	Proveedor	Objetivo (detalle de cumplimiento de la actividad)
LANZAMIENTO DEL CARNAVAL AYACUCHANO 2024 - EDICIÓN BICENTENARIO	Ayacucho, Ayacucho	26/01/2024	0.00	Ninguno	Realizado con el objetivo de promover la diversidad cultural de esta importante fiesta.
CARNAVAL AYACUCHANO 2024 - EDICIÓN BICENTENARIO	Ayacucho, Ayacucho	10/02/2024	57,427.00	Alto Estilo Mobiliario y Eventos SAC Ancajima Vivanco Lesly Beteta Cespedes Alan J & G Colors Graff S.A.C. Standes Corporativos S.A.	El curso inició en el parque Simón Bolívar y recorrió las principales calles hacia la Plaza de Armas de Huamanga. Contó con la participación de 100 instituciones y la especial participación de la comparsa del Bicentenario.
LANZAMIENTO “XX CONCURSO NACIONAL DE HUAYLARSH WANKA 2024 - EDICIÓN BICENTENARIO	Lima	23/02/2024	2,900.00	Producciones Aladam E.I.R.L	El evento se realizó en el video wall y explanada del ministerio de Cultura, con la puesta en escena de 100 parejas de Huaylarsh y la asistencia de más de 300 personas.
LANZAMIENTO DE LA FESTIVIDAD SEMANA SANTA EN AYACUCHO - EDICIÓN BICENTENARIO	Ayacucho	28/02/2024	0.00	Ninguno	El evento tuvo como objetivo difundir la agenda de actividades de esta importante manifestación religiosa.
SEMANA SANTA AYACUCHANA 2024 - EDICIÓN BICENTENARIO	Ayacucho, Ayacucho	27/03/2024 - 31/03/2024	37,460	Huillca Baldeon Saturnina Men Graph S.A.C. Hurtado Rivera Benjamín Producciones Aladam E.I.R.L.	El PEB participó entregó 4000 velas a la Hermandad de Cargadores del Señor del Santo Sepulcro y la Virgen Dolorosa y a la población asistente a la procesión del Señor del Santo Sepulcro y la Virgen Dolorosa, entrega de 4000 afiches de la actividad, entrega de letras LED y participación de los voluntarios del Bicentenario.

XXXII CONCURSO NACIONAL OFICIAL DEL HUAYLARSH NACIÓN WANKA	Huancayo, Junín	01/04/2024	0.00	Ninguno	Se presentaron 52 conjuntos que llegaron de cada distrito de la provincia de Huancayo. Los ganadores recibieron el trofeo Bicentenario.
LANZAMIENTO FESTIVIDAD DE LAS CRUCES DE MAYO Y EL GRAN CONCURSO DE LA CHONGUINADA JUNINA – EDICIÓN BICENTENARIO	Junín, Junín	17/04/2024	0.00	Ninguno	Participaron más de 2,000 personas que disfrutaron de los concursos de Chutos, Argentinos, orquestas y de la Chonguinada. Los ganadores de los primeros lugares de cada concurso fueron premiados con medallas y trofeos Bicentenario.
FESTIVIDAD DE LAS CRUCES DE MAYO Y EL GRAN CONCURSO DE LA CHONGUINADA JUNINA – EDICIÓN BICENTENARIO	Junín, Junín	01/05/2024 - 03/05/2024	31,600	Producciones Aladam E.I.R.L. Asia South American Business S.A.C. Cruz Flores Hilda Percy Sanchez Arzapalo Producciones Aladam E.I.R.L.	
LANZAMIENTO EXPO PERÚ LOS ANDES AYACUCHO -2024 - EDICIÓN BICENTENARIO	Ayacucho	09/05/2024	0.00	Ninguno	Evento organizado por la Mancomunidad Regional de Los Andes, el Gobierno Regional de Ayacucho con el apoyo del PEB. Asistieron ministros de estado, gobernadores regionales de la mancomunidad regional y productores de las seis regiones participantes.
LANZAMIENTO DEL BICENTENARIO DE LA BATALLA DE JUNÍN - EDICIÓN BICENTENARIO	Junín	19/05/2024	0.00	Ninguno	Actividad organizada por el Gobierno Regional con apoyo del PEB, que participó con el equipo de voluntarios, redes digitales y el programa Modo Bicentenario. El evento convocó a la población en general.
FERIA LO BUENO DE VIAJAR HUANCAYO - EDICIÓN BICENTENARIO	Huancayo, Junín	07/06/2024 - 09/06/2024	0.00	Ninguno	Evento realizado por Promperú, donde Junín y Ayacucho tuvieron un stand especial para mostrar sus productos.
EXPO PERÚ LOS ANDES AYACUCHO 2024 -	Ayacucho	25/07/2024 -	18,500	Avi Multimedios E.I.R.L.	El evento reunió a emprendedores, artesanos, compradores internacionales y expositores de la

EDICIÓN BICENTENARIO		09/07/2024			gastronomía peruana. El PEB participó mediante el brandeado con imágenes y personajes alusivos al bicentenario y con la cobertura del evento a través del Programa de TV Modo Bicentenario.
SANTIAGO WANKA 2024 - EDICIÓN BICENTENARIO	Huancayo, Junín	15/08/2024	430.70	Instinto Merchadising SAC	El PEB entregó trofeos a los ganadores del concurso en las diversas categorías.
8° FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE HUANCAYO - EDICIÓN BICENTENARIO	Huancayo, Junín	16/08/2024 - 25/08/2024	16,600	Avi Multimedios E.I.R.L	El PEB participó con el brandeo del pórtico y letras decorativas, así como la presencia de Voluntarios del Bicentenario.
FIESTA PATRONAL DE LA VIRGEN DE COCHARCAS - EDICIÓN BICENTENARIO	Quinua, Ayacucho	09/09/2024 - 12/09/2024	7,670	Silver Multiservicios Integrales S.R.L	La Fiesta Patronal de Quinua en honor a la Santísima Virgen de Cocharcas es una de las celebraciones religiosas más importantes del distrito, que se lleva a cabo cada año en el mes de septiembre. Esta festividad reúne a los devotos locales y a visitantes de otras regiones del Perú, quienes participan en diversas actividades religiosas, culturales y sociales. La Virgen de Cocharcas, también conocida como "La Mamacha Cocharcas," es venerada como la protectora de los agricultores y ganaderos de la región.
FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA "CANTO A LA LIBERTAD LATINOAMERICANA" - EDICIÓN BICENTENARIO	Quinua, Ayacucho	05/10/2024 - 06/10/2024	74,760	Lizeth Sarita Rojas Huamán Gilgal producciones SAC Silver Multiservicios Integrales S.R.L	El evento "Canto a la Libertad" se organizó en conmemoración del bicentenario de la independencia del Perú, destacando el papel histórico de Quinua como escenario de la batalla de Ayacucho. El evento incluyó un concierto con artistas nacionales e internacionales, así como un festival de gastronomía y artesanía.

CUADRO N° 02 RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN Y AYACUCHO AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2024

Fuente: Informe 000007-2024-UAPI-PEB-JCD/MC. Actualizado al 28 de diciembre del 2024

Elaboración: Comisión Especial Multipartidaria del Bicentenario de la Independencia del Perú

RESUMEN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LAS REGIONES

Nombre de la actividad	Lugar donde se desarrolló la actividad	Fecha
FESTIVIDAD DE DESPEDIDA DE LOS NEGRITOS DE HUÁNUCO, EN HONOR AL NIÑO JESÚS - EDICIÓN BICENTENARIO	Huánuco	19/01/2024
64° CONCURSO NACIONAL Y 14° MUNDIAL DE MARINERA - EDICIÓN BICENTENARIO	Callao	28/01/2024
FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DE LA CANDELARIA – EDICIÓN BICENTENARIO	Puno	02/02/2024-13/02/2024
CARNAVAL INOLVIDABLE 2024 - EDICIÓN BICENTENARIO	Cajamarca	11/02/2024
APU TUSUY 2024 "COSTUMBRES QUE NOS UNEN" - EDICIÓN BICENTENARIO	Abancay	02/03/2024-03/03/2024
59° FESTIVAL INTERNACIONAL DE LA VENDIMIA IQUEÑA, FIVI 2024 - EDICIÓN BICENTENARIO	Ica	06/03/2024-09/03/2024
XVIII EDICIÓN DEL CARNAVAL ORIGINARIO DEL PERÚ PUKLLAY 2024 - EDICIÓN BICENTENARIO	Apurímac	14/03/2024-15/03/2024
FESTIVIDAD DEL SEÑOR DE LA SOLEDAD 2024 - EDICIÓN BICENTENARIO	Ancash	09/05/2024
III FESTIVAL DE LA CHUNGUINADA CERREÑA - EDICIÓN BICENTENARIO	Pasco	25/05/2024-26/05/2024
RAYMI LLAQTA DE LOS CHACHAPOYAS - EDICIÓN BICENTENARIO	Amazonas	07/06/2024-08/06/2024
FESTIVAL REGIONAL DE MÚSICA “A RITMO DE CUMBIA PERUANA” - EDICIÓN BICENTENARIO	Piura	21/06/2024
FIESTA DE SAN JUAN DE KIMBIRI - EDICIÓN BICENTENARIO	Cusco	22/06/2024
FIESTA SAN JUAN FESTEJA - EDICIÓN BICENTENARIO	Loreto	22/06/2024-24/06/2024
INTI RAYMI - EDICIÓN BICENTENARIO	Cusco	23/06/2024-25/06/2024
50° SEMANA TURÍSTICA DE MOYOBAMBA – EDICIÓN BICENTENARIO	San Martín	25/06/2024-26/06/2024
FESTIVIDAD DE SAN PEDRITO DE CHIMBOTE - EDICIÓN BICENTENARIO	Ancash	29/06/2024

DESFILE CÍVICO MILITAR POR EL BICENTENARIO DE LAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO – EDICIÓN BICENTENARIO	Lima	29/06/2024
GRAN CORSO OLAYA - EDICIÓN BICENTENARIO	Lima	30/06/2024
IV EDICIÓN DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE GUITARRA “XIMÉNEZ ABRIL” - EDICIÓN BICENTENARIO	Lima	01/07/2024-03/07/2024
I FESTIVAL NACIONAL DE DANZAS TÍPICAS DEL PERÚ - EDICIÓN BICENTENARIO	Ancash	06/07/2024
LA FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DEL CARMEN - EDICIÓN BICENTENARIO	Ancash	16/07/2024
PERÚ MUCHO GUSTO TACNA 2024 - EDICIÓN BICENTENARIO	Tacna	26/07/2024-28/07/2024
FEXTICUM 2024: FERIA DE EXPOSICIONES TÍPICO CULTURALES DE MONSEFÚ - EDICIÓN BICENTENARIO	Lambayeque	27/07/2024-30/07/2024
GRAN PARADA Y DESFILE Y CÍVICO MILITAR 2024 POR FIESTAS PATRIAS – EDICIÓN BICENTENARIO	Lima	29/07/2024
XII FESTIVAL ECOTURISTICO - VICUÑA 2024 - EDICION BICENTENARIO	Arequipa	07/09/2024-08/09/2024
EXPO AMAZONICA - EDICIÓN BICENTENARIO	Madre de Dios	19/09/2024-22/09/2024
FESTIVIDAD VIRGEN DE LAS MERCEDES, PATRONA DE JULIACA – EDICIÓN BICENTENARIO	Juliaca, Puno	24/09/2024
FESTIVAL BINACIONAL TURISMO Y PAZ – EDICIÓN BICENTENARIO	Tumbes	27/09/2024-28/09/2024
VIVA PUCALLPA 2024 – EDICIÓN BICENTENARIO	Pucallpa, Ucayali	10/10/2024-11/10/2024
XII FESTIVAL ECOTURISTICO - VICUÑA 2024 - EDICION BICENTENARIO	Arequipa	07/09/2024-08/09/2024

CUADRO N° 03 RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS REGIONES AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2024

Fuente: Informe 000007-2024-UAPI-PEB-JCD/MC. Actualizado al 28 de diciembre del 2024

Elaboración: Comisión Especial Multipartidaria del Bicentenario de la Independencia del Perú

RESUMEN DE EXPOSICIONES VIRTUALES E ITINERANTES

N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	LUGAR DE LA ACTIVIDAD	FECHA	OBJETIVO (DETALLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD)	N° DE VISITAS
1	INDEPENDENCIA: IMÁGENES EN CONSTRUCCIÓN	Virtual	2021-2024	Esta exposición muestra algunos de los principales relatos que forman parte del imaginario de la construcción de la república del Perú. Busca revelar cómo algunas de las imágenes icónicas que se han reproducido, sobre todo desde el sistema educativo, son construcciones en torno a procesos complejos que nos invitan a repensar aquello que hoy nos identifica como nación. La muestra reconoce a aquellos héroes y heroínas que participaron desde el anonimato en la Independencia del Perú. Asimismo, reivindica la figura de Túpac Amaru, el papel fundamental que tuvo con su insurrección y el rol que jugaron las mujeres en el apoyo de su causa. La exposición se puede visitar a través del siguiente enlace: https://bicentenario.gob.pe/exposiciones/independencia/	66,284
2	EL DESAFÍO DEL NOSOTROS	Virtual	2021-2024	Esta exposición explora los procesos de representación y demarcación de nuestras diferencias y reconoce los desafíos que tenemos los peruanos para construir una nación múltiple e intercultural. Por ello, este proyecto expositivo propone repensar el patrimonio cultural tanto material como inmaterial como una plataforma de diálogo que reconoce las conexiones e intercambios históricos entre grupos sociales, presentándose como un campo de auto representación más pertinente para imaginar un “nosotros” sin prejuicios ni encasillamientos, sino definido por múltiples narrativas, memorias y voces. La exposición se puede visitar a través del siguiente enlace: https://bicentenario.gob.pe/exposiciones/desafio/	171,279

3	HISTÓRICAS. PRECURSORAS DE LA IGUALDAD EN EL SIGLO XX	Virtual	2021-2024	Esta exposición interactiva cuenta la historia de más de 100 mujeres que le abrieron camino a millones de peruanas en espacios en los que antes no tenían cabida. Se trabajó una serie documental de 10 capítulos basada en materiales de archivo, recursos gráficos y entrevistas a mujeres especialistas en cada uno de los temas en los que se ha estructurado la exposición: precursoras de las aulas, de la universidad, de los derechos laborales, del feminismo, de la política, del arte y la cultura, del orden y la seguridad, del deporte y de las letras. La exposición se puede visitar a través del siguiente enlace: https://bicentenario.gob.pe/exposiciones/historicas/	9,044
4	AMA/ZONAS DE MITOS Y VISIONES	Virtual	2021-2024	Se desarrolló una serie audiovisual de corte documental de 10 capítulos, que presentan un registro importante de la cultura y los valores de la Amazonía, demostrando que el arte es fundamental para nuestra memoria histórica. Cada capítulo se centra en un tema específico e incluye recursos artísticos como fotografías, reproducciones y animaciones de obras de arte amazónico, además de artistas y especialistas que ayudan a abordar, crítica y reflexivamente, sucesos de interés global en relación con la Amazonía y su contexto. La exposición se puede visitar a través del siguiente enlace: https://bicentenario.gob.pe/exposiciones/amazonas/	21,838

5	21 INTELECTUALES PERUANOS DEL SIGLO XX	Virtual	2021-Febrero 2024	Esta muestra desarrollada en formato virtual, propone un panorama amplio y diverso del contexto en el que surgieron y se desarrollaron algunos de los intelectuales cuyo legado sigue viviendo entre nosotros. Al contar la historia de estas personalidades, el proyecto podrá presentar la situación que atravesaba el país hace un siglo, cuando aparecieron los problemas sociales, técnicos y culturales que caracterizaron al convulsionado siglo XX. Los intelectuales seleccionados para esta exposición son: Dora Mayer, Angélica Palma, Julio C. Tello, Julia Codesido, Miguelina Acosta Cárdenas, José Sabogal, César Vallejo, José Carlos Mariátegui, María Wiese, entre otros.	154,064
6	“VIDA NUESTRO VERDADERO ORO: LA MINERÍA ILEGAL E INFORMAL EN MADRE DE DIOS”	Plaza de Armas de Puerto Maldonado - Madre de Dios	26/07/2021- 20/09/2021	Exposición conformada por material documental e imágenes diversas como pinturas y fotografías, que denota que la historia de la Amazonía carga sobre sí un relato que justifica prácticas coloniales e impone diversos mecanismos de control sobre el territorio amazónico. La minería ilegal e informal en Madre de Dios y en otras regiones del Perú, no solo deteriora el territorio amazónico; también ha significado un nuevo régimen de la regulación de espacio, los cuerpos y el tejido social de las comunidades. Para esto, se ha identificado tres formas de impacto que se enmarca en lo ambiental, de la salud y de lo sociocultural, las cuales subyacen a la idea de conflicto enmarado en la escasez/degradación de recursos, violencia e injusticia ambiental.	1,301
7	EL DESAFÍO DEL NOSOTROS	Huamanga - Ayacucho	22/07/2021- 18/09/2021	Exposición que explora los procesos de representación y demarcación de nuestras diferencias y reconoce los desafíos que tenemos los peruanos para construir una nación múltiple e intercultural. Por esa razón, este proyecto expositivo propone repensar el patrimonio cultural tanto material como inmaterial como una plataforma de diálogo que reconoce las conexiones e intercambios históricos entre grupos sociales, presentándose como un campo de auto representación más pertinente para imaginar un “nosotros” sin prejuicios ni encasillamientos, sino definido por múltiples narrativas, memorias y voces.	22,497
		Huancayo - Junín	16/08/2021- 14/10/2021		

8	EXPOSICIÓN “HISTÓRICAS: PRECURSORAS DE LA IGUALDAD EN EL SIGLO XX”	Galería Lima del Museo Metropolitano de Lima - Lima	05/11/2021- 15/12/2021	Exposición interactiva cuenta la historia de más de 100 mujeres que le abrieron camino a millones de peruanas en espacios en los que antes no tenían cabida. Se trabajó una serie documental de 10 capítulos basada en materiales de archivo, recursos gráficos y entrevistas a mujeres especialistas en cada uno de los temas en los que se ha estructurado la exposición: precursoras de las aulas, de la universidad, de los derechos laborales, del feminismo, de la política, del arte y la cultura, del orden y la seguridad, del deporte y de las letras.	1,185
		Centro Cultural de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa - Arequipa	05/05/2022- 31/05/2022		4,419
		Centro Cultural Casa Basadre - Tacna	01/07/2022- 14/09/2022		
9	EXPOSICIÓN “EL DESAFÍO DEL NOSOTROS	Pasaje Paloma de La Paz-Plaza Cívica - Piura	21/06/2022- 21/08/2022	Exposición que explora los procesos de representación y demarcación de nuestras diferencias y reconoce los desafíos que tenemos los peruanos para construir una nación múltiple e intercultural. Por ende, este proyecto expositivo propone repensar el patrimonio cultural tanto material como inmaterial como una plataforma de diálogo que reconoce las conexiones e intercambios históricos entre grupos sociales, presentándose como un campo de auto representación más pertinente para imaginar un “nosotros” sin prejuicios ni encasillamientos, sino definido por múltiples narrativas, memorias y voces.	8,350
		Cajamarca Pasaje La Cultura)	16/08/2022- 14/10/2022		

10	“VIDA NUESTRO VERDADERO ORO: LA MINERÍA ILEGAL E INFORMAL EN MADRE DE DIOS”	Cusco (Plaza San Francisco, San Sebastián)	02/08/2022-25/08/2022	Exposición conformada por material documental e imágenes diversas como pinturas y fotografías, que denota que la historia de la Amazonía carga sobre sí un relato que justifica prácticas coloniales e impone diversos mecanismos de control sobre el territorio amazónico. La minería ilegal e informal en Madre de Dios y en otras regiones del Perú, no solo deteriora el territorio amazónico; también ha significado un nuevo régimen de la regulación de espacio, los cuerpos y el tejido social de las comunidades. Para esto, se ha identificado tres formas de impacto que se enmarca en lo ambiental, de la salud y de lo sociocultural, las cuales subyacen a la idea de conflicto enmarcado en la escasez/degradación de recursos, violencia e injusticia ambiental.	8,386
		San Martín (Plaza de Armas de Moyobamba/ Centro Cultural de Moyobamba)	01/10/2022-31/10/2022		
		Cusco (Plaza San Francisco, San Sebastián)	02/08/2022-25/08/2022		
11	EXPOSICIÓN “EL DESAFÍO DEL NOSOTROS”	Lambayeque (Museo Nacional Tumbas Reales de Sipán)	25/05/2023-31/07/2023	Exposición que explora los procesos de representación y demarcación de nuestras diferencias y reconoce los desafíos que tenemos los peruanos para construir una nación múltiple e intercultural. El proyecto expositivo propone repensar el patrimonio cultural tanto material como inmaterial como una plataforma de diálogo que reconoce las conexiones e intercambios históricos entre grupos sociales, presentándose como un campo de auto representación más pertinente para imaginar un “nosotros” sin prejuicios ni encasillamientos, sino definido por múltiples narrativas, memorias y voces.	10,338
12	EXPOSICIÓN “HISTÓRICAS: PRECURSORAS DE LA IGUALDAD EN EL SIGLO XX”	La Libertad, Trujillo (Casa de la Identidad Regional)	26/07/2023-24/09/2023	Exposición interactiva que cuenta la historia de más de 100 mujeres que le abrieron camino a millones de peruanas en espacios en los que antes no tenían cabida. Se trabajó una serie documental de diez capítulos basada en materiales de archivo, recursos gráficos y entrevistas a mujeres especialistas en cada uno de los temas en los que se ha estructurado la exposición: precursoras de las	5,050

				aulas, de la universidad, de los derechos laborales, del feminismo, de la política, del arte y la cultura, del orden y la seguridad, del deporte y de las letras.	
13	EXPOSICIÓN “COLECCIÓN DE ARTE TRADICIONAL Y ARTESANÍA BICENTENARIO”	Lima, Cercado de Lima (Casa Museo O 'Higgins)	11/08/2023- 20/09/2023	La exposición presentó la creación de artistas tradicionales y artesanos peruanos en diferentes técnicas, líneas artísticas y/o artesanales e invitó a la ciudadanía a reflexionar sobre la memoria histórica y la independencia como un proceso que continúa. Del mismo modo, se precisa que dichas obras forman parte del legado Bicentenario que estará a disposición de la ciudadanía, brindando nuevas lecturas a partir de nuestra diversidad e identidad.	73,336
14	EXPOSICIÓN “200 AÑOS DESPUÉS. LOS ESCOLARES PREGUNTAN, LOS HISTORIADORES RESPONDEN”	Lima, Jesús María	19/07/2024- 06/08/2024	En el marco de la FIL LIMA (Edición Bicentenario): La exposición tuvo como objetivo dar a conocer a la ciudadanía el proceso de consolidación de la independencia del Perú, resaltando la importancia de las batallas de Junín y Ayacucho, a través de las preguntas que escolares realizaron a historiadores en el libro que conlleva el mismo título de la exposición y pertenece a la colección Biblioteca Bicentenario.	113,335
15	EXPOSICIÓN DE LA COLECCIÓN DE ARTE TRADICIONAL Y ARTESANÍA BICENTENARIO EN EL MARCO DE LA FERIA RURAQ MAKI	Lima, San Borja	19/07/2024- 31/07/2024	La exposición buscaba dar a conocer la creación de artistas tradicionales y artesanos peruanos en diferentes técnicas, líneas artísticas y/o artesanales e invitar a la ciudadanía a reflexionar sobre la memoria histórica y la independencia como un proceso que continúa hasta hoy.	31,526

CUADRO N° 04 RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DE EXPOSICIONES VIRTUALES E ITINERANTES AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2024

Fuente: Informe 000007-2024-UAPI-PEB-JCD/MC. Actualizado al 28 de diciembre del 2024

Elaboración: Comisión Especial Multipartidaria del Bicentenario de la Independencia del Perú

RESUMEN DE EXPOSICIONES REGIONALES

Nº	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	LUGAR DONDE SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD	REGIÓN	FECHA
1	"TÚPAC AMARU Y MICAELA BASTIDAS: MEMORIA, SÍMBOLOS Y MISTERIOS"	Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM)	Lima	4/11/2020-18/05/2021
2	EXPOSICIÓN NACIONAL DE ARTE COLLAGE	Museo José Carlos Mariátegui	Lima	15/01/2021-26/02/2021
3	54 AÑOS DEL MUSEO HISTÓRICO REGIONAL DE CUSCO	Virtual - DDC Cusco	Cusco	2021-2024
4	ARTE POPULAR TRADICIONAL DE AYACUCHO	Museo Histórico Regional Hipólito Unanue	Ayacucho	19/03/2021-30/11/2021
5	A TI MUJER	Museo José Carlos Mariátegui	Lima	25/03/2021-10/05/2021
6	75 AÑOS DEL MUSEO NACIONAL DE LA CULTURA PERUANA	Museo Nacional de la Cultura Peruana	Lima	31/03/2021-30/11/2021
7	EVOLUCIÓN ARQUITECTÓNICA DE LA CASA DEL INKA GARCILASO DE LA VEGA	Virtual - DDC Cusco	Cusco	2021-2024
8	TEMAFIL 2021, BICENTENARIO DEL PERÚ	Virtual - Museo Postal y Filatélico del Perú/Círculo Amigos de la Filatelia	Lima	26/04/2021-07/05/2021
9	"VESTIMENTAS WARI EN PUCLLANA"	Museo de Sitio Pucllana	Lima	10/05/2021-30/06/2021

10	LA VORAGINE	Museo José Carlos Mariátegui	Lima	17/05/2021- 13/06/2021
11	EMBLEMAS DEL PERÚ INDEPENDIENTE	Virtual - Museo Postal y Filatélico del Perú/Círculo Amigos de la Filatelia	Lima	2021
12	PERSONAJES DEL BICENTENARIO	Museo José Carlos Mariátegui	Lima	16/06/2021- 16/07/2021
13	CERÁMICA DE CONCHOPATA	Museo Histórico Regional Hipólito Unanue	Ayacucho	21/06/2021- 30/11/2021
14	"TUPAC AMARUQ, MICAELA BASTIDASPA: KAWSAYNINKUTA UYANKUTA, P'ACHAKUSKANKUTA, KUNKANKUTA MASHKASPA"	Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM)	Lima	23/06/2021- 23/09/2021
15	BICENTENARIO: IMÁGENES DE NUESTRA AMAZONIA	Museo Amazónico – DDC Loreto	Loreto	1/07/2021- 31/07/2021
16	"LAS INDEPENDENCIAS REGIONALES: GUERRA, MUJERES Y PARTICIPACIÓN POPULAR"	Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM)	Lima	2/07/2021- 30/10/2021
17	"MINIATURAS FUNERARIAS DE LA ÉPOCA LIMA"	Museo de Sitio Pucllana	Lima	5/07/2021- 30/08/2021
18	"PUCLLANA: 40 AÑOS RECUPERANDO NUESTRA HISTORIA ANCESTRAL"	Pasaje de los Pintores, en el Parque Central de Miraflores y Museo de Sitio Pucllana	Lima	7/07/2021- 1/08/2021
19	FOTOGRAFÍAS DE HANS HEINRICH BRÜNING	Museo Arqueológico Nacional Brüning	Lambayeque	10/07/2021- 30/11/2021

20	MATA INDIO, UNA TUMBA INCA EN ZAÑA	Museo de Sitio Huaca Rajada de Sipán	Lambayeque	20/07/2021- 29/01/2022
21	SALA INDEPENDENCIA	Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú	Lima	20/07/2021-a la fecha
22	ARTE TRADICIONAL: LA CREATIVIDAD EN LA RESILENCIA	Museo Nacional de la Cultura Peruana	Lima	20/07/2021- 29/10/2021
23	VESTIGIOS INDELEBLES	Museo José Carlos Mariátegui	Lima	22/07/2021- 22/08/2021
24	"LXS LIBERTADORXS. CONTRAMONUMENTO"	Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM)	Lima	27/07/2021- 30/10/2021
25	LA PEREGRINACIÓN HISTÓRICA HACIA EL MUSEO NACIONAL DEL PERÚ	Museo Nacional del Perú (MUNA)	Lima	27/07/2021- 17/12/2021
26	NO HAY PAÍS MÁS DIVERSO	Museo Nacional del Perú (MUNA)	Lima	27/07/2021- 17/12/2021
27	RECUPERACIÓN DE NUESTROS TESOROS	Museo Nacional del Perú (MUNA)	Lima	27/07/2021- 17/12/2021
28	EXPOSICIÓN VIRTUAL "PACHACAMAC AL BICENTENARIO" PARTE I: PACHACAMAC PREHISPÁNICO PARTE II: PACHACAMAC COLONIAL Y REPUBLICANO PARTE III: PACHACAMAC DE 1958 A 2007 PARTE IV: PACHACAMAC HOY	Virtual - Museo Pachacamac	Lima	2021
29	MUSEO POSTAL Y FILATÉLICO DEL PERÚ	Virtual - Museo Postal y Filatélico del	Lima	2021

		Perú/Círculo Amigos de la Filatelia		
30	LA INTERPRETACIÓN DEL QUE VE	Virtual - DDC Cusco	Cusco	2021
31	LA REVOLUCIÓN CENTENARIA DE LA AMAZONIA. IQUITOS - UCAYALI - SAN MARTÍN 1921	Museo Amazónico – DDC Loreto	Loreto	5/08/2021- 31/08/2021
32	LA MÚSICA EN LA OBRA DEL INKA GARCILASO DE LA VEGA	Virtual - DDC Cusco	Cusco	2021
33	BICENTENARIO: DOS VISIONES PLÁSTICAS DE LA AMAZONÍA PERUANA	Museo Amazónico – DDC Loreto	Loreto	1/09/2021- 31/09/2021
34	USO DE ENERGÍAS RENOVABLES Y EL MEDIO AMBIENTE	Museo Provincial de Yungay	Ancash	3/10/2021- 30/10/2021
35	OSQOLLO	Museo de Sitio Julio C. Tello	Ica	8/10/2021- 15/01/2022
36	AMIFIL-EXFILIMA 2021, FILATELIA PERUANA DEL BICENTENARIO	Museo Postal y Filatélico del Perú	Lima	9/10/2021- 30/10/2021
37	"ENTRE OLEOS, LIENZOS Y PINTURAS"	Museo Arqueológico Antropológico de Apurímac	Apurímac	28/10/2021- 31/12/2021
38	75 AÑOS DEL MUSEO NACIONAL DE LA CULTURA PERUANA. DIÁLOGOS ENTRE EL PASADO Y LO ACTUAL	Museo Nacional de la Cultura Peruana	Lima	7/11/2021- 2/01/2022
39	EN BUSCA DE ALGO PERDIDO... PERÚ UN SUEÑO	Museo Nacional del Perú (MUNA)	Lima	06/11/2021- 17/12/2021
40	EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA: LA	Museo Regional de Arqueología de Junín	Junín	05/03/2023

	MAGIA Y COLOR DEL VALLE DEL MANTARO			
41	EXPOSICIÓN DE TEJIDO EN TELAR DE FAJA	Museo de Sitio Chotuna Chornancap	Lambayeque	12-19-26/03/2023
42	EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA "ÉPOCA DEL CAUCHO EN LA AMAZONÍA PERUANA"	Museo Amazónico	Loreto	Permanente
43	EXPOSICIÓN VISUAL Y VIRTUAL "TEATRO AMAZÓNICO: AYER, HOY Y SIEMPRE"	Museo Amazónico	Loreto	01-03/03/2023
44	EXPOSICIÓN PICTÓRICA "MUJERES FUERTES"	Museo Amazónico	Loreto	07-31/03/2023
45	EXPOSICIÓN VENTA DE ARTE POPULAR	Museo Nacional de la Cultura Peruana	Lima	5/03/2023
46	EXPOSICIÓN TEMPORAL: ENCUENTRO CON LA HUACA PUCLLANA	Museo de Sitio Pucllana	Lima	10/04/2023 - 10/05/2023
47	MUA: EXPOSICIÓN VENTA DE CERÁMICA AYACUCHANA	Museo Pachacamac	Lima	02/04/2023
48	EXPOSICIÓN COLECTIVA DE FOTOGRAFÍA "SANDER: DEL IMPACTO DE LA IMAGEN A NUESTROS TIEMPOS"	Museo José Carlos Mariátegui	Lima	14/04/2023
32	LA MÚSICA EN LA OBRA DEL INKA GARCILASO DE LA VEGA	Virtual - DDC Cusco	Cusco	2021
33	BICENTENARIO: DOS VISIONES PLÁSTICAS DE LA AMAZONÍA PERUANA	Museo Amazónico – DDC Loreto	Loreto	1/09/2021- 31/09/2021
34	USO DE ENERGÍAS RENOVABLES Y EL MEDIO AMBIENTE	Museo Provincial de Yungay	Ancash	3/10/2021- 30/10/2021
35	OSQOLLO	Museo de Sitio Julio C. Tello	Ica	8/10/2021-

				15/01/2022
36	AMIFIL-EXFILIMA 2021, FILATELIA PERUANA DEL BICENTENARIO	Museo Postal y Filatélico del Perú	Lima	9/10/2021-30/10/2021
37	"ENTRE OLEOS, LIENZOS Y PINTURAS"	Museo Arqueológico Antropológico de Apurímac	Apurímac	28/10/2021-31/12/2021
38	75 AÑOS DEL MUSEO NACIONAL DE LA CULTURA PERUANA. DIÁLOGOS ENTRE EL PASADO Y LO ACTUAL	Museo Nacional de la Cultura Peruana	Lima	7/11/2021-2/01/2022
39	EN BUSCA DE ALGO PERDIDO... PERÚ UN SUEÑO	Museo Nacional del Perú (MUNA)	Lima	06/11/2021-17/12/2021
40	EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA: LA MAGIA Y COLOR DEL VALLE DEL MANTARO	Museo Regional de Arqueología de Junín	Junín	05/03/2023
41	EXPOSICIÓN DE TEJIDO EN TELAR DE FAJA	Museo de Sitio Chotuna Chornancap	Lambayeque	12-19-26/03/2023
42	EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA "ÉPOCA DEL CAUCHO EN LA AMAZONÍA PERUANA"	Museo Amazónico	Loreto	Permanente
43	EXPOSICIÓN VISUAL Y VIRTUAL "TEATRO AMAZÓNICO: AYER, HOY Y SIEMPRE"	Museo Amazónico	Loreto	01-03/03/2023
44	EXPOSICIÓN PICTÓRICA "MUJERES FUERTES"	Museo Amazónico	Loreto	07-31/03/2023
45	EXPOSICIÓN VENTA DE ARTE POPULAR	Museo Nacional de la Cultura Peruana	Lima	5/03/2023
46	EXPOSICIÓN TEMPORAL: ENCUENTRO CON LA HUACA PUCLLANA	Museo de Sitio Pucllana	Lima	10/04/2023 - 10/05/2023

47	MUA: EXPOSICIÓN VENTA DE CERÁMICA AYACUCHANA	Museo Pachacamac	Lima	02/04/2023
48	EXPOSICIÓN COLECTIVA DE FOTOGRAFÍA "SANDER: DEL IMPACTO DE LA IMAGEN A NUESTROS TIEMPOS"	Museo José Carlos Mariátegui	Lima	14/04/2023
49	EXPOSICIÓN TEMPORAL "EL CAMBIO CLIMÁTICO"	Museo Arqueológico de Áncash "Augusto Soriano Infante"	Ancash	
50	EXPOSICIÓN TEMPORAL "LA IMPORTANCIA DE LA PROTECCIÓN DE LOS ECOSISTEMAS TERRESTRE Y PATRIMONIO CULTURAL EN EL SANTUARIO NACIONAL DE MEGANTONI"	Museo Amazónico Andino Qhapaq Ñan Quillabamba	Cusco	25/05/2023
51	EXPOSICIÓN TEMPORAL "ALFARERÍA INKA"	Museo Histórico Regional del Cusco	Cusco	02-31/05/2023
52	EXPOSICIÓN TEMPORAL "HUANCAVELICA"	Museo Regional "Daniel Hernández Morillo"	Huancavelica	02/05/2023
53	EXPOSICIÓN TEMPORAL "RELIGIOSIDAD, FE Y TRADICIÓN EN EL VALLE DEL MANTARO"	Museo Regional de Arqueología de Junín	Junín	13/05/2023
54	EXPOSICIÓN DE TEJIDO EN TELAR DE FAJA	Museo de Sitio Chotuna Chornancarp	Lambayeque	18/05/2023
55	EXPOSICIÓN TEMPORAL "EL MUSEO Y LA COMUNIDAD"	Museo Tumbas Reales de Sipán	Lambayeque	26/05/2023
56	RUNASIMI, QUECHUA PARA TODOS	Casa de la Gastronomía Peruana	Lima	27/05/2023
57	DEVELANDO EL PASADO: BOLSAS OFRENDA DEL HORIZONTE MEDIO	Museo de Sitio Pucllana	Lima	18-31/05/2023
58	EXPOSICIÓN VENTA DE CERÁMICA AYACUCHANA	Museo Pachacamac	Lima	07/05/2023

59	#ANDOCONSERVANDO: PUNTADAS APLICADAS EN CONSERVACIÓN TEXTIL	Museo Pachacamac	Lima	19/05/2023
60	EXPOSICIÓN TEMPORAL "APRENDO Y JUEGO EN EL MUSEO PACHACAMAC"	Museo Pachacamac	Lima	18-31/05/2023
61	PRESENTACIÓN DE CÓDIGOS QR CON VIDEOS EN LENGUA DE SEÑAS PERUANA	Museo Nacional de la Cultura Peruana	Lima	18/05/2023
62	EXPOSICIÓN "FILATELIA Y MUSEOS, SOSTENIBILIDAD Y BIENESTAR"	Museo Postal y Filatélico del Perú	Lima	18-31/05/2023
63	INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN COMPETITIVA "MI COLECCIÓN FAVORITA"	Museo Postal y Filatélico del Perú	Lima	31/05/2023
64	ACTIVIDAD LÚDICA "LA METALURGIA EN PIURA"	Sala de Oro del Museo Municipal Vicús	Piura	16/05/2023
65	GUIADO VIRTUAL "LAS COLECCIONES DE LA SALA DE ORO"	Sala de Oro del Museo Municipal Vicús	Piura	17/05/2023
66	CONFERENCIA "EL ROL DEL MUSEO EN LA SOCIEDAD"	DDC Piura	Piura	19/05/2023
67	EXPOSICIÓN TEMPORAL "EL TEJIDO DE LOS CINTOS CHUMBI Y WATU DEL PUEBLO KICHWA"	Museo Departamental de San Martín	San Martín	18/05/2023
68	EXPOSICIÓN "ARTESANÍA EN PASAYA – CABEZA DE VACA"	Museo de Sitio Cabeza de Vaca Gran Chilimasa	Tumbes	16/05/2023
69	EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA "ZONA ARQUEOLÓGICA MONUMENTAL CABEZA DE	Museo de Sitio Cabeza de Vaca Gran Chilimasa	Tumbes	18/05/2023

	VACA"			
70	EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA "ÉPOCA DEL CAUCHO EN LA AMAZONÍA PERUANA"	Museo Amazónico	Loreto	Permanente
71	EXPOSICIÓN TEMPORAL: LOS PRIMEROS POBLADORES DE MIRAFLORES	Museo de Sitio Pucllana	Lima	28/05/2023-17/07/2023
72	INAUGURACIÓN DE EXPOSICIÓN TEMPORAL "PALEONTOLOGÍA, MUSEOS Y COMUNIDAD"	Museo Tumbas Reales de Sipán	Lambayeque	07/06/2023
73	INAUGURACIÓN Y DIFUSIÓN DE HERRAMIENTAS PARA LA INCLUSIÓN Y ACCESIBILIDAD DE LOS VISITANTES Y DE LA EXPOSICIÓN TEMPORAL "WALTER ALVA Y SUS APORTES EN LA LUCHA CONTRA EL TRÁFICO ILÍCITO DE PATRIMONIO CULTURAL"	Museo Tumbas Reales de Sipán	Lambayeque	20/06/2023
74	EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA "LA DANZA DEL HUAYLARHS: LA FIESTA DE COLOR Y PASIÓN AL AIRE LIBRE	Museo Regional de Arqueología de Junín	Junín	02/07/2023
75	EXPOSICIÓN TEMPORAL "SABORES Y SABERES DE MI TIERRA"	Museo Arqueológico Nacional Brüning	Lambayeque	02/07/2023
76	EXPOSICIÓN ARTÍSTICA MINIATURAS DE ESTAMPAS PERUANAS	Museo Arqueológico Nacional Brüning	Lambayeque	23/07/2023
77	"COMUNIDAD, PALEONTOLOGÍA Y MUSEOS"	Museo Tumbas Reales de Sipán	Lambayeque	06/07/2023
78	EXPOSICIÓN VENTA DE ARTE POPULAR	Museo Nacional de la Cultura Peruana	Lima	02/07/2023

79	"I EXPO BIBLIOGRÁFICA EN FOLKLORE"	Museo Nacional de la Cultura Peruana	Lima	02/07/2023
80	EXPOSICIÓN DE ARTESANÍA AYACUCHANA	Museo Pachacamac	Lima	02/07/2023
81	APRENDO Y JUEGO	Museo Pachacamac	Lima	02/07/2023
82	EXPOSICIÓN ARTÍSTICA "RELATOS DEL PACHAKUTI"	Museo Pachacamac	Lima	15/07/2023
83	EXPOSICIÓN TEMPORAL: LA PESCA ANCESTRAL DE PUCLLANA	Museo de Sitio Pucllana	Lima	01-17/07/2023
84	EXPOSICIÓN "HUAQUEADAS"	Museo de Sitio Pucllana	Lima	19/08/2023- 18/09/2023
85	EXPOSICIÓN PICTÓRICA INDIVIDUAL "PINCELADAS DE SIEMBRA Y COSECHA" DE LA ARTISTA PLÁSTICA SONIA ESTRADA	Museo José Carlos Mariátegui	Lima	11/07/2023
86	FILATELIA Y FOTOGRAFÍA: LA LUZ Y LA ESTAMPA	Museo Postal y Filatélico del Perú	Lima	19/08/2023
87	EXPOSICIÓN DE TEXTILES AYACUCHANOS	Museo Pachacamac	Lima	06/08/2023
88	"RELATOS DEL PACHAKUTI" DEL ARTISTA CHILENO CLEMENTE MC KAY	Museo Pachacamac	Lima	06/08/2023 – 04/09/2023
89	EXPOSICIÓN DEL PROCESO DE TEJIDO EN TELAR DE FAJA POR EL GRUPO DE ARTESANAS CETERNI DE CHOTUNA. Y EXPOSICIÓN DE PRODUCTOS DE ARTESANÍA	Museo de Sitio Chotuna Chornancarp	Lambayeque	01/10/2023

90	EXPOSICIÓN VENTA DE ARTESANÍA SHIPIBO - KONIBO	Museo Pachacamac	Lima	01/10/2023
91	CENTENARIO DEL FALLECIMIENTO DEL MARISCAL ANDRÉS AVELINO CÁCERES	Museo Postal y Filatélico del Perú	Lima	10/10/2023
92	EXPOSICIÓN VIRTUAL "FILATELIA, PINTURA Y PALEONTOLOGÍA"	Museo Postal y Filatélico del Perú	Lima	16/10/2023
93	I EXPOSICIÓN DE ARTISTAS DE LA ALFORJA CHOTANA	Museo Arqueológico Nacional Brüning	Lambayeque	15/10/2023
94	EXPOSICIÓN TEMPORAL: ALIMENTOS ANCESTRALES EN PUCLLANA	Museo de Sitio Pucllana	Lima	01-16/10/2023
95	EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA "ARQUEOLÓGICA-HISTÓRICA DE APURÍMAC"	Museo Arqueológico, Antropológico de Apurímac	Apurímac	20/10/2023
96	EXPOSICIÓN TEMPORAL "ESTUDIO DEL PAISAJE EN LA ACADEMIA" DEL ARTISTA MICHAEL FABRICIO MIRANDA	Museo Histórico Regional de Cusco	Cusco	02-31/10/2023
97	VISITA LA CASA DE LOS TÍTERES	Museo Tumbas Reales de Sipán	Lambayeque	01/10/2023
98	EXPOSICIÓN TEMPORAL "EL ARTISTA Y LA ÉPOCA" UN ARTISTA PINTANDO POEMAS DEL ARTISTA PLÁSTICO ALEJANDRO MEDINA	Museo José Carlos Mariátegui	Lima	20/10/2023
99	EXPOSICIÓN DE MUÑEQUERÍA "LOS NIÑOS EXTRAÑOS DE PATSY CARMILLA"	Museo Histórico Regional de Cusco	Cusco	02-15/11/2023
100	EXPOSICIÓN NUEVA ESCUELA CUSQUEÑA DE LOS MILENIAL	Museo Histórico Regional de Cusco	Cusco	16-30/11/2023

101	EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA “ÉPOCA DEL CAUCHO EN LA AMAZONIA PERUANA”	Museo Amazónico	Loreto	Todo noviembre
102	EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA "EL PERÚ EN LA ANTÁRTIDA"	Museo Amazónico	Loreto	Todo noviembre
103	EXPOSICIÓN TEMPORAL: OFRENDAS PARA LA MUERTE EN LA ÉPOCA LIMA	Museo de Sitio Pucllana	Lima	30/10/2023 – 06/11/2023
104	FIESTA DE INTEGRACIÓN COMUNITARIA: PRESENTACIÓN, EXPOSICIÓN Y DESFILE DE MODA DE TEXTILERÍA DEL NORTE PERUANO	Museo Tumbas Reales de Sipán	Lambayeque	09/11/2023
105	RETRATOS DE MEMORIA	Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM)	Lima	09/11/2023
106	FOTOS DE HUGO NED ALARCÓN	Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM)	Lima	17/11/2023
107	OFRENDA PARA EL ALMA	Museo Regional "Daniel Hernández Morillo"	Huancavelica	30/10/2023
108	SENTIMIENTO DE LA PIEDRA DE HUAMANGA	Museo Histórico Regional Hipólito Unanue	Ayacucho	26/09/2023-14/11/2023
109	EXPOSICIÓN TEMPORAL "LOS NIÑOS EXTRAÑOS DE PATSY CARMILLA"	Museo Histórico Regional de Cusco	Cusco	02-15/11/2023
110	MUA: VISITAS GRATUITAS A LAS SALAS DE EXPOSICIÓN TEMPORAL "LAS SEÑORAS Y LOS SEÑORES MOCHICAS DE LAMBAYEQUE".	Museo Tumbas Reales de Sipán	Lambayeque	03/12/2023
111	MUA: VISITAS GRATUITAS A LA	Museo Tumbas Reales de Sipán	Lambayeque	03/12/2023

	"REPRODUCCIÓN DE LA CÁMARA FUNERARIA DEL SEÑOR DE SIPÁN Y LA SALA DE BANQUETES PROTOCOLARES DE HUACA EL LIMÓN"			
112	EXPOSICIÓN TEMPORAL DE PINTURA "ARTE CUSQUEÑO CCAJAVILCA"	Museo Histórico Regional de Cusco	Cusco	01-14/12/2023
98	EXPOSICIÓN TEMPORAL "EL ARTISTA Y LA ÉPOCA" UN ARTISTA PINTANDO POEMAS DEL ARTISTA PLÁSTICO ALEJANDRO MEDINA	Museo José Carlos Mariátegui	Lima	20/10/2023
99	EXPOSICIÓN DE MUÑEQUERÍA "LOS NIÑOS EXTRAÑOS DE PATSY CARMILLA"	Museo Histórico Regional de Cusco	Cusco	02-15/11/2023
100	EXPOSICIÓN NUEVA ESCUELA CUSQUEÑA DE LOS MILENIAL	Museo Histórico Regional de Cusco	Cusco	16-30/11/2023
101	EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA "ÉPOCA DEL CAUCHO EN LA AMAZONIA PERUANA"	Museo Amazónico	Loreto	Todo noviembre
102	EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA "EL PERÚ EN LA ANTÁRTIDA"	Museo Amazónico	Loreto	Todo noviembre
103	EXPOSICIÓN TEMPORAL: OFRENDAS PARA LA MUERTE EN LA ÉPOCA LIMA	Museo de Sitio Pucllana	Lima	30/10/2023 – 06/11/2023
104	FIESTA DE INTEGRACIÓN COMUNITARIA: PRESENTACIÓN, EXPOSICIÓN Y DESFILE DE MODA DE TEXTILERÍA DEL NORTE PERUANO	Museo Tumbas Reales de Sipán	Lambayeque	09/11/2023

105	RETRATOS DE MEMORIA	Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM)	Lima	09/11/2023
106	FOTOS DE HUGO NED ALARCÓN	Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM)	Lima	17/11/2023
107	OFRENDA PARA EL ALMA	Museo Regional "Daniel Hernández Morillo"	Huancavelica	30/10/2023
108	SENTIMIENTO DE LA PIEDRA DE HUAMANGA	Museo Histórico Regional Hipólito Unanue	Ayacucho	26/09/2023- 14/11/2023
109	EXPOSICIÓN TEMPORAL "LOS NIÑOS EXTRAÑOS DE PATSY CARMILLA"	Museo Histórico Regional de Cusco	Cusco	02-15/11/2023
110	MUA: VISITAS GRATUITAS A LAS SALAS DE EXPOSICIÓN TEMPORAL "LAS SEÑORAS Y LOS SEÑORES MOCHICAS DE LAMBAYEQUE".	Museo Tumbas Reales de Sipán	Lambayeque	03/12/2023
111	MUA: VISITAS GRATUITAS A LA "REPRODUCCIÓN DE LA CÁMARA FUNERARIA DEL SEÑOR DE SIPÁN Y LA SALA DE BANQUETES PROTOCOLARES DE HUACA EL LIMÓN"	Museo Tumbas Reales de Sipán	Lambayeque	03/12/2023
112	EXPOSICIÓN TEMPORAL DE PINTURA "ARTE CUSQUEÑO CCAJAVILCA"	Museo Histórico Regional de Cusco	Cusco	01-14/12/2023
113	EXPOSICIÓN DE PINTURA Y ESCULTURA - I.E FRANCISCO BOLOGNESI	Museo Histórico Regional de Cusco	Cusco	12-13/12/2023
114	"ROCKARICATURAS" EXPOSICIÓN DE CARICATURAS Y ARTISTAS DEL ROCK	Museo Amazónico	Loreto	01-29/12/2023

115	INAUGURACIÓN DE EXPOSICIÓN TEMPORAL “BIENES DEL NIÑO DIOS DE ÍLLIMO”	Museo Arqueológico Nacional Brüning	Lambayeque	19/12/2023
116	EXPOSICIÓN TEMPORAL VICTOR JARA	Museo Histórico Regional Hipólito Unanue	Ayacucho	27/11/2023- 05/12/2023
117	EXPOVENTA DE ARTESANÍA CON IDENTIDAD TUCUMANA	Museo de Sitio Túcume	Lambayeque	03/12/2023
118	EXPOSICIÓN TEMPORAL "YUYARISUN	Museo Histórico Regional de Cusco	Cusco	Enero
119	EXPOSICIÓN TEMPORAL "ENFERMEDADES DEL ANTIGUO PERÚ: APRENDIENDO DE LO NUESTRO"	Museo Regional de Arqueología de Junín	Junín	Enero
120	"ECOS DEL PASADO" DE LA ARTISTA ANNA KLOS. EXPOSICIÓN INDIVIDUAL	Museo José Carlos Mariátegui	Lima	Enero
121	INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN TEMPORAL "HUELLAS DE MAR Y ARENA"	Museo de Sitio "Julio C. Tello" de Paracas	Ica	Febrero
122	EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA FACULTAD DE COMUNICACIÓN E IDIOMAS UNSAAC	Museo Histórico Regional de Cusco	Cusco	Febrero
123	EXPOSICIÓN DE TRABAJOS DE JÓVENES ESTUDIANTES DEL NIVEL SECUNDARIO - SICUANI, TINTA Y MARAGANÍ	Museo Histórico Regional de Cusco	Cusco	Febrero
124	EXPOSICIÓN "DANZANTES DE TIJERAS EN PACHACAMAC"	Museo Pachacamac	Lima	Febrero
125	INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN TEMPORAL “AKSHU TATAY – RENCUENTRO CON LA	Museo de Sitio de Wariwillka	Junín	Febrero

	TRADICIÓN”:			
126	"FILATELIA, LAS MUJERES Y EL TECHO DE CRISTAL	Museo Pachacamac	Lima	Marzo
127	EXPOSICIÓN PICTÓRICA "PERUANICEMOS AL PERÚ" DE OSHKA TARAZONA	Museo José Carlos Mariátegui	Lima	Marzo
128	PUCLLANA FESTIVA: LAS MACHITAS CAPORALES	Museo de Sitio Pucllana	Lima	Marzo
129	INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN TEMPORAL: "LAS SACRIFICADAS"	Museo de Sitio Pucllana	Lima	Marzo
130	HISTORIA Y SOSTENIBILIDAD	Museo de Sitio Pucllana	Lima	Marzo
131	INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN CARNAVAL DE SONRISAS	Museo Nacional de la Cultura Peruana	Lima	Abril
132	EXPOSICIÓN "EVOCANDO A LEONARDO DA VINCI"	Museo José Carlos Mariátegui	Lima	Abril
133	EXPOSICIÓN TEMPORAL CIENCIA EN LA COCINA"	Museo Regional de Ica "Adolfo Bermúdez Jenkins"	Ica	Abril
134	EXPOSICIÓN TEMPORAL DE FILATELIA Y NUMISMÁTICA EMITIDA EN MEMORIA DEL INCA GARCILASO DE LA VEGA	Museo Histórico Regional de Cusco	Cusco	Abril
135	EXPOSICIÓN TEMPORAL "LA DANZA DE LAS TIJERAS EN EL SANTUARIO DE PACHACAMAC. COLECCIÓN FAMILIA SAIRE	Museo Pachacamac	Lima	Abril
136	EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA - CN. TIMPIA	Museo Amazónico Andino Qhapaq Ñan	Cusco	Abril

		Quillabamba		
137	INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN DE ARTE "LÍNEA, EXPRESIÓN Y COLOR" DEL ARTISTA HERMIS ALBERTO ARAUJO NEVADO	Museo Tumbas Reales de Sipán	Lambayeque	Abril
138	EXPOSICIÓN PICTÓRICA: REVIL EN EL TIEMPO	Museo Amazónico	Loreto	Abril
139	EXPOSICIÓN PICTÓRICA : TRAVESÍAS DEL TOÉ	Museo Amazónico	Loreto	Abril
140	LABORATORIOS ABIERTOS. INVESTIGACIONES EN EL MUSEO PACHACAMAC	Museo Pachacamac - Lima	Lima	Mayo
141	"WASINMAN KUTISPA"	Museo Departamental San Martín	San Martín	Mayo
142	EXPOSICIÓN PICTÓRICA "MADRE QUECHUA"	Museo Histórico Regional de Cusco	Cusco	Mayo
143	EXPOSICIÓN TEMPORAL "OBRAS DECLARADAS"	Museo Histórico Regional de Cusco	Cusco	Mayo
144	II EXPOSICIÓN INDIVIDUAL ANDRE CASAVILCA PACO "HISTORIAS DE COLOR"	Museo Regional "Daniel Hernández Morillo"	Huancavelica	Mayo
145	CONTINUARÁ LA EXPOSICIÓN TEMPORAL " RITUALIDAD Y TRADICIÓN DESDE EL ROL DE LA MUJER EN EL VALLE DEL MANTARO"	Museo Regional de Arqueología de Junín	Junín	Mayo
146	INAUGURACIÓN DE EXPOSICIÓN "VILLA EL SALVADOR Y EL LENTE DE CARLOS FERRAND"	Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM)	Lima	Mayo
147	EXPOSICIÓN TEMPORAL "TEJIENDO CULTURAS"	Museo Histórico Regional de Cusco	Cusco	Junio
148	MUA: RECORRIDO VIRTUAL DE LA	Museo Postal y Filatélico del Perú	Lima	Junio

	EXPOSICIÓN “MI COLECCIÓN FAVORITA”			
149	LABORATORIO ABIERTOS: INVESTIGACIONES EN EL MUSEO PACHACAMAC	Museo Pachacamac	Lima	Junio
150	EXPOSICIÓN TEMPORAL DEL IV CONCURSO DE DIBUJO Y PINTURA	Museo Amazónico Andino Qhapaq Ñan Quillabamba	Cusco	Junio
151	MUA: INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN TEMPORAL COLECTIVA ARTÍSTICA - CIUDAD PREHISPÁNICA	Museo de Sitio Pucllana	Lima	Junio
152	EXPOSICIÓN TEMPORAL COLECTIVA ARTÍSTICA - CIUDAD PREHISPÁNICA	Museo de Sitio Pucllana	Lima	Junio
153	EXPOSICIÓN TEMPORAL COLECTIVA ARTÍSTICA - CONEXIÓN URBANA ENTRE EL PASADO Y EL PRESENTE	Museo de Sitio Pucllana	Lima	Junio
154	EXHIBICIÓN DE TEXTIL PREHISPÁNICO	Museo Arqueológico "Samuel Humberto Espinoza Lozano"	Huancavelica	Junio
155	EXPOSICIÓN PICTÓRICA JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI VIDA Y COLOR" DEL ARTISTA PLÁSTICO ANDRÉS GARCÍA VALENZUELA	Museo José Carlos Mariátegui	Lima	Junio
156	RITOS FUNERARIOS	Museo Arqueológico Zonal Cabana	Ancash	Junio
157	EXPOSICIÓN DE PESCA CHIMÚ	Museo de Sitio de Chan Chan	La Libertad	Julio
158	DELICIAS GASTRONÓMICAS LAMBAYEVANAS CON SABOR A TÚCUME	Museo de Sitio Túcume	Lambayeque	Julio

159	VISITA GUIADA, IDENTIDAD NACIONAL	Museo Amazónico Andino Qhapaq Ñan Quillabamba	Cusco	Julio
160	EXPOSICIÓN TEMPORAL PROYECTO PACHAKUNA: PERÚ SAGRADO ANCESTRAL	Museo Histórico Regional de Cusco	Cusco	Julio
161	ZONA BICENTENARIO 2024	Museo Amazónico Andino Qhapaq Ñan Quillabamba	Cusco	Julio
162	EXPOSICIÓN TEMPORAL CULTURA AFROPERUANA EN ZAÑA	Museo Arqueológico Nacional Brüning	Lambayeque	Julio
163	EXPOSICIÓN TEMPORAL MINIATURAS DE ESTAMPAS PERUANAS	Museo Arqueológico Nacional Brüning	Lambayeque	Julio
164	EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA DEL PERRO PERUANO	Museo de Sitio Cabeza de Vaca Gran Chilimasa	Tumbes	Julio
165	EXPOSICIÓN PICTÓRICA LOS SECRETOS DE LA CARNE	Museo Amazónico	Loreto	Julio
166	INAUGURACIÓN DE EXPOSICIÓN “DEL DESPLAZAMIENTO A LA INTEGRACIÓN”	Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM)	Lima	Julio
167	EXPOSICIÓN FOTOGRAFÍA ENTRE CONCRETO Y BRONCE: EL MONUMENTO A LOS VENCEDORES DE JUNÍN	Museo Regional de Arqueología de Junín	Junín	Julio
168	DIA INTERNACIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	Museo Arqueológico, Antropológico de Apurímac	Apurímac	Agosto
169	VISITAS ESPECIALIZADAS A LA EXPOSICIÓN "LABORATORIOS ABIERTOS"	Museo Pachacamac	Lima	Agosto

170	EXPOVENTA DE ARTESANÍA CON IDENTIDAD TUCUMANA	Museo de Sitio Túcume	Lambayeque	Agosto
171	DELICIAS GASTRONÓMICAS LAMBAYECANAS CON SABOR A TÚCUME	Museo de Sitio Túcume	Lambayeque	Agosto
172	MATICES DE NUESTRA HISTORIA	Museo Regional "Daniel Hernández Morillo"	Huancavelica	Agosto
173	ZONA BICENTENARIO 2024	Museo Amazónico Andino Qhapaq Ñan Quillabamba	Cusco	Agosto
174	MUA: EXPOSICIÓN VIRTUAL "SANTA ROSA DE LIMA EN LA FE, EL ARTE Y LA FILATELIA"	Museo Postal y Filatélico del Perú	Lima	Agosto
175	EXPOSICIÓN INDIVIDUAL MARINA DE GUERRA DEL PERÚ EN LIENZO	Museo Amazónico	Loreto	Agosto
176	LÍNEA DEL TIEMPO DEL PROCESO LIBERTARIO DEL PERÚ Y LA CONSOLIDACIÓN DE LA INDEPENDENCIA CON LA BATALLA DE JUNÍN Y AYACUCHO	Museo Arqueológico, Antropológico de Apurímac	Apurímac	Agosto
177	FESTIVAL DE FOTOGRAFÍA "TRADICIONES DE HUANCAMELICA	Museo Regional "Daniel Hernández Morillo"	Huancavelica	Agosto
178	INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN PICTÓRICA. "FRACTURAS URBANAS" DEL ARTISTA PLÁSTICO TEODORO TOTO NÚÑEZ MEDINA	Museo José Carlos Mariátegui	Lima	Agosto
177	FESTIVAL DE FOTOGRAFÍA "TRADICIONES DE HUANCAMELICA	Museo Regional "Daniel Hernández Morillo"	Huancavelica	Agosto

179	SALA TEMPORAL: "EL TELAR ANDINO: TECNOLOGÍA, ADAPTACIÓN E INCLUSIÓN"	Museo de Sitio "Arturo Jiménez Borja" – Puruchuco	Lima	Agosto
180	EXPOSICIÓN PICTÓRICA "PINTURA CONTEMPORÁNEA"	Museo Histórico Regional de Cusco	Cusco	Septiembre
181	EXPOSICIÓN TEMPORAL "MATES BURILADOS"	Museo Histórico Regional de Cusco	Cusco	Septiembre
182	MUA: EXPOSICIÓN VIRTUAL "EL QUINTO DÍA DIOS HIZO LOS MARES, GÉNESIS 1:20-21"	Museo Postal y Filatélico del Perú	Lima	Septiembre
183	ZONA BICENTENARIO	Museo Amazónico Andino Qhapaq Ñan Quillabamba	Cusco	Septiembre
184	APERTURA DE LA EXPOSICIÓN MUSEOGRÁFICA "DRAMA Y HUMOR"	Museo Tumbas Reales de Sipán	Lambayeque	Septiembre
185	EL AJÍ EN PUCLLANA Y SU REVALORACIÓN EN LA ACTUALIDAD	Museo de Sitio Pucllana	Lima	Septiembre
186	EXPOSICIÓN COLECTIVA 62 ANIVERSARIO BELLAS ARTES	Museo Amazónico	Loreto	Septiembre
187	INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN “MAMÁ, NO QUIERO GUERRA”	Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM)	Lima	Septiembre

CUADRO N° 05 RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DE EXPOSICIONES REGIONALES AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2024

Fuente: Informe 000007-2024-UAPI-PEB-JCD/MC. Actualizado al 28 de diciembre del 2024

Elaboración: Comisión Especial Multipartidaria del Bicentenario de la Independencia del Perú

RESUMEN SOBRE RECONOCIMIENTO SIMBÓLICO POR EL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DEL PERÚ EN LAS REGIONES DE JUNÍN Y AYACUCHO

N°	RECONOCIMIENTO	REGIÓN	FECHA	OBJETIVO (DETALLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD)
1	DEVELACIÓN DE UNA ESCULTURA EN RECONOCIMIENTO AL HISTORIADOR AQUILINO CASTRO VÁSQUEZ	Yanacancha, Junín	15/11/2021	Esta iniciativa tuvo como objetivo revalorizar el legado de Aquilino Castro Vásquez en vida, por haber recuperado la memoria de su tierra natal Chupaca, promoviendo así el orgullo y la identidad cultural de la ciudadanía local a fin de inspirar a más peruanos y peruanas con su legado.
2	DEVELACIÓN DE LA ESCULTURA DEL CABALLO DE BASILIO AUQUI POR EL BICENTENARIO DE SECCHAPAMPA	Chiara, Junín	28/11/2021	Esta es la primera vez que esculturas de héroes locales peruanos fueron exhibidos en el lugar donde se realizó la hazaña de Secchapampa. De esta manera, se logró reivindicar, visibilizar y difundir el valioso aporte de los héroes que no fueron reconocidos en la historia peruana, especialmente en la gesta emancipadora y en la construcción de la república.
3	DEVELACIÓN DE PLACA CONMEMORATIVA POR LA HAZAÑA DE LAS HERMANAS TOLEDO	Concepción, Junín	09/07/2021	El PEB realizó un conversatorio y una ceremonia con develación de placa conmemorativa para honrar a Cleofé Ramos de Toledo y sus hijas por su participación en la lucha independentista. De esta manera, se logró reivindicar, visibilizar y difundir el valioso aporte de los héroes que no fueron reconocidos en la Historia peruana, especialmente en la gesta emancipadora y en la construcción de la república.
4	DEVELACIÓN DE PLACA CONMEMORATIVA POR EL BICENTENARIO DE LA MUERTE	Chiara, Ayacucho	06/05/2022	Se realizó la conmemoración de los 200 años de la muerte del héroe nacional Basilio Auqui Huaytalla, líder de la resistencia ayacuchana en Secchapampa, resaltando el valioso aporte de los héroes que no fueron reconocidos en la

	DE BASILIO AUQUI			historia peruana, especialmente en la gesta emancipadora y en la construcción de la República.
5	DEVELACIÓN DE PLACA CONMEMORATIVA POR EL BICENTENARIO DE LA MUERTE DE MARÍA PARADO JAYO	Huamanga, Ayacucho	01/05/2022	Se realizó la conmemoración de los 200 años de la muerte de la María Parado Jayo, heroína de la independencia. Con ello, se logró reivindicar, visibilizar y difundir el valioso aporte de los héroes que no fueron reconocidos en la historia peruana, especialmente en la gesta emancipadora y en la construcción de la república.
6	DEVELACIÓN DE PLACA DE MÁRMOL POR LOS 50 AÑOS ANIVERSARIO DEL SANTUARIO HISTÓRICO DE CHACAMARCA	Junín, Junín	06/08/2024	En el marco de la conmemoración del Bicentenario de la consolidación de la Independencia del Perú, el Estado peruano rindió homenaje al Santuario Histórico de Chacamarca, escenario donde se libró la gloriosa batalla de Junín. Asimismo, se reconoció a las peruanas y peruanos que forjaron los cimientos de la libertad de nuestra nación.
7	DEVELACIÓN DE PLACA DE BRONCE POR EL BICENTENARIO DE LA BATALLA DE JUNÍN EN EL MONUMENTO A LOS VENCEDORES DE JUNÍN	Junín, Junín	07/08/2024	Se realizó la develación de la placa conmemorativa en el Monumento a los Vencedores de Junín, recientemente renovado por el Gobierno con ocasión del Bicentenario de la Batalla de Junín.

CUADRO N° 06 RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES SOBRE RECONOCIMIENTOS SIMBOLICO AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2024

Fuente: Informe 000007-2024-UAPI-PEB-JCD/MC. Actualizado al 28 de diciembre del 2024

Elaboración: Comisión Especial Multipartidaria del Bicentenario de la Independencia del Perú

RESUMEN SOBRE LAS ACTIVIDADES DE “PAÍSES AMIGOS DEL BICENTENARIO” AGENDA INTERNACIONAL DE LA AGENDA DE CONMEMORACIÓN DEL BICENTENARIO DE LA INDEPENDIA DEL PERÚ

Nº	EVENTO	PAÍS A CARGO	FECHA	LUGAR
1	"Concierto en homenaje a los Bicentenarios de las Batallas de Junín y Ayacucho y del nacimiento del compositor austriaco Anton Bruckner (1824-1896)"	Austria	14/09/2024	Universidad Nacional de Música, Lima
2	Miniserie “Cosmovisión Indígena en las Américas”	Canadá	A partir del 29/01/2024	Transmisión en TV Perú
3	"Feliz Año Nuevo Chino"	República Popular China	06/02/2024	Parque Chino de Miraflores, Lima.
4	Danza clásica Odissi y música vocal Hindustani en Lima a cargo de las famosas artistas Sra. Leema Bhol y la vocalista Sra. Anisha Ray	República de la India	26/01/2024-27/01/2024	Lima, Cusco
5	Danza folclórica Garba a cargo del famoso grupo indio Nrityavali, danza incluida recientemente en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco.		09/02/2024	Lima
6	Show cultural		23/03/2024	Plaza de Armas de Calca
7	Show cultural		24/03/2024	Parque frente a la Municipalidad de Ollantaytambo

8	Clase demostrativa		25/03/2024	Jardín Botánico San Francisco, Cusco
9	Show cultural		26/03/2024	Teatro Municipal del Cusco
10	Eventos en el marco del Día Internacional del Yoga		15/05/2024- 26/06/2024	11 sedes en Lima, Ayacucho, Cusco, Trujillo, Junín, Arequipa
11	Danza Kathak, invitados por el Consejo Indio para las Relaciones Culturales		18/08/2024	Ayacucho
12	Danza Kathak, invitados por el Consejo Indio para las Relaciones Culturales		19/08/2024	Lima
13	Danza Kathak, invitados por el Consejo Indio para las Relaciones Culturales		20/08/2024	Ica

CUADRO N° 07 RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES SOBRE “PAÍSES AMIGOS DEL BICENTENARIO “AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2024

Fuente: Informe 000007-2024-UAPI-PEB-JCD/MC. Actualizado al 28 de diciembre del 2024

Elaboración: Comisión Especial Multipartidaria del Bicentenario de la Independencia del Perú



**MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES –
CONSEJO NACIONAL PARA LA INTEGRACIÓN DE LA
PERSONA CON DISCAPACIDAD (CONADIS)**

Con fecha 03 de septiembre del 2024 hemos presentado el oficio N°032-2024-2025-LVOM-CEMBI/CR, solicitando información al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, sobre el estado situacional de las actividades del programa de valores del bicentenario, y que presentamos en el siguiente cuadro:

Nº	Requerimiento
1	Información actualizada y detallada sobre el 4.1.4 programa de valores bicentenario (página 24), a cargo de la Unidad Ejecutora del consejo nacional para la integración de la persona con discapacidad (CONADIS) del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que tienen alcance nacional; precisando si se han cumplido con la actividad “inclúyeme, soy capaz” cuyo plazo vence en el mes de diciembre del 2024., así mismo especificando a cuantas personas discapacitados han sido beneficiados laboralmente e incluidos en los sectores públicos y privados, o cuantos trabajan formalmente de manera independiente.
2	Información actualizada y detallada sobre el 4.4.4 programa de valores bicentenario (página 25), a cargo de la Unidad Ejecutora del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS) del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que tienen alcance nacional; precisando si se ha cumplido con la actividad del programa para la incorporación de la perspectiva de discapacidad, cuyo plazo vence en el mes de diciembre del 2024.;así mismo detallando a cuantos funcionarios públicos se ha capacitado en los tres niveles de gobierno, sobre la incorporación de la discapacidad en la gestión pública, erradicando prácticas y barreras excluyentes o discriminatorias de los discapacitados que representan no menos del 10.3% de la población.

Con fecha 11de octubre del 2024, el Ministerio de la Mujer y poblaciones vulnerables nos remitió el oficio N° D 001717-2024-MIMP-SG, con referencia al oficio solicitada por nuestra comisión N° 032-2024-2025-LVOM-CEMBI/CR sobre las actividades de la Agenda de Conmemoración del Bicentenario de la Independencia del Perú de la siguiente manera:





RESUMEN DEL PROGRAMA DE VALORES BICENTENARIO

Nº	ACTIVIDAD	EJES DE ACCION	SERVICIOS	OBJETIVO	FERIAS	ASISTENCIA TÉCNICAS EN EL SECTOR PRIVADO	ASISTENCIA TÉCNICAS EN EL SECTOR PUBLICO
1	“Inclúyeme, soy capaz”	Eje 01: Promoción del derecho de acceso al Empleo público y privado de las personas con discapacidad	Inscripción de la Hoja de vida de la persona con discapacidad en la base de datos. Registro y publicación de vacantes de empleo en el portal de empleos de CONADIS Difusión de convocatorias a usuarios inscritos en la base de datos	Busca la promoción de oportunidades laborales para personas con discapacidad en el sector público y privado	Entre enero y setiembre del 2024 se realizaron 33 ferias de emprendimiento, de las cuales participaron 274 emprendedores	Se han realizado 56 asistencias técnicas sobre la temática de inclusión laboral, de las cuales participaron 563 personas	Durante en el año 2024, entre los meses de enero y setiembre se brindaron asistencias técnicas a 56 entidades de los tres niveles de gobierno, con una participación de 2459 servidores públicos.





		Eje 02: Promoción de los emprendimientos de las personas con discapacidad para lograr la economía personal, familiar y/o social	Realización de actividades de promoción de los emprendimientos: Ferias de emprendimiento denominadas “Emprende sin límites”	Fomenta las inclusiones económicas de las personas con discapacidad emprendedoras.			
2		Eje 03: Articulación y sinergias para la inclusión económica de las personas con discapacidad	Asistencia técnica a las empresas privadas en el marco de la estrategia.	Articulación y sinergias que se establecen con empresas privadas, a fin de brindar asistencia técnicas en el marco de la estrategia ¡Inclúyeme, Soy Capaz!,			

CUADRO N° 08 RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE VALORES DEL BCIENTENARIO AL 11 DE OCTUBRE DEL 2024

Fuente: Informe 000007-2024-UAPI-PEB-JCD/MC. Actualizado al 11 de octubre del 2024
Elaboración: Comisión Especial Multipartidaria del Bicentenario de la Independencia del Perú





MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Con fecha 03 de septiembre del 2024 hemos presentado el oficio N°033-2024-2025-LVOM-CEMBI/CR, solicitando información al Ministerio de Relaciones Exteriores, sobre las actividades del programa países amigos del bicentenario (PPAB), y que presentamos en el siguiente cuadro:

Nº	Requerimiento
1	Información actualizada y detallada sobre el 4.2.2 programa de valores bicentenario (página 68), a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores, que tienen alcance nacional e internacional; precisando si se ha cumplido con la actividad “Programa de Países Amigos del Bicentenario (PPAB)” cuyos plazos vence en el mes de diciembre del 2024; así mismo especificando a cuantos gobiernos e instituciones públicas y privadas de terceros países invitaron a participar en la conmemoración por los 200 años de la heroica batalla de Junín.
2	Información actualizada y detallada sobre el 4.2.2 programa de valores bicentenario (página 68), a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores, que tienen alcance nacional e internacional; precisando si se ha cumplido con la actividad “Programa de Países amigos del Bicentenario (PPAB)” cuyos plazos vencen en el mes de diciembre del 2024, especificando a cuantos gobiernos e instituciones públicas y privadas de terceros países, convocaron a involucrarse en las actividades del programa interno del proyecto especial bicentenario (parques culturales, cabildos 21 internacionales, etc.); así mismo, aparte de los países de argentina, chile y España, a la actualidad que países más se incorporaron y hemos suscrito declaraciones y preparación de planes de trabajo bilaterales sobre el proceso de la independencia peruana, en especial por los 200 años del bicentenario de la heroica batalla de Junín.

Con fecha 02 de octubre del 2024, el Ministerio de Relaciones Exteriores nos remitió el oficio OF. RE (MIN) N° 3-0-A/410 con referencia al oficio solicitada por nuestra comisión N° 033-2024-2025-LVOM-CEMBI/CR sobre las actividades del Programa Países Amigos del Bicentenario de la siguiente manera:



RESUMEN DE ACTIVIDADES AMIGOS DEL BICENTENARIO 2024

N °	EVENTO	PAÍS	FECHA	LUGAR
1	"Concierto en homenaje a los Bicentenarios de las Batallas de Junín y Ayacucho y del nacimiento del compositor austriaco Antón Bruckner (1824-1896)"	Austria	14 de setiembre	Universidad Nacional de Música, Lima
2	Miniserie "Cosmovisión Indígena en las Américas"	Canadá	A partir del 29 de enero.	Transmisión en TV Perú
3	"Feliz Año Nuevo Chino"	República Popular China	martes 6 de febrero de 2024	Parque Chino de Miraflores, Lima.
4	-Danza clásica Odissi y música vocal Hindustani en Lima a cargo de las famosas artistas Sra. Leema Bhol y la vocalista Sra. Anisha Ray		26 y 27 de enero	Lima, Cusco
5	Danza folclórica Garba a cargo del famoso grupo indio Nrityavali. Danza incluida recientemente en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco.		9 de febrero de 2024	Lima
6	Show cultural		23 de marzo	Plaza de Armas de Calca
7	Show cultural		24 de marzo	Parque frente a la Municipalidad de Ollantaytambo
8	Clase demostrativa		25 de marzo	Jardín Botánico San Francisco, Cusco



9	Show cultural		26 de marzo	Teatro Municipal del Cusco
10	Eventos en el marco del Día Internacional del Yoga	República de la India		11 sedes en Lima, Ayacucho, Cusco, Trujillo, Junín, Arequipa
			15 de mayo - 26 junio	
11	Danza Kathak, invitados por el Consejo Indio para las Relaciones Culturales		18 de julio	Ayacucho
12	Danza Kathak, invitados por el Consejo Indio para las Relaciones Culturales		19 de julio	Lima
13	Danza Kathak, invitados por el Consejo Indio para las Relaciones Culturales		20 de julio	Ica

CUADRO N° 09 RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES DE AMIGOS DEL BICENTENARIO 2024 AL 02 DE OCTUBRE DEL 2024

Fuente: Informe 000007-2024-UAPI-PEB-JCD/MC. Actualizado al 02 de octubre del 2024

Elaboración: Comisión Especial Multipartidaria del Bicentenario de la Independencia del Perú

RESUMEN SOBRE LAS NUEVAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

N°	ACTIVIDADES 2024	ENTIDAD A CARGO
1	"Non nimea yoinabo. Animales de nuestro bosque". Pintura amazónica de Roldán y Harry Pinedo	
2	"Aniquilar la luz o hacerla". Lectura plástica en torno a la poética de Blanca Varela - Exposición homenaje	
3	"Puerta entreabierta. Blanca Varela 1926-2009"	
4	Luz de ojo (ojo cholo). Ensayos fotográficos documentales peruanos 1989-2018	
5	"La casa de Adelina y Amador". Jeannine Ferrand. Fotografías	



6	Huacas. Fotografías de Felipe Cortázar	Centro Cultural Inca Garcilaso del Ministerio de Relaciones Exteriores
7	Exposición bibliográfica en homenaje al centenario del natalicio de Jorge Eduardo Eielson	
8	Manos sabias. Colección Esther Ventura. Textiles prehispánicos	
9	Exposición bibliográfica en homenaje a María Jesús Alvarado, luchadora por los derechos políticos de las mujeres del Perú	
10	Exposición de fotografía histórica de la Marina de Guerra del Perú	
11	"El paisaje como experiencia". Billy Hare	
12	Pintura contemporánea con temática afroperuana de Joan Jiménez Suero (Entes)	
13	Exposición bibliográfica sobre arte popular ayacuchano	
14	Pintura mural andina	Embajada del Perú en Alemania
15	Lima y su centro histórico	
16	Concierto por el Bicentenario "Chaos"	
17	Presentación de los libros "Cuentos Orales Quechua de Pomacanchi El Qanchi Machu aún vive"	Consulado General del Perú en Mendoza, Argentina
18	Muestra pictórica "Paisajes" de artista peruana Mónica Luza Elías	
19	Conmemoración del Bicentenario de la Batalla de Junín	
20	Conversatorio Bicentenario de la Batalla de Junín	Embajada del Perú en Australia
21	Conmemoración de la Independencia del Perú	
22	Exhibición Toros de Pucará en Sídney. Velada especial para autoridades australianas y personalidades locales 13 Junio, galería en Bondi Beach, Sídney.	Embajada del Perú en Australia
23	Inauguración de la muestra "Toro itinerante de Pucará: Embajador del Altiplano peruano" & talleres de pintado de toritos en crudo.	
24	Recital del tenor peruano John Schofield.	Embajada del Perú en Bélgica
25	Exhibición de la muestra "Toro Itinerante de Pucará. Embajador del Altiplano peruano".	
26	Concierto de música lírica peruana de la tenor Lilian Cornelio "Hatun Killa"	Embajada del Perú en

	Bolivia
27 Exposición Numismática del Banco Central de Reserva del Perú - MUCEN	Consulado General del Perú en Cochabamba, Bolivia
28 Activación cultural en el recinto histórico "Casa de la Libertad" de Sucre	Consulado General del Perú en Cochabamba y Consulado General del Perú en Sucre, Bolivia
29 Festival Peruano 2024	Consulado General del Perú en Río de Janeiro, Brasil
30 Homenaje al Perú - Festival Iberoamericano de Artes Escénicas Santos - Miradas 2023	Consulado General del Perú en San Pablo, Brasil
31 Festival Peruano en el Museo de Imágen y Sonido de San Pablo	Consulado General del Perú en Montreal, Canadá
32 Exhibición fotográfica "Qhapac Ñan. El gran camino Inca".	
33 "Bicentenario del Perú: Retablo Musical"	
33 Presencia de un representante de la Dirección de Políticas para Población Afroperuana del Ministerio de Cultura y de la artista Ebelin Ortiz - Mes de la Herencia Africana	Embajada del Perú en Colombia
34 Publicación del poemario "Temblar" de José María Arguedas. Presentación en la Feria Internacional del Libro de Bogotá	Embajada del Perú en Corea.
35 Muestra fotográfica "Qhapaq Nan: el Gran Camino Inca"	
36 Exhibición de la muestra "Toro Itinerante de Pucará. Embajador del Altiplano peruano".	
37 Actividad de promoción cultural por fiestas patrias. Presentación en vivo de danzas y música peruana; y exhibición de caballos de paso peruanos.	Embajada del Perú en

38	Exposición fotográfica "Shipibo-Konibo. Retratos de mi sangre".	Costa Rica
39	Conversatorio en conmemoración del Bicentenario de la batalla de Ayacucho.	
40	Conversatorio académico sobre el Bicentenario de la Independencia del Perú	Embajada del Perú en Cuba
41	Exposición fotográfica Q'onoy en los espacios abiertos del Terminal Terrestre de Machala,	
42	Muestra de danza y de interpretación de cajón peruano a cargo del Grupo Afroperuano "Colibrí" de Zarumilla	Consulado General del Perú en Machala, Ecuador
43	Celebración del Bicentenario de las Batallas de Ayacucho y Junín a través de la Sinfonía de Enrique Iturrialde, interpretada por las Orquestas Sinfónicas de El Oro y Piñas	
44	Evento de promoción cultural "Treasures crossing popular art between Egypt and Peru"	Embajada del Perú en Egipto
45	Conferencia magistral titulada "El Perú y sus desafíos en el siglo XXI"	
46	Exposición Libros y Autores en el Virreinato del Perú en el Archivo General de Indias en Sevilla	Embajada del Perú en España
47	Clase Virtual entre colegios de Jaén (Perú y España)	
48	Charla sobre Julio C. Tello y Exposición de 5 piezas de arte precolombino	Consulado General del Perú en Sevilla, España, y Oficina Desconcentrada del MRE en Cajamarca
49	Conversatorio y exposición sobre la batalla de Ayacucho	
50	Conversatorio virtual sobre la batalla de Junín	Embajada del Perú en Estados Unidos
51	Presentación de danzantes de tijeras - hermanos Chávez de Huancavelica	
52	Exposición fotográfica "Shipibo-Konibo. Retratos de mi Sangre" de David Díaz Gonzáles en la 33° edición del "Festival Biarritz Amérique Latine: Cinémas et Cultures"	Consulado General del Perú en Miami, Estados Unidos
53	Exposición fotográfica "Qhapaq Ñan: El Gran Camino Inca", en el Museo Arqueológico de la Antigua Corinto.	
54	Exposición "Torito de Pucará: Embajador del Altiplano Peruano" en el Museo Bizantino y Cristiano de Atenas	Embajada del Perú en Grecia

55	Presentación de libro del Primer Secretario de Guatemala, el Sr. Fernando Tapia en la Universidad Autónoma de Santa Ana en El Salvador	Embajada del Perú en Guatemala
56	Presentación de libro del Primer Secretario de Guatemala, el Sr. Fernando Tapia en la Librería Sophos de Guatemala	
57	Presentación de libro del Primer Secretario de Guatemala, el Sr. Fernando Tapia en la en la XXI Feria Internacional del Libro en Guatemala (Filgua)	
58	Exposición "Shipibo Konibo. Retratos de mi sangre"	Embajada del Perú en Honduras
59	Exhibición en el MUDEC - Bicentenario del Perú y Bicentenario del nacimiento de Antonio Raimondi	Consulado General del Perú en Milán, Italia
60	Misa solemne para la conmemoración del Bicentenario de la Independencia del Perú	Consulado General del Perú en Roma, Italia
61	Muestra sobre cerámica Nazca, Tiahuanaco e Inca con la Universidad de Tenri	Embajada del Perú en Japón
62	Muestra fotográfica "Qhapaq Ñan" en Fukaya, prefectura de Saitama, Japón	Consulado General del Perú en Tokio, Japón
63	Muestra fotográfica "Qhapaq Ñan" en Takayama, prefectura de Gifu, Japón	
64	Exhibición fotográfica "Qhapaq Ñan: Perú, integración y Diversidad"	Embajada del Perú en Noruega
65	Conferencia sobre el Bicentenario de la Batalla de Ayacucho (9 de diciembre) y de la convocatoria del Congreso de Panamá de 1826 (7 de diciembre)	Embajada del Perú en Panamá
66	Lanzamiento de la "Emisión Postal en Conmemoración de los 200 años de la Batalla de Ayacucho", a cargo de Correos de Panamá	
67	"Homenaje a los 200 años de las Batallas de Junín y Ayacucho"	Embajada del Perú en Paraguay
68	"Conferencia en Conmemoración de las Batallas de Junín y Ayacucho"	Embajada del Perú en Singapur
69	Exposición "Shipibo Konibo. Retratos de mi sangre"	Consulado General del Perú en Ginebra, Suiza
70	Exposición "Shipibo Konibo. Retratos de mi sangre"	Embajada del Perú en

Suiza		
71	“Nos adieux au masque péruvien” ("Nuestro adiós a la máscara peruana"), 17 objetos pertenecientes a los estilos prehispánicos de las culturas Lambeyeque, Huaura, Chancay pertenecientes al Patrimonio Cultural de la Nación las cuales retornarán al Perú.	Embajada del Perú en Tailandia
72	Exhibición fotográfica "Qhapac Ñan. El gran camino Inca".	
73	Taller "Crea tu propio retablo".	
74	Actividad academica y conmemorativa en el marco del bicentenario	Embajada del Perú en Santa Sede (Vaticano)
75	Conmemoración del Bicentenario de la Batalla de Ayacucho y participación del General Eugenio Garzón	Embajada del Perú en Uruguay
76	Conmemoración del Bicentenario de la Batalla de Ayacucho y participación del General Eugenio Garzón	Oficina Desconcentrada del MRE en Cusco
77	Conmemoración del Bicentenario de la Batalla de Junín: "Cusco y el bicentenario: historia, retos y desafíos"	
78	Conmemoración del Bicentenario de la Batalla de Ayacucho: "Cusco y el bicentenario: historia, retos y desafíos"	
79	"Tertulias: Palabras del Bicentenario".	Oficina Desconcentrada del MRE en Moquegua
80	Exposición artística del pintor local Dimas Paredes	Oficina Desconcentrada del MRE en Pucallpa
81	Taller "Reflexión, Revalorización y Reconstrucción de la Memoria e Identidad Afroperuana".	

CUADRO N° 10 RESUMEN DE LAS NUEVAS ACTIVIDADES PRESENTADA POR EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Fuente: Informe 000007-2024-UAPI-PEB-JCD/MC. Actualizado al 02 de octubre del 2024

Elaboración: Comisión Especial Multipartidaria del Bicentenario de la Independencia del Perú



GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN Y AYACUCHO

En ese sentido, luego de haber concluido la celebración por la conmemoración de los 200 años de la heroica de la batalla de Junín, hemos solicitado información actualizada al gobierno regional de Junín, sobre las actividades que se realizaron (nombre de la actividad, lugar, fecha, costo, proveedor, objetivo), así mismo hemos solicitado información al gobierno regional de Ayacucho, sobre las actividades programadas y realizadas por la conmemoración de los 200 años de la heroica batalla de Ayacucho; en el cual detallamos los oficios presentados en los siguientes cuadros:

Nº	OFICIO	FECHA	INSTITUCION	ASUNTO
1	N°034-2024-2025-LVOM-CEMBI/CR	03/09/2024	Gobierno Regional de Junín	Solicitud de información sobre las actividades realizadas por la conmemoración de los 200 años de la heroica batalla de Junín.
2	N°035-2024-2025-LVOM-CEMBI/CR	05/09/2024	Gobierno Regional de Ayacucho	Solicitud de información sobre las actividades programadas y realizadas por la conmemoración de los 200 años de la heroica batalla de Ayacucho.

SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN

Con fecha 15 de mayo del año 2024 se realizó la tercera sesión extraordinaria, donde participó el Sr. Zósimo Cárdenas Zamora, Gobernador Regional de Junín y el Sr. Elio Munzón Zevallos Meza, Alcalde provincial de Junín quienes fueron convocados para informar sobre las actividades realizadas y programadas con motivo de la Conmemoración del Bicentenario de la Batalla de Junín, las mismas que detallamos a continuación:



Nº	ACTIVIDADES REALIZADAS	OBJETIVO	INSTITUCIÓN	FECHA
1	Primer encuentro internacional de Historiadores, profesionales y estudiantes de Latinoamérica: Junín Bicentenario a 200 años del grito de la libertad americana.	Conocer la historia de la batalla de Junín desde un punto de vista literario.	Gobierno Regional de Junín	28/02/2024
2	Lanzamiento de la Semana Santa con alusión al Bicentenario.	Exposición de los lugares turísticos de la región, además de exponer bailes, costumbres, gastronomía y artesanía.	Gobierno Regional de Junín	Del 19 al 21 de marzo de 2024
3	Lanzamiento de la Danza de la Chonguinada "Edición Bicentenario"	Exposición de los lugares turísticos de la región, además de exponer bailes, costumbres, gastronomía y artesanía.	Municipalidad provincial de Junín	17/04/2024
4	Lanzamiento por el Bicentenario de la Batalla de Junín. (Plaza de Armas y Plaza San Martín)	Dar a conocer todas las actividades que se vendrán realizando por el Bicentenario de la Batalla de Junín.	Gobierno Regional de Junín	19/05/2024
5	Creación de una historia gráfica: las rutas del bicentenario gloriosa batalla de Junín y la libertad americana (para distribución escolar).	Contar la historia de la Batalla de Junín de manera Gráfica, para su enseñanza a los escolares.	Gobierno Regional de Junín	30/05/2024

6	Segundo encuentro académico interdisciplinario sobre la Batalla de Junín (UNCP Huancayo).	Conocer la historia de la batalla de Junín desde un punto de vista literario.	Gobierno Regional de Junín	30/05/23024
7	Escenificaciones Flashmob en Satipo	Dar a conocer como se llevó a cabo la Batalla de Junín desde una perspectiva real.	Gobierno Regional de Junín	31/05/2024
8	Escenificaciones Flashmob en Huancayo.	Dar a conocer como se llevó a cabo la Batalla de Junín desde una perspectiva real.	Gobierno Regional de Junín	01/06/2024

CUADRO N° 11 ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN

Fuente: PPT Tercera Sesión Extraordinaria. Actualizado al 15 de mayo del 2024

Elaboración: Comisión Especial Multipartidaria del Bicentenario de la Independencia del Perú

N°	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	OBJETIVO	INSTITUCIÓN	FECHA
1	I Bienal de Arte Junín 2024 - Edición Bicentenario (Concurso de Pintura y el Concurso de Artes Tradicionales).	Invitar a los artistas del país a participar en el concurso de Pintura y Arte Tradicionales.	Gobierno Regional de Junín	En proceso
2	Escenificaciones Flashmob en Tarma.	Dar a conocer como se llevó a cabo la Batalla de Junín desde una perspectiva real.	Gobierno Regional de Junín	En proceso
3	Conferencia Rally Bicentenario.	Presentar el programa de Rally Bicentenario para un lograr el seguimiento por medio de	Gobierno Regional de Junín	En proceso



		redes de dicha actividad.		
4	Mesa Redonda de Historiadores “Representaciones Culturales sobre Junín y la Independencia del Perú”.	Conocer la historia de la batalla de Junín desde un punto de vista literario con un debate acerca de ello.	Gobierno Regional de Junín	En proceso
5	Conferencia de prensa (Concursos Escolares) DREJ - Ministerio de Educación.	Concurso literario escolar alusivo al bicentenario de la batalla de Junín.	Gobierno Regional de Junín	En proceso
6	Tercer encuentro internacional de Historiadores, profesionales y estudiantes de Latinoamérica: Junín Bicentenario a 200 años del grito de la libertad americana.	Dar a conocer como se llevó a cabo la Batalla de Junín desde una perspectiva real.	Gobierno Regional de Junín	En proceso
7	Lanzamiento Bicentenario en Junín	Dar a conocer todas las actividades que se vendrán realizando por el Bicentenario de la Batalla de Junín.	Gobierno Regional de Junín	En proceso
8	Escenificación de la Batalla de Marcavalle y Pucara.	Constatar este hecho histórico ocurrido después de la Batalla de Junín, ello para tener conocimiento de una lucha importante para la independencia del país.	Gobierno Regional de Junín	En proceso
9	Lanzamiento de la canción alusiva al Bicentenario (Susana Baca).	Dar reconocimiento por medio de una canción por los 200 años del Bicentenario de la Batalla de Junín	Gobierno Regional de Junín	En proceso
10	Lanzamiento Bicentenario en Satipo.	Dar a conocer todas las actividades que se vendrán realizando por el Bicentenario de la	Gobierno Regional de	En proceso





		Batalla de Junín.	Junín	
11	Homenaje a Razuri.	Dar a un homenaje a José Andrés Rázuri homenajearlo en su propia ciudad natal.	Gobierno Regional de Junín	En proceso
12	Lanzamiento de documental	Contar la historia de la Batalla de Junín de manera audiovisual.	Gobierno Regional de Junín	En proceso
13	Lanzamiento Bicentenario en Tarma.	Dar a conocer todas las actividades que se vendrán realizando por el Bicentenario de la Batalla de Junín.	Gobierno Regional de Junín	En proceso
14	Programa Willax y Panamericana.	Contar una historia asociada al bicentenario, además de dar a conocer los lugares turísticos de la región.	Gobierno Regional de Junín	En proceso
15	Libro Gran Edición sobre el Bicentenario.	Contar la historia de la Batalla de Junín desde una perspectiva de edición exclusiva.	Gobierno Regional de Junín	En proceso
16	Ceremonia del lanzamiento de la emisión de monedas y billetes conmemorativos al Bicentenario de la Batalla de Junín.	Poner en conocimiento de estas monedas de plata exclusivas al Bicentenario de la Batalla de Junín.	Gobierno Regional de Junín	En proceso
17	Certamen de Miss World Perú (Edición especial del Bicentenario).	Constatar una reina que pueda simbolizar la importancia de nuestros 200 años de independencia de Junín.	Gobierno Regional de Junín	En proceso
18	Concierto del Bicentenario a campo libre con artistas internacionales.	Celebración días previos al evento central para la población de la región Junín.	Gobierno Regional de Junín	En proceso





19	Revaloración Internacional del Folklore. (Coordinación con CIOF)	Revaloración Internacional del Folklore a nivel internacional.	Gobierno Regional de Junín	En proceso
20	Maratón de Junín.	Revaloración del deporte.	Gobierno Regional de Junín	En proceso
21	Serenata al bicentenario de la batalla de Junín.	Homenaje al Bicentenario de la Batalla de Junín.	Gobierno Regional de Junín	En proceso
22	Maratón en Junín.	Revaloración del deporte.	Gobierno Regional de Junín	En proceso
23	Encuentro de Presidentes y Cancilleres de los países que participaron en la batalla de Junín.	Homenaje al Bicentenario de la Batalla de Junín.	Gobierno Regional de Junín	En proceso
24	Evento conmemorativo de la difusión y promoción al bicentenario.	Homenaje al Bicentenario de la Batalla de Junín.	Gobierno Regional de Junín	En proceso
25	Paracaidismo y Sobrevuelo en las pampas de Junín (FAP).	Homenaje al Bicentenario de la Batalla de Junín	Gobierno Regional de Junín	En proceso
26	Evento Cívico Militar en la Pampa de Chacamarca – Junín.	Homenaje al Bicentenario de la Batalla de Junín.	Gobierno Regional de Junín	En proceso
27	Homenaje histórico de escoltas militares de las comisiones internacionales en la Pampa de Chacamarca – Junín.	Homenaje al Bicentenario de la Batalla de Junín.	Gobierno Regional de Junín	En proceso
28	Reconstrucción escénica artística - Pampas de Chacamarca – Junín.	Homenaje al Bicentenario de la Batalla de Junín.	Gobierno Regional de Junín	En proceso



29	Obra teatral y musical de Carabobo a Junín.	Homenaje al Bicentenario de la Batalla de Junín.	Gobierno Regional de Junín	En proceso
30	Cumbre de Gobernadores por el Bicentenario de la Batalla de Junín.	Homenaje al Bicentenario de la Batalla de Junín.	Gobierno Regional de Junín	En proceso
31	Concurso internacional de ensayo para jóvenes: Premio Junín Bicentenario 2024 “Unidad para la paz y desarrollo”	Incentivar a la participación de jóvenes a nivel nacional e internacional.	Gobierno Regional de Junín	En proceso
32	Conferencia de prensa de impacto nacional e internacional – Lima (medios nacionales e internacionales).	Brindar las actividades contempladas del 1 al 6 de agosto.	Gobierno Regional de Junín	En proceso
33	Evento de Bandas Escolares (Coordinación con DREJ)	Participación de los institutos educativos para su remembranza de este hecho histórico.	Gobierno Regional de Junín	En proceso
34	Instalación de iconografía de la batalla de Junín en la pampa de Chacamarca (08 esculturas ingreso y 08 esculturas en el monumento).	Escenarios listos para el evento central.	Gobierno Regional de Junín	En proceso
35	Producción de una película (90 minutos) Junín gloriosa victoria para la paz.	Contar la historia de la Batalla de Junín a nivel nacional e internacional.	Gobierno Regional de Junín	En proceso

CUADRO N° 12 ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR EL GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN

Fuente: PPT Tercera sesión Extraordinaria. Actualizado al 15 de mayo del 2024

Elaboración: Comisión Especial Multipartidaria del Bicentenario de la Independencia del Perú



Cabe Precisar, que en cumplimiento de nuestras obligaciones de seguimiento y fiscalización nuestra comisión ha solicitado información actualizada, el oficio N° 034-2024-2025-LVOM-CEMBI/CR con fecha 03 de setiembre del 2024, al Gobierno Regional de Junín, solicitando información actualizada sobre las actividades que se realizadas en la región y (festivales, certámenes, concursos, pasacalles, conferencias, exposiciones, ceremonias, conciertos, reconocimientos y otros eventos análogos) a nivel nacional sobre la conmemoración por los 200 años de la heroica batalla de Junín, y que concluyo el 06 de agosto del año 2024, con el siguiente detalle:

Nombre de la actividad	Lugar donde se desarrolló la actividad	Fecha	Costo Actualizado (soles)	Proveedor	Objetivo (detalle del cumplimiento de la actividad)

De lo mencionado, no hemos tenido respuesta de la solicitud de información actualizada, sobre las actividades conmemorativas realizadas en el año 2024, con relación a la batalla de Junín que se implementaron en la región, en el cual están consideradas en el IV Componentes de la Agenda de conmemoración del Bicentenario de la Independencia del Perú (Conmemoración histórica), aprobada por Decreto Supremo 011-2021-MC.

SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

Con fecha 23 de setiembre del 2024, el Gobierno Regional de Ayacucho nos remitió el oficio N°1319-2024-GRA/GR-GG, con referencia al oficio N° 035-2024-2025-LVOM-CEMBI/CR solicitada por nuestra comisión sobre las actividades programadas y realizadas por la conmemoración de los 200 de la Batalla de Ayacucho, cuyo consolidado debidamente detallado presentamos en el siguiente cuadro elaborado por nuestra comisión:



Nº	ACTIVIDAD	LUGAR	FECHA	COSTO ACTUALIZADO (SOLES)	PROVEEDOR	OBJETIVO (DETALLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD)
1.	Carnavales	Huamanga- Ayacucho	10 al 14 de febrero del 2024	S./, 2100.00	Jimena Quispe Escalante. Servicio de impresión de afiche 70x 1m cucho de 250.gr	Promocionar el carnaval Ayacuchano a nivel local, regional, nacional e internacional. Promoción y gestión cultural de la festividad del carnaval ayacuchano: Reuniones multisectoriales para coordinar los permisos para el desarrollo de las nuevas rutas de las comparsas partiendo de la av. Javier Pérez de Cuellar en dirección a la plaza mayor de Huamanga. Promoción y difusión (elaboración de afiches, redes sociales). Recepción de turistas nacionales e internacionales para promoción de los carnavales en el aeropuerto y terminales terrestre (sur, libertadores de América, Totorá) Entrega de afiches a operadores turísticos, restaurantes, hospedajes, negocios, agencia de viaje, instituciones, avenidas, calles principales, etc. Coordinación para transmisión en vivo con américa tv y canal N con las provincias de la mar, huamanga, distrito de Quinua, Titankayocc para promoción cultural de los carnavales. Se logró la visita de más 50 000 visitantes durante el desarrollo del carnaval ayacuchano Edición Bicentenario.
	Semana Santa Edición bicentenario	Huamanga- Ayacucho	21 a 31 de marzo del 2024	S/8,980.00	Jimena Quispe Escalante. Servicio de impresión de afiches, programas	Promoción y difusión y gestión cultural de la semana santa en la región de Ayacucho. Garantizar que la semana santa de Ayacucho sea de impacto social que trasciendo naciones a fin de mostrar una imagen más

				S/5,500.00	y banners. Yoko Abimael Villanueva	multifacética y religiosa de nuestra región en su Edición Bicentenario. Reuniones multisectoriales para aprobación del afiche oficial. Convocatoria a las mayordomías, representante del PEB, instituciones principales de la Región de Ayacucho para el desarrollo del Lanzamiento Oficial.
				S/6,195.00	Spot publicitario de semana. Tribu agencia de comunicaciones E.I.R.L Difusión de Spot Sobre semana santa.	Lanzamiento oficial de la semana santa edición bicentenario 2024 en la basílica catedral de Ayacucho. Entrega de afiches a operadores turísticos, restaurantes, hospedajes, negocios, agencias de viaje, instituciones, avenidas y calles principales, etc. Coordinación con el arzobispo metropolitano de Ayacucho para convocatoria de reuniones para la elaboración y redacciones del programa general. Coordinación con el PEB para solicitar apoyo con velas y transmisión en vivo de las procesiones y actividades en general.
2	Activaciones en las 11 provincias- firma de convenios	11 provincias de la región de Ayacucho	Abril y mayo del 2024	-	-	Reunión con las municipalidades provinciales de la Region de Ayacucho y la Municipalidad distrital de Quinua. Reunión virtual con alcaldes provinciales. Firma de convenios con las 11 municipalidades provinciales de la región de Ayacucho para construir una ciudadanía activa enfocada a la educación y sensibilización histórica de nuestro patrimonio cultural, usando recursos educativos y culturales que promuevan el cuidado, protección y defensa de este legado histórico relacionado a la batalla de Ayacucho. las fechas para los trabajos de promoción y difusión se encuentran

						pendientes a la falta de habilitación presupuestal para la correspondiente ejecución de la actividad.
3	Las independencias americanas – congreso internacional de historiadores	Huamanga-Ayacucho	13 al 17 de agosto	S/6,300.00	GSANFOOD Ayacucho S.A.C. -Servicio de Coffee Break para 700 personas durante 4 días mañana y tarde.	Construir una ciudadanía democrática que reconozca su identidad valorando la multiculturalidad, realzando los festejos conmemorativos de 200 años de la batalla de Ayacucho, y promover la reflexión y el dialogo a través la actividad académica que reúna a historiadores y profesionales de las ciencias sociales del Perú. Elaboración de plan de trabajo, socialización de actividades institucionales con PEB y UNSCH, convocatoria de artesanos para la participación en la feria , promoción y difusión del material publicitario , coordinación para la entrega de refrigerio a los participantes.
4	Foro nacional: el emprendimiento	Huamanga-Ayacucho				Inspirar a las mujeres ayacuchanas a promover y lanzar nuevas empresas partiendo desde la experiencia y compartir de las ponentes.
5	La mujer en el marco del Bicentenario			-	-	Internacionales ayudando a construir una personalidad de liderazgo empresarial. Reuniones con la vicegobernadora regional, gerencia de desarrollo económico, gerencia de desarrollo social (proyecto mujer), representantes de la asociación COTIMA, coordinador ejecutivo del Bicentenario y Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo para plantear fechas, propuestas y exposición de plan de trabajo. Elaboración de plan de trabajo. Coordinación con asociaciones de empresarias/ emprendedoras mujeres a nivel regional y nacional para su participación como panelistas/ponentes tal es el caso de Asociación de mujeres

						empresarias del Perú, Rita Suaña Coila y empresarias locales.
6	Tras las huellas del Bicentenario	Santuario Histórico de la Pampa de Ayacucho	9 de diciembre			Como se recuerda, con ocasión del sesquicentenario de la Batalla de Ayacucho, el 9 de diciembre de 1974, los países vinculados a la referida efeméride hicieron entrega formal de piedras oriundas de cada país, las cuales se encuentran ubicados en la parte inferior del obelisco de la pampa de Ayacucho. Por consiguiente, atendiendo a que la trascendencia de la conmemoración lo amerita, el gobierno regional de Ayacucho viene organizando la actividad, TRAS LAS HUELLAS DEL BICENTENARIO, consistente en un intercambio protocolar de elementos culturales oriundos de cada país que serán ubicados en un retablo ayacuchano, cuyas medidas se consigan en el anexo. Para concretar la referida actividad, se viene coordinando con el Ministerio de Relaciones Exteriores para que a través de su despacho las embajadas de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Panamá puedan auscultar la posibilidad de que esos países participen en dicha actividad aportando cada una un elemento cultural con las medidas correspondientes. Detalles de elementos culturales. Elemento cultural más representativo de cada país, teniendo como ejemplo: artesanía, elementos de Folklor y/o elementos de música de cada país. El elemento elegido deberá contar con las siguientes medidas: alto de 25cm, ancho de 25 cm y profundidad de 20, las cuales serán ubicadas en la presente caja de san marcos. Adjunto imagen referencial donde se ubicarán objetos elegidos por cada país.

7	Escenificación de la Batalla de Ayacucho	Santuario Histórico de la Pampa de Ayacucho	9 de diciembre	-	-	Realizar los festejos conmemorativos de los 200 aniversarios de la Batalla de Ayacucho. Acciones a realizar. Invitación a las embajadas involucradas en la Batalla de Ayacucho. Confirmación de participación de las FFAA. Autorizaciones y permisos para el desarrollo de la escenificación de la Batalla de Ayacucho (SERNAP, DDC, DIRESA, CRUZ ROJA, DREA, PNP de Tránsito, PNP, BOMBEROS , SAMU, DEFENSA CIVIL, PERFECTURA, MUNICIPALIDAD DE QUINUA) Elaboración de los planes de contingencia (BOMBEROS, PNP, DIRESA, DEFENSA CIVIL, CRUZ ROJA) Acta de acuerdo y compromiso por el Bicentenario de la Batalla de Ayacucho (jefe del estado mayor general del ejército – JEMGEL y el GORE)
---	--	---	----------------	---	---	---

						Invitación a autoridades para el lanzamiento de la Batalla de Ayacucho, (mes de noviembre) Invitación para el desarrollo de actos protocolares del 09 de diciembre a las instituciones involucradas (mes de noviembre) Participación de 1,020 militares del ejército (escuela técnica, cadetes, escuela técnica militar, escuela militar de chorrillos, escuela de comando, legión peruana de la guardia, oficiales del grado de capitán que serán actores principales) Proceso de convocatoria a las instituciones públicas y privadas para la participación en la escenificación de la Batalla de 1, 200 estudiantes de 5to año de educación secundaria de las instituciones educativas de Ayacucho, escuelas pre policiales, ejército peruano, organizaciones civiles etc., participación de FFAA delegaciones internacionales y nacionales en las actividades del 09 de diciembre 2024, se contará con la participación de delegaciones de países latinoamericanas.
--	--	--	--	--	--	---

CUJADRO N° 13 ACTIVIDADES REALIZADAS Y PROGRAMADAS POR EL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

Fuente: Informe N° 1446-2024-GRA/GRDE-DICERTUR/DR.. Actualizado al 23 de setiembre del 2024
Elaboración: Comisión Especial Multipartidaria del Bicentenario de la Independencia del Perú

VI. ANALISIS DEL ESTADO SITUACIONAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSION DE LA AGENDA DE CONMEMORACION DEL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DEL PERU.

Conforme se detalla en los antecedentes del presente informe, es necesario tener presente el Decreto Supremo N° 004-2018-MC, que crea el Proyecto Especial Bicentenario de la Independencia del Perú, con el objeto de formular la Agenda de Conmemoración del Bicentenario de la Independencia del Perú; la misma que fue aprobada mediante Decreto Supremo N° 009-2018-MC; encontrándose actualmente vigente la segunda actualización de la citada Agenda de Conmemoración del Bicentenario de la Independencia del Perú que fuera aprobada con Decreto Supremo N° 011-2021-MC, cuya línea de tiempo de las respectivas normas citamos a continuación:

GRAFICO N° 01 NORMAS RESPECTO AL PROYECTO ESPECIAL Y AGENDA DEL BICENTENARIO



Fuente: Diario Oficial El Peruano – Normas Legales

Elaboración: Comisión Especial Multipartidaria del Bicentenario de la Independencia del Perú

Conforme a las mociones 440 y 500 con las que se constituyó la Comisión Especial Multipartidaria del Bicentenario de la Independencia del Perú, para el Periodo Parlamentario 2021 - 2026, del encargo otorgado por el pleno del congreso a nuestra comisión, tenemos como primer punto “Desarrollar acciones de coordinación, seguimiento y monitoreo a la ejecución de los proyectos de inversión pública incluidos en la Agenda de Conmemoración del Bicentenario de la Independencia del Perú, aprobada mediante Decreto Supremo N° 011-2021-MC.”, trabajo que venimos desarrollando, para lo cual se toma como referencia la segunda actualización de la agenda.

La citada norma comprende la construcción de Parques Culturales Bicentenario, uno en cada capital de departamento, un parque en la provincia constitucional del Callao y un parque en Lima Provincias, haciendo un total de 26 Parques Culturales Bicentenario. Asimismo, en la referida Agenda de Conmemoración, incluido los citados parques, comprende un listado total de 302 obras emblemáticas, vinculadas al cierre de brechas sociales y recuperación de sitios históricos, las que se encuentran clasificadas o distribuidas por sectores, conforme al siguiente detalle:

SECTOR	PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	OBRAS POR IMPUESTOS	OTRAS MODALIDADES DE INVERSION
MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO	29	-	-
MINISTERIO DEL AMBIENTE	12	-	-
MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO	13	-	2
MINISTERIO DE CULTURA	22	-	-
MINISTERIO DE DEFENSA	1	-	-
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	1	-	-
MINISTERIO DE EDUCACION	88	14	-
MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS	1	-	1
MINISTERIO DEL INTERIOR	6	-	-
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	1	-	-
MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES	1	-	-
MINISTERIO DE PRODUCCION	12	-	1
MINISTERIO DE SALUD	30	-	-
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	18	-	27
MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	19	3	-
TOTAL	254	17	31

CUADRO N° 14 SECTORES Y MODALIDADES DE INVERSION

Elaboración: Comisión Especial Multipartidaria del Bicentenario de la Independencia del Perú



LISTADO DE OBRAS SECTORIALES (Decreto Supremo N° 011-2021-MC)

SECTORES																
REGIONES CON PROYECTOS	CULTURA	MINCETUR	EDUCACION	ENERGIA	MTC	VIVIENDA CONSTRUCCION	MIDAGRI	SALUD	JUSTICIA	MINAM	INTERIOR	PRODUCCION	MUJER	MEF	DEFENSA	TOTAL PROYECTOS POR REGION
AMAZONAS	(-1)	2	1	-4 PER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
ANCASH	(-1)	1	5 (Oxl)	-5 PER	1 (APP)	2 (Oxl)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
APURIMAC	(-1)	-	-	-4 PER	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	4
AYACUCHO	3	1	-	-3 PER	-	-	2	2	1	-	-	-	-	-	-	9
AREQUIPA	(-1)	-	1	-	1 (APP)	-	-	2	-	1	1	1	-	-	-	7
CAJAMARCA	(-1)	1	2	-15 PER	1	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	8
CALLAO	(-1)	-	1	-	1 3 (APP)	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	6
CUZCO	6 (-1)	1 (APP)	1	-5 PER	1 1 (APP)	1 (Oxl)	2	3	-	-	1	-	-	-	-	17
HUANCAVELICA	(-1)	-	-	-5 PER	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	4
HUANUCO	(-1)	-	-	-4 PER	1 (APP)	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	3
ICA	(-1)	-	1 (Oxl)	-	1 3 (APP)	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	6
JUNIN	1 (-1)	1	4	-3 PER	1 (APP)	-	3	2	-	1	-	1	-	-	-	14
LIMA	9 (-1)	1 (APP)	64	-2 PER	4 3 (APP)	7	1	5	-	2	1	1 1 (APP)	-	1	-	100
LA LIBERTAD	(-1)	-	2	-3 PER	2 (APP)	1	-	2	-	-	-	1	-	-	-	8
LAMBAYEQUE	(-1)	1	1	-6 PER	1 (APP)	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	7





LORETO	1 (-1)	-	-	-3 PER	1	1	-	1	-	-	-	1	-	-	1	6
MADRE DE DIOS	(-1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MOQUEGUA	(-1)	-	2 (OxI)	-	1 (APP)	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	6
PASCO	(-1)	1	-	-1 PER	1 (APP)	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3
PIURA	1 (-1)	-	3 5 (OxI)	-2 PER	2	2	1	-	-	3	-	2	-	-	-	19
PUNO	(-1)	1	6	-6 PER	1 1 (APP)	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	15
SAN MARTIN	(-1)	2	1	-4 PER	1 (APP)	3	-	4	-	1	1	-	-	-	-	13
TACNA	(-1)	1	1 (OxI)	-1 PER	1 1 (APP)	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	6
TUMBES	(-1)	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	2	-	-	-	5
UCAYALI	(-1)	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	5
MULTI DEPARTAMENTAL	-	-	-	-2 PER 1 (APP)	4 5 (APP)	-	4	-	-	-	-	1	-	-	-	13
TODOS NACIONAL	1 (24 PCB)	-	-	1 (79 PER)	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	6
TOTAL PROYECTOS POR SECTORES	22	15	102	2	45	22	29	30	1	12	6	13	1	1	1	302

CUADRO N° 15 LISTADO DE OBRAS SECTORIALES

Fuente: Decreto Supremo N° 011-2021-MC.

Elaboración: Comisión Especial Multipartidaria del Bicentenario de la Independencia del Perú

(-1) Parque Cultural Bicentenario en cada departamento

(APP) Asociación Público Privada

(OxI) Obras por Impuestos

(PER) Proyectos de Electrificación Rural



SEGUIMIENTO ANTE EL PROYECTO ESPECIAL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DEL PERÚ (PEB) SOBRE EL AVANCE DE LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION

Tomando en cuenta el listado de proyectos de la Agenda del Bicentenario de la Independencia del Perú y las funciones asignadas al Proyecto Especial Bicentenario de la Independencia del Perú (PEB), entidad creada por Decreto Supremo N°004-2018-MC y adscrita al Ministerio de Cultura, de ejecutar, articular, impulsar y dar seguimiento a la implementación y cumplimiento de la citada Agenda; en su oportunidad, en cumplimiento de nuestras obligaciones de seguimiento y fiscalización mediante Oficio N° 004-2022-2023-LVOM-CEMBI/CR se solicitó información al Ministerio de Cultura sobre el estado situacional de los proyectos comprendidos en dicha Agenda, requerimiento que fuera atendido por el referido sector, mediante Oficio N° 000553-2023-SG/MCE, adjunto al cual remitieron el Informe N° 000007-2023-UAPI-WAC-PEB/MC, elaborado por la Unidad de Articulación y Promoción Interinstitucional del Proyecto Especial Bicentenario, brindándonos información actualizada en ese entonces al 30 de abril del 2023, sobre el estado situacional por departamento, de las 302 obras que forman parte de la Agenda de Conmemoración del Bicentenario de la Independencia del Perú, aprobada por Decreto Supremo 011-2021-MC.

Del análisis de la citada información y cumpliendo nuestra labor de seguimiento hicimos algunas precisiones, que se debe tener presente; en la parte del análisis en el punto 3.2.1) se tiene que el valor total actualizado de los proyectos es de S/. 75,663 millones de soles, sin considerar los 02 proyectos del Sector Transporte y Comunicaciones (Carretera Central y Puente Santa Rosa), cuyo valor tiene un monto superior a los 12,800 millones, que no lo consideran por la mínima ejecución (1%) y porque altera los resultados reales de la información sobre la ejecución; y que el avance financiero al 30 de abril del 2023 es del 44% de forma acumulada, que equivale a una ejecución real acumulativa de S/33,278 millones de soles; costo actualizado y ejecución acumulada que no concuerda con la consignada en el cuadro 01 del citado informe; pero para efectos del presente informe tendremos en cuenta el que corresponde al citado cuadro 01. Es así que a dicha fecha, de las 302 obras que ejecutan los diferentes sectores del Ejecutivo, 92 están concluidos (84 obras de inversión pública y 8 obras por otras modalidades de inversión), quedando 210 obras en ejecución (183 proyectos de inversión pública y 27 proyectos por otras modalidades de inversión), información que consolidamos en el siguiente cuadro:



TIPO DE OBRA	ESTADO DE LA OBRA	CANTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (MILLONES)	EJECUCION ACUMULADA (MILLONES)	% DE AVANCE
OBRAS PUBLICAS	OBRAS EN EJECUCION (+)	183	21,370	6,668	31 %
	OBRAS CONLUIDAS	84	10,202	8,663	85 %
OBRAS POR OTRAS MODALIDADES	OBRAS EN EJECUCION	27	41,783	16,256	39 %
	OBRAS CONLUIDAS	8	2,830	1,872	66 %
TOTAL		302	76,185	33,459	44 %

CUADRO N° 16 RESUMEN DEL ESTADO DE LAS OBRAS AL 30 DE ABRIL DEL 2023

Fuente: Informe N° 000007-2023-UAPI-WAC-PEB/MC. Actualizado al 30 de abril del 2023

(+) No se contabiliza la inversión de 02 proyectos del Sector Transporte y Comunicaciones.

Elaboración: Comisión Especial Multipartidaria del Bicentenario de la Independencia del Perú

Continuando con nuestra labor de seguimiento de la Agenda del Bicentenario y tomado en cuenta la información con la que se contaba y que nos remitiera el Ministerio de Cultura mediante Oficio N° 000553-2023-SG/MCE, información actualizada al 30 de abril del 2023, después de un plazo prudencial, mediante Oficio N° 080-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR, entre otros puntos, solicitamos al Ministerio de Cultura, información actualizada y detallada del estado situacional de las 210 obras que aún quedaban pendientes de ejecución y que forman parte de la Agenda de Conmemoración, conforme lo indican en el Informe N° 000007-2023-UAPI-WAC-PEB/MC; pedido que fuera atendido por el referido Sector, mediante OFICIO N° 000949-2023-SG/MC, con el cual nos remitieron el Memorando N° 313-2023-PEB/MC, elaborado por el Proyecto Especial Bicentenario y el Informe N° 000521-2023-OINV/MC, elaborado por la Oficina de Inversiones de la Unidad Ejecutora 008: MC Proyectos Especiales, brindándonos información actualizada al 30 de setiembre del 2023.

En el extremo del estado situacional de las 210 obras, nos informaron que al 30 de setiembre del 2023, aún quedaban pendientes de ejecución 200 obras, precisando además el avance y en qué fase se encontraban estas, conforme así lo detallan en el cuadro 01, cuadro que adecuamos en el presente informe, de los cuales 177 son proyectos de inversión y 23 se ejecutan por otras



modalidades de inversión (Asociación Público Privada – APP y Proyectos en Activos - AP).

Estado de Obra	Cantidad
Culminadas	102
En ejecución física	144
Paralizadas	15
Expediente Técnico aprobado	14
Elaboración de Expediente Técnico	16
Con viabilidad de perfil	07
En fase de transacción (inversiones en APP y PA, no adjudicadas a la fecha)	03
En Idea	01
Total	302

CUADRO N° 17 RESUMEN ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2023

Fuente: MEMORANDO N° 000313-2023-PEB/MC. Actualizado al 30 de setiembre del 2023

Elaboración: Comisión Especial Multipartidaria del Bicentenario de la Independencia del Perú

En el citado informe también indican la ejecución financiera tan solo de 300 proyectos y no consideran 02 proyectos del Sector Transporte y Comunicaciones (Carretera Central y Puente Santa Rosa), que requieren de una inversión de 12,874 millones, cuya ejecución acumulada es de 197 millones, que representa el 2%, indicando que el monto de inversión de estos 02 proyectos distorsiona la interpretación real del avance financiero del resto de proyectos que ejecutan los sectores del ejecutivo. Respecto a la inversión en los 300 proyectos, en ese entonces, ascendía a S/. 75,939 millones de soles, con un avance financiero al 30 de setiembre del 2023 de 46%, que equivalía a una ejecución real acumulativa de S/. 34,935 millones de soles, información que consolidamos en el siguiente cuadro.

TIPO DE OBRA	ESTADO DE LA OBRA	CANTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (MILLONES)	EJECUCION ACUMULADA (MILLONES)	% DE AVANCE
OBRAS PUBLICAS	Obras concluidas	90	11,328	9,722	86%
	Obras en ejecución física	128	14,347	5,483	38%

	Expediente Técnico aprobado	14	1,682	32	2%
	Elaboración Expediente Técnico (*)	11	1,682	169	10%
	Perfil (7 viables y 1 en idea)	7	824	0	0%
	Obra Paralizada	15	1,833	886	48%
SUB TOTAL OBRAS PUBLICAS		265	31,695	16,292	51 %
OBRAS POR OTRAS MODALIDADES	Obras concluidas	12	5,523	3,160	57%
	Obras en ejecución física	16	33,254	15,476	47%
	Expediente Técnico aprobado	0			0%
	Elaboración Expediente Técnico	3	2,157	7	0%
	Perfil (03 fase de transacción)	4	3,310	0	0%
	Obra Paralizada	0			0%
SUB TOTAL DE APP Y PA		35	44,244	18,643	42 %
TOTAL		300	75,939	34,935	46 %

CUADRO N° 18 ESTADO Y AVANCE FINANCIERO DE LAS OBRAS AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2023
 Fuente: MEMORANDO N° 000313-2023-PEB/MC. Actualizado al 30 de setiembre del 2023
 (+) No se contabiliza la inversión de 02 proyectos del Sector Transporte y Comunicaciones.
 Elaboración: Comisión Especial Multipartidaria del Bicentenario de la Independencia del Perú

Continuando con el seguimiento de la Agenda del Bicentenario y tomado en cuenta la información con la que se contaba y que nos remitiera el Ministerio de Cultura mediante Oficio N° 000949-2023-SG/MC, información actualizada al 30 de setiembre del 2023, después de un plazo prudencial, mediante Oficio N° 308-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR, entre otros puntos, solicitamos al Ministerio de Cultura, información actualizada y detallada del estado situacional de las 200 obras que aún quedaban pendientes de ejecución y que forman parte de la Agenda de Conmemoración, conforme lo indican en el Memorando N° 313-2023-PEB/MC y en el Informe N° 000521-2023-OINV/MC; solicitud que fuera reiterada con Oficio N° 340-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR, y que fuera atendida por el referido Sector, mediante OFICIO N° 000422-2024-DM/MC, al respecto queremos aclarar que el citado oficio atiende nuestra solicitud reiterada, pero también nos indican que oportunamente atendieron nuestra solicitud de información con OFICIO N° 000294-2024-SG/MC, el cual, consideramos que no cumplió con atender nuestro requerimiento de información, al haberse remitido con errores en su

contenido, comprendiendo información pasada, que correspondía a una solicitud anterior y que brindaba información confusa, que motivo su reiteración, superado este impase; es así que, con el citado oficio se nos remitió el INFORME N° 000092-2024-OINV/MC elaborado por la Oficina de Inversiones de la Unidad Ejecutora 008: MC Proyectos Especiales y el Informe N° 004-2024-UAPI-PEB-JPO/MC, elaborado por el Proyecto Especial Bicentenario, brindándonos información actualizada al 14 de febrero del 2024.

En el extremo del estado situacional de las 302 obras y que al 30 de setiembre del 2023 quedaban pendientes de ejecución 200 obras, con la citada información recepcionada y analizada se tiene que al 14 de febrero del 2024, todavía quedan pendientes de ejecución 196 obras, es decir ya están concluidas 106, que representa el 35 % del total de obras de la referida Agenda del Bicentenario; precisando además en qué fase se encuentran y el porcentaje de avance, conforme así lo detallan en el cuadro 01, cuadro que adecuamos en el presente informe, de los cuales 174 son proyectos de inversión bajo la modalidad de obras publicas y 22 son por otras modalidades de inversión (Asociación Público Privada – APP y Proyectos en Activos - AP). En los citados informes no nos remiten los avances financieros de las obras.

Estado de Obra	Cantidad	Porcentaje
Culminadas	106	35 %
En ejecución física	143	47 %
Paralizadas	10	4 %
Expediente Técnico aprobado	12	4 %
Elaboración de Expediente Técnico	18	6 %
Pre inversión	13	4 %
Total	302	100 %

CUADRO N° 19 RESUMEN ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS AL 14 DE FEBRERO DEL 2024

Fuente: INFORME N° 000092-2024-OINV/MC y el Informe N° 004-2024-UAPI-PEB-JPO/MC. Actualizado al 14 de febrero del 2024

Elaboración: Comisión Especial Multipartidaria del Bicentenario de la Independencia del Perú

Continuando con nuestra labor de seguimiento de la Agenda del Bicentenario y tomado en cuenta la información con la que se contaba y que nos remitiera el Ministerio de Cultura mediante Oficio N° 000294-2024-SG/MC, información actualizada al 14 de febrero del 2024, después de un plazo prudencial, mediante Oficio N° 050-2024-2025-LVOM-CEMBI/CR, entre otros puntos, solicitamos al Ministerio de Cultura, información actualizada y detallada del estado situacional de las 196 obras que aún quedaban pendientes de ejecución y que forman parte de la Agenda de Conmemoración, conforme lo indican en el INFORME N° 000092-2024-OINV/MC elaborado por la Oficina de Inversiones de la Unidad Ejecutora 008: MC Proyectos Especiales y el Informe N° 004-2024-UAPI-PEB-JPO/MC, elaborado por el Proyecto Especial Bicentenario; pedido que fuera atendido por el referido Sector, mediante OFICIO N° 001899-2024-DM/MC, con el cual nos remitieron el documento “Respuesta a la solicitud de información realizada por la Comisión Especial Multipartidaria Conmemorativa del Bicentenario de la Independencia del Perú”, información consolidada de la Unidad Ejecutora 008 Proyectos Especiales, del Proyecto Especial Bicentenario de la Independencia del Perú y de la Oficina de Inversiones de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, brindándonos información actualizada al 30 de setiembre del 2024.

En el extremo del estado situacional de las 302 obras y que al 14 de febrero del 2024 quedaban pendientes de ejecución 196 obras, con la citada información recepcionada y analizada se tiene que al 30 de setiembre del 2024, todavía quedan pendientes de ejecución 178 obras, es decir ya están concluidas 124, que representa el 41.1 % del total de obras de la referida Agenda del Bicentenario; precisando además en qué fase se encuentran y el porcentaje de avance, conforme así lo detallan en el cuadro 01 Estado actual (Cantidad) de las obras de la Agenda, cuadro que adecuamos en el presente informe, de los cuales 158 son proyectos de inversión bajo la modalidad de obras públicas y 20 son por otras modalidades de inversión (Asociación Público Privada – APP y Proyectos en Activos - AP).

Estado del Proyecto	Cantidad	Porcentaje
Culminadas	124	41.1 %
En ejecución física	122	40.4 %
Paralizadas	18	6.0 %
Expediente Técnico aprobado	11	3.6 %

Elaboración de Expediente Técnico	19	6.3 %
Perfil Viable	6	2.0 %
Idea	2	0.7 %
Total	302	100 %

CUADRO N° 20 RESUMEN ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2024

Fuente: OFICIO N° 001899-2024-DM/MC. Actualizado al 30 de setiembre del 2024

Elaboración: Comisión Especial Multipartidaria del Bicentenario de la Independencia del Perú

Tomando en cuenta el estado actual de las obras al 30 de setiembre del 2024 (información brindada por el Ministerio de Cultura con OFICIO N° 001899-2024-DM/MC), conforme figuran en el Cuadro N° 20, consideramos pertinente comparar con la anterior información actualizada al 14 de febrero del 2024 (información brindada por el Ministerio de Cultura a través del INFORME N° 000092-2024-OINV/MC y el Informe N° 004-2024-UAPI-PEB-JPO/MC), comparación que nos permitirá conocer el avance de la ejecución en sus diversos estados de las 302 obras que forman parte de la Agenda de Conmemoración del Bicentenario de la Independencia del Perú, conforme se detalla en el cuadro siguiente:

CUADRO COMPARATIVO DEL AVANCE DE EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE LA AGENDA BICENTENARIO					
Estado del Proyecto	Cantidad		Porcentaje		AVANCE CANTIDAD/PORCENTAJE
	Información al 14/02/2024	Información al 30/09/2024	Información al 14/02/2024	Información al 30/09/2024	
Culminadas	106	124	35 %	41.1 %	Mas 18 PROYECTOS / Mas 6.1 %
En ejecución física	143	122	47 %	40.4 %	Menos 21 PROYECTOS / Menos 6.6 %
Paralizadas	10	18	4 %	6.0 %	Mas 8 PROYECTOS / Mas 2.0 %
Expediente Técnico aprobado	12	11	4 %	3.6 %	Menos 1 PROYECTO / Menos 0.4 %
Elaboración de Expediente Técnico	18	19	6 %	6.3 %	Mas 1 PROYECTO / Mas 0.3 %

Perfil Viable	13	6	4 %	2.0 %	Menos 5 PROYECTOS / Menos 1.3 %
Idea	-	2	-	0.7 %	-
Total	302	302	100 %	100 %	

CUADRO N° 21 CUADRO COMPARATIVO DE AVANCE AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2024

Fuente: - INFORME N° 000092-2024-OINV/MC y el Informe N° 004-2024-UAPI-PEB-JPO/MC. Actualizado al 14 de febrero del 2024 comparado con la información remitida con el OFICIO N° 001899-2024-DM/MC. Actualizado al 30 de setiembre del 2024

Elaboración: Comisión Especial Multipartidaria del Bicentenario de la Independencia del Perú

SEGUIMIENTO ESPECIAL Y ESPECIFICO A LOS PROYECTOS DE INVERSION QUE SE ENCUENTRAN PARALIZADOS

En el Informe N° 000007-2023-UAPI-WAC-PEB/MC, que elaborara en su oportunidad la Unidad de Articulación y Promoción Interinstitucional del Proyecto Especial Bicentenario, también nos brindan información respecto a las obras paralizadas al 30 de abril del 2023, conforme así se observa en el Anexo 1 que al 30 de abril del 2023, 19 proyectos se encuentran paralizados, información que lo hemos consolidado para facilitar su estudio y análisis en los cuadros elaborados por nuestra comisión, que a continuación detallamos:

SECTORES								TOTAL PROYECTOS POR UNIDADES EJECUTORAS
UNIDAD EJECUTORA	CULTURA	ENERGIA Y MINAS	MIDAGRI	PRODUCCION	SALUD	MTC	VIVIENDA	
MIDAGRI			4					4
ENERGIA Y MINAS		2						2
SALUD					1			1
VIVIENDA							3	3
GORE APURIMAC			1					1
GORE AYACUCHO	1		1					2
MP SANCHEZ							1	1

CARRION								
PRODUCCION				1				1
MD NUEVA CAJAMARCA							1	1
GORE TACNA			1					1
MTC						2		2
TOTAL PROYECTOS POR SECTORES	1	2	7	1	1	2	5	19

CUADRO N° 22 RESUMEN DE LAS OBRAS PARALIZADAS AL 30 DE ABRIL 2023

Fuente: Informe N° 000007-2023-UAPI-WAC-PEB/MC.

Elaboración: Comisión Especial Multipartidaria del Bicentenario de la Independencia del Perú

Según el referido informe y el cuadro resumen, de los 302 proyectos considerados en la Agenda del Bicentenario, con la información actualizada en ese entonces al 30 de abril del 2023, se tiene que, 19 proyectos de inversión se encuentran paralizados, cuyo consolidado debidamente detallado presentamos en el siguiente cuadro elaborado por nuestra comisión:

OBRAS PARALIZADAS AL 30 DE ABRIL DEL 2023						
SECTOR	UNIDAD EJECUTORA	DEPARTAMENTO	CUI	NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
CULTURA	GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO	AYACUCHO	2230368	Mejoramiento de la conservación del patrimonio cultural del sitio arqueológico de Wari, Huamanga - Ayacucho	50,9%	51,5%
ENERGIA Y MINAS	DGER/MEM	CUSCO	2276033	ELECTRIFICACION DE OCHO (08) PROYECTOS DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO - SECTOR 2	4,6%	0%
ENERGIA Y MINAS	- DGER/MEM	LA LIBERTAD	2132587	SISTEMA ELECTRICO RURAL TAYABAMBA- HUANCASPATA V ETAPA	98,6%	54%
AGRARIA	UEI DE GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	APURIMAC	2215017	Mejoramiento y Ampliación del servicio de agua de riego en las comunidades de Chullcuisa, Santa Rosa, Cupisa, Champacocha, Ancatira, Choccecancha Y Argama Alta, Distritos De San Jeronimo Y	33,1%	16%



				Pacucha, Provincia de Andahuaylas, Departamento de Apurímac.		
AGRARIA	PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL INTEGRADO	AYACUCHO	2077939	Ampliación de la presa ancascocha y afianzamiento del valle de Yauca (Ayacucho y Arequipa)	35,5%	22,1%
AGRARIA	PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL	CUSCO	2141237	Mejoramiento de la irrigación Marcahuasi - Mollepata, provincia de Anta - Cusco	75,5%	63,4%
AGRARIA	PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL	HUANCAVELICA	2221352	Instalación del sistema de riego Tutapayoc vista Alegre - Pantekilla, distrito de Surcubamba - Tayacaja - Huancavelica	95,3%	66,1%
AGRARIA	PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL	HUANCAVELICA	2229551	Instalación del servicio de agua del sistema de riego Pumapahuasin - Socaoran - Uchubamba - Ccollpa, distrito de Callanmarca, Angaraes, Huancavelica	49,8%	31,7%
AGRARIA	PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL	JUNIN	2184535	Instalación de agua para riego de los anexos de Uyo, Lauca, Andamarca, Huata, Antacalla y Andamayo, distrito de Andamarca - Concepcion - Junin	95,3%	94,3%
AGRARIA	UEI DEL PROYECTO ESPECIAL AFIANZAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS DE TACNA	TACNA	2106687	Mejoramiento y ampliación de la provisión de agua para desarrollo agrícola en el valle de Tacna - Vilavilani II - Fase I - Construcción canal Vilachaullani - Calachaca - Chuapalca	31,8%	4,8%
PRODUCCION	28169-PROGRAMA NACIONAL DE DIVERSIFICACION PRODUCTIVA	LORETO	2274894	Mejoramiento del servicio de comercialización del Gran Mercado de Belén - Iquitos, provincia de Maynas, departamento de Loreto	75,3%	49,7%
SALUD	PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES- PRONIS	APURIMAC	2343407	Mejoramiento y ampliación de los servicios de salud del establecimiento de salud Challhuahuacho, del distrito de Challhuahuacho, Provincia de Cotabambas, Departamento de Apurímac	70,2%	58,3%



MTC	DIRECCIÓN DE INVERSIÓN PRIVADA EN TRANSPORTES	PUNO	2233842	Autopista Puno - Juliaca (+)	94,8%	81,6%
MTC	DIRECCIÓN DE INVERSIÓN PRIVADA EN TRANSPORTES	CAJAMARCA	2132587	Carretera Longitudinal de la Sierra - Tramo 2: Ciudad de Dios - Cajamarca - Chiple, Cajamarca - Trujillo y Dv. Chilete - Empalme PE-3N. (+)	80,4%	78,6%
VIVIENDA	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	APURIMAC	2286058	Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado sanitario de los barrios urbanos: Patron Santiago, El Salvador, los Álamos, Wichaypampa, Señor de Huanca y San Marcos del Distrito de Challhuahuacho, Provincia de Cotabambas, Departamento de Apurímac	83,5%	84%
VIVIENDA	PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO	LIMA	2344329	Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado para el esquema San Juan De Amancaes - Distrito Rímac	84,1%	98%
VIVIENDA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANCHEZ CARRION	LA LIBERTAD	2084708	Mejoramiento y ampliación de sistema de agua potable y alcantarillado de la ciudad de huamachuco - distrito de Huamachuco, Provincia de Sánchez Carrión - La Libertad	38,1%	16%
VIVIENDA	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	PIURA	2260867	Mejoramiento del sistema de evacuación, tratamiento y disposición final de las aguas servidas de las ciudades de Sullana y Bellavista, Provincia de Sullana - Piura	65,9%	67%
VIVIENDA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA	SAN MARTIN	2300077	Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado con conexiones domiciliarias en la ciudad de Nueva Cajamarca, Distrito de Nueva Cajamarca - Rioja - San Martín	96,1%	82%

CUADRO N° 23 DETALLE DE LAS OBRAS PARALIZADAS AL 30 DE ABRIL 2023

Fuente: Informe N° 000007-2023-UAPI-WAC-PEB/MC.

Elaboración: Comisión Especial Multipartidaria del Bicentenario de la Independencia del Perú

Contando con información específica respecto a las obras paralizadas y continuando con nuestra labor de seguimiento de la citada Agenda del Bicentenario, especialmente en el extremo de las obras paralizadas, luego de un plazo prudencial, se requirió información al respecto; y del análisis y verificación de la información brindada por el Ministerio de Cultura a través del Memorando N° 313-2023-PEB/MC y el Informe N° 000521-2023-OINV/MC, en cuyo Anexo 02 y Anexo 1- A de los citados documentos, respectivamente, observamos que, de los 19 proyectos que se encontraban paralizados al 30 de abril del 2023, algunos se han reactivado y otros han adquirido la condición de paralizados, desprendiéndose de ello, que aún quedan 15 proyectos paralizados al 30 de setiembre del 2023; información que nos permitió hacer un análisis comparativo entre el Informe N° 000007-2023-UAPI-WAC-PEB/MC (19 obras paralizadas al 30 de abril del 2023) y el informe según MEMORANDO N° 000313-2023-PEB/MC (15 obras paralizadas al 30 de setiembre del 2023), identificándose 8 proyectos que se han reactivado y han dejado su condición de paralizados, conociendo su avance físico y financiero, conforme al siguiente detalle en el cuadro elaborado por nuestra comisión.

SECTOR ENERGIA Y MINAS (LEVANTARON LA PARALIZACION)					
Unidad Ejecutora	Departamento	CUI	Nombre del Proyecto de Inversión	Avance Financiero	Avance Físico
IRECCIÓN DE PROYECTOS - DIRECCIÓN GENERAL DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS - DGER/MEM	CUSCO	2276033	ELECTRIFICACION DE OCHO (08) PROYECTOS DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO - SECTOR 2	4,6%	0%
DIRECCIÓN DE PROYECTOS - DIRECCIÓN GENERAL DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS - DGER/MEM	LA LIBERTAD	2132587	SISTEMA ELECTRICO RURAL TAYABAMBA-HUANCASPATA V ETAPA	98,6%	54%
SECTOR AGRARIA (LEVANTARON LA PARALIZACION)					
Unidad Ejecutora	Departamento	CUI	Nombre del Proyecto de Inversión	Avance Financiero	Avance Físico
UEI DE GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	APURIMAC	2215017	Mejoramiento y Ampliación del servicio de agua de riego en las comunidades de Chullcuisa, Santa Rosa, Cupisa, Champacocha, Ancatira, Choccecancha Y Argama Alta, Distritos De San Jeronimo Y Pacucha, Provincia de Andahuaylas,	33,1%	16%

			Departamento de Apurímac.		
PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL INTEGRADO	AYACUCHO	2077939	Ampliación de la presa ancascocha y afianzamiento del valle de Yauca (Ayacucho y Arequipa)	35,5%	22,1%
SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES (LEVANTARON LA PARALIZACION)					
Unidad Ejecutora	Departamento	CUI	Nombre del Proyecto de Inversión	Avance Financiero	Avance Físico
DIRECCIÓN DE INVERSIÓN PRIVADA EN TRANSPORTES	PUNO	2233842	Autopista Puno - Juliaca (+)	94,8%	81,6%
DIRECCIÓN DE INVERSIÓN PRIVADA EN TRANSPORTES	CAJAMARCA	2132587	Carretera Longitudinal de la Sierra - Tramo 2: Ciudad de Dios - Cajamarca - Chiple, Cajamarca - Trujillo y Dv. Chilete - Empalme PE-3N.(+)	80,4%	78,6%
SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO (LEVANTARON LA PARALIZACION)					
Unidad Ejecutora	Departamento	CUI	Nombre del Proyecto de Inversión	Avance Financiero	Avance Físico
PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO	LIMA	2344329	Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado para el esquema San Juan De Amancaes - Distrito Rímac	84,1%	98%
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA	SAN MARTIN	2300077	Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado con conexiones domiciliarias en la ciudad de Nueva Cajamarca, Distrito de Nueva Cajamarca - Rioja - San Martin	96,1%	82%

CUADRO N° 24 DETALLE DE LAS OBRAS QUE LEVANTARON SU PARALIZACION AL 30 DE SETIEMBRE 2023

Fuente: Informe N° 000007-2023-UAPI-WAC-PEB/MC Y MEMORANDO N° 000313-2023-PEB/MC.

Elaboración: Comisión Especial Multipartidaria del Bicentenario de la Independencia del Perú

Tomando en cuenta las obras reactivadas y el citado análisis comparativo se tiene que 11 obras continuaban paralizadas al 30 de setiembre del 2023, a las cuales se agregan 4 nuevas obras que están en dicha condición, las mismas que detallamos a continuación en el respectivo cuadro elaborado por nuestra comisión.

SECTOR AGRARIA						
Unidad Ejecutora	Departamento	CUI	Proyecto de Inversión	Avance Financiero	Avance Físico	Resumen de la Situación Actual
REGION HUANCavelica	HUANCavelica	2414831	Creación del sistema del servicio de riego en los distritos de Acobamba, Pomacocha y Caja de la Provincia de Acobamba - Departamento de Huancavelica	0.7%	0.00%	Este proyecto se encuentra Suspendido y judicializado se está realizando las actividades para la evaluación en la comunidad de choccapampa para una posible ubicación de la futura represa
REGION LAMBAYEQUE – OLMOS	LAMBAYEQUE	2262744	Mejoramiento de la infraestructura de conducción y trasvase del canal Huallabamba, Distrito de Motupe, Incahuasi y Kañaris, Provincias de Lambayeque y Ferreñafe - Región Lambayeque	6.6%	0%	El proyecto ya no continuo su ejecución por conflictividad social. Se adjunta documento sustentatorio.
SECTOR SALUD						
Unidad Ejecutora	Departamento	CUI	Proyecto de Inversión	Avance Financiero	Avance Físico	Resumen de la Situación Actual
REGION AREQUIPA	AREQUIPA	2279438	Mejoramiento de los servicios de salud del establecimiento de Salud de Chala, Distrito de Chala, Provincia de Caraveli - Región Arequipa	90.7%	89.6%	Obra con contrato resuelto el 20/12/2019, con un avance de ejecución física de 87.96%, la obra se encuentra en proceso de ejecución del expediente técnico de saldo de obra.
REGION AREQUIPA	AREQUIPA	2279710	Mejoramiento de los servicios de salud del hospital Camana distrito y provincia de Camana - Región Arequipa	76.4%	78.3%	Se está realizando la constatación física e inventario de obra, para posteriormente poder realizar el expediente de saldo de obra

CUADRO N° 25 NUEVAS OBRAS PARALIZADAS AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2023
 Fuente: MEMORANDO N° 000313-2023-PEB/MC. Actualizado al 30 de setiembre del 2023
 Elaboración: Comisión Especial Multipartidaria del Bicentenario de la Independencia del Perú

Finalmente, en esa oportunidad luego de haber citado las obras que levantaron su paralización (cuadro 24) y las nuevas obras en condición de paralizadas (cuadro 25), tenemos el siguiente consolidado del total de las obras paralizadas al 30 de setiembre del 2023, cuyo resumen por sectores y el detalle de cada proyecto presentamos en los respectivos cuadros elaborados por nuestra comisión.

UNIDAD EJECUTORA	SECTORES							TOTAL PROYECTOS POR UNIDADES EJECUTORAS
	CULTURA	ENERGIA Y MINAS	MIDAGRI	PRODUCCION	SALUD	MTC	VIVIENDA	
MIDAGRI AGRO RURAL			4					4
ENERGIA Y MINAS		-						-
SALUD					1			1
VIVIENDA							2	2
GORE AREQUIPA					2(*)			2
GORE APURIMAC								
GORE AYACUCHO	1							1
MP SANCHEZ CARRION							1	1
PRODUCCION				1				1
MD NUEVA CAJAMARCA							-	-
GORE HUANCAVELICA			1(*)					1
GORE LAMBAYEQUE			1 (*)					1
GORE TACNA			1					1
MTC						-		-
TOTAL PROYECTOS POR SECTORES	1	-	7	1	3	-	3	15

CUADRO N° 26 RESUMEN DE LAS OBRAS PARALIZADAS AL 30 DE SETIEMBRE 2023
 Fuente: MEMORANDO N° 000313-2023-PEB/MC.
 Elaboración: Comisión Especial Multipartidaria del Bicentenario de la Independencia del Perú
 (*) PARALIZADAS INCORPORADAS CON EL INFORME - MEMORANDO N° 000313-2023-PEB/MC

Unidad Ejecutora	SECTOR CULTURA						Resumen de la Situación Actual
	Departamento	CUI	Proyecto de Inversión	Avance Financiero	Avance Físico		
GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO	Ayacucho	2230368	Mejoramiento de la conservación del patrimonio cultural del sitio arqueológico de Wari, Huamanga – Ayacucho	50,9%	51,5%		Proyecto culminado (liquidación Física y financiera I etapa por el Gore Ayacucho), para iniciar segundo tramo MINCUL requiere documentación de dicha liquidación.



SECTOR AGRARIA						
Unidad Ejecutora	Departamento	CUI	Proyecto de Inversión	Avance Financiero	Avance Físico	Resumen de la Situación Actual
UEI DEL PROYECTO ESPECIAL AFIANZAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS DE TACNA	Tacna	2106687	Mejoramiento y ampliación de la provisión de agua para desarrollo agrícola en el valle de Tacna - Vilavilani II - Fase I - Construcción canal Vilachaulani - Calachaca - Chuapalca	31,9%	4,8%	Proyecto culminado (liquidación Física y financiera I etapa por el Gore Ayacucho), para iniciar segundo tramo MINCUL requiere documentación de dicha liquidación.
PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL	Junín	2184535	Instalación de agua para riego de los anexos de Uyo, Lauca, Andamarca, Huata, Antacalla y Andamayo, distrito de Andamarca - Concepción - Junín	95,3%	94,3%	Actualmente la obra se encuentra paralizada, mediante Acta de paralización de fecha 31 de diciembre del 2019.
PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL	Cusco	2141237	Mejoramiento de la irrigación Marcahuasi - Mollepata, provincia de Anta - Cusco	75,7%	63,4%	El presente proyecto se encuentra paralizado, por motivo de resolución de contrato del Contratista. - Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas del Colegio de Ingenieros del Perú- Consejo Departamental de Piura.
PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL	Huancavelica	2221352	Instalación del sistema de riego Tutapayocc vista Alegre - Pantekilla, distrito de Surcubamba - Tayacaja - Huancavelica	96,2%	66,10%	Obra se encuentra paralizada. Acciones para la reactivación de la obra: Se cuenta con informe técnico del estado situacional técnico-financiero-legal y la valorización de corte técnico-financiero del proyecto. - El presente proyecto, forma parte del inventario de obras paralizadas en el marco de la LEY 31589. "ley que garantiza la reactivación de obras públicas paralizadas". Actualmente, el área técnica viene formulando los términos de referencia para la contratación del servicio de elaboración del expediente técnico de saldo de obra.
PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL	Huancavelica	2229551	Instalación del servicio de agua del sistema de riego Pumapahuasin - Socaoran - Uchubamba - Ccollpa, distrito de Callanmarca, Angaraes, Huancavelica	50,9%	31,7%	El presente proyecto se encuentra paralizado desde el 21/01/2021. - Con fecha 07.07.2023 se publicó en el módulo del SEACE, la segunda convocatoria del proceso de selección para la contratación del servicio de consultoría en general especializado, para elaborar el informe técnico del estado situacional técnico financiero



						legal y la valorización de corte técnico financiero, del proyecto sometido a mecanismos de solución de controversias. Este informe, servirá como insumo para la elaboración de los TDR del expediente de saldo de obra. respecto a la segunda convocatoria del proceso de selección antes mencionado, se declaró desierto; en ese sentido, se re formulará los TDR.
REGION HUANCAMELICA	Huancavelica	2414831	Creación del sistema del servicio de riego en los distritos de Acobamba, Pomacocha y Caja de la Provincia de Acobamba - Departamento de Huancavelica. (*)	0.7%	0.00%	Este proyecto se encuentra Suspendido y judicializado se está realizando las actividades para la evaluación en la comunidad de choccapampa para una posible ubicación de la futura represa
REGION LAMBAYEQUE – OLMOS	Lambayeque	2262744	Mejoramiento de la infraestructura de conducción y trasvase del canal Huallabamba, Distrito de Motupe, Incahuasi y Kañaris, Provincias de Lambayeque y Ferreñafe - Región Lambayeque. (*)	6.6%	0%	El proyecto ya no continuo su ejecución por conflictividad social. Se adjunta documento sustentatorio.
SECTOR PRODUCCION						
Unidad Ejecutora	Departamento	CUI	Proyecto de Inversión	Avance Financiero	Avance Físico	Resumen de la Situación Actual
28169-PROGRAMA NACIONAL DE DIVERSIFICACION PRODUCTIVA	Loreto	2274894	Mejoramiento del servicio de comercialización del Gran Mercado de Belén - Iquitos, provincia de Maynas, departamento de Loreto	75,3%	49,7%	A la fecha de corte 08/09/2023, se ha dado el consentimiento de buena pro al servicio de corte técnico, liquidación parcial de obra y elaboración del expediente técnico de saldo de obra, así como a la consultoría correspondiente a su supervisión
SECTOR SALUD						
Unidad Ejecutora	Departamento	CUI	Proyecto de Inversión	Avance Financiero	Avance Físico	Resumen de la Situación Actual
PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES-PRONIS	Apurímac	2343407	Mejoramiento y ampliación de los servicios de salud del establecimiento de salud Challhuahuacho, del distrito de Challhuahuacho, Provincia de Cotabambas, Departamento de Apurímac	70,6%	58,3%	Contrato resuelto al 60.15% (Según constatación notarial): - El 10/03/2023 culminó el acto de constatación física notarial. - El 03/07/2023 culmina el diagnóstico del saldo de obra. -Se aprobó el Plan de Trabajo de elaboración del expediente técnico el 31.08.2023. - ET. PRINCIPAL: - Expediente en desarrollo bajo la modalidad de Administración Directa.

						- Se inició la elaboración del desarrollo del expediente el 01.09.2023, con un plazo de 90 días hasta su aprobación - ET. CONTINGENCIA: Al respecto el 31/05/23, en reunión virtual, el GORE se comprometió a adecuar el colegio Amauta, para la contingencia. El GORE ha señalado, que ha culminado el expediente e inicio la adecuación de la infraestructura el 03.07.2023, estimándose la entrega de la adecuación de la obra para el 15.09.2023
REGION AREQUIPA	Arequipa	2279438	Mejoramiento de los servicios de salud del establecimiento de Salud de Chala, Distrito de Chala, Provincia de Caraveli - Región Arequipa. (*)	90.7%	89.6%	Obra con contrato resuelto el 20/12/2019, con un avance de ejecución física de 87.96%, la obra se encuentra en proceso de ejecución del expediente técnico de saldo de obra.
REGION AREQUIPA	Arequipa	2279710	Mejoramiento de los servicios de salud del hospital Camana distrito y provincia de Camana - Región Arequipa. (*)	76.4%	78.3%	Se está realizando la constatación física e inventario de obra, para posteriormente poder realizar el expediente de saldo de obra
SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO						
Unidad Ejecutora	Departamento	CUI	Proyecto de Inversión	Avance Financiero	Avance Físico	Resumen de la Situación Actual
PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	Piura	2260867	Mejoramiento del sistema de evacuación, tratamiento y disposición final de las aguas servidas de las ciudades de Sullana y Bellavista, Provincia de Sullana - Piura	67.2%	67%	El PNSU comunicó a la JRD la resolución de contrato tripartito por incumplimiento de obligaciones. • el 01.08.2023 el PNSU remitió a la PP las 14 decisiones que emitió la JRD las cuales la entidad está en desacuerdo para el inicio de las acciones arbitrales. • el 24.08.2023 vence el plazo del PNSU para interponer arbitraje respecto a la resolución de contrato del consorcio Sullabella. • el 11.09.2023 vence el plazo de PNSU para iniciar arbitraje respecto a las decisiones con la JRD.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANCHEZ CARRION	La Libertad	2084708	Mejoramiento y ampliación de sistema de agua potable y alcantarillado de la ciudad de huamachuco - distrito de Huamachuco, Provincia de	38,1%	16%	Mediante resolución de alcaldía N° 203-2022-MPSC de fecha 15-06-2022, se resuelve: artículo 1.: declarar la nulidad de oficio del contrato de ejecución de obra N° 010-2019-MPSC/SG-LOG. La



			Sánchez Carrión - La Libertad			obra se encuentra paralizada
PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	Apurímac	2286058	Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado sanitario de los barrios urbanos: Patron Santiago, El Salvador, los Álamos, Wichaypampa, Señor de Huanca y San Marcos del Distrito de Challhuahuacho, Provincia de Cotabambas, Departamento de Apurímac	83,7%	84%	Se ha modificado la programación financiera, respecto a la programación remitida al MEF, en diciembre del 2022 * el avance del E.T. es de un 99%. En reunión de mesa técnica, la MDCH se comprometió en obtener el terreno requerido hasta el 05.09.2023.

CUADRO N° 27 DETALLE DE LAS OBRAS PARALIZADAS AL 30 DE SETIEMBRE 2023

Fuente: MEMORANDO N° 000313-2023-PEB/MC.

Elaboración: Comisión Especial Multipartidaria del Bicentenario de la Independencia del Perú

(*) PARALIZADAS INCORPORADAS CON EL INFORME - MEMORANDO N° 000313-2023-PEB/MC

Luego de haber tomado conocimiento de la existencia de obras paralizadas, por la información brindada por el Ministerio de Cultura, a través del Informe N° 000007-2023-UAPI-WAC-PEB/MC (19 obras paralizadas al 30 de abril del 2023) y el informe según MEMORANDO N° 000313-2023-PEB/MC (15 obras paralizadas al 30 de setiembre del 2023), nuestra comisión considero pertinente y oportuno solicitar información a cada unidad ejecutora, que nos permita corroborar el estado situacional de cada obra e identificar los problemas que han generado su paralización para coadyuvar al destrabe y busca de soluciones, es así que, en el último trimestre del 2023, solicitamos información al respecto a las unidades ejecutoras de los tres niveles de gobierno; y, ante la falta de respuesta en algunos casos, en los primeros días del presente año se ha reiterado el requerimiento de información, consolidado del requerimiento de información y seguimiento de las respectivas respuestas que presentamos en los siguientes cuadros:

N°	OFICIOS	FECHA	ENTIDAD	ASUNTO
1	N° 085-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	04/10/2023	Ministra de Desarrollo Agrario y Riego	Solicitud de Información, sobre proyectos de inversión que se encuentran paralizados
2	N° 086-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	04/10/2023	Ministro de Energía y Minas	Solicitud de Información, sobre proyectos de inversión que se encuentran paralizados.
3	N° 087-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	04/10/2023	Ministro de Salud	Solicitud de Información, sobre proyecto de inversión que se encuentra paralizado
4	N° 088-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	04/10/2023	Ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento	Solicitud de Información, sobre proyectos de inversión que se encuentran paralizados.





5	N° 089-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	04/10/2023	Gobernador Regional de Apurímac	Solicitud de Información, sobre proyecto de inversión que se encuentra paralizado
6	N° 090-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	04/10/2023	Gobernador Regional de Ayacucho	Solicitud de Información, sobre proyectos de inversión que se encuentran paralizados.
7	N° 091-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	04/10/2023	Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión	Solicitud de Información, sobre proyecto de inversión que se encuentra paralizado.
8	N° 092-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	04/10/2023	Ministra de la Producción	Solicitud de Información, sobre proyecto de inversión que se encuentra paralizado.
9	N° 093-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	04/10/2023	Municipalidad Distrital de Nueva Cajamarca	Solicitud de Información, sobre proyecto de inversión que se encuentra paralizado
10	N° 094-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	04/10/2023	Gobernador Regional de Tacna	Solicitud de Información, sobre proyecto de inversión que se encuentra paralizado.
11	N° 095-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	04/10/2023	Ministro de Transportes y Comunicaciones	Solicitud de Información, sobre proyectos de inversión que se encuentran paralizados.
12	N° 0109-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	26/10/2023	Gobernador Regional de Huancavelica	Solicitud de Información, sobre proyecto de inversión que se encuentra paralizado.
13	N° 0110-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	26/10/2023	Gobernador Regional de Lambayeque	Solicitud de Información, sobre proyecto de inversión que se encuentra paralizado.
14	N° 0111-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	26/10/2023	Gobernador Regional de Arequipa	Solicitud de Información, sobre proyectos de inversión que se encuentran paralizados.
15	N° 0287-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	09/01/2024	Ministra de Desarrollo Agrario y Riego	Reitera solicitud de información, sobre proyectos de inversión que se encuentran paralizados.
16	N° 0288-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	09/01/2024	Ministro de Energía y Minas	Reitera solicitud de información, sobre proyectos de inversión que se encuentran paralizados.
17	N° 0289-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	09/01/2024	Ministro de Salud	Reitera solicitud de información, sobre proyecto de inversión que se encuentra paralizado.
18	N° 0290-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	09/01/2024	Ministra Vivienda, Construcción y Saneamiento	Reitera solicitud de información, sobre proyectos de inversión que se encuentran paralizados.
19	N° 0291-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	09/01/2024	Gobernador Regional de Apurímac	Reitera solicitud de información, sobre proyecto de inversión que se encuentra paralizado.
20	N° 0292-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	09/01/2024	Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión	Reitera solicitud de información, sobre proyecto de inversión que se encuentra paralizado.
21	N° 0293-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	09/01/2024	Ministra de Producción	Reitera solicitud de información, sobre proyecto de inversión que se encuentra paralizado.



22	N° 0294-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	09/01/2024	Gobernador Regional de Tacna	Reitera solicitud de información, sobre proyecto de inversión que se encuentra paralizado.
23	N° 0295-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	09/01/2024	Ministro de Transportes y Comunicaciones	Reitera solicitud de información, sobre proyectos de inversión que se encuentran paralizados.
24	N° 0296-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	09/01/2024	Gobernador Regional de Huancavelica	Reitera solicitud de información, sobre proyecto de inversión que se encuentra paralizado.

CUADRO N° 28 DETALLE DE OFICIOS REQUIRIENDO INFORMACION A LAS UNIDADES EJECUTORA CON OBRAS PARALIZADAS AL 30 DE SETIEMBRE 2023

Fuente: MEMORANDO N° 000313-2023-PEB/MC.
Elaboración: Comisión Especial Multipartidaria del Bicentenario de la Independencia del Perú

OFICIO	ASUNTO	INSTITUCIÓN	FECHA PRESENTACIÓN /N° EXPEDIENTE	ATENCIÓN OPORTUNA	OFICIO REITERATIVO	FECHA PRESENTACIÓN /N° EXPEDIENTE	ESTADO ACTUAL
N° 085-2023-2024	Solicito información sobre proyectos de inversión paralizados	Ministro de Desarrollo Agrario y Riego	04/10/2023 00059709-2023	SIN RESPUESTA	N° 0287-2023-2024	09/01/2024 00001226-2024	RESPUESTA CON FECHA 20 FEBRERO 2024 - OFICIO N° 0660-2024-MIDAGRI-SG
N° 086-2023-2024	Solicito información sobre proyectos de inversión paralizados	Ministro de Energía y Minas	04/10/2023 3605488	SIN RESPUESTA	N° 0288-2023-2024	09/01/2024 3640126	RESPUESTA CON FECHA 16 ENERO 2024 - OFICIO N° 054-2024-MINEM/SG
N° 087-2023-2024	Solicito información sobre proyectos de inversión paralizados	Ministro de Salud	04/10/2023 2023-0214822	SIN RESPUESTA	N° 0289-2023-2024	09/01/2024 2024-0004835	RESPUESTA CON FECHA 22 FEBRERO 2024 - OFICIO N° D000544-2024-DM-MINSA
N° 088-2023-2024	Solicito información sobre proyectos de inversión paralizados	Ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento	04/10/2023 00152278-2023	SIN RESPUESTA	N° 0290-2023-2024	09/01/2024 00152278-2024	RESPUESTA CON FECHA 21 FEBRERO 2024 - OFICIO N° 362-2024-VIVIENDA/SG
N° 089-2023-2024	Solicito información sobre proyectos de inversión	Gobernador Regional de Apurímac	04/10/2023 27031	SIN RESPUESTA	N° 0291-2023-2024	10/01/2024	SIN RESPUESTA

	paralizados						
N° 090-2023-2024	Solicito información sobre proyectos de inversión paralizados	Gobernador Regional de Ayacucho	04/10/2023 3804431	RESPUESTA CON FECHA 08 NOVIEMBRE 2023 - OFICIO N° 1067-2023-GRA/GR-GG			
N° 091-2023-2024	Solicito información sobre proyectos de inversión paralizados	Alcalde de la Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión	04/10/2023 15155	SIN RESPUESTA	N° 0292-2023-2024	09/01/2024 342	RESPUESTA CON FECHA 18 ENERO 2024 - OFICIO N° 021-2024-MPSC-GM
N° 092-2023-2024	Solicito información sobre proyectos de inversión paralizados	Ministra de la Producción	04/10/2023 00072204-2023	SIN RESPUESTA	N° 0293-2023-2024	09/01/2024 0001550-2024	RESPUESTA CON FECHA 28 FEBRERO 2024 - OFICIO N° 00000168-2024- PRODUCE/DM
N° 093-2023-2024	Solicito información sobre proyectos de inversión paralizados	Alcalde de la Municipalidad Distrital de Nueva Cajamarca	04/10/2023 04dh183ky	RESPUESTA CON FECHA 16 NOVIEMBRE 2023 - OFICIO N° 0124			
N° 094-2023-2024	Solicito información sobre proyectos de inversión paralizados	Gobernador Regional de Tacna	04/10/2023 20230011267528.	SIN RESPUESTA	N° 0294-2023-2024	09/01/2024 2024-0011006441	RESPUESTA CON FECHA 7 FEBRERO 2024 - OFICIO N° 268-2024- GGR/GOB.REG.TA CNA
N° 095-2023-2024	Solicito información sobre proyectos de inversión paralizados	Ministro de Transportes y Comunicaciones	04/10/2023 S-792301-2023	SIN RESPUESTA	N° 0295-2023-2024	09/01/2024 S-847999-2024	RESPUESTA CON FECHA 9 FEBRERO 2024 - OFICIO N° 268-2024-MTC/04
N° 109-2023-2024	Solicito información sobre proyectos de inversión paralizados	Gobierno Regional Huancavelica	26/10/2023 D1LHXNX38	SIN RESPUESTA	N° 0296-2023-2024	09/01/2024 rd7h4o9w1	RESPUESTA CON FECHA 23 ENERO 2024 - OFICIO N° 010- 2024/GOB.REG.HV CA/GGR/DRYTPLC LP
N° 110-2023-2024	Solicito Información sobre proyectos de Inversión	Gobierno Regional Lambayeque	26/10/2023 4812328	RESPUESTA CON FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2023 - OFICIO N° 001799-2023- GR.LAMB/PEOT-			

	Maralizados			GG			
N° 111-2023-2024	Solicito Información sobre proyectos de inversión paralizados	Gobierno Regional Arequipa	26/10/2023 3948855	RESPUESTA CON FECHA 14 NOVIEMBRE 2023 - OFICIO N° 1791			

CUADRO N° 29 CUADRO DE SEGUIMIENTO DE OFICIOS OBRAS PARALIZADAS AL 30 DE SETIEMBRE 2023
Elaboración: Comisión Especial Multipartidaria del Bicentenario de la Independencia del Perú

Es necesario que se tenga presente el compromiso de la unidades ejecutoras respecto a la atención de nuestros requerimientos de información en relación a las obras paralizadas, se tiene que algunas han atendido al primer requerimiento y otras, luego de nuestra reiteración; quedando pendiente tan solo la información del Gobierno Regional de Apurímac, que hasta la fecha no atiende nuestro Oficio N° 089-2023-2024 (04/10/2023) y el reiterativo Oficio N° 0291-2023-2024 (10/01/2024), desatención que estamos evaluando para adoptar las acciones que ameriten; debiéndose tener presente que esta información nos permite conocer el real estado situacional de los proyectos de inversión y las razones que generaron su paralización y corroborar la información que nos remite el Ministerio de Cultura en su labor de monitoreo y seguimiento de la citada Agenda, cuya información amerita una actualización, para lo cual haremos el requerimiento correspondiente.

Continuando con el seguimiento de las obras paralizadas y tomando en cuenta la información brindada por el Ministerio de Cultura a través del Memorando N° 313-2023-PEB/MC y el Informe N° 000521-2023-OINV/MC, Anexo 02 y Anexo 1- A, respectivamente, información actualizada al 30 de setiembre del 2023, conforme a lo analizado y consignado anteriormente, en la información, se tenía 15 proyectos paralizados; y según la información brindada con posterioridad por dicho sector, mediante Informe N° 004-2024-UAPI-PEB-JPO/MC, actualizada al 14 de febrero del 2024, se nos informa que todavía continúan paralizadas 10 obras, y que del análisis comparativo entre el MEMORANDO N° 000313-2023-PEB/MC (15 obras paralizadas al 30 de setiembre del 2023) y el Informe N° 004-2024-UAPI-PEB-JPO/MC (10 obras paralizadas al 14 de febrero del 2024), nos permite conocer cómo evoluciona el avance, desprendiéndose de dicha información, que 5 obras se han reactivado y levantaron su condición de paralizadas, y que ya se encuentran en ejecución, conforme lo detallamos en el siguiente cuadro elaborado por nuestra comisión.

SECTOR CULTURA (LEVANTARON LA PARALIZACION)						
Unidad Ejecutora	Departamento	CUI	Proyecto de Inversión	Avance Financiero	Avance Físico	Resumen de la Situación Actual
GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO	Ayacucho	2230368	Mejoramiento de la conservación del patrimonio cultural del sitio arqueológico de Wari, Huamanga – Ayacucho	52,2%	51,5%	[09/02/2024] – En elaboración Expediente Tecnico Actualmente se encuentra en proceso de Saneamiento Físico Legal del Terreno, el cual se estima culminar en segundo trimestre 2024. En simultáneo, se viene solicitando, de manera reiterativa al GORE Ayacucho, los documentos que sustenten la liquidación técnico financiera de los años 2014 al 2016 a fin de elaborar el expediente técnico de saldo de obra.
SECTOR PRODUCCION (LEVANTARON LA PARALIZACION)						
Unidad Ejecutora	Departamento	CUI	Proyecto de Inversión	Avance Financiero	Avance Físico	Resumen de la Situación Actual
28169-PROGRAMA NACIONAL DE DIVERSIFICACION PRODUCTIVA	Loreto	2274894	Mejoramiento del servicio de comercialización del Gran Mercado de Belén - Iquitos, provincia de Maynas, departamento de Loreto	75,6%	81%	[05/02/2024] A la fecha de corte 05/02/2024, el proyecto se encuentra en la ejecución del servicio de corte, liquidación parcial de obra y elaboración del expediente técnico de saldo de obra, así como su supervisión.
SECTOR SALUD (LEVANTARON LA PARALIZACION)						
Unidad Ejecutora	Departamento	CUI	Proyecto de Inversión	Avance Financiero	Avance Físico	Resumen de la Situación Actual
PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES-PRONIS	Apurímac	2343407	Mejoramiento y ampliación de los servicios de salud del establecimiento de salud Challhuahuacho, del distrito de Challhuahuacho, Provincia de Cotabambas, Departamento de Apurímac	41.1%	68.8%	[06/02/2024] En ejecución de saldo de obra: El 28/01/2024 se inició el plazo de ejecución de la obra, estando las acciones de supervisión a cargo del Inspector de la Obra hasta la contratación del Supervisor de la Obra.
SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO						
Unidad Ejecutora	Departamento	CUI	Proyecto de Inversión	Avance Financiero	Avance Físico	Resumen de la Situación Actual
MVCS - AGUA SEGURA LIMA Y CALLAO	Lima	2344329	Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado para el esquema San Juan De Amancaes - Distrito Rímac	78.4%	98%	[29/01/2024] Saldo de obra con contrato N° 015-2023/VIVIENDA/VMCS/PASLC firmada el 21.11.2023 con un plazo de ejecución de 465 DC.

MVCS - AGUA SEGURA LIMA Y CALLAO	Lima	2400301	Esquema Carapongo - ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado de los sectores 136 Y 137 Distrito de Lurigancho	96%	96%	[11/01/2024] Hasta la actualidad continua la transferencia parcial de la obra de áreas y/o partidas no observadas mediante documento aprobado "procedimiento de transferencia PASLC Y SEDAPAL", para el cual se está gestionando pequeño presupuesto para el ploteo e impresión de planos y documentación.
----------------------------------	------	---------	--	-----	-----	---

CUADRO N° 30 DETALLE DE LAS OBRAS QUE LEVANTARON SU PARALIZACION AL 14 DE FEBRERO DE 2024

Fuente: Informe N° 004-2024-UAPI-PEB-JPO/MC.

Elaboración: Comisión Especial Multipartidaria del Bicentenario de la Independencia del Perú

Obras que no figuran en el listado de paralizadas al 30 de setiembre del 2023

Pero del análisis y comparación de la información brindada a nuestra comisión, resulta que de las 5 obras que se mencionan como reactivadas, se advierte que 2 de ellas, no figuraban al 30 de setiembre del 2023 en el listado de las 15 obras paralizadas, conforme se detalla en el Anexo 1-A del MEMORANDO N° 000313-2023-PEB/MC, sobre el cual, se solicitara la aclaración correspondiente, en tal sentido tan solo 3 obras se reactivaron y dejaron su condición de paralizadas, resultando importante resaltar la reactivación de estas 3 obras:

- “Mejoramiento de la conservación del patrimonio cultural del sitio arqueológico de Wari, Huamanga – Ayacucho”, con CUI N° 2230368.
- “Mejoramiento del servicio de comercialización del Gran Mercado de Belén - Iquitos, provincia de Maynas, departamento de Loreto”, con CUI N° 2274894.
- “Mejoramiento y ampliación de los servicios de salud del establecimiento de salud Challhuahuacho, del distrito de Challhuahuacho, Provincia de Cotabambas, Departamento de Apurímac”, con CUI N° 2343407.

Las mismas que se encontraban dentro de los 11 proyectos que figuraban como paralizados al 30 de abril del 2023 (Informe N° 000007-2023-UAPI-WAC-PEB/MC) y mantener tal condición al 30 de setiembre del 2023 (informe según MEMORANDO N° 000313-2023-PEB/MC); ahora continúan en esa condición 8 proyectos de inversión, respecto a los cuales, esperamos coadyuvar para que puedan ser reactivadas y culminadas.

Finalmente, luego de haber citado y aclarado respecto a las obras que levantaron su paralización, se tiene que, al 14 de febrero del 2024, continúan paralizadas 12 obras, cuyo resumen por sectores y el detalle de cada proyecto presentamos en los respectivos cuadros elaborados por nuestra comisión.

UNIDAD EJECUTORA	SECTORES							TOTAL PROYECTOS POR UNIDADES EJECUTORAS
	CULTURA	ENERGIA Y MINAS	MIDAGRI	PRODUCCION	SALUD	MTC	VIVIENDA	
MIDAGRI AGRORURAL			4					4
ENERGIA Y MINAS		-						-
SALUD					-			-
VIVIENDA							2	2
GORE AREQUIPA					2			2
GORE APURIMAC								
GORE AYACUCHO	-							-
MP SANCHEZ CARRION							1	1
PRODUCCION				-				-
MD NUEVA CAJAMARCA							-	-
GORE HUANCAVELICA			1					1
GORE LAMBAYEQUE			1					1
GORE TACNA			1					1
MTC						-		-
TOTAL PROYECTOS POR SECTORES	-	-	7	-	2	-	3	12

CUADRO N° 31 RESUMEN DE LAS OBRAS PARALIZADAS AL 14 DE FEBRERO 2024
 Fuente: Informe N° 004-2024-UAPI-PEB-JPO/MC.
 Elaboración: Comisión Especial Multipartidaria del Bicentenario de la Independencia del Perú

Según el referido informe, nuestra revisión y aclaración y el cuadro resumen, respecto a las obras paralizadas, de tener 15 obras paralizados al 30 de setiembre del 2023, luego de reactivarse 3 de ellas, al 14 de febrero del 2024 todavía continúan paralizadas 12 obras, cuyo detalle lo hemos consolidado en el siguiente cuadro elaborado por nuestra comisión:

UNIDAD EJECUTORA	DEPARTAMENTO	CUI	PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO	RESUMEN DE LA SITUACIÓN ACTUAL
UEI DEL PROYECTO ESPECIAL AFIANZAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS DE TACNA	Tacna	2106687	Mejoramiento y ampliación de la provisión de agua para desarrollo agrícola en el valle de Tacna - Vilavilani II - Fase I - Construcción canal Vilachauillani - Calachaca - Chuapalca	4,8%	[22/12/2023] Proyecto de inversión pública Paralizado por conflictos sociales, en proceso de cierre y liquidación.
PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL	Junín	2184535	Instalación de agua para riego de los anexos de Uyo, Lauca, Andamarca, Huata, Antacalla y Andamayo, distrito de Andamarca - Concepción – Junín	94,3%	[17/01/2024] OBRA PARALIZADA, mediante acta de paralización de fecha 31 de diciembre del 2019. En el mes de setiembre del año 2023 se transfirieron recursos a la Unidad Zonal Junín para actualización del expediente de saldo de obra. Con fecha 25/10/2023 mediante orden de servicio se contrata al consultor para la elaboración del informe técnico del estado situacional y valorización de corte técnico-financiero. Actualmente, el consultor presentó el Informe Técnico antes mencionado, el cual, se encuentra en revisión por la Unidad Zonal de Junín.
PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL	Cusco	2141237	Mejoramiento de la irrigación Marcahuasi - Mollepata, provincia de Anta – Cusco	63,4%	[09/01/2024] El presente proyecto se encuentra paralizado, por motivo de resolución de contrato del Contratista de obra.
PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL	Huancavelica	2221352	Instalación del sistema de riego Tutapayocc vista Alegre - Pantekilla, distrito de Surcubamba - Tayacaja - Huancavelica	66,10%	[22/01/2024] OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA. Acciones para la reactivación de la obra: Se cuenta con informe técnico del estado situacional técnico-financiero-legal y la valorización de corte técnico-financiero del proyecto. - El presente proyecto, forma parte del inventario de obras paralizadas en el marco de la LEY 31589. "LEY QUE GARANTIZA LA REACTIVACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS PARALIZADAS". el

					área técnica actualizará los términos de referencia para la contratación del servicio de elaboración del expediente técnico de saldo de obra, para su posterior proceso de convocatoria en el presente año fiscal.
PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL	Huancavelica	2229551	Instalación del servicio de agua del sistema de riego Pumapahuasin – Socaoran – Uchubamba - Ccollpa, distrito de Callanmarca, Angaraes, Huancavelica	31,7%	[23/01/2024] EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA PARALIZADO DESDE EL 21/01/2021. Con fecha 13.12.2023 se da conformidad al servicio denominado Informe TÉCNICO del estado situacional y la VALORIZACIÓN de corte TÉCNICO-financiero del proyecto. Este informe, servirá como insumo para la elaboración de los TDR del expediente de saldo de obra.
REGION HUANCVELICA	Huancavelica	2414831	Creación del sistema del servicio de riego en los distritos de Acobamba, Pomacocha y Caja de la Provincia de Acobamba - Departamento de Huancavelica. (*)	0.00%	Este proyecto se encuentra Suspendido y judicializado se está realizando las actividades para la evaluación en la comunidad de choccapampa para una posible ubicación de la futura represa.
REGION LAMBAYEQUE – PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES	Lambayeque	2262744	Mejoramiento de la infraestructura de conducción y trasvase del canal Huallabamba, Distrito de Motupe, Incahuasi y Kañaris, Provincias de Lambayeque y Ferreñafe - Región Lambayeque. (*)	0%	[12/01/2024] EL PROYECTO YA NO CONTINUA SU EJECUCIÓN POR CONFLICTIVIDAD SOCIAL. SE ADJUNTA DOCUMENTO SUSTENTATORIO
REGION AREQUIPA	Arequipa	2279438	Mejoramiento de los servicios de salud del establecimiento de Salud de Chala, Distrito de Chala, Provincia de Caraveli - Región Arequipa. (*)	87.96%	[10/01/2024] OBRA CON CONTRATO RESUELTO DE EXP. DE SALDO DE OBRA EL 17/07/2023 SEGUN CONTRATO N°041-2021-GRA, CON UN AVANCE DE EJECUCION FISICA DE 87.96%
REGION AREQUIPA	Arequipa	2279710	Mejoramiento de los servicios de salud del hospital Camana distrito y provincia de Camana - Región Arequipa. (*)	72.8%	[09/01/2024] OBRA CON CONTRATO RESUELTO (CONTRATO N° 153-2016-GRA/PR EL DIA 28/06/2023), CON AVANCE DE EJECUCION DE 72.88%.

PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	Piura	2260867	Mejoramiento del sistema de evacuación, tratamiento y disposición final de las aguas servidas de las ciudades de Sullana y Bellavista, Provincia de Sullana - Piura	67%	[15/01/2024] - Con respecto a la programación financiera presentado en el mes de setiembre al MEF ha tenido modificaciones, producto de la nota modificatoria presupuestal realizada. - Se encuentra paralizada debido a que el contrato N°094-2019/VIVIENDA/VMCS/PNSU fue resuelto mediante Carta Notarial N° 051-2023-VIVIENDA/VMCS/PNSU/3.3 de fecha 15 de junio de 2023 por causal de incumplimiento del contratista El 04.12.2023, se efectuó el apercibimiento de la Resolución de contrato al Consorcio Grau por incumplimiento de obligaciones contractuales en la subsanación de observaciones del informe final de obra (planos post construcción en otros) y presentación de la documentación respecto a la valorización de obra N° 44 (valorización negativa). - Se viene elaborando los Términos de Referencia para la elaboración del Expediente Técnico del saldo de obra, el mismo que más adelante conllevará a la contratación del ejecutor del saldo de obra, teniendo previsto su inicio para el cuarto trimestre del 2024.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANCHEZ CARRION	La Libertad	2084708	Mejoramiento y ampliación de sistema de agua potable y alcantarillado de la ciudad de huamachuco - distrito de Huamachuco, Provincia de Sánchez Carrión - La Libertad	38.1%	[21/12/2023] LA OBRA SE ENCUENTRA EN PERITAJE
PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	Apurímac	2286058	Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado sanitario de los barrios urbanos: Patron Santiago, El Salvador, los Álamos, Wichaypampa, Señor de Huanca y San Marcos del Distrito de Challhuahuacho, Provincia de Cotabambas, Departamento de Apurímac	83.8%	[06/02/2024] Con respecto a la programación financiera presentado en el mes de setiembre al MEF ha tenido modificaciones, producto de la nota modificatoria presupuestal realizada. - Expediente Técnico se encuentra con un avance del 99% - Se tiene culminado los diseños del Expediente Técnico de saldo de obra del proyecto Challhuahuacho Etapa II, se requiere la obtención del terreno definitivo de 614 m 2. No se puede sacar la RD de aprobación del E.T. sin tener el saneamiento físico legal del terreno para la estabilización del talud de la PTAR. - A la fecha se encuentra pendiente

					autorización del botadero en la zona de Challhuapuquio, siendo el responsable la Municipalidad Distrital de Challhuahuacho (MDCH). El equipo de estudios viene efectuando la actualización de presupuesto y cotizaciones.
--	--	--	--	--	---

CUADRO N° 32 DETALLE DE LAS OBRAS PARALIZADAS AL 14 DE FEBRERO 2024

Fuente: Informe N° 004-2024-UAPI-PEB-JPO/MC.

Elaboración: Comisión Especial Multipartidaria del Bicentenario de la Independencia del Perú

(*) LA INFORMACION QUE SE TIENE ES AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2023 - MEMORANDO N° 000313-2023-PEB/MC

Continuando con el seguimiento de las obras paralizadas y tomando en cuenta la información brindada por el Ministerio de Cultura a través del Informe N° 004-2024-UAPI-PEB-JPO/MC, información actualizada al 14 de febrero del 2024, conforme a lo analizado y consignado anteriormente, en la información, se tenía 10 proyectos paralizados, pero con nuestra revisión y aclaración, queda claro que son 12 los proyectos que se encuentran paralizados en dicha fecha; y según la información brindada con posterioridad por dicho sector, mediante OFICIO N° 001899-2024-DM/MC, con el cual nos remitieron el documento “Respuesta a la solicitud de información realizada por la Comisión Especial Multipartidaria Conmemorativa del Bicentenario de la Independencia del Perú”, actualizada al 30 de setiembre del 2024, se nos informa que todavía continúan paralizadas 18 obras, y que del análisis comparativo entre el Informe N° 004-2024-UAPI-PEB-JPO/MC (12 obras paralizadas al 14 de febrero del 2024) y el OFICIO N° 001899-2024-DM/MC (18 obras paralizadas al 30 de setiembre del 2024), nos permite conocer cómo evoluciona el avance, desprendiéndose de dicha información, que 1 obra se ha reactivado y levantado su condición de paralizada, y que ya se encuentran en ejecución, conforme lo detallamos en el siguiente cuadro elaborado por nuestra comisión.

SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO (LEVANTARON LA PARALIZACION)						
Unidad Ejecutora	Departamento	CUI	Proyecto de Inversión	Avance Financiero	Avance Físico	Resumen de la Situación Actual
PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	Apurímac	2286058	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS BARRIOS URBANOS: PATRON SANTIAGO, EL	69.9%	84%	El 27.08.2024 mediante la Resolución Directoral N°00014-2024-VIVIENDA/VMCS-PNSU se realizó la inclusión en la lista priorizada de obras públicas paralizadas para el año 2024 conforme a las disposiciones de la ley N°31589.

			SALVADOR, LOS ÁLAMOS, WICHAYPAMPA, SEÑOR DE HUANCA Y SAN MARCOS DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO, PROVINCIA DE COTABAMBAS, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC			.
--	--	--	---	--	--	---

CUADRO N° 33 DETALLE DE LAS OBRAS QUE LEVANTARON SU PARALIZACION AL 30 DE SETIEMBRE DE 2024
Fuente: Informe N° 004-2024-UAPI-PEB-JPO/MC y OFICIO N° 001899-2024-DM/MC.
Elaboración: Comisión Especial Multipartidaria del Bicentenario de la Independencia del Perú

Del análisis de la referida información identificamos que otro proyecto que se encontraba en nuestro listado de obras paralizadas al 14 de febrero del 2024, se ha reactivado y levantado su condición de paralizada, y que ya se encuentran en elaboración del expediente técnico, conforme lo detallamos en el siguiente cuadro elaborado por nuestra comisión

SECTOR AGRARIA (LEVANTARON LA PARALIZACION)						
Unidad Ejecutora	Departamento	CUI	Proyecto de Inversión	Avance Financiero	Avance Físico	Resumen de la Situación Actual
REGION HUANCAMELICA	Huancavelica	2414831	Creación del sistema del servicio de riego en los distritos de Acobamba, Pomacocha y Caja de la Provincia de Acobamba – Departamento de Huancavelica.	0.7%	0.00%	Elaboración de Expediente Técnico.

CUADRO N° 34 DETALLE DE LAS OBRAS QUE LEVANTARON SU PARALIZACION AL 30 DE SETIEMBRE DE 2024
Fuente: Informe N° 004-2024-UAPI-PEB-JPO/MC y OFICIO N° 001899-2024-DM/MC.
Elaboración: Comisión Especial Multipartidaria del Bicentenario de la Independencia del Perú

Tomando en cuenta la obra reactivada según lo informado por el referido sector y el citado análisis comparativo que advierte de otra obra reactivada, se tiene que 10 obras continuaban paralizadas al 30 de setiembre del 2024, a las cuales se agregan 8 nuevas obras que están en dicha condición, las que detallamos a continuación en el cuadro elaborado por nuestra comisión.

SECTOR INTERIOR						
Unidad Ejecutora	Departamento	CUI	Proyecto de Inversión	Avance Financiero	Avance Físico	Resumen de la Situación Actual
INTERIOR Oficina General de Infraestructura	Arequipa	2197523	Ampliación y mejoramiento de la Escuela Técnico Superior PNP – Arequipa	70.7%	63.1%	Cuenta con expediente técnico del saldo de obra aprobado. Se está gestionado la previsión presupuestal con fines de iniciar con el proceso de convocatoria. Al respecto, mediante ACTA el GORE se comprometió a formular en la IOARR de CUI 2173290 (con un Expediente Técnico complementario), que comprenderá la implementación del servicio de agua potable para la Escuela de Arequipa (ubicada en la zona de San José) para agosto 2025.
SECTOR PRODUCCION						
Unidad Ejecutora	Departamento	CUI	Proyecto de Inversión	Avance Financiero	Avance Físico	Resumen de la Situación Actual
PRODUCCIÓN Programa Nacional de Diversificación Productiva	Loreto	2274894	Mejoramiento del servicio de comercialización del Gran Mercado de Belén - Iquitos, provincia de Maynas, departamento de Loreto	76.5%	88%	Se encuentra en proceso de elaboración del servicio especializado "Corte Técnico, Liquidación Parcial de Obra y Elaboración de Expediente de Saldo de Obra del proyecto". Suscripción del Contrato N°043-2023-PRODUCE entre PRODUCE y Consorcio Illary. El contratista se encuentra en proceso de desarrollo del Informe N° 2 de 4 entregables
SECTOR TRANSPORTES						
Unidad Ejecutora	Departamento	CUI	Proyecto de Inversión	Avance Financiero	Avance Físico	Resumen de la Situación Actual
MTC	Ancash – La Libertad	2234988	Carretera Pallasca - Mollepata - Mollebamba - Santiago De Chuco Empalme Ruth No 10 (Ancash/La Libertad)	81.7%	22.4%	Proyecto conformado por 02 tramos, cuya situación es la siguiente: - Mollepata – Pallasca: Se resuelve el contrato de obra mediante RD 963-2022-MTC/20. Reactivación de Obras Públicas Paralizadas – Ley N° 31589 - Con contrato N°01-2024-MTC/20.2 se realiza la contratación del servicio del estudio definitivo para la culminación de obra.
MTC (DIPT)	Puno	2233842	Autopista Puno – Juliaca (**)	81.5%	97.2%	Obra paralizada, depende de acciones de liberación de predios e interferencias y modificaciones al EDI, que deberán ser presentadas por el concesionario. Se viene negociando el acta de acuerdo para la suspensión de la obra. Se tiene estimado reanudar, aprox. en 1 año ya con los predios saneados, libres de interferencias y con las modificaciones al EDI aprobadas.
MTC (DIPT)	Cajamarca		Carretera Longitudinal de la Sierra - Tramo 2: Ciudad de Dios - Cajamarca - Chiple, Cajamarca - Trujillo y Dv. Chilete - Empalme	82.8%	58.2%	-Demora en liberación de interferencias y adquisición de predios - Demora en modificaciones de EDI

			PE 3N. (**)			
MTC (DIPT)	Cajamarca	2173121	Rehabilitación y mejoramiento de la carretera PE-3N longitudinal de la Sierra Norte, Tramo Cochabamba-Cutervo-Santo Domingo de la Capilla-Chiple (**)	83-1%	79.6%	Obra paralizada, depende de acciones de liberación de predios e interferencias.
SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO						
Unidad Ejecutora	Departamento	CUI	Proyecto de Inversión	Avance Financiero	Avance Físico	Resumen de la Situación Actual
MVCS	Lima	2344329	Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado para el esquema San Juan De Amancaes - Distrito Rimac	76.3%	98%	La elaboración E.T. de saldo, tiene un avance del 45% teniendo aprobados el plan de trabajo, el informe N° 01 y N° 02. A la fecha el expediente de prestación de adicional N°02 (por el concepto de pruebas hidráulicas de alcantarillado) se encuentra en evaluación por parte del PASLC, precisar que se tendrá una reunión de coordinación con el consultor y la supervisión el día 05.09.24, con el propósito de definir las pruebas a realizarse. Respecto a la subsanación del informe N°03, se encuentra en revisión por parte de la supervisión, teniendo como fecha límite 05.09.24
MVCS	Lima	2400301	Esquema carapongo - ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado de los sectores 136 Y 137 Distrito De Lurigancho	96%	96%	Obra paralizada con contrato resuelto. Mediante memorando N° D 458-2024-VIVIENDA/VMCS-PASLC-4.2, la unidad de obras remite información respecto al saldo de ET, por lo que los términos de referencia se modificarán bajo la modalidad de concurso – oferta, para la ejecución del saldo de obra, con la finalidad de culminar a la brevedad el proyecto, el mismo que se estima remitir actualizado el 15.12.24.

CUADRO N° 35 NUEVAS OBRAS PARALIZADAS AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2024
Fuente: OFICIO N° 001899-2024-DM/MC. Actualizado al 30 de setiembre del 2024
Elaboración: Comisión Especial Multipartidaria del Bicentenario de la Independencia del Perú

Finalmente, luego de haber citado y aclarado respecto a las obras que levantaron su paralización, se tiene que, al 30 de setiembre del 2024, continúan paralizadas 18 obras, cuyo resumen por sectores y el detalle de cada proyecto presentamos en los respectivos cuadros elaborados por nuestra comisión.

UNIDAD EJECUTORA	INTERIOR	MIDAGRI	PRODUCCION	SALUD	MTC	VIVIENDA	TOTAL PROYECTOS POR UNIDADES EJECUTORAS
MIDAGRI AGRORURAL		4					4
INTERIOR	1			-			1
VIVIENDA						3	3
GORE AREQUIPA				2			2
MP SANCHEZ CARRION						1	1
PRODUCCION			1				1
GORE LAMBAYEQUE		1					1
GORE TACNA		1					1
MTC					4		4
TOTAL PROYECTOS POR SECTORES	-	6	1	2	4	4	18

CUADRO N° 36 RESUMEN DE LAS OBRAS PARALIZADAS AL 30 DE SETIEMBRE 2024

Fuente: OFICIO N° 001899-2024-DM/MC. Actualizado al 30 de setiembre del 2024

Elaboración: Comisión Especial Multipartidaria del Bicentenario de la Independencia del Perú

Según el referido informe, nuestra revisión y aclaración y el cuadro resumen, respecto a las obras paralizadas, de tener 12 obras paralizados al 14 de febrero del 2024, luego de reactivarse 2 de ellas, al 30 de setiembre del 2024 se ha incrementado el número de obras paralizadas, continuando en dicha condición 18 obras, cuyo detalle lo hemos consolidado en el siguiente cuadro elaborado por nuestra comisión:



UNIDAD EJECUTORA	DEPARTAMENTO	CUI	PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	RESUMEN DE LA SITUACIÓN ACTUAL
UEI DEL PROYECTO ESPECIAL AFIANZAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS DE TACNA	Tacna	2106687	Mejoramiento y ampliación de la provisión de agua para desarrollo agrícola en el valle de Tacna - Vilavilani II - Fase I - Construcción canal Vilachaullani - Calachaca - Chuapalca. (*)	31.9%	1.8 %	Conflictos sociales GORE continua con acciones administrativas para definir el estado de avance de los componentes del proyecto.
PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL	Junín	2184535	Instalación de agua para riego de los anexos de Uyo, Lauca, Andamarca, Huata, Antacalla y Andamayo, distrito de Andamarca - Concepción – Junín.	87.7%	82.5%	En elaboración de expediente técnico de saldo de obra Actualización del expediente técnico de saldo de obra a cargo de la unidad zonal Junín
PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL	Cusco	2141237	Mejoramiento de la irrigación Marcahuasi - Mollepata, provincia de Anta – Cusco	54.2%	43.9%	Con fecha 27/06/2024, mediante Resolución Jefatural N°77-2024-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL DE/UIR, se aprueba el expediente técnico de saldo de obra. En actos preparatorios para la contratación directa de ejecución de obra. Se ha solicitado recursos con cargo al Fondo Sierra Azul, mediante el OFICIO N°1397-2024- MIDAGRI DVDAFIR-AGRO RURAL-DE
PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL	Huancavelica	2221352	Instalación del sistema de riego Tutapayoc vista Alegre - Pantekilla, distrito de Surcubamba - Tayacaja - Huancavelica.	91%	66,1%	Demora en la adjudicación de buena pro de la contratación del servicio de consultoría para elaborar el expediente de saldo de obra. Se incorporó recursos para la convocatoria de la consultoría de obra para la elaboración y supervisión del expediente técnico de saldo de obra, por lo que se dieron inicio los actos administrativos para las respectivas contrataciones.
PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL	Huancavelica	2229551	Instalación del servicio de agua del sistema de riego Pumapahuasin – Socaoran – Uchubamba - Ccollpa, distrito de	51.27%	31,7%	Demora en la adjudicación de buena pro de la contratación del servicio de consultoría para elaborar el expediente de saldo de obra, demora en la aprobación de recursos presupuestales para ejecución física, lo que retrasaría la ejecución de la obra.





			Callanmarca, Angaraes, Huancavelica			Se cuenta con los Tdr para la contratación de los servicios de consultoría de elaboración y supervisión del expediente técnico de saldo de obra. Se solicitará la incorporación no prevista para lanzar el proceso de selección de los servicios antes mencionados.
REGION LAMBAYEQUE - PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES	Lambayeque	2262744	Mejoramiento de la infraestructura de conducción y trasvase del canal Huallabamba, Distrito de Motupe, Incahuasi y Kañaris, Provincias de Lambayeque y Ferreñafe - Región Lambayeque. (*)	6.6%	0%	El proyecto ya no continuó su ejecución por conflictividad social. Se adjunta documento sustentatorio
REGION AREQUIPA	Arequipa	2279438	Mejoramiento de los servicios de salud del establecimiento de Salud de Chala, Distrito de Chala, Provincia de Caraveli - Región Arequipa.	85.6%	18.8%	Demoras en la culminación del expediente técnico de saldo de obra
REGION AREQUIPA	Arequipa	2279710	Mejoramiento de los servicios de salud del hospital Camana distrito y provincia de Camana - Región Arequipa. (*)	74.8%	72.9%	El 28/06/2024 se dio inicio a la elaboración del expediente técnico de saldo de obra, tiene un plazo de 155 D.C, se está a la espera del primer entregable por parte del consultor encarado de la elaboración del expediente de saldo de obra, el mismo que está programado para ser entregado a los 60 DC. El proyecto presenta arbitraje en proceso, de acuerdo al cronograma de actividades la culminación de la obra será el año 2027, por controversias que pudiesen presentarse.
PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	Piura	2260867	Mejoramiento del sistema de evacuación, tratamiento y disposición final de las aguas servidas de las ciudades de Sullana y Bellavista, Provincia de Sullana - Piura	67.8%	67%	1. Se han realizado las modificaciones a los Términos de Referencia en atención al Informe de Hito de Control N° 451-2024-OCI/5303-SCC, por cuanto existen incongruencias que afectan la continuidad del proceso de contratación. 2. Con fecha 27 de agosto se remitió los nuevos TDR a la Unidad de Administración para la contratación correspondiente. 3. Actualmente, se viene realizando estudio de mercado por la Subunidad de Abastecimiento.





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANCHEZ CARRION	La Libertad	2084708	Mejoramiento y ampliación de sistema de agua potable y alcantarillado de la ciudad de huamachuco - distrito de Huamachuco, Provincia de Sánchez Carrión - La Libertad	38.1%	16%	La municipalidad de Sánchez Carrión actualmente viene coordinando con el Ministerio de Vivienda para la evaluación de los TDR.
INTERIOR	Arequipa	2197523	Ampliación y mejoramiento de la Escuela Tecnico Superior PNP – Arequipa	70.7%	63.1%	Cuenta con expediente técnico del saldo de obra aprobado. Se está gestionado la previsión presupuestal con fines de iniciar con el proceso de convocatoria. Al respecto, mediante ACTA el GORE se comprometió a formular en la IOARR de CUI 2173290 (con un Expediente Técnico complementario), que comprenderá la implementación del servicio de agua potable para la Escuela de Arequipa (ubicada en la zona de San José) para agosto 2025.
PRODUCCIÓN	Loreto	2274894	Mejoramiento del servicio de comercialización del Gran Mercado de Belén - Iquitos, provincia de Maynas, departamento de Loreto	76.5%	88%	Se encuentra en proceso de elaboración del servicio especializado "Corte Técnico, Liquidación Parcial de Obra y Elaboración de Expediente de Saldo de Obra del proyecto". Suscripción del Contrato N°043-2023- PRODUCE entre PRODUCE y Consorcio Illary. El contratista se encuentra en proceso de desarrollo del Informe n° 2 de 4 entregables
MTC	Ancash – La Libertad	2234988	Carretera Pallasca - Mollepata - Mollebamba - Santiago De Chuco Empalme Ruth No 10 (Ancash/La Libertad)	81.7%	22.4%	Proyecto conformado por 02 tramos, cuya situación es la siguiente: - Mollepata – Pallasca: Se resuelve el contrato de obra mediante RD 963-2022-MTC/20. Reactivación de Obras Públicas Paralizadas – Ley N° 31589 - Con contrato N°01-2024-MTC/20.2 se realiza la contratación del servicio del estudio definitivo para la culminación de obra.
MVCS	Lima	2344329	Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado para el esquema San Juan De Amancaes - Distrito Rímac	76.3%	98%	La elaboración E.T. de saldo, tiene un avance del 45% teniendo aprobados el plan de trabajo, el informe N° 01 y N° 02. A la fecha el expediente de prestación de adicional N°02 (por el concepto de pruebas hidráulicas de alcantarillado) se encuentra en evaluación por parte del PASLC, precisar que se tendrá una reunión de coordinación con el consultor y la supervisión el día 05.09.24, con el propósito de definir las pruebas a realizarse. Respecto a la subsanación del informe





						Nº03, se encuentra en revisión por parte de la supervisión, teniendo como fecha límite 05.09.24
MVCS	Lima	2400301	Esquema carapongo - ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado de los sectores 136 Y 137 Distrito De Lurigancho	96%	96%	Obra paralizada con contrato resuelto. Mediante memorando N° D 458-2024- VIVIENDA/VMCS-PASLC-4.2, la unidad de obras remite información respecto al saldo de ET, por lo que los términos de referencia se modificarán bajo la modalidad de concurso – oferta, para la ejecución del saldo de obra, con la finalidad de culminar a la brevedad el proyecto, el mismo que se estima remitir actualizado el 15.12.24.
MTC (DIPT)	Puno	2233842	Autopista Puno – Juliaca (**)	81.5%	97.2%	Obra paralizada, depende de acciones de liberación de predios e interferencias y modificaciones al EDI, que deberán ser presentadas por el concesionario. Se viene negociando el acta de acuerdo para la suspensión de la obra. Se tiene estimado reanudar, aprox. en 1 año ya con los predios saneados, libres de interferencias y con las modificaciones al EDI aprobadas.
MTC (DIPT)	Cajamarca		Carretera Longitudinal de la Sierra - Tramo 2: Ciudad de Dios - Cajamarca - Chiple, Cajamarca - Trujillo y Dv. Chilete - Empalme PE 3N. (**)	82.8%	58.2%	-Demora en liberación de interferencias y adquisición de predios - Demora en modificaciones de EDI
MTC (DIPT)	Cajamarca	2173121	Rehabilitación y mejoramiento de la carretera PE-3N longitudinal de la Sierra Norte, Tramo Cochabamba-Cutervo-Santo Domingo de la Capilla-Chiple (**)	83-1%	79.6%	Obra paralizada, depende de acciones de liberación de predios e interferencias.

CUADRO N° 37 DETALLE DE LAS OBRAS PARALIZADAS AL 30 DE setiembre 2024

Fuente: OFICIO N° 001899-2024-DM/MC. Actualizado al 30 de setiembre del 2024

Elaboración: Comisión Especial Multipartidaria del Bicentenario de la Independencia del Perú

(*) obras que no continúan por conflictos sociales.

(**) obras paralizadas por la modalidad de APP y concesiones.



SEGUIMIENTO ESPECIAL Y ESPECÍFICO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN POR DEPARTAMENTO

Tomando en cuenta que en la Agenda de Conmemoración del Bicentenario de la Independencia del Perú, cuya segunda actualización fuera aprobada por el Decreto Supremo N° 011-2021-MC, se consideran proyectos de inversión en todos los departamentos del país, incluido la provincia constitucional del Callao, es que nuestra comisión considero pertinente hacer el seguimiento también por cada departamento, es así que, al conmemorarse en el año 2024 el Bicentenario de las Batallas de Junín y Ayacucho, respectivamente; y existiendo en los departamentos de Junín y Ayacucho proyectos de inversión que forman parte de la Agenda de Conmemoración del Bicentenario de la Independencia del Perú; nuestra comisión priorizó incidir en el seguimiento del estado situacional de los proyectos de inversión y los proyectos en otras modalidades de inversión en los citados departamentos.

➤ PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN

En ese sentido, en el primer trimestre del 2024 se intensificó el seguimiento de los proyectos que corresponde al departamento de Junín, partiendo del análisis comparativo de la información brindada por el Ministerio de Cultura hasta ese entonces, contenido en el Informe N° 000007-2023-UAPI-WAC-PEB/MC (estado situacional de la obras actualizado hasta el 30 de abril del 2023) y MEMORANDO N° 000313-2023-PEB/MC (estado situacional de la obras actualizado hasta el 30 de setiembre del 2023), identificándose la existencia de 12 proyectos que corresponden al departamento de Junín y 6 proyectos multidepartamentales que incluye al citado departamento, conforme al cuadro comparativo del avance de ejecución de los proyectos de inversión y otras modalidades en el departamento de Junín, comparación del avance físico y financiero y el estado situacional, en este caso al 30 de setiembre del 2023, que nuestra comisión ha elaborado conforme al siguiente detalle:



COMPARATIVO AVANCE DE EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION DEPARTAMENTO DE JUNIN

PROYECTO DE INVERSION CUI	UNIDAD EJECUTORA	COSTO Actualizado	Informe N° 000007-2023- UAPI-WAC-PEB/MC AL 30 DE ABRIL 2023		Memorando N° 000313-2023- PEB/MC AL 30 DE SETIEMBRE 2023		ESTADO
			Avance Financiero	Avance Físico	Avance Financiero	Avance Físico	
Reparación de edificación y obras exteriores; construcción de baño o servicios sanitarios; adquisición de grupo electrógeno y museografía; en el(la) monumento a los vencedores de Junín, ubicado en la pampa de chacamarca, casa hacienda san francisco de chichausiri, distrito de Junín, provincia Junín, departamento Junín CUI 2456690	UNIDAD EJECUTORA 008: MC-PROYECTOS ESPECIALES	4,584,919	13,8%	0%	13.9%	0.0%	[29/09/23] En proceso de Licitación, en dos meses se tendrá la buena pro.
Creación de servicios culturales a través del parque cultural bicentenario en Junín, distrito de Huancayo - provincia de Huancayo - departamento de Junín CUI 2499924	UNIDAD EJECUTORA 008: MC-PROYECTOS ESPECIALES	18,028,653	8,9%	0%	8.9%	0.0%	[30/09/2023] - en tercer entregable del Expediente técnico.
Mejoramiento y ampliación del servicio de agua para el sistema de riego en los distritos de Pancán, San Pedro de Chunán y Yauli de la provincia de Jauja, región Junín CUI 2317700	MIDAGRI - AGRO RURAL	15,486,468	1,9%	0%	1.9%	0.00%	[14/03/2022] Expediente Técnico en elaboración, el entregable 04 OBSERVADO.





Mejoramiento de los servicios de investigación y transferencia tecnológica agraria en la estación experimental agraria Pichanaki en la localidad de Pichanaki del distrito de Pichanaqui, provincia de Chanchamayo, departamento de Junín. CUI 2472700	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y MONITOREO EN LAS ESTACIONES EXPERIMENTALES AGRARIAS	29,535,448	0,6%	0%	0.6%	0.00%	[25/09/2023] Se aprobó el expediente técnico, no se realizará ejecución física en el presente año.
Mejoramiento y creación de los servicios turísticos públicos en el santuario señor de Muruhuay, distrito de Acobamba - provincia de Tarma - región Junín CUI 2300618	MINCETUR - PLAN COPESCO	20,621,950	54,3%	45,9%	58.6%	50.9%	[06/09/2023] El expediente técnico del componente museográfico se encuentra culminado, se vienen elaborando los TDR para la ejecución del servicio, Respecto a las Vías y Señalización Turística Se viene realizando las coordinaciones pertinentes
Mejoramiento de los servicios de educación superior tecnológica del IESTP Santiago Antúnez de Mayolo, del distrito y provincia de Huancayo CUI 2234830	UE N° 118: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN BÁSICA Y SUPERIOR	130,586,154	29,3%	1,5%	38.3%	12.4%	[14/09/2023] el proyecto se encuentra en ejecución física.
Mejoramiento de la prestación del servicio educativo del nivel inicial, primaria y secundaria de la institución educativa 9 de julio ubicado en el distrito de Concepción - provincia de Concepción - departamento de Junín CUI 2488994	UEI 125: PROYECTO ESPECIAL DE INVERSIÓN PÚBLICA ESCUELAS BICENTENARIO	85,085,242	5,9%	0%	8.3%	0.0%	[14/09/2023] En aprobación del Entregable 03 del Diseño de Escuela Permanente (incluye precio objetivo)
Mejoramiento del servicio de educación inicial, primaria y secundaria de la I.E. seis de agosto en el distrito de Junín - provincia de Junín - departamento de Junín CUI 2482810	UEI 125: PROYECTO ESPECIAL DE INVERSIÓN PÚBLICA ESCUELAS BICENTENARIO	113,098,681	7,2%	0%	11.1%	0.0%	[14/09/2023] En aprobación del Entregable 03 del Diseño de Escuela Permanente (incluye precio objetivo)
Mejoramiento de la prestación de servicios educativos del nivel inicial, primaria y secundaria de	UEI 125: PROYECTO ESPECIAL DE	109,334,969	5,6%	0%	10.8%	0.0%	[14/09/2023]





la institución educativa 19 de abril ubicado en el distrito de Chupaca - provincia de Chupaca - departamento de Junín CUI 2489023	INVERSIÓN PÚBLICA ESCUELAS BICENTENARIO						En aprobación del Entregable 03 del Diseño de Escuela Permanente (incluye precio objetivo)
Creación servicios tecnológicos en la cadena productiva del sector cuero y calzado anexo de san roque de malayo del distrito de Saño - provincia de Huancayo - departamento de Junín CUI 2267894	DIRECCION DE OPERACIONES PRODUCCION	20,147,415	42,4%	39,6%	47.3%	39.6%	[08/09/2023]: Componente de infraestructura cuenta con un avance físico del 78.62% al 01 de setiembre de 2023. La ejecución de la obra durante los meses de julio y agosto del presente año presentó un avance del 0.00 % debido a que la obra se encuentra paralizada.
Instalación de banda ancha para la conectividad integral y desarrollo social de la región Junín(+) CUI 2263639	Dirección de Ingeniería y Operaciones - PRONATEL	329,167,185	72,9%	60%	78.9%	60%	[06/09/2023] (Culminación al 100% de la obra civil e instalación de cámaras y sensores). Por otro lado, se proyecta el inicio de operación para el trimestre IV del presente año.
Instalación de agua para riego de los anexos de Uyo, Lauca, Andamarca, Huata, Antacalla y Andamayo, distrito de Andamarca - Concepción – Junín CUI 2184535	PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL	8,635,522	95,3%	94,3%	95,3%	94,3%	01/08/2023] Actualmente la obra se encuentra paralizada, mediante Acta de paralización de fecha 31 de diciembre del 2019.





PROYECTOS MULTIDEPARTAMENTALES

PROYECTO DE INVERSION CUI	UNIDAD EJECUTORA	COSTO Actualizado	Informe N° 000007-2023- UAPI-WAC-PEB/MC AL 30 DE ABRIL 2023		Memorando N° 000313-2023- PEB/MC AL 30 DE SETIEMBRE 2023		DIFERENCIA/ OBSERVACION
			Avance Financiero	Avance Físico	Avance Financiero	Avance Físico	
Mejoramiento y ampliación de los Servicios públicos para el desarrollo productivo local en el ámbito de la sierra y selva del Perú” - Avanzar Rural CUI 2471146	MIDAGRI AGRORURAL	241,237,802	50.3%	44.9%	63.5%	58.6%	11/09/2023 En ejecución al 60.57% sin problemas en la ejecución
Mejoramiento de la disponibilidad, acceso y uso de semillas de calidad de: papa, maíz amiláceo, leguminosas de grano y cereales, en las regiones de Junín, Ayacucho, Cusco y Puno. 4 departamentos CUI 2361771	MIDAGRI - INIA	116,453,930	20.6%	19.8%	26.6%	24.3%	04/09/2023 El proyecto de inversión tiene como presupuesto 2023, para el desarrollo de sus actividades en los 04 componentes: producción de semillas, generación de cultivares regionales de especies altoandinas; infraestructura para producción entre otros.
Mejoramiento del servicio de control de disturbios civiles a Nivel Nacional CUI 2251056	MINISTERIO DEL INTERIOR - OGA	611,875,956	14.3%	16.4%	14.4%	16.4%	30/05/2023 Minibuses: Contrato N° 075-2019-IN-OGAF (22/11/2019) Cancelación De Contrato 18 Unid y Adicional 04 Unid de un total de 63 unidades
Creación de un sistema de mensajería de alerta temprana a nivel nacional CUI 2381444	MTC - AG	31,653,237	82.8%	82.5%	99.7%	82.5%	06/09/2023 A través de Oficio N° 1069-2023-MTC/27, el MTC al INDECI, reitera suscripción de convenios para uso de infraestructura y utilización de equipos dada la inminente puesta en funcionamiento del proyecto “Creación de un Sistema de Mensajería de Alerta





							Temprana a nivel Nacional (SISMATE)
Creación de la carretera central Huaycan – cieneguilla Santiago de Tuna - San Andres de Tupicocha - San Damian Yuracmayo - Yauli Pachachaca - EMP. PE-22 distrito de Santa Rosa de Sacco - provincia de Yauli - departamento de Junín CUI 2436163	MTC- PRO VIAS NACIONAL (G2G)	11,959,416,075	0.6%	0.0%	1.1%	0.0%	13/09/2023 Nueva carretera central Daniel Alcides Carrión Modalidad de Contrato Gobierno a Gobierno. PMO: Project Manager Office: Consortio EGIS-SETEC de Francia. Contrato (27-May-21) por EUR 61.5 millones Plazo, Inicio: 28-May-21 / Fin estimado: Jun-31
Masificación de Gas Natural - distribución de gas natural por red de ductos en las regiones de Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Junín, Cusco, Puno y Ucayali S/CUI	MEM (APP)	200,000,000	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	Proyecto que cambio de modalidad de ejecución, el cual se encuentra en su etapa de priorización

CUADRO N° 38 COMPARATIVO AVANCE DE EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION DEPARTAMENTO DE JUNIN

Fuente: Informe N° 000007-2023-UAPI-WAC-PEB/MC y MEMORANDO N° 000313-2023-PEB/MC.

Elaboración: Comisión Especial Multipartidaria del Bicentenario de la Independencia del Perú



En el cuadro 38, se hace un comparativo del avance de la ejecución de los proyectos de inversión en el departamento de Junín, tomando en cuenta la información brindada por el Ministerio de Cultura y con la finalidad de corroborar dicha información y tenerla actualizada, en su oportunidad se solicitó información a las respectivas unidades ejecutoras a cargo de los proyectos de inversión que corresponde a dicho departamento y también a los que tienen a cargo proyectos multidepartamentales que también incluyen al departamento de Junín, relación de oficios que de manera consolidada presentamos en el siguiente cuadro:

N°	OFICIOS	FECHA	ENTIDAD	ASUNTO
1	N° 310-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	09/02/2024	Ministra de Desarrollo Agrario y Riego	Solicitud de Información, sobre proyectos de inversión del departamento de Junín
2	N° 311-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	09/02/2024	Ministro de Comercio Exterior y Turismo	Solicitud de Información, sobre proyectos de inversión del departamento de Junín
3	N° 312-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	09/02/2024	Ministro de Educación	Solicitud de Información, sobre proyectos de inversión del departamento de Junín
4	N° 313-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	09/02/2024	Ministra de Producción	Solicitud de Información, sobre proyectos de inversión del departamento de Junín
5	N° 314-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	09/02/2024	Ministro de Transportes y Comunicaciones	Solicitud de Información, sobre proyectos de inversión del departamento de Junín
6	N° 315-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	09/02/2024	Ministro del Interior	Solicitud de Información, sobre proyectos de inversión del departamento de Junín
7	N° 316-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	09/02/2024	Ministro de Energía y Minas	Solicitud de Información, sobre proyectos de inversión del departamento de Junín

CUADRO N° 39 DETALLE DE OFICIOS REQUIRIENDO INFORMACION A LAS UNIDADES EJECUTORAS DE PROYECTOS DE INVERSION EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN

Fuente: Informe N° 000007-2023-UAPI-WAC-PEB/MC y MEMORANDO N° 000313-2023-PEB/MC.

Elaboración: Comisión Especial Multipartidaria del Bicentenario de la Independencia del Perú

Luego del requerimiento de información y continuando con el análisis y seguimiento de los proyectos que corresponden al departamento de Junín, incluido los proyectos multidepartamentales y tomando en cuenta el avance de la información recepcionada en el primer trimestre del año 2024, realizamos un análisis comparativo entre la información del Ministerio de Cultura (Memorando N° 000313-2023-PEB/MC, actualizada al 30 de setiembre del 2023) y la información brindada por cada Unidad Ejecutora, conforme al cuadro que se presenta:

SEGUIMIENTO INFORMACION DE LAS UNIDADES EJECUTORAS

PROYECTO DE INVERSION CUI	UNIDAD EJECUTORA	COSTO Actualizado	INFORMACION PEB Memorando N° 000313-2023- PEB/MC AL 30 DE SETIEMBRE 2023		INFORMACION UNIDAD EJECUTORA		ESTADO SITUACIONAL
			Avance Financiero	Avance Físico	Requerimiento	Respuesta	
Reparación de edificación y obras exteriores; construcción de baño o servicios sanitarios; adquisición de grupo electrógeno y museografía; en el(la) monumento a los vencedores de Junín, ubicado en la pampa de chacamarca, casa hacienda san francisco de chichausiri, distrito de Junín, provincia Junín, departamento Junín CUI 2456690	UNIDAD EJECUTORA 008: MC-PROYECTOS ESPECIALES	4,584,919	13,8%	0%	OFICIO N° 308- 2023-2024-LVOM- CEMBI/CR 01/02/2024	SIN RESPUESTA	
Creación de servicios culturales a través del parque cultural bicentenario en Junín, distrito de Huancayo - provincia de Huancayo - departamento de Junín CUI 2499924	UNIDAD EJECUTORA 008: MC-PROYECTOS ESPECIALES	18,028,653	8,9%	0%	OFICIO N° 308- 2023-2024-LVOM- CEMBI/CR 01/02/2024	SIN RESPUESTA	
Mejoramiento y ampliación del servicio de agua para el sistema de riego en los distritos de Pancán, San Pedro de Chunán y Yauli de la provincia de Jauja, región Junín CUI 2317700	MIDAGRI - AGRO RURAL	15,486,468	1,9%	0%	OFICIO N° 0310- 2023-2024-LVOM- CEMBI/CR 08/02/2024	OFICIO N° 0757- 2024-MIDAGRI- SG 29/02/2024	Con Memorándum N°019-2024-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UIR de fecha 09-01-2024, concluye que corresponde regularizar la resolución del Contrato N° 67-2018-MINAGRI-AGRO RURAL por haber incurrido en penalidad máxima por mora al acumular más del 10 % del monto del contrato, remitido a la UA por tercera vez.



Mejoramiento de los servicios de investigación y transferencia tecnológica agraria en la estación experimental agraria Pichanaki en la localidad de Pichanaki del distrito de Pichanaqui, provincia de Chanchamayo, departamento de Junín. CUI 2472700	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y MONITOREO EN LAS ESTACIONES EXPERIMENTALES AGRARIAS	29,535,448	0,6%	0%	OFICIO N° 0310-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR 08/02/2024	OFICIO N° 0757-2024-MIDAGRI-SG 29/02/2024	Tiene Expediente Técnico aprobado, con un devengado acumulado de 173,307.27. Cuenta con programación en el PMI para los años 2026 y 2027, con montos de S/ 14,206,381 y S/ 15,155,759, respectivamente
Mejoramiento y creación de los servicios turísticos públicos en el santuario señor de Muruhuay, distrito de Acobamba - provincia de Tarma - región Junín CUI 2300618	MINCETUR - PLAN COPESCO	20,621,950	58.6%	50.9%	OFICIO N° 0311-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR 08/02/2024	SIN RESPUESTA	
Mejoramiento de los servicios de educación superior tecnológica del IESTP Santiago Antúnez de Mayolo, del distrito y provincia de Huancayo CUI 2234830	UE N° 118: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN BÁSICA Y SUPERIOR	130,586,154	38.3%	12.4%	OFICIO N° 0312-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR 08/02/2024	OFICIO N° 00127-2024-MINEDU/VMGI/P EIP-EB/DIEJE 19/02/2024	Avance Ejecutado Acumulado al 31.12.2023 de 28.67% EQUIPAMIENTO En proceso de convocatoria - programado para el 2024 - 2025 CAPACITACION Etapa de aprobación del informe de consistencia seguido a esto la etapa de contratación - programado para el 2024
Mejoramiento de la prestación del servicio educativo del nivel inicial, primaria y secundaria de la institución educativa 9 de julio ubicado en el distrito de Concepción - provincia de Concepción - departamento de Junín CUI 2488994	UEI 125: PROYECTO ESPECIAL DE INVERSIÓN PÚBLICA ESCUELAS BICENTENARIO	85,085,242	8.3%	0.0%	OFICIO N° 0312-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR 08/02/2024	OFICIO N° 00127-2024-MINEDU/VMGI/P EIP-EB/DIEJE 19/02/2024	Entregable de diseño 3 – I.E. 9 de Julio Como parte de la subsanación de observaciones de la presentación 3, el contratista EB Consorcio Gestor ha presentado al PEIP un total de 981 documentos, los cuales se encuentran en proceso de revisión por parte de los especialistas del Paquete 6 del PEIPEB. En tal sentido, se tiene programado en los próximos meses la aceptación del diseño (presentación 3, presentación 4) de la escuela permanente de la I.E. 9 de Julio.





Mejoramiento del servicio de educación inicial, primaria y secundaria de la I.E. seis de agosto en el distrito de Junín - provincia de Junín - departamento de Junín CUI 2482810	UEI 125: PROYECTO ESPECIAL DE INVERSIÓN PÚBLICA ESCUELAS BICENTENARIO	113,098,681	11.1%	0.0%	OFICIO N° 0312-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR 08/02/2024	OFICIO N° 00127-2024-MINEDU/VMGI/P EIP-EB/DIEJE 19/02/2024	Entregable de diseño 3 – I.E. Seis de Agosto Como parte de la subsanación de observaciones de la presentación 3, el contratista EB Consorcio Gestor ha presentado al PEIP un total de 588 documentos, los cuales se encuentran en proceso de revisión por parte de los especialistas del Paquete 6 del PEIPEB. En este contexto, se tiene programado en los próximos meses la aceptación del diseño (presentación 3, presentación 4) de la escuela permanente de la I.E. Seis de Agosto
Mejoramiento de la prestación de servicios educativos del nivel inicial, primaria y secundaria de la institución educativa 19 de abril ubicado en el distrito de Chupaca - provincia de Chupaca - departamento de Junín CUI 2489023	UEI 125: PROYECTO ESPECIAL DE INVERSIÓN PÚBLICA ESCUELAS BICENTENARIO	109,334,969	10.8%	0.0%	OFICIO N° 0312-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR 08/02/2024	OFICIO N° 00127-2024-MINEDU/VMGI/P EIP-EB/DIEJE 19/02/2024	Entregable de diseño 3 – I.E. 19 de Abril Como parte de la subsanación de observaciones de la presentación 3, el contratista EB Consorcio Gestor ha presentado al PEIP un total de 717 documentos, los cuales se encuentran en proceso de revisión por parte de los especialistas del Paquete 6 del PEIPEB. En ese sentido, se tiene programado en los próximos meses la aceptación del diseño (presentación 3, presentación 4) de la escuela permanente de la I.E. 19 de Abril.
Creación servicios tecnológicos en la cadena productiva del sector cuero y calzado anexo de san roque de malayo del distrito de Saño - provincia de Huancayo - departamento de Junín CUI 2267894	DIRECCION DE OPERACIONES PRODUCCION	20,147,415	47.3%	39.6%	OFICIO N° 0313-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR 08/02/2024	SIN RESPUESTA	
Instalación de banda ancha para la conectividad integral y desarrollo social de la región Junín(+)	Dirección de Ingeniería y Operaciones -	329,167,185	78.9%	60%	OFICIO N° 0314-2023-2024-LVOM-	SIN RESPUESTA	





CUI 2263639	PRONATEL				CEMBI/CR 08/02/2024		
Instalación de agua para riego de los anexos de Uyo, Lauca, Andamarca, Huata, Antacalla y Andamayo, distrito de Andamarca - Concepción – Junín	PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL	8,635,522	95,3%	94,3%	OFICIO N° 0310- 2023-2024-LVOM- CEMBI/CR 08/02/2024	OFICIO N° 0757- 2024-MIDAGRI- SG 29/02/2024	obra se encuentra paralizada, DEVENGADO EJECUTADO POR LA MUNICIPALIDAD DE ANDAMARCA EL PRESENTE AÑO SE HA CONSIDERADO DENTRO DEL INFORME DE LAS OBRAS PARALIZADAS ANTE FONDO SIERRA AZUL, PARA PODER SER REACTIVADA, así mismo el 2023 se asignó presupuesto para la elaboración del expediente de saldo de obra
CUI 2184535							

CUADRO N° 40 SEGUIMIENTO DE LA INFORMACION UNIDADES EJCUTORAS DE LOS PROYECTOS DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN

Fuente: MEMORANDO N° 000313-2023-PEB/MC y Oficios de respuesta de las entidades

Elaboración: Comisión Especial Multipartidaria del Bicentenario de la Independencia del Perú



Continuando con el seguimiento de los proyectos de inversión del departamento de Junín que forman parte de la Agenda del Bicentenario y recepcionada la información requerida por nuestra comisión mediante el Oficio N° 308-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR (01/02/2024) y reiterado con Oficio N° 340-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR (01/02/2024), en cuyos oficios en el punto 7 requerimos información sobre los proyectos de inversión que corresponden al departamento de Junín y proyectos de inversión multidepartamental que comprenden a dicho departamento, y que fuera atendida con fecha 6 de mayo del 2024 por el referido Sector, mediante OFICIO N° 000422-2024-DM/MC, adjunto al cual se nos remitió el INFORME N° 000092-2024-OINV/MC elaborado por la Oficina de Inversiones de la Unidad Ejecutora 008: MC Proyectos Especiales y el Informe N° 004-2024-UAPI-PEB-JPO/MC, elaborado por el Proyecto Especial Bicentenario, brindándonos información actualizada al 14 de febrero del 2024, que consolidamos en un cuadro comparativo de los avances de la ejecución de los proyectos de inversión del departamento de Junín, que presentamos a continuación (CUADRO N° 41).

Asimismo, si bien es cierto la última información brindada por el Ministerio de Cultura nos llegó el 6 de mayo del 2024, cuya actualización es al 14 de febrero del 2024 y al existir información brindada por cada Unidad Ejecutora cuya fecha es cercana o posterior a la fecha de actualización de la información del Ministerio de Cultura, por ello, también presentamos un cuadro de seguimiento de la información de las unidades ejecutoras comparando con la información brindada por el citado sector encargado del monitoreo y seguimiento de la Agenda del Bicentenario, cuadro que también presentamos a continuación (CUADRO N° 42).

COMPARATIVO AVANCE DE EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION DEPARTAMENTO DE JUNIN

PROYECTO DE INVERSION CUI	UNIDAD EJECUTORA	COSTO Actualizado	Memorando N° 000313-2023- PEB/MC AL 30 DE SETIEMBRE 2023		INFORME N° 000092-2024- OINV/MC Informe N° 004-2024-UAPI-PEB- JPO/MC AL 14 DE FEBRERO 2024		DIFERENCIA/ OBSERVACION
			Avance Financiero	Avance Físico	Avance Financiero	Avance Físico	
Reparación de edificación y obras exteriores; construcción de baño o servicios sanitarios; adquisición de grupo electrógeno y museografía; en el(la) monumento a los vencedores de Junín, ubicado en la pampa de chacamarca, casa hacienda san francisco de chichausiri, distrito de Junín, provincia Junín, departamento Junín CUI 2456690	UNIDAD EJECUTORA 008: MC-PROYECTOS ESPECIALES	4,616,719	13.9%	0.0%	26.0%	11.2%	[31/01/2024] Al mes de enero 2024 La obra se encuentra en un avance acumulado de 20.70%
Creación de servicios culturales a través del parque cultural bicentenario en Junín, distrito de Huancayo - provincia de Huancayo - departamento de Junín CUI 2499924	UNIDAD EJECUTORA 008: MC-PROYECTOS ESPECIALES	18,028,653	8.9%	0.0%	8.9%	0.0%	Al respecto, el proyecto en mención se encuentra en elaboración del expediente técnico bajo la modalidad de Convenio de Administración de Recursos cuyo monto de inversión es de S/ 18,028,653.47 (contándose con presupuesto para el presente ejercicio presupuestal). A la fecha, el primer, segundo y tercer entregable fueron aprobados, encontrándose pendiente el levantamiento



							de observaciones del cuarto entregable (cuyo plazo máximo es el 26.02.2024) por parte del contratista CLAUSTRO S.A.C. Asimismo, la aprobación del Expediente Técnico será en el segundo trimestre del 2024. Finalmente, en el 2024 se cuenta con un PIM de S/ 5,398,597.00 y para la Gestión del Proyecto un monto de S/ 10,000.
Mejoramiento y ampliación del servicio de agua para el sistema de riego en los distritos de Pancán, San Pedro de Chunán y Yauli de la provincia de Jauja, región Junín CUI 2317700	MIDAGRI - AGRO RURAL	15,486,468	1.9%	0.00%	1.9%	0.00%	La Procuraduría Pública del MIDAGRI ha comunicado a la Entidad, la conclusión del proceso arbitral seguido por CONSORCIO NORTE contra el PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL-AGRO RURAL, relacionado a las controversias derivadas del Contrato N° 215-2018- MINAGRI-AGRORURAL, para la Contratación de la Ejecución de Obra.
Mejoramiento de los servicios de investigación y transferencia tecnológica agraria en la estación experimental agraria Pichanaki en la localidad de Pichanaki del distrito de Pichanaqui, provincia de Chanchamayo, departamento de Junín. CUI 2472700	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y MONITOREO EN LAS ESTACIONES EXPERIMENTALES AGRARIAS	29,535,448	0.6%	0.00%	0.6%	0.00%	[25/09/2023] SE APROBÓ EL EXPEDIENTE TÉCNICO, NO SE REALIZARÁ EJECUCIÓN FÍSICA EN EL PRESENTE AÑO





Mejoramiento y creación de los servicios turísticos públicos en el santuario señor de Muruhuay, distrito de Acobamba - provincia de Tarma - región Junín CUI 2300618	MINCETUR - PLAN COPESCO	21,462,886	58.6%	50.9%	60.7%	54.3%	[16/01/2024] producto 1: (infraestructura) Adecuadas condiciones de estacionamiento, espacios para exposición de muestras culturales y servicios de interpretación cultural - EJECUCIÓN DE OBRA, EN FASE DE CULMINACIÓN FÍSICA. productos 2 y 3: (mobiliario y equipamiento) museografía de centro de interpretación y ambientes complementarios - El expediente técnico del componente museográfico SE ENCUENTRA observado, SE VIENEN subsanando las observaciones para su aprobación y ejecución, UNA VEZ CULMINADA LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE INTERPRETACIÓN. PRODUCTO: Vías y Señalización Turística (vías de acceso al Santuario, construcción de terrazas e instalación de señales turísticas) - Se viene realizando las coordinaciones pertinentes para obtener la información del saneamiento físico legal del proyecto de inversión con las autoridades competentes para poder realizar el diagnóstico de saneamiento físico legal correspondiente.
---	----------------------------	------------	-------	-------	-------	-------	---





Mejoramiento de los servicios de educación superior tecnológica del IESTP Santiago Antúnez de Mayolo, del distrito y provincia de Huancayo CUI 2234830	UE N° 118: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN BÁSICA Y SUPERIOR	130,586,154	38.3%	12.4%	48.3%	24.8%	[15/01/2024] EL PI SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN FÍSICA CON UN AVANCE ACUMULADO DE 24.81% AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023: I) COMPONENTE INFRAESTRUCTURA EN EJECUCIÓN FÍSICA CON UN AVANCE DE 28.67% II) SUPERVISIÓN (GERENCIA DE OBRA) EN EJECUCIÓN CON UN AVANCE ACUMULADO DE 57.34%. III) COMPONENTE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO EN ACTOS PREPARATORIOS PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN. IV) COMPONENTE CAPACITACIÓN, EN ELABORACIÓN DE LOS DOCUMENTOS EQUIVALENTES.
Mejoramiento de la prestación del servicio educativo del nivel inicial, primaria y secundaria de la institución educativa 9 de julio ubicado en el distrito de Concepción - provincia de Concepción - departamento de Junín CUI 2488994	UEI 125: PROYECTO ESPECIAL DE INVERSIÓN PÚBLICA ESCUELAS BICENTENARIO	85,286,424	8.3%	0.0%	10.2%	2.6%	[24/01/2024] El presente proyecto se encuentra en ejecución física de la escuela de contingencia, a la fecha se cuenta con un avance valorizado de obra del 100%. Adicionalmente, en el periodo de reporte se aceptó con comentarios la presentación 3 del Diseño Permanente.





Mejoramiento del servicio de educación inicial, primaria y secundaria de la I.E. seis de agosto en el distrito de Junín - provincia de Junín - departamento de Junín CUI 2482810	UEI 125: PROYECTO ESPECIAL DE INVERSIÓN PÚBLICA ESCUELAS BICENTENARIO	113,679,478	11.1%	0.0%	12.9%	8.1%	[24/01/2024] El presente proyecto se encuentra en ejecución física de la escuela de contingencia, a la fecha se cuenta con un avance valorizado de obra del 100%. Adicionalmente, en el periodo de reporte se aceptó con comentarios la presentación 3 del Diseño Permanente.
Mejoramiento de la prestación de servicios educativos del nivel inicial, primaria y secundaria de la institución educativa 19 de abril ubicado en el distrito de Chupaca - provincia de Chupaca - departamento de Junín CUI 2489023	UEI 125: PROYECTO ESPECIAL DE INVERSIÓN PÚBLICA ESCUELAS BICENTENARIO	109,829,496	10.8%	0.0%	12.3%	7.4%	24/01/2024] El presente proyecto se encuentra en ejecución física de la escuela de contingencia, a la fecha se cuenta con un avance valorizado de obra del 100%. Adicionalmente, en el periodo de reporte se aceptó con comentarios la presentación 3 del Diseño Permanente.
Creación servicios tecnológicos en la cadena productiva del sector cuero y calzado anexo de san roque de malayo del distrito de Saño - provincia de Huancayo - departamento de Junín CUI 2267894	DIRECCION DE OPERACIONES PRODUCCION	19,837,015	47.3%	39.6%	58.5%	49.0%	[19/01/2024] Con fecha 27.05.2022, inició la ejecución física del componente Infraestructura. -La obra cuenta con un avance físico de 93.05% al 12.12.23. -El componente de Equipamiento cuenta con Documento Equivalente aprobado (componente en ejecución física). - El componente de Capacitación cuenta con Documento Equivalente aprobado.
Instalación de banda ancha para la conectividad integral y desarrollo social de la región Junín(+)	Dirección de Ingeniería y Operaciones -	329,167,185	78.9%	60%	79.1%	79.1%	[03/05/2023] En el Trimestre I del presente año, Se otorgó conformidad al 75% del Hito





CUI 2263639	PRONATEL						Contractual 02: Localidades con cobertura de Internet e Intranet y sus INSTITUCIONES ABONADAS conectadas. Para el trimestre II se tiene proyectado la implementación de nodos al 100% (100% Hito 01). en el mes de abril se dio conformidad al 100% de la implementación y conectividad de IAOS (Hito 02 de la Red de Acceso). ASIMISMO, SE PREVÉ EL INICIO DE OPERACIÓN PARA EL TRIMESTRE IV DEL PRESENTE AÑO.
Instalación de agua para riego de los anexos de Uyo, Lauca, Andamarca, Huata, Antacalla y Andamayo, distrito de Andamarca - Concepción – Junín CUI 2184535	PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL	8,635,522	95,3%	94,3%	95,5%	94%	[17/01/2024] OBRA PARALIZADA , mediante acta de paralización de fecha 31 de diciembre del 2019. En el mes de setiembre del año 2023 se transfirieron recursos a la Unidad Zonal Junín para actualización del expediente de saldo de obra. Con fecha 25/10/2023 mediante orden de servicio se contrata al consultor para la elaboración del informe técnico del estado situacional y valorización de corte técnico-financiero. Actualmente, el consultor presentó el Informe Técnico antes mencionado, el cual, se encuentra en revisión por la Unidad Zonal de Junín.



PROYECTOS MULTIDEPARTAMENTALES

PROYECTO DE INVERSION CUI	UNIDAD EJECUTORA	COSTO Actualizado	Memorando N° 000313-2023- PEB/MC AL 30 DE SETIEMBRE 2023		INFORME N° 000092-2024- OINV/MC Informe N° 004-2024-UAPI-PEB- JPO/MC AL 14 DE FEBRERO 2024		DIFERENCIA/ OBSERVACION
			Avance Financiero	Avance Físico	Avance Financiero	Avance Físico	
Mejoramiento y ampliación de los Servicios públicos para el desarrollo productivo local en el ámbito de la sierra y selva del Perú” - Avanzar Rural CUI 2471146	MIDAGRI AGRORURAL	251,666,743	63.5%	58.6%	64.9%	62.6%	[12/01/2024] EN EJECUCIÓN AL 64.35% SIN PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN
Mejoramiento de la disponibilidad, acceso y uso de semillas de calidad de: papa, maíz amiláceo, leguminosas de grano y cereales, en las regiones de Junín, Ayacucho, Cusco y Puno. 4 departamentos CUI 2361771	MIDAGRI - INIA	116,453,930	26.6%	24.3%	34.2%	33.7%	[06/02/2024] EL PROYECTO DE INVERSIÓN TIENE COMO PRESUPUESTO 2024 EL MONTO DE S/ 18,111,369.00, PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES EN LOS 04 COMPONENTES. C1: MEJORA DE LA DISPONIBILIDAD DE TECNOLOGIA PARA PRODUCCION DE SEMILLAS DE CALIDAD, C2: FORTALECIDA CAPACIDAD





							TÉCNICA OPERATIVA PARA LA PRODUCCIÓN DE SEMILLAS DE CALIDAD, C3: MEJORA DE CAPACIDADES DE GESTIÓN Y PROMOCIÓN PARA EL USO DE SEMILLAS DE CALIDAD. C4 FORTALECIDAS CAPACIDADES DE LOS ACTORES DEL SISTEMA DE SEMILLAS DE CALIDAD Y GESTION DEL PROYECTO. RESPECTO A LA EJECUCIÓN FÍSICA PRESENTA UN AVANCE DE 33.69% Y LA EJECUCIÓN FINANCIERA 34.61%. DURANTE EL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO SE CONTINUÓ CON LA EJECUCION DE OBRAS y SERVICIOS RELACIONADAS A CONSTRUCCION, ACONDICIONAMIENTO Y REHABILITACION DE ALMACENES DE SEMILLAS Y AMBIENTES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA EN EL AMBITO DE LAS EEa AREQUIPA, CANAÁN, Y ANDENES.
--	--	--	--	--	--	--	--





Mejoramiento del servicio de control de disturbios civiles a Nivel Nacional CUI 2251056	MINISTERIO DEL INTERIOR - OGA	755,686,190	14.4%	16.4%	13.0%	16.4%	[30/05/2023] Minibuses: Contrato N° 075-2019-In-Ogaf (22/11/2019) Cancelación De Contrato 18 Unid Y Adicional 04 Unid de un total de 63 unidades
Creación de un sistema de mensajería de alerta temprana a nivel nacional CUI 2381444	MTC - AG	31,653,237	99.7%	82.5%	99.7%	82.5%	[13/10/2023] En el mes de setiembre, mediante el Informe N° 0414-2023-MTC/27.01 ((I- 464177-2023) se ha solicitado la contratación del servicio legal-contractual para evaluar los alcances, condiciones y obligaciones pactadas en el Contrato N° 104-2019-MTC/10.02 “Adquisición del proyecto creación de un sistema de mensajería de alerta temprana a nivel nacional (SISMATE)”. Los mismos que van permitir verificar el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones contractuales pactadas, así como absolver las consultas a fin de otorgar la conformidad final a la implementación y Puesta en Funcionamiento del SISMATE.





Creación de la carretera central Huaycan – cieneguilla Santiago de Tuna - San Andres de Tupicocha - San Damian Yuracmayo - Yauli Pachachaca - EMP. PE-22 distrito de Santa Rosa de Sacco - provincia de Yauli - departamento de Junín CUI 2436163	MTC- PRO VIAS NACIONAL (G2G)	11,959,416,075	1.1%	0.0%	1.2%	0.0%	[13/10/2023] NUEVA CARRETERA CENTRAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN Modalidad de Contrato Gobierno a Gobierno. PMO: Project Manager Office: Consorcio EGIS-SETEC de Francia. Contrato (27-May-21) por EUR 61.5 millones Plazo, Inicio: 28- May-21 / Fin estimado: Jun-31
Masificación de Gas Natural - distribución de gas natural por red de ductos en las regiones de Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Junín, Cusco, Puno y Ucayali S/CUI	MEM (APP)	200,000,000	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	Proyecto que cambio de modalidad de ejecución, el cual se encuentra en su etapa de priorización

CUADRO N° 41 COMPARATIVO AVANCE DE EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION DEPARTAMENTO DE JUNIN

Fuente: MEMORANDO N° 000313-2023-PEB/MC y el INFORME N° 000092-2024-OINV/MC e Informe N° 004-2024-UAPI-PEB-JPO/MC

Elaboración: Comisión Especial Multipartidaria del Bicentenario de la Independencia del Perú



SEGUIMIENTO DE LA INFORMACION DE LAS UNIDADES EJECUTORAS

PROYECTO DE INVERSION CUI	UNIDAD EJECUTORA	COSTO Actualizado	INFORME N° 000092-2024- OINV/MC Informe N° 004-2024-UAPI-PEB- JPO/MC AL 14 DE FEBRERO 2024		INFORMACION UNIDAD EJECUTORA		ESTADO SITUACIONAL
			Avance Financiero	Avance Físico	Requerimiento	Respuesta	
Reparación de edificación y obras exteriores; construcción de baño o servicios sanitarios; adquisición de grupo electrógeno y museografía; en el(la) monumento a los vencedores de Junín, ubicado en la pampa de chacamarca, casa hacienda san francisco de chichausiri, distrito de Junín, provincia Junín, departamento Junín. CUI 2456690	UNIDAD EJECUTORA 008: MC-PROYECTOS ESPECIALES	4,616,719	26.0%	11.2%	OFICIO N° 308- 2023-2024-LVOM- CEMBI/CR 01/02/2024	OFICIO N° 000422-2024- DM/MC 06/05/2024	[31/01/2024] Al mes de enero 2024 La obra se encuentra en un avance acumulado de 20.70%
Creación de servicios culturales a través del parque cultural bicentenario en Junín, distrito de Huancayo - provincia de Huancayo - departamento de Junín CUI 2499924	UNIDAD EJECUTORA 008: MC-PROYECTOS ESPECIALES	18,028,653	8.9%	0.0%	OFICIO N° 308- 2023-2024-LVOM- CEMBI/CR 01/02/2024	OFICIO N° 000422-2024- DM/MC 06/05/2024	Al respecto, el proyecto en mención se encuentra en elaboración del expediente técnico bajo la modalidad de Convenio de Administración de Recursos cuyo monto de inversión es de S/ 18,028,653.47 (contándose con presupuesto para el presente ejercicio presupuestal). A la fecha, el primer, segundo y tercer



							entregable fueron aprobados, encontrándose pendiente el levantamiento de observaciones del cuarto entregable (cuyo plazo máximo es el 26.02.2024) por parte del contratista CLAUSTRO S.A.C. Asimismo, la aprobación del Expediente Técnico será en el segundo trimestre del 2024. Finalmente, en el 2024 se cuenta con un PIM de S/ 5,398,597.00 y para la Gestión del Proyecto un monto de S/ 10,000.
Mejoramiento y ampliación del servicio de agua para el sistema de riego en los distritos de Pancán, San Pedro de Chunán y Yauli de la provincia de Jauja, región Junín CUI 2317700	MIDAGRI - AGRO RURAL	15,486,468	1.9%	0.00%	OFICIO N° 0310-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR 08/02/2024	OFICIO N° 0757-2024-MIDAGRI-SG 29/02/2024	Con Memorandum N°019-2024-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UIR de fecha 09-01-2024, concluye que corresponde regularizar la resolución del Contrato N° 67-2018-MINAGRI-AGRO RURAL por haber incurrido en penalidad máxima por mora al acumular más del 10 % del monto del contrato, remitido a la UA por tercera vez.





Mejoramiento de los servicios de investigación y transferencia tecnológica agraria en la estación experimental agraria Pichanaki en la localidad de Pichanaki del distrito de Pichanaqui, provincia de Chanchamayo, departamento de Junín. CUI 2472700	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y MONITOREO EN LAS ESTACIONES EXPERIMENTALES AGRARIAS	29,535,448	0.6%	0.00%	OFICIO N° 0310-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR 08/02/2024	OFICIO N° 0757-2024-MIDAGRI-SG 29/02/2024	Tiene Expediente Técnico aprobado, con un devengado acumulado de 173,307.27. Cuenta con programación en el PMI para los años 2026 y 2027, con montos de S/ 14,206,381 y S/ 15,155,759, respectivamente.
Mejoramiento y creación de los servicios turísticos públicos en el santuario señor de Muruhuay, distrito de Acobamba - provincia de Tarma - región Junín CUI 2300618	MINCETUR - PLAN COPESCO	21,462,886	60.7%	54.3%	OFICIO N° 0311-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR 08/02/2024	OFICIO N° 307-2024-MINCETUR/DM 19/04/2024	Respecto al componente Centro de Interpretación, escenario de exposición y estacionamiento - infraestructura su ejecución se concluyó el 29/12/2023; se encuentra en recepción de obra. Respecto al componente Museografico, luego de recepcionada la obra, se contratar al ejecutor de dicho componente.
Mejoramiento de los servicios de educación superior tecnológica del IESTP Santiago Antúnez de Mayolo, del distrito y provincia de Huancayo CUI 2234830	UE N° 118: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN BÁSICA Y SUPERIOR	130,586,154	48.3%	24.8%	OFICIO N° 0312-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR 08/02/2024	OFICIO N° 00127-2024-MINEDU/VMGI/P EIP-EB/DIEJE 19/02/2024	Avance Ejecutado Acumulado al 31.12.2023 de 28.67% EQUIPAMIENTO En proceso de convocatoria - programado para el 2024 - 2025 CAPACITACION Etapa de aprobación del informe de consistencia seguido a esto la etapa de contratación - programado para el 2024





Mejoramiento de la prestación del servicio educativo del nivel inicial, primaria y secundaria de la institución educativa 9 de julio ubicado en el distrito de Concepción - provincia de Concepción - departamento de Junín CUI 2488994	UEI 125: PROYECTO ESPECIAL DE INVERSIÓN PÚBLICA ESCUELAS BICENTENARIO	85,286,424	10.2%	2.6%	OFICIO N° 0312-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR 08/02/2024	OFICIO N° 00127-2024-MINEDU/VMGI/P EIP-EB/DIEJE 19/02/2024	Entregable de diseño 3 – I.E. 9 de Julio Como parte de la subsanación de observaciones de la presentación 3, el contratista EB Consorcio Gestor ha presentado al PEIP un total de 981 documentos, los cuales se encuentran en proceso de revisión por parte de los especialistas del Paquete 6 del PEIPEB. En tal sentido, se tiene programado en los próximos meses la aceptación del diseño (presentación 3, presentación 4) de la escuela permanente de la I.E. 9 de Julio.
Mejoramiento del servicio de educación inicial, primaria y secundaria de la I.E. seis de agosto en el distrito de Junín - provincia de Junín - departamento de Junín CUI 2482810	UEI 125: PROYECTO ESPECIAL DE INVERSIÓN PÚBLICA ESCUELAS BICENTENARIO	113,679,478	12.9%	8.1%	OFICIO N° 0312-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR 08/02/2024	OFICIO N° 00127-2024-MINEDU/VMGI/P EIP-EB/DIEJE 19/02/2024	Entregable de diseño 3 – I.E. Seis de Agosto Como parte de la subsanación de observaciones de la presentación 3, el contratista EB Consorcio Gestor ha presentado al PEIP un total de 588 documentos, los cuales se encuentran en proceso de revisión por parte de los especialistas del Paquete 6 del PEIPEB. En este contexto, se tiene programado en los próximos meses la aceptación del diseño (presentación 3, presentación 4) de la escuela permanente de la I.E. Seis de Agosto.





Mejoramiento de la prestación de servicios educativos del nivel inicial, primaria y secundaria de la institución educativa 19 de abril ubicado en el distrito de Chupaca - provincia de Chupaca - departamento de Junín CUI 2489023	UEI 125: PROYECTO ESPECIAL DE INVERSIÓN PÚBLICA ESCUELAS BICENTENARIO	109,829,496	12.3%	7.4%	OFICIO N° 0312-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR 08/02/2024	OFICIO N° 00127-2024-MINEDU/VMGI/P EIP-EB/DIEJE 19/02/2024	Entregable de diseño 3 – I.E. 19 de Abril Como parte de la subsanación de observaciones de la presentación 3, el contratista EB Consorcio Gestor ha presentado al PEIP un total de 717 documentos, los cuales se encuentran en proceso de revisión por parte de los especialistas del Paquete 6 del PEIPEB. En ese sentido, se tiene programado en los próximos meses la aceptación del diseño (presentación 3, presentación 4) de la escuela permanente de la I.E. 19 de Abril.
Creación servicios tecnológicos en la cadena productiva del sector cuero y calzado anexo de san Roque de malayo del distrito de Saño - provincia de Huancayo - departamento de Junín CUI 2267894	DIRECCION DE OPERACIONES PRODUCCION	19,837,015	58.5%	49.0%	OFICIO N° 0313-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR 08/02/2024	OFICIO N° 00000238-2024-PRODUCE/DM19/17/04/2024	Este PI se encuentra en fase de ejecución, cuenta con un devengado acumulado de S/ 14,142,407.88, que representa un avance financiero del 71.3%; además, reporta un saldo pendiente por ejecutar de S/ 5,694,607.05 y en el presente Año Fiscal tiene una asignación presupuestal (PIM) de S/ 3,247,601. Asimismo, el PI CITEccal Junín se encuentra priorizado en el PMI 2025 – 2027. Asimismo, el avance físico de infraestructura al 29 de febrero del 2024 es de 92.39 % y el avance de equipamiento al 31 enero del 2024 es del 61.02 % el cual se valorizó





							específicamente los equipos de calzado, estando pendiente de valorizar los equipos de curtiembre.
Instalación de banda ancha para la conectividad integral y desarrollo social de la región Junín(+) CUI 2263639	Dirección de Ingeniería y Operaciones - PRONATEL	329,167,185	79.1%	79.1%	OFICIO N° 0314-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR 08/02/2024	SIN RESPUESTA	
Instalación de agua para riego de los anexos de Uyo, Lauca, Andamarca, Huata, Antacalla y Andamayo, distrito de Andamarca - Concepción – Junín CUI 2184535	PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL	8,635,522	95,5%	94%	OFICIO N° 0310-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR 08/02/2024	OFICIO N° 0757-2024-MIDAGRI-SG 29/02/2024	obra se encuentra paralizada, DEVENGADO EJECUTADO POR LA MUNICIPALIDAD DE ANDAMARCA EL PRESENTE AÑO SE HA CONSIDERADO DENTRO DEL INFORME DE LAS OBRAS PARALIZADAS ANTE FONDO SIERRA AZUL, PARA PODER SER REACTIVADA, así mismo el 2023 se asignó presupuesto para la elaboración del expediente de saldo de obra

CUADRO N° 42 SEGUIMIENTO DE LA INFORMACION UNIDADES EJCUTORAS PROYECTOS DEPARTAMENTO DE JUNIN

Fuente: INFORME N° 000092-2024-OINV/MC e Informe N° 004-2024-UAPI-PEB-JPO/MC y Oficios de respuesta de las entidades

Elaboración: Comisión Especial Multipartidaria del Bicentenario de la Independencia del Perú



Continuando con el seguimiento de los proyectos de inversión del departamento de Junín que forman parte de la Agenda del Bicentenario y recepcionada la información requerida por nuestra comisión mediante el Oficio N° 050-2024-2025-LVOM-CEMBI/CR (02/10/2024), en cuyos oficios en el punto 9 requerimos información sobre los proyectos de inversión que corresponden al departamento de Junín y proyectos de inversión multidepartamental que comprenden a dicho departamento, y que fuera atendido por el Ministerio de Cultura mediante OFICIO N° 001899-2024-DM/MC, de fecha 27 de diciembre del 2024, adjunto al cual se nos remitió el documento “RESPUESTA A LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN REALIZADA POR LA COMISIÓN ESPECIAL MULTIPARTIDARIA CONMEMORATIVA DEL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DEL PERÚ”, brindándonos información actualizada al 30 de setiembre del 2024, que consolidamos en un cuadro comparativo de los avances de la ejecución de los proyectos de inversión del departamento de Junín.

Respecto a nuestro requerimiento de información de los proyectos de inversión del departamento de Junín, el Ministerio de Cultura remitió información de los 11 proyectos de inversión que corresponden al citado departamento, y de manera adicional, también nos brindan información relacionada a 5 proyectos de inversión; asimismo, en relación a la información solicitada de los 6 proyectos de inversión multidepartamental que comprenden al departamento de Junín, al absolver nuestro requerimiento, tan solo nos remitieron información respecto a 3 de ellos, y también nos brindan información de manera adicional, relacionada a 1 proyectos de inversión; hacemos una precisión en relación a los 3 proyectos cuya información no fuera remitida, en el Anexo denominado lista de proyectos por departamento ubicamos la información faltante; cuyo análisis, comparación y consolidación presentamos a continuación en los respectivos cuadros elaborados por nuestra comisión

COMPARATIVO AVANCE DE EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION DEPARTAMENTO DE JUNIN

PROYECTO DE INVERSION CUI	UNIDAD EJECUTORA	COSTO Actualizado	INFORME N° 000092-2024- OINV/MC Informe N° 004-2024-UAPI- PEB-JPO/MC AL 14 DE FEBRERO 2024		OFICIO N° 001899-2024- DM/MC AL 30 DE SETIEMBRE 2024		DIFERENCIA/ OBSERVACION
			Avance Financiero	Avance Físico	Avance Financiero	Avance Físico	
Creación de servicios culturales a través del parque cultural bicentenario en Junín, distrito de Huancayo - provincia de Huancayo - departamento de Junín CUI 2499924	UNIDAD EJECUTORA 008: MC-PROYECTOS ESPECIALES	42,744,782.62	8.9%	0.0%	3.9 %	0.0%	Con Expediente Técnico aprobado Estado actual: - El PCB Junín forma parte de los 06 parques culturales priorizados, habiéndose elaborado su expediente técnico mediante un Convenio de Administración de Recursos, suscrito entre el Ministerio de Cultura y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), el 30 de diciembre de 2021. - El expediente técnico del proyecto fue aprobado mediante Resolución N° 007-2024-OINV/MC, de fecha 27 de mayo de 2024, por un monto de inversión (primera etapa) de S/ 36,609,396.50, y un plazo de ejecución de 360 días calendarios. - El 15 de julio de 2024 se convocó el



							proceso para la ejecución de la obra y el 04.10.2024 se consintió la buena pro. Se tiene programado la suscripción del contrato el 31.10.2024. • El 31 de julio de 2024 se convocó el proceso para la supervisión de la obra. Se tiene programada la suscripción de contrato el 13.11.2024. • Se programa iniciar la obra en diciembre de 2024 y culminar la obra en diciembre de 2025.
Mejoramiento y ampliación del servicio de agua para el sistema de riego en los distritos de Pancán, San Pedro de Chunán y Yauli de la provincia de Jauja, región Junín CUI 2317700	MIDAGRI - AGRO RURAL	15,486,468	1.9%	0.00%	1.9%	0.00%	Elaboración de Exp. Técnico (Paralizada por contrato resuelto) Entregable 04 OBSERVADO. Se reiteró las observaciones al producto final, persistiendo criterios técnicos discordantes, en especial por una propuesta de transvase para la conducción de agua. La entidad comunica la resolución del Contrato del consultor de elaboración expediente.
Mejoramiento de los servicios de investigación y transferencia tecnológica agraria en la estación experimental agraria Pichanaki en la localidad de Pichanaki del distrito de Pichanaqui, provincia de Chanchamayo, departamento de Junín. CUI 2472700	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y MONITOREO EN LAS ESTACIONES EXPERIMENTALES AGRARIAS	29,535,448	0.6%	0.00%	0.6%	0.00%	Expediente Técnico aprobado Se aprobó el expediente técnico, no se realizará ejecución física en el presente año.





Mejoramiento y creación de los servicios turísticos públicos en el santuario señor de Muruhuay, distrito de Acobamba - provincia de Tarma - región Junín CUI 2300618	MINCETUR - PLAN COPESCO	22,255,049	60.7%	54.3%	60.7%	52.7%	En Ejecución (Componente infraestructura culminada, en ejecución el com. Museografía) Componente Museografía: Convocatoria desierta Componente Accesos: este componente no ha sido programado a la fecha porque se encuentra pendiente el saneamiento de agua y desagüe en el área de intervención, por parte de la Municipalidad Distrital de Acobamba.
Mejoramiento de los servicios de educación superior tecnológica del IESTP Santiago Antúnez de Mayolo, del distrito y provincia de Huancayo CUI 2234830	UE N° 118: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN BÁSICA Y SUPERIOR	132,055,039	48.3%	24.8%	58.3%	37.80%	En Ejecución (Obra retrasada Incumplimientos por parte del contratista) Se encuentra en ejecución física con un avance acumulado de 38.57% al mes de agosto del 2024: i) componente infraestructura en ejecución física con un avance de 44.60%.
Mejoramiento de la prestación del servicio educativo del nivel inicial, primaria y secundaria de la institución educativa 9 de julio ubicado en el distrito de Concepción - provincia de Concepción - departamento de Junín CUI 2488994	UEI 125: PROYECTO ESPECIAL DE INVERSIÓN PÚBLICA ESCUELAS BICENTENARIO	100,208,660	10.2%	2.6%	25.3%	19.10%	En Ejecución (En ejecución la escuela permanente) Obra Pública que se ejecuta a través de gobierno a Gobierno - Escuelas bicentenarias – PEIP – MINEDU Se culminaron los trabajos de demolición de los activos existentes y se está ejecutando la Etapa 2: construcción de las escuelas permanentes, el cual presenta un avance físico de 21.02%





Mejoramiento del servicio de educación inicial, primaria y secundaria de la I.E. seis de agosto en el distrito de Junín - provincia de Junín - departamento de Junín CUI 2482810	UEI 125: PROYECTO ESPECIAL DE INVERSIÓN PÚBLICA ESCUELAS BICENTENARIO	134,530,256	12.9%	8.1%	28.1%	23.80%	En Ejecución (En ejecución la escuela permanente) Obra Pública que se ejecuta a través de gobierno a Gobierno - Escuelas bicentenarias – PEIP – MINEDU Se culminaron los trabajos de demolición de los activos existentes y se está ejecutando la Etapa 2: construcción de las escuelas permanentes, el cual presenta un avance físico de 6.35%
Mejoramiento de la prestación de servicios educativos del nivel inicial, primaria y secundaria de la institución educativa 19 de abril ubicado en el distrito de Chupaca - provincia de Chupaca - departamento de Junín CUI 2489023	UEI 125: PROYECTO ESPECIAL DE INVERSIÓN PÚBLICA ESCUELAS BICENTENARIO	99,200,617	12.3%	7.4%	32.2%	23.40%	En Ejecución (en ejecución la escuela permanente) Obra Pública que se ejecuta a través de gobierno a Gobierno - Escuelas bicentenarias – PEIP – MINEDU Se culminaron los trabajos de demolición de los activos existentes y se está ejecutando la Etapa 2: construcción de las escuelas permanentes, el cual presenta un avance físico de 17.12%
Creación servicios tecnológicos en la cadena productiva del sector cuero y calzado anexo de san Roque de malayo del distrito de Saño - provincia de Huancayo - departamento de Junín CUI 2267894	DIRECCION DE OPERACIONES PRODUCCION	20,031,818	58.5%	49.0%	77.1%	71.0%	En Ejecución En ejecución el componente infraestructura Se espera culminar el componente de infraestructura, en el mes de noviembre, la demora es debido a los equipos sobredimensionados del área de curtiembre, por lo que se está evaluando realizar los trabajos de ampliación del área; así mismo, el componente de equipamiento se espera





							culminar, en el mes de febrero 2025. Quedaría pendiente la ejecución del componente de intangibles.
Instalación de banda ancha para la conectividad integral y desarrollo social de la región Junín CUI 2263639	Dirección de Ingeniería y Operaciones - PRONATEL	360,964,150	79.1%	79.1%	76.9%	93%	Obra culminada (En liquidación y cierre). Obra por otra modalidad - Modalidad Proyecto por Activo.
Instalación de agua para riego de los anexos de Uyo, Lauca, Andamarca, Huata, Antacalla y Andamayo, distrito de Andamarca - Concepción – Junín CUI 2184535	PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL	8,675,111	95,5%	94%	95.4%	94.3%	Obra Paralizada Saldo de obra se encuentra suspendida Demora en la aprobación del expediente, por observaciones no levantada dentro de los plazos requeridos, y demora en la aprobación de recursos presupuestales, lo que retrasaría la ejecución de la obra
Reparación de edificación y obras exteriores; construcción de baño o servicios sanitarios; adquisición de grupo electrógeno y museografía; en el(la) monumento a los vencedores de Junín, ubicado en la pampa de chacamarca, casa hacienda san francisco de chichausiri, distrito de Junín, provincia Junín, departamento Junín (*) CUI 2456690	UNIDAD EJECUTORA 008: MC-PROYECTOS ESPECIALES	4,616,719	26.0%	11.2%	73.1%	94%	En ejecución (Componente Infraestructura: Obra en ejecución, y el componente de museografía culminado) Pendiente completar la colocación de pisos y contra zócalos en el interior del obelisco (fecha programa de recepción de obra: 30 de noviembre de 2024).
Programa Nacional de Electrificación Rural al 100 % en ámbito rural – Distritos de Rio Tambo, Pariahuanca, Mazamari de la región de Junín. (*)	DIRECCIÓN DE PROYECTOS - DIRECCIÓN GENERAL	25,105,546	-	-	95%	100%	Obras culminadas en funcionamiento





3PIP	DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS – DGER/MEM						
Mejoramiento de la capacidad resolutiva del centro de salud de Mazamari-Microred Mazamari-Red Satipo-Diresa- Junín, Distrito de Mazamari - Satipo – Junín. (*) CUI 2140972	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAZAMARI	8,607,172			100.0%	100.0%	Obra culminada (En liquidación y cierre)
Implementación del instituto regional de Enfermedades Neoplásicas de la Macro Región Del Centro del Perú. (*) CUI 2161774	GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	270,131,472			98.8%	90.8%	Obra culminada (En liquidación y cierre)
Centro de pronóstico hidrometeorológico e innovación de la dirección regional del SENAMHI- Junín. (*) CUI 2157965	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN SENAMHI	14,182,923			94.2%	93.8%	En Ejecución (Actos preparatorios para la ejecución de saldo de la obra)



PROYECTOS MULTIDEPARTAMENTALES

PROYECTO DE INVERSION CUI	UNIDAD EJECUTORA	COSTO Actualizado	INFORME N° 000092-2024- OINV/MC Informe N° 004-2024-UAPI- PEB-JPO/MC AL 14 DE FEBRERO 2024		OFICIO N° 001899-2024- DM/MC AL 30 DE SETIEMBRE 2024		DIFERENCIA/ OBSERVACION
			Avance Financiero	Avance Físico	Avance Financiero	Avance Físico	
Mejoramiento de la disponibilidad, acceso y uso de semillas de calidad de: papa, maíz amiláceo, leguminosas de grano y cereales, en las regiones de Junín, Ayacucho, Cusco y Puno. 4 departamentos CUI 2361771	MIDAGRI - INIA	116,453,930	34.2%	33.7%	39.7%	36.3%	En ejecución
Creación de la carretera central Huaycan – Cieneguilla Santiago de Tuna - San Andrés de Tupicocha - San Damián Yuracmayo - Yauli Pachachaca - EMP. PE-22 distrito de Santa Rosa de Sacco - provincia de Yauli - departamento de Junín CUI 2623129 (CUI 2436163)	MTC- PROVIAS NACIONAL (G2G)	24,528,949,829	1.2%	0.0%	0.3%	0.0%	Obra Pública que se ejecuta a través de Gobierno a Gobierno, (CUI 2436163 - Proyecto cerrado. Se habilito: CUI 2623129 Nueva Carretera Central Daniel Alcides Carrión). En elaboración Expediente Técnico La PMO ha presentado el primer Informe del trazo definitivo de la carretera, el cual se viene coordinando con Provias Nacional
Masificación de Gas Natural - distribución de gas natural por red de ductos en las regiones de Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Junín, Cusco, Puno y Ucayali	MEM (APP)	200,000,000	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	Se otorgaron la Buena Pro de los proyectos pertenecientes a las regiones de Huancavelica (15.03.24) y Cusco (12.04.24) Como principales contingencias tenemos:



S/CUI							a) Demoras en el saneamiento técnico y legal de los terrenos para los proyectos de masificación de Gas Natural en los restos de regiones sin buena pro, b) Demoras en la entrega de la documentación técnica por parte de los Gobiernos Regionales y Municipalidades Provinciales y Distritales, c) Demora en el otorgamiento de permisos y/o autorizaciones con las municipalidades provinciales y distritales para la ejecución de proyectos. d) Falta de comunicación entre las autoridades regionales y locales con la empresa contratista.
Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 4: Huancayo-Izcuchaca Mayocc-Ayacucho/Ayacucho Andahuaylas-Puente Sahuinto/Dv. Pisco - Huaytará – Ayacucho. (*) S/CUI	MTC	4,077,940,000			0.0%	0.0%	Modalidad: iniciativa estatal cofinanciada Fase: Transacción Modalidad contractual: Contrato de concesión Buena Pro: III Trimestre 2024

CUADRO N° 43 COMPARATIVO AVANCE DE EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION DEPARTAMENTO DE JUNIN

Fuente: INFORME N° 000092-2024-OINV/MC e Informe N° 004-2024-UAPI-PEB-JPO/MC y el OFICIO N° 001899-2024-DM/MC

(*) Información adicional a la requerida por nuestra comisión

Elaboración: Comisión Especial Multipartidaria del Bicentenario de la Independencia del Perú





PROYECTO DE INVERSION CUI	UNIDAD EJECUTORA	COSTO Actualizado	INFORME N° 000092-2024- OINV/MC Informe N° 004-2024-UAPI- PEB-JPO/MC AL 14 DE FEBRERO 2024		OFICIO N° 001899-2024- DM/MC AL 30 DE SETIEMBRE 2024		DIFERENCIA/ OBSERVACION
			Avance Financiero	Avance Físico	Avance Financiero	Avance Físico	
Mejoramiento y ampliación de los Servicios públicos para el desarrollo productivo local en el ámbito de la sierra y selva del Perú” - Avanzar Rural. (*) CUI 2471146	MIDAGRI AGRORURAL	251,666,743	64.9%	62.6%	80.7%	79.5%	EN EJECUCIÓN Demora en atención a solicitud de desembolso por parte del ente cooperante - FIDA
Mejoramiento del servicio de control de disturbios civiles a Nivel Nacional. (*) CUI 2251056	MINISTERIO DEL INTERIOR - OGA	697,885,029	13.0%	16.4%	14.1%	12.3%	PROYECTO NACIONAL Proceso de selección para la adquisición de bienes: Mochila táctica (1,099 unidades), Vara rígida (3,795 unidades) y correa (3,795 unidades).
Creación de un sistema de mensajería de alerta temprana a nivel nacional. (*) CUI 2381444	MTC - AG	31,826,116	99.7%	82.5%	99.1%	99.7%	Que Everbridge no haya subsanado las observaciones presentadas y/o que demore en la subsanación de observaciones que persisten, lo cual generaría atrasos para el cierre del proyecto. Asimismo, en caso no haya sido subsanadas las observaciones de las pruebas, se tendrían que volver a realizar dichas pruebas. Este escenario también podría afectar el cronograma.

CUADRO N° 44 COMPARATIVO AVANCE DE EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION DEPARTAMENTO DE JUNIN

Fuente: INFORME N° 000092-2024-OINV/MC e Informe N° 004-2024-UAPI-PEB-JPO/MC y el OFICIO N° 001899-2024-DM/MC

(*) Información omitida, ubicada en el Anexo denominado Lista de Proyectos por Departamento.

Elaboración: Comisión Especial Multipartidaria del Bicentenario de la Independencia del Perú



➤ **PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE
AYACUCHO**

En este segundo trimestre del 2024 se ha continuado con el seguimiento de los proyectos por departamento, priorizando el seguimiento de los proyectos que corresponde al departamento de Ayacucho, en primer lugar realizando un análisis comparativo, tomando como base la información general que nos remitiera el Ministerio de Cultura, contenidos en el Informe N° 000007-2023-UAPI-WAC-PEB/MC (estado situacional de la obras actualizado hasta el 30 de abril del 2023) y MEMORANDO N° 000313-2023-PEB/MC (estado situacional de la obras actualizado hasta el 30 de setiembre del 2023), sin considerar los proyectos culminados, se identifica 8 proyectos que corresponden al departamento de Ayacucho y 5 proyectos multidepartamentales que incluye al citado departamento, conforme al cuadro comparativo del avance de ejecución de los proyectos de inversión y otras modalidades en el departamento de Ayacucho, comparación del avance físico y financiero y el estado situacional, en este caso al 30 de setiembre del 2023, que nuestra comisión ha elaborado conforme al siguiente detalle:



COMPARATIVO AVANCE DE EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

PROYECTO DE INVERSION CUI	UNIDAD EJECUTORA	COSTO Actualizado	Informe N° 000007-2023- UAPI-WAC-PEB/MC AL 30 DE ABRIL 2023		Memorando N° 000313-2023- PEB/MC AL 30 DE SETIEMBRE 2023		ESTADO
			Avance Financiero	Avance Físico	Avance Financiero	Avance Físico	
Reparación de edificación y obras exteriores; construcción de baño o servicios sanitarios; adquisición de museografía; en el(la) monumento conmemorativo de la batalla de Ayacucho (obelisco), distrito de Quinua, provincia Huamanga, departamento Ayacucho CUI 2456689	UNIDAD EJECUTORA 008: MC-PROYECTOS ESPECIALES	5,277,364	11,7%	0%	50.3% 12.0%	50.3% 12.0%	[30/09/2023] la obra está en ejecución sin problemas a la fecha.
Creación de los servicios culturales a través del parque cultural bicentenario Región Ayacucho, provincia de Huamanga - departamento de Ayacucho (*) CUI 2499997	UNIDAD EJECUTORA 008: MC-PROYECTOS ESPECIALES	30,006,600	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	[30/09/2023] Se ha realizado la visita técnica a Ayacucho para verificar los documentos de sostenibilidad, entre ellos el saneamiento físico legal..
Mejoramiento de la conservación del patrimonio cultural del sitio arqueológico de Wari, Huamanga – Ayacucho CUI 2230368	GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO	9,871,151	50.9%	51.5%	50.9%	51.5%	[15/09/2023] Proyecto culminado (liquidación FÍSICA y financiera primera etapa por el Gore Ayacucho), para iniciar con el segundo tramo MINCUL requiere documentación de dicha liquidación.





Ampliación de la presa ancascocha y afianzamiento del valle de Yauca (Ayacucho y Arequipa) CUI 2077939	REGION AYACUCHO - PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL INTEGRADO (PRIDER)	183,824,748	35,5%	22,1%	37,3%	25,7%	[13/08/2023] Se ha ejecutado limpieza y desbroce movimiento de tierras, en material suelta, roca suelta y roca fija, eliminación del material excedente, perfilado y compactado, obras de drenaje con tubería etc.
Mejoramiento y ampliación el servicio de agua para riego en la zona de Esmeralda Alta, del Distrito de Luricocha y Distrito de Huanta - Provincia de Huanta -Departamento de Ayacucho CUI 2332660	REGION AYACUCHO - PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL INTEGRADO (PRIDER)	114,382,337	1,0%	0,0%	5,5%	0,9%	[14/08/2023] En ejecución, se continúan con los trabajos para los canales de riego Yungayllo Pahuanacucho, Tomapata - Silveracucho, Opanccay y Huancayocc - Huamanccacca.
MEJORAMIENTO SISTEMA ELECTRICO RURAL CORACORA EN 22,9KV CUI 2445243	DIRECCIÓN DE PROYECTOS - DIRECCIÓN GENERAL DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS – DGER/MEM	19,713,515	0,0%	61%			
Mejoramiento y ampliación de los servicios del santuario de la memoria la Hoyada en el distrito de Andrés Avelino Cáceres - Provincia de Huamanga - Ayacucho. CUI 2449300	GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO	39,359,919	20,6%	3,6%	36,7%	36,7%	[15/09/2023] La obra viene siendo ejecutado. hay un déficit de ejecución física de obra por la mala elaboración del expediente técnico, los cuales contemplan restricciones de áreas del terreno, planos mal diseñados y falta de aprobación de los distintos insumos requeridos





Mejoramiento de la capacidad resolutive del hospital San Miguel, segundo nivel de atención, La Mar – Ayacucho CUI 2194682	GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO	106,391,302	94,1%	90%	95.7%	90.0%	[06/07/2023] A la fecha la obra se encuentra en ejecución, los avances de las partidas Estructuras, avance acumulado 99.993%, Arquitectura, avance acumulado 97.142%, Instalaciones Sanitarias, avance acumulado 99.188%, instalaciones eléctricas y comunicaciones, avance acumulado 88.337%, instalaciones mecánicas, avance acumulado 97.069% y equipamiento, avance acumulado 85.096%.
--	-------------------------------	-------------	-------	-----	-------	-------	---

PROYECTOS MULTIDEPARTAMENTALES

PROYECTO DE INVERSION CUI	UNIDAD EJECUTORA	COSTO Actualizado	Informe N° 000007-2023- UAPI-WAC-PEB/MC AL 30 DE ABRIL 2023		Memorando N° 000313-2023- PEB/MC AL 30 DE SETIEMBRE 2023		DIFERENCIA/ OBSERVACION
			Avance Financiero	Avance Físico	Avance Financiero	Avance Físico	
Mejoramiento y ampliación de los Servicios públicos para el desarrollo productivo local en el ámbito de la sierra y selva del Perú” - Avanzar Rural CUI 2471146	MIDAGRI AGRORURAL	241,237,802	50.3%	44.9%	63.5%	58.6%	11/09/2023 En ejecución al 60.57% sin problemas en la ejecución





Mejoramiento de la disponibilidad, acceso y uso de semillas de calidad de: papa, maíz amiláceo, leguminosas de grano y cereales, en las regiones de Junín, Ayacucho, Cusco y Puno. 4 departamentos CUI 2361771	MIDAGRI - INIA	116,453,930	20.6%	19.8%	26.6%	24.3%	04/09/2023 El proyecto de inversión tiene como presupuesto 2023, para el desarrollo de sus actividades en los 04 componentes: producción de semillas, generación de cultivares regionales de especies altoandinas; infraestructura para producción entre otros.
Mejoramiento del servicio de control de disturbios civiles a Nivel Nacional CUI 2251056	MINISTERIO DEL INTERIOR - OGA	611,875,956	14.3%	16.4%	14.4%	16.4%	30/05/2023 Minibuses: Contrato N° 075-2019-IN-OGAF (22/11/2019) Cancelación De Contrato 18 Unid y Adicional 04 Unid de un total de 63 unidades
Creación de un sistema de mensajería de alerta temprana a nivel nacional CUI 2381444	MTC - AG	31,653,237	82.8%	82.5%	99.7%	82.5%	06/09/2023 A través de Oficio N° 1069-2023-MTC/27, el MTC al INDECI, reitera suscripción de convenios para uso de infraestructura y utilización de equipos dada la inminente puesta en funcionamiento del proyecto "Creación de un Sistema de Mensajería de Alerta Temprana a nivel Nacional (SISMATE)
Masificación de Gas Natural - distribución de gas natural por red de ductos en las regiones de Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Junín, Cusco, Puno y Ucayali S/CUI	MEM (APP)	200,000,000	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	Proyecto que cambio de modalidad de ejecución, el cual se encuentra en su etapa de priorización

CUADRO N° 46 COMPARATIVO AVANCE DE EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

Fuente: Informe N° 000007-2023-UAPI-WAC-PEB/MC y MEMORANDO N° 000313-2023-PEB/MC.

Elaboración: Comisión Especial Multipartidaria del Bicentenario de la Independencia del Perú



En el cuadro 46, se hace un comparativo del avance de la ejecución de los proyectos de inversión en el departamento de Ayacucho, tomando en cuenta la información brindada por el Ministerio de Cultura y con la finalidad de corroborar dicha información y tenerla actualizada, en su oportunidad se solicitó información al Gobierno Regional de Ayacucho, que como unidad ejecutora tiene a su cargo 5 proyectos de inversión y respecto a los 3 proyectos restantes, al haberse recepcionado con fecha 6 de mayo del 2024 del Ministerio de Cultura, el OFICIO N° 000422-2024-DM/MC, adjunto al cual se nos remitió el INFORME N° 000092-2024-OINV/MC elaborado por la Oficina de Inversiones de la Unidad Ejecutora 008: MC Proyectos Especiales y el Informe N° 004-2024-UAPI-PEB-JPO/MC, elaborado por el Proyecto Especial Bicentenario, brindándonos información actualizada al 14 de febrero del 2024, en donde contiene información de la UNIDAD EJECUTORA 008: MC-PROYECTOS ESPECIALES; en tal sentido, consideramos que no era necesario por el momento requerir información respecto a 2 proyectos a cargo de dicha unidad ejecutora; y respecto a los proyectos multidepartamentales, tratándose de los mismos proyectos que corresponden al departamento de Junín, la información solicitada respecto a dicho departamento también nos sirve para los fines del análisis que estamos realizando respecto al departamento de Ayacucho.

N°	OFICIOS	FECHA	ENTIDAD	ASUNTO
1	N° 350-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	16/04/2024	Gobierno Regional de Ayacucho	Solicitud de Información, sobre 5 proyectos de inversión del departamento de Ayacucho
2	N° 310-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	09/02/2024	Ministra de Desarrollo Agrario y Riego	Solicitud de Información, parte referida a los proyectos MULTIDEPARTAMENTALES
5	N° 314-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	09/02/2024	Ministro de Transportes y Comunicaciones	Solicitud de Información, parte referida a los proyectos MULTIDEPARTAMENTALES
6	N° 315-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	09/02/2024	Ministro del Interior	Solicitud de Información, parte referida a los proyectos MULTIDEPARTAMENTALES
7	N° 316-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	09/02/2024	Ministro de Energía y Minas	Solicitud de Información, parte referida a los proyectos MULTIDEPARTAMENTALES

CUADRO N° 47 DETALLE DE OFICIOS REQUIRIENDO INFORMACION A LAS UNIDADES EJECUTORAS DE PROYECTOS DE INVERSION EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

Fuente: Informe N° 000007-2023-UAPI-WAC-PEB/MC y MEMORANDO N° 000313-2023-PEB/MC.

Elaboración: Comisión Especial Multipartidaria del Bicentenario de la Independencia del Perú

COMPARATIVO AVANCE DE EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

PROYECTO DE INVERSION CUI	UNIDAD EJECUTORA	COSTO Actualizado	Memorando N° 000313- 2023-PEB/MC AL 30 DE SETIEMBRE 2023		INFORME N° 000092-2024- OINV/MC Informe N° 004-2024-UAPI- PEB-JPO/MC AL 14 DE FEBRERO 2024		ESTADO
			Avance Financiero	Avance Físico	Avance Financiero	Avance Físico	
Reparación de edificación y obras exteriores; construcción de baño o servicios sanitarios; adquisición de museografía; en el(la) monumento conmemorativo de la batalla de Ayacucho (obelisco), distrito de Quinua, provincia Huamanga, departamento Ayacucho CUI 2456689	UNIDAD EJECUTORA 008: MC-PROYECTOS ESPECIALES	6,208,859	50.3%	12.0%	73.5%	75.9%	[30/09/2023] La obra está en ejecución sin problemas a la fecha
Creación de los servicios culturales a través del parque cultural bicentenario Región Ayacucho, provincia de Huamanga - departamento de Ayacucho (*) CUI 2499997	UNIDAD EJECUTORA 008: MC-PROYECTOS ESPECIALES	30,006,600	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	Los estudios de preinversión de los siguientes proyectos de PCB se actualizarán durante el segundo semestre del 2024
Mejoramiento de la conservación del patrimonio cultural del sitio arqueológico de Wari, Huamanga – Ayacucho CUI 2230368	GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO	9,871,151.4	50.9%	51.5%	52.2 %		Actualmente, se encuentra en proceso de saneamiento físico legal del terreno, el cual se estima culminar en el segundo trimestre del 2024. Simultáneamente, la Unidad Ejecutora 008 Proyectos Especiales viene solicitando al Gobierno Regional de Ayacucho, de manera reiterativa, los documentos que sustenten la liquidación técnico financiera de los años





							del 2014 al 2016 con la finalidad de elaborar el expediente técnico de saldo de obra (Oficio N° 000034-2024-J-UE008/MC del 19 de enero de 2024). Finalmente, se debe puntualizar que, en tanto no se remita el expediente de liquidación de obra, no se podrán gestionar los recursos como demanda adicional para el presente ejercicio presupuestal.
Ampliación de la presa ancascocha y afianzamiento del valle de Yauca (Ayacucho y Arequipa) CUI 2077939	REGION AYACUCHO - PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL INTEGRADO (PRIDER)	183,824,748	37.3%	25.7%	39.0%	25.7%	[16/01/2024] En ejecución A DICIEMBRE DEL 2023 a. Avance valorizado programado acumulado en montos: (S/. 52,759,345.74) b. Avance físico programado acumulado en porcentajes: (28.70%) c. Avance valorizado real acumulado en montos: (S/. 46,855,638.10) d. Avance físico real acumulado en porcentajes: (25.49%)
Mejoramiento y ampliación el servicio de agua para riego en la zona de Esmeralda Alta, del Distrito de Luricocha y Distrito de Huanta - Provincia de Huanta -Departamento de Ayacucho CUI 2332660	REGION AYACUCHO - PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL INTEGRADO (PRIDER)	114,382,337	5.5%	0.9%	10.0%	5.0%	[11/01/2024] El Avance Físico DEL MES DE DICIEMBRE del Proyecto del Presupuesto Base de Ejecución (CD+GG) es de 1.41 %, con monto de S/. 661,134.94 y un acumulado de 11.64 %, con monto de S/. 5,444,017.53. correspondiente a modalidad de ejecución por ADMINISTRACION DIRECTA y a nivel presupuesto de EXPEDIENTE TÉCNICO de S/ 114,382,336.54 se tiene el avance físico del mes de 0.60% equivalente a un monto de S/. 680,968.99 y un acumulado de S/ 5,607,338.05 equivalente a 4.90 % del Expediente Técnico de ejecución.





MEJORAMIENTO SISTEMA ELECTRICO RURAL CORACORA EN 22,9KV CUI 2445243	DIRECCIÓN DE PROYECTOS - DIRECCIÓN GENERAL DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS – DGER/MEM	19,713,515					
Mejoramiento y ampliación de los servicios del santuario de la memoria la Hoyada en el distrito de Andrés Avelino Cáceres - Provincia de Huamanga - Ayacucho. CUI 2449300	GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO	39,359,919	36.7%	36.7%	46.9%	29.6%	[03/01/2024] El Avance Ejecutado Acumulado hasta la fecha de 31 de diciembre del 2023 es de 30.28% mientras que el avance programado acumulado es de 73.26% con respecto al presupuesto total con un monto de S/. 39'359,918.61 soles, La obra se encuentra RETRASADO según cronograma programado del proyecto. Este retraso en la ejecución de obra es consecuencia de falta de especialistas ya que existe incompatibilidad entre planos, EETT, metrados, diseños y entre otros, asimismo la falta de insumos de primera instancia como el cemento y acero. de igual forma por la implementación del PEA y áreas invasadas.





Mejoramiento de la capacidad resolutive del hospital San Miguel, segundo nivel de atención, La Mar – Ayacucho CUI 2194682	GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO	114,116,728	95.7%	90.0%	97.6%	96.9%	[06/07/2023] A la fecha la obra se encuentra en ejecución, los avances de las partidas Estructuras, avance acumulado 99.993%, Arquitectura, avance acumulado 97.142%, Instalaciones Sanitarias, avance acumulado 99.188%, instalaciones eléctricas y comunicaciones, avance acumulado 88.337%, instalaciones mecánicas, avance acumulado 97.069% y equipamiento, avance acumulado 85.096%.
--	----------------------------------	-------------	-------	-------	-------	-------	---

PROYECTOS MULTIDEPARTAMENTALES

PROYECTO DE INVERSION CUI	UNIDAD EJECUTORA	COSTO Actualizado	Memorando N° 000313- 2023-PEB/MC AL 30 DE SETIEMBRE 2023		INFORME N° 000092-2024- OINV/MC Informe N° 004-2024-UAPI- PEB-JPO/MC AL 14 DE FEBRERO 2024		DIFERENCIA/ OBSERVACION
			Avance Financiero	Avance Físico	Avance Financiero	Avance Físico	
Mejoramiento y ampliación de los Servicios públicos para el desarrollo productivo local en el ámbito de la sierra y selva del Perú” - Avanzar Rural CUI 2471146	MIDAGRI AGRORURAL	241,237,802	63.5%	58.6%	64.9%	62.6%	[12/01/2024] EN EJECUCIÓN AL 64.35% SIN PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN
Mejoramiento de la disponibilidad, acceso y uso de semillas de calidad de: papa, maíz amiláceo, leguminosas de grano y cereales, en las regiones de Junín, Ayacucho, Cusco y Puno. 4 departamentos	MIDAGRI - INIA	116,453,930	26.6%	24.3%	34.2%	33.7%	[06/02/2024] EL PROYECTO DE INVERSIÓN TIENE COMO PRESUPUESTO 2024 EL MONTO DE S/ 18,111,369.00, PARA EL DESARROLLO DE SUS





CUI 2361771							ACTIVIDADES EN LOS 04 COMPONENTES. C1: MEJORA DE LA DISPONIBILIDAD DE TECNOLOGIA PARA PRODUCCION DE SEMILLAS DE CALIDAD, C2: FORTALECIDA CAPACIDAD TÉCNICA OPERATIVA PARA LA PRODUCCIÓN DE SEMILLAS DE CALIDAD, C3: MEJORA DE CAPACIDADES DE GESTIÓN Y PROMOCIÓN PARA EL USO DE SEMILLAS DE CALIDAD. C4 FORTALECIDAS CAPACIDADES DE LOS ACTORES DEL SISTEMA DE SEMILLAS DE CALIDAD Y GESTION DEL PROYECTO. RESPECTO A LA EJECUCIÓN FÍSICA PRESENTA UN AVANCE DE 33.69% Y LA EJECUCIÓN FINANCIERA 34.61%. DURANTE EL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO SE CONTINUÓ CON LA EJECUCION DE OBRAS y SERVICIOS RELACIONADAS A CONSTRUCCION, ACONDICIONAMIENTO Y REHABILITACION DE ALMACENES DE SEMILLAS Y AMBIENTES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA EN EL AMBITO DE LAS EEa AREQUIPA, CANAÁN, Y ANDENES.
-------------	--	--	--	--	--	--	---





Mejoramiento del servicio de control de disturbios civiles a Nivel Nacional CUI 2251056	MINISTERIO DEL INTERIOR - OGA	611,875,956	14.4%	16.4%	13.0%	16.4%	[30/05/2023] Minibuses: Contrato N° 075-2019-In-Ogaf (22/11/2019) Cancelación De Contrato 18 Unid Y Adicional 04 Unid de un total de 63 unidades
Creación de un sistema de mensajería de alerta temprana a nivel nacional CUI 2381444	MTC - AG	31,653,237	99.7%	82.5%	99.7%	82.5%	[13/10/2023] En el mes de setiembre, mediante el Informe N° 0414-2023-MTC/27.01 ((I- 464177-2023) se ha solicitado la contratación del servicio legal-contractual para evaluar los alcances, condiciones y obligaciones pactadas en el Contrato N° 104-2019-MTC/10.02 “Adquisición del proyecto creación de un sistema de mensajería de alerta temprana a nivel nacional (SISMATE)”. Los mismos que van permitir verificar el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones contractuales pactadas, así como absolver las consultas a fin de otorgar la conformidad final a la implementación y Puesta en Funcionamiento del SISMATE.
Masificación de Gas Natural - distribución de gas natural por red de ductos en las regiones de Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Junín, Cusco, Puno y Ucayali S/CUI	MEM (APP)	200,000,000	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	Proyecto que cambio de modalidad de ejecución, el cual se encuentra en su etapa de priorización

CUADRO N° 48 COMPARATIVO AVANCE DE EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
Fuente: MEMORANDO N° 000313-2023-PEB/MC y el INFORME N° 000092-2024-OINV/MC e Informe N° 004-2024-UAPI-PEB-JPO/MC.
Elaboración: Comisión Especial Multipartidaria del Bicentenario de la Independencia del Perú



Luego del requerimiento de información, hasta la fecha se ha recepcionado del Gobierno Regional de Ayacucho información parcial, estamos a la espera de la información solicitada, que nos permita realizar el análisis comparativo correspondiente entre la información del Ministerio de Cultura y la información brindada por cada Unidad Ejecutora, la información recepcionada hasta la fecha es la siguiente:

Nº	OFICIOS	FECHA	ENTIDAD	OFICIO DE RESPUESTA	PROYECTO DE INVERSION
1	Nº 350-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	16/04/2024	Gobierno Regional de Ayacucho	Nº 592-2024-GRA/GR.GG. 21/05/2024	Mejoramiento de la capacidad resolutive del hospital San Miguel, segundo nivel de atención, La Mar – Ayacucho CUI 2194682
2	Nº 350-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	16/04/2024	Gobierno Regional de Ayacucho	Nº 681-2024-GRA/GG-GRD-DIRCETUR-DR-DT.. 26/04/2024	Mejoramiento de la conservación del patrimonio cultural del sitio arqueológico de Wari, Huamanga – Ayacucho CUI 2230368

CUADRO Nº 49 DETALLE DE INFORMACION RECEPCIONADA DE LAS UNIDADES EJECUTORAS DE PROYECTOS DE INVERSION EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

Elaboración: Comisión Especial Multipartidaria del Bicentenario de la Independencia del Perú

Continuando con el seguimiento de los proyectos de inversión del departamento de Ayacucho que forman parte de la Agenda del Bicentenario y recepcionada la información requerida por nuestra comisión mediante el Oficio Nº 050-2024-2025-LVOM-CEMBI/CR (02/10/2024), en cuyos oficios en el punto 10 requerimos información sobre los proyectos de inversión que corresponden al departamento de Ayacucho, y que fuera atendido por el Ministerio de Cultura mediante y proyectos de inversión multidepartamental que comprenden a dicho departamento OFICIO Nº 001899-2024-DM/MC, de fecha 27 de diciembre del 2024, brindándonos información actualizada al 30 de setiembre del 2024, que consolidamos en un cuadro comparativo de los avances de la ejecución de los proyectos de inversión del departamento de Ayacucho.

COMPARATIVO AVANCE DE EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

PROYECTO DE INVERSION CUI	UNIDAD EJECUTORA	COSTO Actualizado	INFORME N° 000092- 2024-OINV/MC Informe N° 004-2024- UAPI-PEB-JPO/MC AL 14 DE FEBRERO 2024		OFICIO N° 001899-2024- DM/MC AL 30 DE SETIEMBRE 2024		ESTADO
			Avance Financiero	Avance Físico	Avance Financiero	Avance Físico	
Reparación de edificación y obras exteriores; construcción de baño o servicios sanitarios; adquisición de museografía; en el(la) monumento conmemorativo de la batalla de Ayacucho (obelisco), distrito de Quinua, provincia Huamanga, departamento Ayacucho CUI 2456689	UNIDAD EJECUTORA 008: MC-PROYECTOS ESPECIALES	6,208,858	73.5%	75.9%	79.2 %	94.25%	• Obra culminada (06.01.2024) • Museografía culminada (07.07.2024) • Componente de conservación en ejecución Estado Actual: • El componente de infraestructura se encuentra en proceso de liquidación. • La museografía se culminó el 07.07.2024 • El componente de conservación se encuentra en ejecución. Se viene desarrollando el estudio de calas estratigráficas (para determinar las capas pictóricas de las esculturas) para iniciar con la intervención en el bien mueble. • Respecto al expediente de suministro eléctrico, el contratista responsable de su elaboración se encuentra en coordinación con la empresa eléctrica para su aprobación. • Con respecto a la placa de conmemoración de la embajada de Ucrania, se está elaborando propuesta para ser validada por la DDC Ayacucho.



Creación de los servicios culturales a través del parque cultural bicentenario Región Ayacucho, provincia de Huamanga - departamento de Ayacucho CUI 2499997	UNIDAD EJECUTORA 008: MC-PROYECTOS ESPECIALES	30,006,600	0.0%	0.0%	0 %	0.0%	Viable Está a cargo del Gobierno Regional de Ayacucho (es el responsable de la elaboración del expediente técnico/documento equivalente y la ejecución física del proyecto). Estado actual: • De conformidad a las coordinaciones con los involucrados en el proyecto, el 06 de marzo del presente año se realizó el cambio de unidad ejecutora al Gobierno Regional de Ayacucho, considerando a la entidad regional como coejecutora del proyecto. • El 11.09.2024 se suscribió el Convenio Específico N°002-2024-UE008-MC entre el Ministerio de Cultura, el Gobierno Regional de Ayacucho, la Municipalidad Provincial de Huamanga, la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista y la Municipalidad Distrital de Carmen Alto, con el objeto de establecer mecanismos de colaboración para la fase de ejecución del proyecto (elaboración del expediente técnico y ejecución física).
Mejoramiento de la conservación del patrimonio cultural del sitio arqueológico de Wari, Huamanga – Ayacucho CUI 2230368	GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO	9,871,151.4	52.2 %		52.2 %	0.00 %	En ejecución física Estado actual: • El 02.09.2024 se aprobó el expediente técnico (memorias descriptivas, fichas técnicas y planos) del Complejo Arqueológico Monumental Huari Sector B1 y Sector B2 y el expediente de declaratoria (Resolución Viceministerial N° 000257-2024- VMPCIC/MC). • Se dispuso la primera inscripción de dominio respecto a las áreas sin antecedentes registrales a favor del Estado, representado por el Ministerio de Cultura, en el Registro de Predios de la Oficina Registral de Ayacucho y en el Sistema de Información Nacional de Bienes Estatales (SINABIP), así como de la condición de Patrimonio Cultural de la Nación del Complejo Arqueológico Monumental Huari Sector B1 y Sector B2. • Paralelamente, la Unidad Ejecutora 008 Proyectos Especiales viene





							solicitando al Gobierno Regional de Ayacucho reiteradamente los documentos que sustenten la liquidación técnico financiera de los años 2014 a 2016, con la finalidad de elaborar el expediente técnico de saldo de obra (Oficio N° 000034-2024-J-UE008/MC del 19 de enero de 2024). En tanto no se remita el expediente de liquidación de obra, no se podrá elaborar el expediente de saldo de obra y posteriormente gestionar los recursos como demanda adicional.
Ampliación de la presa ancascocha y afianzamiento del valle de Yauca (Ayacucho y Arequipa) CUI 2077939	REGION AYACUCHO - PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL INTEGRADO (PRIDER)	188,782,014	39.0%	25.7%	41.0%	24.4%	En ejecución En ejecución física a agosto del 2024 según el detalle: la inversión está afectado a asignación presupuestal, con oficio N° 1198-2024-GRA/GR se solicita la demanda adicional por el monto de S/4,787,489.00 debidamente justificado de ACUERDO al artículo N° 37 de la directiva N° 0001-2024-EF/50.01
Mejoramiento y ampliación el servicio de agua para riego en la zona de Esmeralda Alta, del Distrito de Luricocha y Distrito de Huanta - Provincia de Huanta - Departamento de Ayacucho CUI 2332660	REGION AYACUCHO - PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL INTEGRADO (PRIDER)	114,382,337	10.0%	5.0%	17.8%	9.1%	En ejecución al mes de agosto, según detalle: se viene solicitando la habilitación presupuestaria al GRA por el monto de S/ 2,500,000.00 soles. con oficio N° 1192- 2024-GRA/GR se solicita la demanda adicional al sector
Programa de electrificación rural en las localidades de Ayacucho. (Coracora, Huanta) 03 PIP	<i>DIRECCIÓN DE PROYECTOS - DIRECCIÓN GENERAL DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS – DGER/MEM</i>	26,898,273			94%	100%	Obra culminada en funcionamiento



Mejoramiento y ampliación de los servicios del santuario de la memoria la Hoyada en el distrito de Andrés Avelino Cáceres - Provincia de Huamanga - Ayacucho. CUI 2449300	GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO	42,744,054	46.9%	29.6%	54.0%	37.4%	En ejecución. El proyecto se encuentra suspendido temporalmente desde el 01 de junio de 2024; por falta de liquidez financiero, la misma que se está solicitando la DA
Mejoramiento de la capacidad resolutive del hospital San Miguel, segundo nivel de atención, La Mar – Ayacucho CUI 2194682	GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO	114,116,728	97.6%	96.9%	95.6%	97.3%	En ejecución (obra terminada en proceso de recepción) Obras en fase de culminación, con Riesgo de encontrar observaciones en el proceso de recepción de obra
Ampliación y mejoramiento de los servicios turísticos públicos en el pueblo de Quinua, distrito de Quinua, Provincia de Huamanga, Región Ayacucho - Componente Casa de la Capitulación CUI 2189844	PLAN COPESCO NACIONAL	26,204,762			97.3%	99.2%	Obra culminada en funcionamiento
Mejoramiento de la capacidad resolutive del Hospital Regional Miguel Ángel Mariscal Llerena de Ayacucho CUI 2165166	GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO	479,749,185			96.7%	93.3%	Obra culminada en funcionamiento

CUADRO N° 50 COMPARATIVO AVANCE DE EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

Fuente: INFORME N° 000092-2024-OINV/MC e Informe N° 004-2024-UAPI-PEB-JPO/MC y OFICIO N° 001899-2024-DM/MC

Elaboración: Comisión Especial Multipartidaria del Bicentenario de la Independencia del Perú

Respecto a los proyectos de inversión multidepartamental que comprenden a dicho departamento, esta comprendido en la información respecto al departamento9 de Junín



SEGUIMIENTO ESPECIAL Y ESPECÍFICO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN POR SECTOR

La Agenda de Conmemoración del Bicentenario de la Independencia del Perú, cuya segunda actualización fuera aprobada mediante Decreto Supremo N° 011-2021-MC, comprende un listado total de 302 obras emblemáticas de 15 sectores del ejecutivo (254 proyectos de inversión pública, 17 obras por impuestos y 31 proyectos bajo otras modalidades: Asociación Público Privadas – APP y Proyectos en Activos - PA) distribuidas en todas las regiones del país, conforme lo detallamos en el siguiente cuadro:

Sector	Proyectos de Inversión Pública	Obras por Impuesto	Proyectos bajo otras modalidades de inversión
Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego	29	-	-
Ministerio del Ambiente	12	-	-
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo	13	-	2
Ministerio de Cultura	22	-	-
Ministerio de Defensa	1	-	-
Ministerio de Economía y Finanzas - OSCE	1	-	-
Ministerio de Educación	88	14	-
Ministerio de Energía y Minas	1	-	1
Ministerio del Interior	6	-	-
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	1	-	-
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables - CONADIS	1	-	-
Ministerio de la Producción	12	-	1
Ministerio de Salud	30	-	-
Ministerio de Transportes y Comunicaciones	18	-	27
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento	19	3	-
TOTAL	254	17	31

CUADRO N° 51 PROYECTOS POR SECTORES A NIVEL NACIONAL
Decreto Supremo N° 011-2021-MC



MINISTERIO DE EDUCACION

Conforme a la Agenda de Conmemoración del Bicentenario de la Independencia del Perú, de las 302 obras emblemáticas vinculadas al cierre de brechas sociales y recuperación de sitios históricos, al sector educación le corresponde 102 obras, de los cuales 88 son proyectos de inversión pública y 14 proyectos en la modalidad de obras por impuestos, a cargo de las siguientes unidades ejecutoras adscritas a dicho sector:

MINISTERIO DE EDUCACION			
UNIDAD EJECUTORA	PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	OBRAS POR IMPUESTOS	TOTAL
UEI 125: PROYECTO ESPECIAL DEL INVERSIÓN PÚBLICA ESCUELAS BICENTENARIO	75		75
UE N° 118: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN BÁSICA Y SUPERIOR	07		07
PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED	06	14	20
TOTAL	88	14	102

CUADRO N° 52 PROYECTOS SECTOR EDUCACION

Elaboración: Comisión Especial Multipartidaria del Bicentenario de la Independencia del Perú

Como resultado del seguimiento de la Agenda del Bicentenario y tomado en cuenta la información con la que se contaba y que nos remitiera el Ministerio de Cultura mediante Oficio N° 000949-2023-SG/MC, información actualizada al 30 de setiembre del 2023, cumpliendo nuestra labor de seguimiento y fiscalización mediante Oficio N° 0330-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR, de fecha 20 de febrero de 2024, y Oficio N° 0351-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR, del 17 de abril de 2024, solicitamos al Ministerio de Educación información actualizada sobre el estado situacional de las obras a cargo de las unidades ejecutoras adscritas al Ministerio de Educación, requerimiento de información que fuera atendido parcialmente por dicho sector con fecha 25 de marzo de 2024, mediante Oficio N° 631-2024-MINEDU/DM, al cual adjuntó el OFICIO N° 00184-2024-MINEDU/VMGI/PEIP-EB/DIEJE y el OFICIO N° 00263-2024-MINEDU/VMGP/UE.118, de la Dirección Ejecutiva del Proyecto Especial de Inversión Pública Escuelas Bicentenario y del responsable de la Unidad Ejecutora 118 Mejoramiento de la Calidad de la Educación Básica y Superior, respectivamente, nos remitió la información

solicitada sobre el estado situacional de los proyectos de inversión a cargo de dichas unidades ejecutoras, conforme al siguiente detalle:

- ❖ Respecto a los 75 Proyectos de Inversión a cargo de la UEI 125: PROYECTO ESPECIAL DEL INVERSIÓN PÚBLICA ESCUELAS BICENTENARIO, nos remitieron el OFICIO N° 00184-2024-MINEDU/VMGI/PEIP-EB/DIEJE de la Dirección Ejecutiva del Proyecto Especial de Inversión Pública Escuelas Bicentenario, al cual adjuntan el INFORME N° 00340-2024-MINEDU/VMGI/PEIP-EB/DIE emitido el 13 de marzo del 2024 por la Dirección de Infraestructura Educativa del PEIP EB, con el cual atienden nuestro requerimiento de información sobre el estado situacional de los 75 Proyectos de Inversión (59 ubicados en Lima Metropolitana y 16 ubicados en los departamentos de Cajamarca, Lambayeque, Puno, Lima Provincias, Junín, La Libertad, Cuzco, Ucayali y la Provincia Constitucional del Callao), proyectos que se encuentran agrupados en 09 paquetes (del 00 al 08), brindándonos información por cada paquete de manera independiente, contenida en el siguiente enlace :

https://drive.google.com/drive/folders/1FZfj8Y-62s3hUrV_Pl0CsN-49FQDMsn?usp=sharing

Asimismo, respecto a las acciones de control realizadas por la Contraloría General de la República al PEIP EB, nos remiten la información relacionada a las situaciones adversas identificadas, contenidas en el siguiente enlace:

<https://drive.google.com/drive/folders/1ZtCYc9ugcwiBD1p5oXKKQO84i3fMmKU?usp=sharing>

- ❖ Respecto a los siete (07) proyectos que tienen como Unidad Ejecutora a la UE N° 118: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN BÁSICA Y SUPERIOR, nos remitieron el OFICIO N° 00263-2024-MINEDU/VMGP/UE.118 de fecha 12 de marzo del 2024, con el cual, atienden nuestro requerimiento de información sobre el estado situacional de los siete (07) proyectos de inversión a cargo de la citada unidad ejecutora.

- ❖ Respecto a los siete (06) proyectos de inversión y los 14 Proyectos de Inversión, bajo la modalidad de Obras por Impuestos, ubicados en los departamentos de Ica, Tacna, 2 Moquegua, 5 Ancash y 5 Piura, a cargo del PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – PRONIED, información que fuera requerida mediante Oficio N° 0330-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR y reiterado con Oficio N° 0351-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR, en los puntos 2 y 3, respectivamente, pese haber recibido del citado ministerio el Oficio N° 631-2024-MINEDU/DM, el Oficio N° 866-2024-MINEDU/DM y el Oficio N° 1237-2024-MINEDU/DM, con el cual adjuntaron el Oficio N° 00532-2024-MINEDU/VMGP/UE.118, sobre este extremo no fue atendido.

Continuando con el seguimiento de los proyectos a cargo del Ministerio de Educación, con fecha 6 de mayo de 2024 mediante Oficio N° 0369-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR, invitamos al Ministro de Educación a informar en la Tercera Sesión Extraordinaria de nuestra comisión, si bien es cierto no se concretizó dicho informe, pero parte de los temas propuestos fueron absueltos mediante Oficio N° 1237-2024-MINEDU/DM, de fecha 12 de junio, adjuntando el Oficio N° 00532-2024-MINEDU/VMGP/UE.118, emitido por la Unidad Ejecutora 118: Mejoramiento de la Calidad de la Educación Básica y Superior del Ministerio de Educación, con el cual atienden nuestro requerimiento de información sobre los 07 proyectos a su cargo y también sobre el estado el estado situacional de los Informes de Hitos de Control

Continuando con el seguimiento de los proyectos a cargo del Ministerio de Educación, y con la finalidad de contar con información actualizada para desarrollar nuestro trabajo, con fecha 18 de setiembre de 2024 mediante Oficio N° 049-2024-2025-LVOM-CEMBI/CR, solicitamos información a dicho sector, sobre el estado situacional de los proyectos de inversión a cargo de sus unidades ejecutoras, especialmente respecto a los siete (06) proyectos de inversión y los 14 Proyectos de Inversión, bajo la modalidad de Obras por Impuestos, ubicados en los departamentos de Ica, Tacna, 2 Moquegua, 5 Ancash y 5 Piura, a cargo del PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – PRONIED, información que fue atendida de manera preliminar mediante el Oficio N° 2899-2024-



MINEDU/DM, información que fuera complementada mediante el Oficio N° 3143-2024-MINEDU/DM y completada mediante Oficio N° 3462-2024-MINEDU/DM, con los citados oficios se ha completado la información requerida a dicho sector y que estamos revisando y analizando, que nos permita consolidarla y compartirla en el próximo informe trimestral y que nos sirva de base para continuar con el seguimiento de los proyectos a cargo de la unidades ejecutoras del Ministerio de Educación.

SEGUIMIENTO A LOS SERVICIOS DE CONTROL IMPLEMENTADOS POR LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

➤ RESPECTO A LAS OBRAS PARALIZADAS

Luego de tener el resultado del análisis de la información que nos brindara en su oportunidad el Ministerio de Cultura, y advertir la existencia de 11 proyectos cuyo estado situacional merece atención especial, al figurar como paralizados al 30 de abril del 2023 (Informe N° 000007-2023-UAPI-WAC-PEB/MC) y mantener tal condición al 30 de setiembre del 2023 (informe según MEMORANDO N° 000313-2023-PEB/MC); ante tal situación, consideramos pertinente y oportuno conocer si la Contraloría General de la República, como órgano rector del Sistema Nacional de Control, tenía identificado esta situación crítica en las que se encontraban las referidas obras, es así que, mediante oficios N° 0113-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR y N° 0297-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR, solicitamos información sobre los servicios de control realizados a los proyectos de inversión que figuran en ambos informes como paralizados, entidad que atendió nuestro requerimiento de información con fecha 06 de marzo del 2024 mediante Oficio N° 002124-2024-CG/DC, de cuya información tenemos que la citada entidad ha realizado servicios de control en todos los proyectos paralizados, conforme al siguiente detalle:

PROYECTO DE INVERSION	UNIDAD EJECUTORA	CANTIDAD Y TIPO DE SERVICIO DE CONTROL	ESTADO
Mejoramiento de la conservación del patrimonio cultural del sitio arqueológico de Wari, Huamanga – Ayacucho	Gobierno Regional de Ayacucho	1 Orientación de Oficio	Pendiente





Mejoramiento de la irrigación Marchahuasi - Mollepata, provincia de Anta – Cusco	Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRO RURAL	5 Control Concurrente	5 No corregidas
Instalación del sistema de riego Tutapayoc vista Alegre - Pantekilla, distrito de Surcubamba - Tayacaja – Huancavelica	Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRO RURAL	1 Auditoria de Cumplimiento	3 implementadas 1 No aplicable 6 No Implementadas
Instalación del servicio de agua del sistema de riego Pumapahuasin – Socaoran – Uchubamba - Ccollpa, distrito de Callanmarca, Angaraes, Huancavelica	Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRO RURAL	1 Control Concurrente 1 Visita de Control	Corregida No corregida
Instalación de agua para riego de los anexos de Uyo, Lauca, Andamarca, Huata, Antacalla y Andamayo, distrito de Andamarca - Concepcion – Junin	Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRO RURAL	La OCI no efectuara servicio de control por estar paralizada	
Mejoramiento y ampliación de la provisión de agua para desarrollo agrícola en el valle de Tacna - Vilavilani II - Fase I - Construcción canal Vilachauillani - Calachaca - Chuapalca	UEI del Proyecto Especial Afianzamiento y Ampliación de los Recursos Hídricos de Tacna	6 Informes de Acción Simultanea 5 Orientaciones de Oficio 1 Informe de Auditoria de Cumplimiento 1 Informe de Hito de Control	5 No Corregido y 1 No aplicable 5 No Aplica No aplica Pendiente
Mejoramiento del servicio de comercialización del Gran Mercado de Belén - Iquitos, provincia de Maynas, departamento de Loreto	Programa Nacional de Diversificación Productiva	2 Visitas de Control 2 Orientaciones de Oficio	Sin Acciones Sin Acciones
Mejoramiento y ampliación de los servicios de salud del establecimiento de salud Challhuahuacho, del distrito de Challhuahuacho, Provincia de Cotabambas, Departamento de Apurímac	Programa Nacional de Inversiones en Salud - PRONIS	2 Informes de Acción Simultanea 1 Informe de Visitas de Control 2 Informe de Auditoria	En 1 De las 9 Situaciones Adversas 7 No Implementadas, 1 No Aplica y 1 Implementada 1 No Aplica No Aplica De las 2 Recomendaciones, 1 No Aplica y Implementada
Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado sanitario de los barrios urbanos: Patron Santiago, El Salvador, los Álamos, Wichaypampa, Señor de Huanca y San Marcos del Distrito de	Programa Nacional de Saneamiento Urbano - PNSU	1 Informe de Control Especifico	Pendiente





Challhuahuacho, Provincia de Cotabambas, Departamento de Apurímac			
Mejoramiento y ampliación de sistema de agua potable y alcantarillado de la ciudad de huamachuco - distrito de Huamachuco, Provincia de Sánchez Carrión – La Libertad	Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión	1 Control Concurrente 2 Servicio de Control Especifico	No corregido Implementado
Mejoramiento del sistema de evacuación, tratamiento y disposición final de las aguas servidas de las ciudades de Sullana y Bellavista, Provincia de Sullana - Piura	Programa Nacional de Saneamiento Urbano - PNSU	15 Informes de Hito de Control 2 Informes	7 Con algunos puntos pendientes de Corregir, 8 No Corregidos 1 No corregida y 1 Ninguna Acción

CUADRO N° 53 CUADRO DE SERVICIOS DE CONTROL EN LAS OBRAS PARALIZADAS AL 30 DE SETIEMBRE 2023

Fuente: Oficio N° 002124-2024-CG/DC de la Contraloría General de la Republica.

Elaboración: Comisión Especial Multipartidaria del Bicentenario de la Independencia del Perú

➤ RESPECTO A LOS PROYECTOS A CARGO DEL SECTOR EDUCACION

En cumplimiento de nuestra labor de seguimiento y fiscalización de la Agenda de Conmemoración del Bicentenario de la Independencia del Perú, cuya segunda actualización fuera aprobada por Decreto Supremo 011–2021-MC, que comprende 302 obras, cuya ejecución le corresponde a diversas Unidades Ejecutoras, entre ellas a entidades adscritas al Ministerio de Educación; con fecha 14 de mayo del 2024, mediante Oficio N° 0372-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR, solicitamos a la Contraloría General dela República, como órgano rector del Sistema Nacional de Control, nos informe sobre las acciones de control realizada a las siguientes Unidades Ejecutoras: UEI 125: PROYECTO ESPECIAL DEL INVERSIÓN PÚBLICA ESCUELAS BICENTENARIO, UE N° 118: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN BÁSICA Y SUPERIOR y al PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED

En atención a nuestro requerimiento de información, la Contraloría General de la Republica con fecha 28 de junio, mediante Oficio N° 006501-2024-CG/DC, nos remitió la información respecto a las acciones de control





realizadas a proyectos de inversión a cargo del Ministerio de Educación, los mismos que se detallan en el Anexo adjunto al citado oficio.

Respecto a los 75 Proyectos de Inversión a cargo de la Unidad Ejecutora UEI 125: PROYECTO ESPECIAL DEL INVERSIÓN PÚBLICA ESCUELAS BICENTENARIO, conforme se consigna en el Cuadro N° 01, han emitido 112 informes de hito control, de los cuales en 12 no se encontraron situaciones adversas, es decir, 100 informes de hitos de control se han identificado un total de 213 situaciones adversas, de las cuales tan solo 35 tienen como estado CON ACCIONES, 4 que NO APLICA y 174 se encuentran PENIENTES.

Respecto a los siete (07) Proyectos de Inversión a cargo de la Unidad Ejecutora PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED, conforme se consigna en el Cuadro N° 02, han emitido 22 informes de hito control, en la modalidad de control concurrente, que fueron notificados a la entidad para que adopte las medidas correctivas pertinentes, en los cuales se han identificado un total de 75 situaciones adversas, cuyo estado es el siguiente: 8 fueron DESESTIMADAS, 13 están SIN ACCIONES, 34 están CORREGIDAS, 8 NO CORREGIDAS y 12 tienen como estado CON ACCIONES.

Respecto a los a los seis (06) Proyectos de Inversión y los catorce (14) Proyectos de Inversión, bajo la modalidad de Obras por Impuestos (ubicados en los departamentos de Ica, Tacna, 2 Moquegua, 5 Ancash y 5 Piura) a cargo de la Unidad Ejecutora UE N° 118: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN BÁSICA Y SUPERIOR, conforme se consigna en el Cuadro N° 03, han emitido 31 informes de hito control, en la modalidad de control concurrente, que fueron notificados a la entidad para que adopte las medidas correctivas pertinentes, en los cuales se han identificado un total de 90 situaciones adversas, cuyo estado es el siguiente: 52 están CORREGIDAS, 26 figuran como NO CORREGIDAS, 7 están SIN ACCIONES, 4 tienen como estado CON ACCIONES y 2 fueron DESESTIMADAS.

Continuando con el seguimiento se programó la Décimo Quinta Sesión Ordinaria invitando al Contralor General de la Republica para que informe en dicha sesión, conforme a lo requerido en el OFICIO N° 082-2024-2025-LVOM-CEMBI/CR, sesión que fuera cancelada, sin perjuicio de la reprogramación de la



citada sesión, solicitaremos la información que fuera requerida en el oficio de invitación, conforme al siguiente detalle:

- Mediante Oficio N° 0372-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR, solicitamos información sobre las acciones de control realizadas por la Contraloría General de la República a las Unidades Ejecutoras adscritas al Ministerio de Educación, que tienen a sus cargo la ejecución proyectos de inversión que forman parte de la Agenda de Conmemoración del Bicentenario de la Independencia del Perú, cuya segunda actualización fuera aprobada por Decreto Supremo 011–2021-MC, requerimiento de información que fue atendido con fecha 28 de junio del 2024 mediante Oficio N° 006501-2024-CG/DC, habiendo transcurrido un plazo prudencial desde la referida fecha, solicitamos nos brinde la siguiente información:
 - ❖ Respecto a los 75 Proyectos de Inversión, que tienen como Unidad Ejecutora a la UEI 125: PROYECTO ESPECIAL DEL INVERSIÓN PÚBLICA ESCUELAS BICENTENARIO del Ministerio de Educación, al haberse emitido 112 Informes de Control, sírvase informar de manera actualizada y detallada sobre las situaciones adversas que han identificado en los citados Hitos de Control, precisando su estado situacional; asimismo, si han emitido nuevos informes de control en relación a los citados proyectos de inversión y cuál es su estado.
 - ❖ Respecto a los siete (07) Proyectos de Inversión que tienen como Unidad Ejecutora a la UE N° 118: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN BÁSICA Y SUPERIOR del Ministerio de Educación, al haberse emitido 22 Informes de Control, sírvase informar de manera actualizada y detallada sobre las situaciones adversas que han identificado en el control concurrente en los citados Hitos de Control, precisando su estado situacional; asimismo, si han emitido nuevos informes de control en relación a los citados proyectos de inversión y cuál es su estado.
 - ❖ Respecto a los seis (06) Proyectos de Inversión y a los catorce (14) Proyectos de Inversión, bajo la modalidad de Obras por Impuestos (ubicados en los departamentos de Ica, Tacna, 2 Moquegua, 5 Ancash y 5 Piura), que tienen como Unidad Ejecutora al PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED del Ministerio de Educación, al haberse emitido 31 Informes de Control, sírvase informar de manera actualizada y detallada sobre las situaciones adversas que han identificado en el control concurrente en los citados Hitos de Control,

precisando su estado situacional; asimismo, si han emitido nuevos informes de control en relación a los citados proyectos de inversión y cuál es su estado.

- Mediante Oficio N° 0113-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR, solicitamos información sobre las acciones de control realizadas por la Contraloría General de la República a once (11) proyectos de inversión que se encontraban paralizados según la información brindada por el Ministerio de Cultura, que forman parte de la Agenda de Conmemoración del Bicentenario de la Independencia del Perú, cuya segunda actualización fuera aprobada por Decreto Supremo 011-2021-MC, requerimiento de información que fue atendido con fecha 06 de marzo del 2024 mediante Oficio N° 002124-2024-CG/DC, habiendo transcurrido un plazo prudencial desde la referida fecha. Al haberse realizado acciones de control (orientaciones de oficio, control concurrente, auditorias de cumplimiento, visitas de control, informes de acción simultánea y control específico) en los 11 proyectos, solicitamos nos brinde información actualizada y detallada sobre las situaciones adversas que han identificado en los respectivos informes de control, precisando su estado situacional; asimismo, si han emitido nuevos informes de control en relación a los citados proyectos de inversión y cuál es su estado.
- Tomando en cuenta que la Agenda de Conmemoración del Bicentenario de la Independencia del Perú, cuya segunda actualización fuera aprobada por Decreto Supremo 011-2021-MC, comprende 302 obras (267 obras públicas y 35 obras en otras modalidades); solicito que como órgano rector del Sistema Nacional de Control se nos informe sobre las situaciones adversas que han identificado en los servicios de control realizados por la Contraloría General de la República, respecto a los demás proyectos de inversión (diferentes a los considerados en el punto 1 y 2 del presente documento) a cargo de las diversas unidades ejecutoras, precisando su estado situacional.



VII. SESIONES DE LA COMISIÓN

SESIONES	FECHA
SESIÓN DE ELECCIÓN E INSTALACIÓN	13 Y 20 DE DICIEMBRE DE 2022
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA	14 DE FEBRERO DE 2022
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA	11 DE MARZO DE 2022
TERCERA SESIÓN ORDINARIA	29 DE MARZO DE 2022
CUARTA SESIÓN ORDINARIA	5 DE JULIO DE 2022
PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA	25 DE JULIO DE 2022
QUINTA SESIÓN ORDINARIA	15 DE AGOSTO DE 2022
SEXTA SESIÓN ORDINARIA	05 DE OCTUBRE DE 2022
SÉTIMA SESIÓN ORDINARIA	04 DE NOVIEMBRE DE 2022
OCTAVA SESIÓN ORDINARIA	13 DE ENERO DE 2023
NOVENA SESIÓN ORDINARIA	7 DE MARZO DE 2023
DÉCIMA SESIÓN ORDINARIA	2 DE MAYO DE 2023
DÉCIMO PRIMERA SESIÓN ORDINARIA	9 DE MAYO DE 2023
DÉCIMO SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA	19 DE MAYO DE 2023
DÉCIMO TERCERA SESIÓN ORDINARIA	26 DE JUNIO DE 2023
SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA	10 DE OCTUBRE DE 2023
DÉCIMO CUARTA SESIÓN ORDINARIA	05 DE MAYO DE 2024
TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA	15 DE ABRIL DE 2024
CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA	30 DE OCTUBRE DE 2024

CUADRO N° 54 DETALLE DE SESIONES DE LA COMISION

Elaboración: Comisión Especial Multipartidaria del Bicentenario de la Independencia del Perú





VIII. REGISTRO DE ASISTENCIA A LA SESIONES DE LA COMISIÓN

Hora de inicio	11:20:00 a.m. (13 diciembre)	Hora Final	10:40:00 a.m. (20 de diciembre)						
Comisión	Congresistas	Cargo	Bancada	N° Sesión	Fecha	Asistencia	Licencia	Inas. Just.	Inas. Injust.
Bicentenario	Luis Arturo Alegría García	Presidente	Fuerza Popular	Sesión de elección e intalación	13 y 20/12/2021	1			
Bicentenario	Alejandro Caverro Alva	Vicepresidente	Avanza País	Sesión de elección e intalación	13 y 20/12/2021	1			
Bicentenario	Miguel Ciccía Vásquez	Secretario	Renovación Popular	Sesión de elección e intalación	13 y 20/12/2021	1			
Bicentenario	Margot Palacios Huamán	Miembro	Perú Libre	Sesión de elección e intalación	13 y 20/12/2021	1			
Bicentenario	Wilson Palacios Soto	Miembro	Acción Popular	Sesión de elección e intalación	13 y 20/12/2021	1			
Bicentenario	Héctor Valer Pinto	Miembro	Somos Perú	Sesión de elección e intalación	13 y 20/12/2021	1			
Bicentenario	Heydi Lizbeth Juárez Calle	Miembro	Alianza para el Progreso	Sesión de elección e intalación	13 y 20/12/2021	1			
Bicentenario	José Luis Elías Ávalos	Miembro	Podemos Perú	Sesión de elección e intalación	13 y 20/12/2021	1			
Bicentenario	Roberto Helbert Sánchez Palomino	Miembro	Juntos por el Perú	Sesión de elección e intalación	13 y 20/12/2021	1			

Hora de inicio	17:11:00 p.m.	Hora Final	17:59:00 p.m.						
Comisión	Congresistas	Cargo	Bancada	N° Sesión	Fecha	Asistencia	Licencia	Inas. Just.	Inas. Injust.
Bicentenario	Luis Arturo Alegría García	Presidente	Fuerza Popular	1era. Ordinaria	14/02/2022	1			
Bicentenario	Alejandro Caverro Alva	Vicepresidente	Avanza País	1era. Ordinaria	14/02/2022	1			
Bicentenario	Miguel Ciccía Vásquez	Secretario	Renovación Popular	1era. Ordinaria	14/02/2022	1			
Bicentenario	Margot Palacios Huamán	Miembro	Perú Libre	1era. Ordinaria	14/02/2022	1			
Bicentenario	Wilson Palacios Soto	Miembro	Acción Popular	1era. Ordinaria	14/02/2022	1			
Bicentenario	Heydi Lizbeth Juárez Calle	Miembro	Alianza para el Progreso	1era. Ordinaria	14/02/2022	1			
Bicentenario	José Luis Elías Ávalos	Miembro	Podemos Perú	1era. Ordinaria	14/02/2022	1			
Bicentenario	Roberto Helbert Sánchez Palomino	Miembro	Juntos por el Perú	1era. Ordinaria	14/02/2022		1		





Hora de inicio	10:14:00 a.m.	Hora Final	10:32:00 a.m.						
Comisión	Congresistas	Cargo	Bancada	N° Sesión	Fecha	Asistencia	Licencia	Inas. Just.	Inas. Injust.
Bicentenario	Luis Arturo Alegria García	Presidente	Fuerza Popular	2da. Ordinaria	11/03/2022	1			
Bicentenario	Alejandro Cavero Alva	Vicepresidente	Avanza País	2da. Ordinaria	11/03/2022	1			
Bicentenario	Miguel Ciccía Vásquez	Secretario	Renovación Popular	2da. Ordinaria	11/03/2022	1			
Bicentenario	Margot Palacios Huamán	Miembro	Perú Libre	2da. Ordinaria	11/03/2022				1
Bicentenario	Wilson Soto Palacios	Miembro	Acción Popular	2da. Ordinaria	11/03/2022	1			
Bicentenario	Heydi Lizbeth Juárez Calle	Miembro	Alianza para el Progreso	2da. Ordinaria	11/03/2022	1			
Bicentenario	José Luis Elías Ávalos	Miembro	Podemos Perú	2da. Ordinaria	11/03/2022	1			
Bicentenario	Roberto Helbert Sánchez Palomino	Miembro	Juntos por el Perú	2da. Ordinaria	11/03/2022		1		

Hora de inicio	10:09:00 a.m.	Hora Final	10:39:00 a.m.						
Comisión	Congresistas	Cargo	Bancada	N° Sesión	Fecha	Asistencia	Licencia	Inas. Just.	Inas. Injust.
Bicentenario	Luis Arturo Alegria García	Presidente	Fuerza Popular	3ra. Ordinaria	29/03/2022	1			
Bicentenario	Alejandro Cavero Alva	Vicepresidente	Avanza País	3ra. Ordinaria	29/03/2022	1			
Bicentenario	Miguel Ciccía Vásquez	Secretario	Renovación Popular	3ra. Ordinaria	29/03/2022	1			
Bicentenario	Margot Palacios Huamán	Miembro	Perú Libre	3ra. Ordinaria	29/03/2022	1			
Bicentenario	Wilson Soto Palacios	Miembro	Acción Popular	3ra. Ordinaria	29/03/2022				1
Bicentenario	Heydi Lizbeth Juárez Calle	Miembro	Alianza para el Progreso	3ra. Ordinaria	29/03/2022	1			
Bicentenario	José Luis Elías Ávalos	Miembro	Podemos Perú	3ra. Ordinaria	29/03/2022	1			
Bicentenario	Roberto Helbert Sánchez Palomino	Miembro	Juntos por el Perú	3ra. Ordinaria	29/03/2022		1		





Hora de inicio	05:17:00 p.m.	Hora Final	05:27:00 p.m.						
Comisión	Congresistas	Cargo	Bancada	Nº Sesión	Fecha	Asistencia	Licencia	Inas. Just.	Inas. Injust.
Bicentenario	Luis Arturo Alegría García	Presidente	Fuerza Popular	4ta. Ordinaria	05/07/2022	1			
Bicentenario	Alejandro Cervero Alva	Vicepresidente	Avanza País	4ta. Ordinaria	05/07/2022		1		
Bicentenario	Miguel Ciccía Vázquez	Secretario	Renovación Popular	4ta. Ordinaria	05/07/2022	1			
Bicentenario	Eduardo Castillo Rivas	Miembro	Fuerza Popular	4ta. Ordinaria	05/07/2022	1			
Bicentenario	Margot Palacios Huamán	Miembro	Perú Libre	4ta. Ordinaria	05/07/2022				1
Bicentenario	Wilson Soto Palacios	Miembro	Acción Popular	4ta. Ordinaria	05/07/2022	1			
Bicentenario	Heydi Lizbeth Juárez Calle	Miembro	Alianza para el Progreso	4ta. Ordinaria	05/07/2022	1			
Bicentenario	José Luis Elías Ávalos	Miembro	Podemos Perú	4ta. Ordinaria	05/07/2022	1			
Bicentenario	Roberto Helbert Sánchez Palomino	Miembro	Juntos por el Perú	4ta. Ordinaria	05/07/2022		1		

Hora de inicio	09:15:00 a.m.	Hora Final	09:20:00 a.m.						
Comisión	Congresistas	Cargo	Bancada	Nº Sesión	Fecha	Asistencia	Licencia	Inas. Just.	Inas. Injust.
Bicentenario	Luis Arturo Alegría García	Presidente	Fuerza Popular	1era. Extraordinaria	25/07/2022	1			
Bicentenario	Alejandro Cervero Alva	Vicepresidente	Avanza País	1era. Extraordinaria	25/07/2022				1
Bicentenario	Miguel Ciccía Vázquez	Secretario	Renovación Popular	1era. Extraordinaria	25/07/2022	1			
Bicentenario	Eduardo Castillo Rivas	Miembro	Fuerza Popular	1era. Extraordinaria	25/07/2022	1			
Bicentenario	Margot Palacios Huamán	Miembro	Perú Libre	1era. Extraordinaria	25/07/2022				1
Bicentenario	Wilson Soto Palacios	Miembro	Acción Popular	1era. Extraordinaria	25/07/2022				1
1Bicentenario	Heydi Lizbeth Juárez Calle	Miembro	Alianza para el Progreso	1era. Extraordinaria	25/07/2022	1			
Bicentenario	José Luis Elías Ávalos	Miembro	Podemos Perú	1era. Extraordinaria	25/07/2022	1			
Bicentenario	Roberto Helbert Sánchez Palomino	Miembro	Juntos por el Perú	1era. Extraordinaria	25/07/2022		1		





Hora inicio	de	Hora Final							
11:35:00 a.m.		12:02:00 p.m.							
Comisión	Congresistas	Cargo	Bancada	Nº Sesión	Fecha	Asistencia	Licencia	Inas. Just.	Inas. Injust.
Bicentenario	Luis Arturo Alegria García	Presidente	Fuerza Popular	5ta. Ordinaria	15/08/2022	1			
Bicentenario	Alejandro Cervero Alva	Vicepresidente	Avanza País	5ta. Ordinaria	15/08/2022	1			
Bicentenario	Miguel Ciccía Vásquez	Secretario	Renovación Popular	5ta. Ordinaria	15/08/2022	1			
Bicentenario	Eduardo Castillo Rivas	Miembro	Fuerza Popular	5ta. Ordinaria	15/08/2022	1			
Bicentenario	Margot Palacios Huamán	Miembro	Perú Libre	5ta. Ordinaria	15/08/2022				1
Bicentenario	Wilson Soto Palacios	Miembro	Acción Popular	5ta. Ordinaria	15/08/2022				1
1Bicentenario	Heydi Lizbeth Juárez Calle	Miembro	Alianza para el Progreso	5ta. Ordinaria	15/08/2022	1			
Bicentenario	José Luis Elías Ávalos	Miembro	Podemos Perú	5ta. Ordinaria	15/08/2022	1			
Bicentenario	Roberto Helbert Sánchez Palomino	Miembro	Juntos por el Perú	5ta. Ordinaria	15/08/2022		1		

Hora inicio	de	Hora Final							
05:04:00 p.m.		06:16:00 p.m.							
Comisión	Congresistas	Cargo	Bancada	Nº Sesión	Fecha	Asistencia	Licencia	Inas. Just.	Inas. Injust.
Bicentenario	Luis Arturo Alegria García	Presidente	Fuerza Popular	6ta. Ordinaria	5/10/2022	1			
Bicentenario	Alejandro Cervero Alva	Vicepresidente	Avanza País	6ta. Ordinaria	5/10/2022	1			
Bicentenario	Miguel Ciccía Vásquez	Secretario	Renovación Popular	6ta. Ordinaria	5/10/2022	1			
Bicentenario	Eduardo Castillo Rivas	Miembro	Fuerza Popular	6ta. Ordinaria	5/10/2022	1			
Bicentenario	Margot Palacios Huamán	Miembro	Perú Libre	6ta. Ordinaria	5/10/2022	1			
Bicentenario	Wilson Soto Palacios	Miembro	Acción Popular	6ta. Ordinaria	5/10/2022				1
Bicentenario	José Luis Elías Ávalos	Miembro	Podemos Perú	6ta. Ordinaria	5/10/2022	1			
Bicentenario	Roberto Helbert Sánchez Palomino	Miembro	Juntos por el Perú	6ta. Ordinaria	5/10/2022		1		





Hora de inicio	12:04:00 p.m.	Hora Final	12:18:00 p.m.						
Comisión	Congresistas	Cargo	Bancada	N° Sesión	Fecha	Asistencia	Licencia	Inas. Just.	Inas. Injust.
Bicentenario	Luis Arturo Alegria García	Presidente	Fuerza Popular	7ma. Ordinaria	04/11/2022	1			
Bicentenario	Alejandro Cavelo Alva	Vicepresidente	Avanza País	7ma. Ordinaria	04/11/2022	1			
Bicentenario	Miguel Cicia Vásquez	Secretario	Renovación Popular	7ma. Ordinaria	04/11/2022	1			
Bicentenario	Eduardo Castillo Rivas	Miembro	Fuerza Popular	7ma. Ordinaria	04/11/2022	1			
Bicentenario	Margot Palacios Huamán	Miembro	Perú Libre	7ma. Ordinaria	04/11/2022	1			
Bicentenario	Wilson Soto Palacios	Miembro	Acción Popular	7ma. Ordinaria	04/11/2022		1		
Bicentenario	José Luis Elías Ávalos	Miembro	Podemos Perú	7ma. Ordinaria	04/11/2022	1			
Bicentenario	Roberto Helbert Sánchez Palomino	Miembro	Juntos por el Perú	7ma. Ordinaria	04/11/2022		1		

Hora de inicio	12:04:00 p.m.	Hora Final	12:18:00 p.m.						
Comisión	Congresistas	Cargo	Bancada	N° Sesión	Fecha	Asistencia	Licencia	Inas. Just.	Inas. Injust.
Bicentenario	Luis Arturo Alegria García	Presidente	Fuerza Popular	8va. Ordinaria	19/01/2023	1			
Bicentenario	Alejandro Cavelo Alva	Vicepresidente	Avanza País	8va. Ordinaria	19/01/2023	1			
Bicentenario	Miguel Cicia Vásquez	Secretario	Renovación Popular	8va. Ordinaria	19/01/2023	1			
Bicentenario	Eduardo Castillo Rivas	Miembro	Fuerza Popular	8va. Ordinaria	19/01/2023	1			
Bicentenario	Margot Palacios Huamán	Miembro	Perú Libre	8va. Ordinaria	19/01/2023		1		
Bicentenario	Wilson Soto Palacios	Miembro	Acción Popular	8va. Ordinaria	19/01/2023		1		
Bicentenario	José Luis Elías Ávalos	Miembro	Podemos Perú	8va. Ordinaria	19/01/2023	1			
Bicentenario	Roberto Helbert Sánchez Palomino	Miembro	Juntos por el Perú	8va. Ordinaria	19/01/2023	1			





Hora de inicio	10:04:00 a.m.	Hora Final	11:26:00 a.m.						
Comisión	Congresistas	Cargo	Bancada	Nº Sesión	Fecha	Asistencia	Licencia	Inas. Just.	Inas. Injust.
Bicentenario	Luis Arturo Alegria García	Presidente	Fuerza Popular	9na. Ordinaria	07/03/2023	1			
Bicentenario	Alejandro Caveró Alva	Vicepresidente	Avanza País	9na. Ordinaria	07/03/2023		1		
Bicentenario	Miguel Ciccía Vásquez	Secretario	Renovación Popular	9na. Ordinaria	07/03/2023	1			
Bicentenario	Eduardo Castillo Rivas	Miembro	Fuerza Popular	9na. Ordinaria	07/03/2023	1			
Bicentenario	Margot Palacios Huamán	Miembro	Perú Libre	9na. Ordinaria	07/03/2023	1			
Bicentenario	Wilson Soto Palacios	Miembro	Acción Popular	9na. Ordinaria	07/03/2023		1		
Bicentenario	José Luis Elías Ávalos	Miembro	No agrupado	9na. Ordinaria	07/03/2023	1			
Bicentenario	Roberto Helbert Sánchez Palomino	Miembro	Juntos por el Perú	9na. Ordinaria	07/03/2023			1	

Hora de inicio	03:11:00 p.m.	Hora Final	04:01:00 p.m.						
Comisión	Congresistas	Cargo	Bancada	Nº Sesión	Fecha	Asistencia	Licencia	Inas. Just.	Inas. Injust.
Bicentenario	Luis Arturo Alegria García	Presidente	Fuerza Popular	10ma. Ordinaria	02/05/2023	1			
Bicentenario	Alejandro Caveró Alva	Vicepresidente	Avanza País	10ma. Ordinaria	02/05/2023	1			
Bicentenario	Miguel Ciccía Vásquez	Secretario	Renovación Popular	10ma. Ordinaria	02/05/2023	1			
Bicentenario	Eduardo Castillo Rivas	Miembro	Fuerza Popular	10ma. Ordinaria	02/05/2023	1			
Bicentenario	Margot Palacios Huamán	Miembro	Perú Libre	10ma. Ordinaria	02/05/2023	1			
Bicentenario	Wilson Soto Palacios	Miembro	Acción Popular	10ma. Ordinaria	02/05/2023		1		
Bicentenario	José Luis Elías Ávalos	Miembro	No Agrupado	10ma. Ordinaria	02/05/2023	1			
Bicentenario	Roberto Helbert Sánchez Palomino	Miembro	Juntos por el Perú	10ma. Ordinaria	02/05/2023		1		





Hora de inicio	02:19:00 p.m.	Hora Final	02:26:00 p.m.						
Comisión	Congresistas	Cargo	Bancada	Nº Sesión	Fecha	Asistencia	Licencia	Inas. Just.	Inas. Injust.
Bicentenario	Leslie Vivian Olivos Martínez	Presidente	Fuerza Popular	11 ava. Ordinaria	09/05/2023	1			
Bicentenario	Alejandro Caveró Alva	Vicepresidente	Avanza País	11 ava. Ordinaria	09/05/2023	1			
Bicentenario	Miguel Ciccía Vásquez	Secretario	Renovación Popular	11 ava. Ordinaria	09/05/2023	1			
Bicentenario	Eduardo Castillo Rivas	Miembro	Fuerza Popular	11 ava. Ordinaria	09/05/2023	1			
Bicentenario	Margot Palacios Huamán	Miembro	Perú Libre	11 ava. Ordinaria	09/05/2023		1		
Bicentenario	Wilson Palacios Soto	Miembro	Acción Popular	11 ava. Ordinaria	09/05/2023		1		
Bicentenario	José Luis Elías Ávalos	Miembro	No Agrupado	11 ava. Ordinaria	09/05/2023	1			
Bicentenario	Roberto Helbert Sánchez Palomino	Miembro	Juntos por el Perú	11 ava. Ordinaria	09/05/2023	1			

Hora de inicio	09:13:00 a.m.	Hora Final	09:51:00 a.m.						
Comisión	Congresistas	Cargo	Bancada	Nº Sesión	Fecha	Asistencia	Licencia	Inas. Just.	Inas. Injust.
Bicentenario	Leslie Vivian Olivos Martínez	Presidente	Fuerza Popular	12 ava. Ordinaria	19/05/2023	1			
Bicentenario	Alejandro Caveró Alva	Vicepresidente	Avanza País	12 ava. Ordinaria	19/05/2023	1			
Bicentenario	Miguel Ciccía Vásquez	Secretario	Renovación Popular	12 ava. Ordinaria	19/05/2023	1			
Bicentenario	Eduardo Castillo Rivas	Miembro	Fuerza Popular	12 ava. Ordinaria	19/05/2023	1			
Bicentenario	Margot Palacios Huamán	Miembro	Perú Libre	12 ava. Ordinaria	19/05/2023	1			
Bicentenario	Wilson Palacios Soto	Miembro	Acción Popular	12 ava. Ordinaria	19/05/2023			1	
Bicentenario	José Luis Elías Ávalos	Miembro	No Agrupado	12 ava. Ordinaria	19/05/2023				1
Bicentenario	Roberto Helbert Sánchez Palomino	Miembro	Juntos por el Perú	12 ava. Ordinaria	19/05/2023	1			





Hora de inicio	15:13:00 p.m.	Hora Final	16:33:00 p.m.						
Comisión	Congresistas	Cargo	Bancada	N° Sesión	Fecha	Asistencia	Licencia	Inas. Just.	Inas. Injust.
Bicentenario	Leslie Vivian Olivos Martínez	Presidente	Fuerza Popular	13° decimo Ordinaria	26/06/2023	1			
Bicentenario	Alejandro Caveró Alva	Vicepresidente	Avanza País	13° decimo Ordinaria	26/06/2023	1			
Bicentenario	Miguel Ciccía Vásquez	Secretario	Renovación Popular	13° decimo Ordinaria	26/06/2023	1			
Bicentenario	Eduardo Castillo Rivas	Miembro	Fuerza Popular	13° decimo Ordinaria	26/06/2023	1			
Bicentenario	Margot Palacios Huamán	Miembro	Perú Libre	13° decimo Ordinaria	26/06/2023	1			
Bicentenario	Wilson Soto Palacios	Miembro	Acción Popular	13° decimo Ordinaria	26/06/2023		1		
Bicentenario	José Luis Elías Ávalos	Miembro	No Agrupado	13° decimo Ordinaria	26/06/2023	1			
Bicentenario	Roberto Helbert Sánchez Palomino	Miembro	Juntos por el Perú	13° decimo Ordinaria	26/06/2023	1			

Hora de inicio	15:18:00 p.m.	Hora Final	16:40:00 p.m.						
Comisión	Congresistas	Cargo	Bancada	N° Sesión	Fecha	Asistencia	Licencia	Inas. Just.	Inas. Injust.
Bicentenario	Leslie Vivian Olivos Martínez	Presidente	Fuerza Popular	2da. Extraordinaria	10/10/2023	1			
Bicentenario	Alejandro Caveró Alva	Vicepresidente	Avanza País	2da. Extraordinaria	10/10/2023		1		
Bicentenario	Miguel Ciccía Vásquez	Secretario	Renovación Popular	2da. Extraordinaria	10/10/2023	1			
Bicentenario	Eduardo Castillo Rivas	Miembro	Fuerza Popular	2da. Extraordinaria	10/10/2023	1			
Bicentenario	Margot Palacios Huamán	Miembro	Perú Libre	2da. Extraordinaria	10/10/2023	1			
Bicentenario	José Luis Elías Ávalos	Miembro	No Agrupado	2da. Extraordinaria	10/10/2023	1			





Hora de inicio	11:13:00 am.	Hora Final	12:47:00 pm.						
Comisión	Congresistas	Cargo	Bancada	N° Sesión	Fecha	Asistencia	Licencia	Inas. Just.	Inas. Injust.
Bicentenario	Leslie Vivian Olivos Martínez	Presidente	Fuerza Popular	14°decimo Ordinaria	05/04/2024	1			
Bicentenario	Alejandro Cervero Alva	Vicepresidente	Avanza País	14°decimo Ordinaria	05/04/2024	1			
Bicentenario	Miguel Ciccía Vásquez	Secretario	Renovación Popular	14°decimo Ordinaria	05/04/2024	1			
Bicentenario	Eduardo Castillo Rivas	Miembro	Fuerza Popular	14°decimo Ordinaria	05/04/2024			1	
Bicentenario	Margot Palacios Huamán	Miembro	Perú Libre	14°decimo Ordinaria	05/04/2024			1	
Bicentenario	José Luis Elías Ávalos	Miembro	No Agrupado	14°decimo Ordinaria	05/04/2024			1	
Bicentenario	Jorge Luis Flores Ancachi	Miembro	Acción Popular	14°decimo Ordinaria	05/04/2024				1

Hora de inicio	12:48:00 pm.	Hora Final	2:01:00 pm.						
Comisión	Congresistas	Cargo	Bancada	N° Sesión	Fecha	Asistencia	Licencia	Inas. Just.	Inas. Injust.
Bicentenario	Leslie Vivian Olivos Martínez	Presidente	Fuerza Popular	3ra. Extraordinaria	15/04/2024		1		
Bicentenario	Alejandro Cervero Alva	Vicepresidente	Avanza País	3ra. Extraordinaria	15/04/2024		1		
Bicentenario	Miguel Ciccía Vásquez	Secretario	Renovación Popular	3ra. Extraordinaria	15/04/2024	1			
Bicentenario	Eduardo Castillo Rivas	Miembro	Fuerza Popular	3ra. Extraordinaria	15/04/2024	1			
Bicentenario	Margot Palacios Huamán	Miembro	Perú Libre	3ra. Extraordinaria	15/04/2024	1			
Bicentenario	José Luis Elías Ávalos	Miembro	No Agrupado	3ra. Extraordinaria	15/04/2024				1
Bicentenario	Jorge Luis Flores Ancachi	Miembro	Acción Popular	3ra. Extraordinaria	15/04/2024	1			





Hora de inicio	10:25 am.	Hora Final	12:55pm.						
Comisión	Congresistas	Cargo	Bancada	N° Sesión	Fecha	Asistencia	Licencia	Inas. Just.	Inas. Injust
Bicentenario	Leslie Vivian Olivos Martínez	Presidente	Fuerza Popular	4ta Extraordinaria	30/10/2024			1	
Bicentenario	Alejandro Caveró Alva	Vicepresidente	Avanza País	4ta Extraordinaria	30/10/2024	1			
Bicentenario	Miguel Ciccía Vásquez	Secretario	Renovación Popular	4ta Extraordinaria	30/10/2024	1			
Bicentenario	Eduardo Castillo Rivas	Miembro	Fuerza Popular	4ta Extraordinaria	30/10/2024			1	
Bicentenario	Margot Palacios Huamán	Miembro	Perú Libre	4ta Extraordinaria	30/10/2024			1	
Bicentenario	José Luis Elías Ávalos	Miembro	No Agrupado	4ta Extraordinaria	30/10/2024			1	
Bicentenario	Jorge Luis Flores Ancachi	Miembro	Accion Popular	4ta Extraordinaria	30/10/2024	1			



IX. ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS


PARACAS



LAMBAYEQUE



AYACUCHO

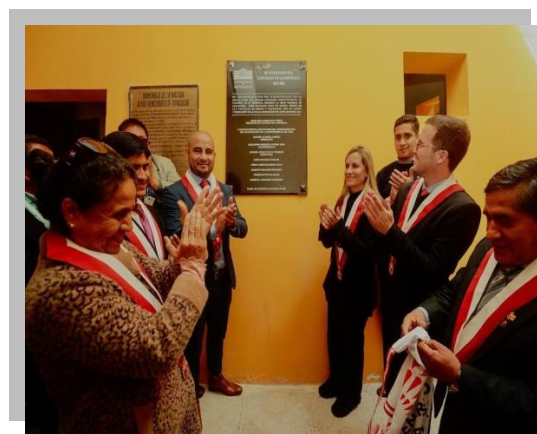



PIURA




VISITA DE INSPECCIÓN AL MUSEO DEL CONGRESO Y DE LA INQUISICIÓN



**REUNIÓN CON LA MINISTRA DE CULTURA, VICEMINISTRA DE
PATRIMONIO, DIRECTOR BICENTENARIO Y FUNCIONARIOS DE HUAURA
PARA ABORDAR LA PROBLEMÁTICA DEL BALCÓN**




APERTURA EL BALCÓN DE HUAURA

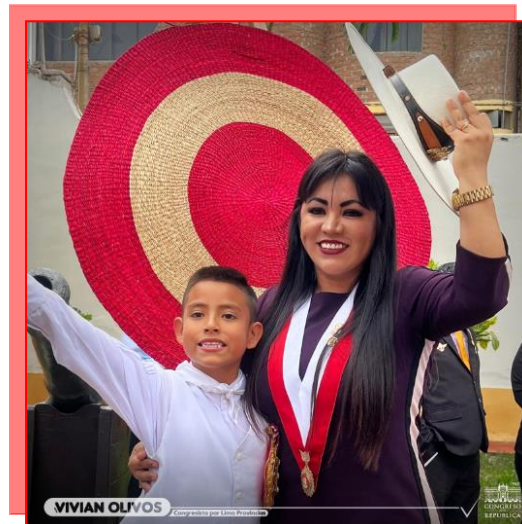

RECONOCIMIENTO A LOS EX POLICÍA FORESTAL - GUARDIA CIVIL, POR SU LUCHA CONTRA EL TERRORISMO (1980 - 2000)




INSPECCIÓN EN LAS OBRAS DE RESTAURACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO

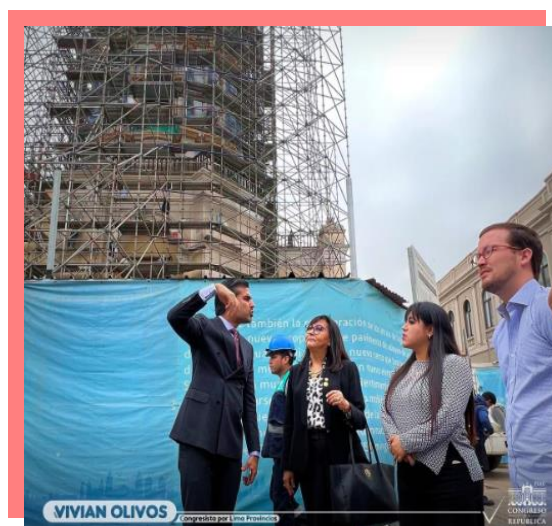

CONMEMORACIÓN DEL 201° ANIVERSARIO DEL PARLAMENTO NACIONAL






CONCIERTO DIDÁCTICO SINFÓNICO PUKALLAY, CON LA ACADEMIA DE MÚSICA OYOLA FLORES

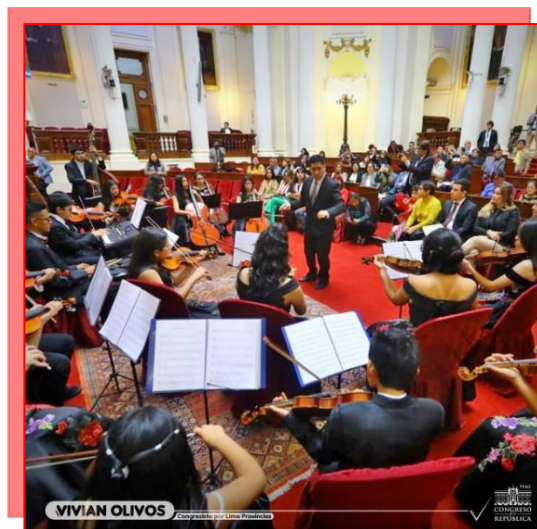

RECONOCIMIENTO COMO DEFENSORES DE LA DEMOCRACIA Y LA PACIFICACIÓN NACIONAL




RECONOCIMIENTO OFICIAL A LOS DANZANTES RAYMONDINOS POR LOS 60° ANIVERSARIO DEL CENTRO POBLADO PERALVILLO – CHANCAY

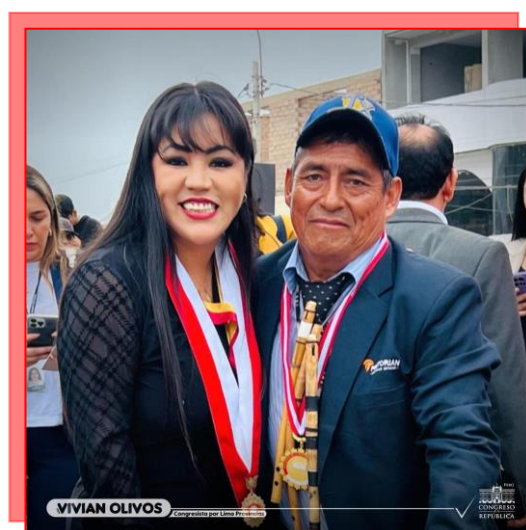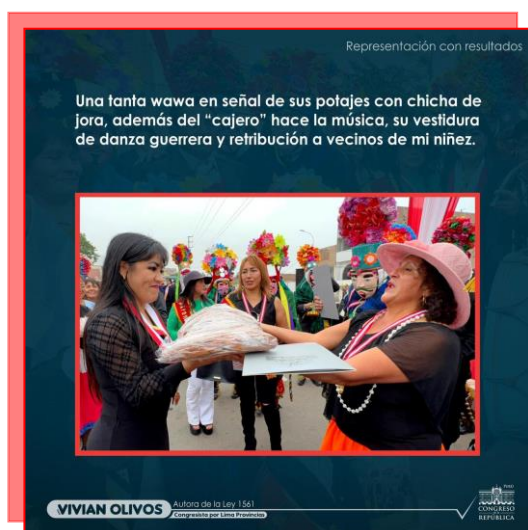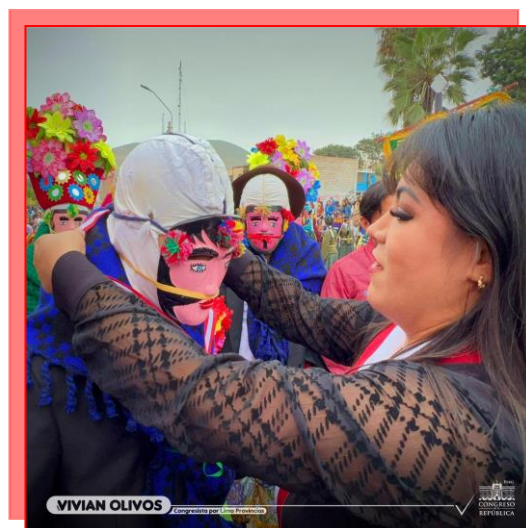

**CONFERENCIA DE PRENSA POR LOS 203 AÑOS DEL GRITO DE
LIBERTAD DE LA INDEPENDENCIA DEL PERÚ; ASIMISMO SE LOGRÓ LA
PRIMERA INSCRIPCIÓN DE DOMINIO DEL TERRENO DEL BALCÓN DE
HUAURA**



RECONOCIMIENTO A LOS HÉROES DE LA PAZ EN AYACUCHO DEL BATALLÓN N°2 “LOS CABITOS” POR SU LUCHA ANTITERRORISTA EN 1985

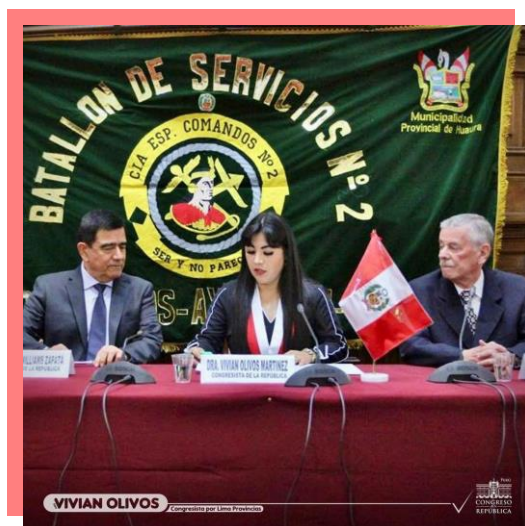


**PRIMER ENCUENTRO INTERNACIONAL DE HISTORIADORES, DE
LATINOAMERICANA: JUNÍN BICENTENARIO A 200 AÑOS DEL
GRITO DE LA LIBERTAD AMERICANA**



REUNION CON EL ALCALDE PROVINCIAL DE JUNIN



PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PARTICIPÓ DEL LANZAMIENTO DE LA DANZA LA CHONGUINADA DE LA PROVINCIA DE JUNÍN 2024

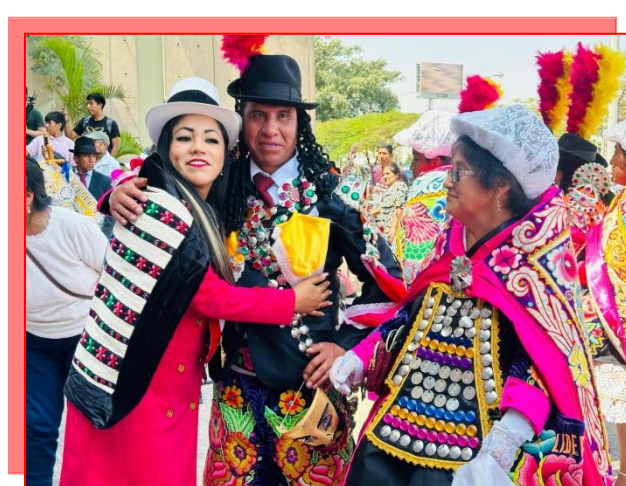

**REUNIÓN CON EL PRESIDENTE DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA
DE LA LIBERTAD, DR. VÍCTOR ALBERTO MARTIN BURGOS MARIÑOS,
SOBRE LAS ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS POR LOS 200 AÑOS
DE LA CREACIÓN DE LA CORTE DE JUSTICIA**




**CONFERENCIA MAGISTRAL: DON JOSE FRANCISCO DE SAN MARTIN Y
MATORRASEL ESTRATEGA MILITAR Y LIBERTADOR DEL PERÚ,
FUNDADOR DE LA LEGION PERUANA DE LA GUARDIA**



REUNIÓN EN EL CUARTEL GENERAL DEL EJÉRCITO, POR LA CONMEMORACIÓN DEL BICENTENARIO DE LAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO




**RECONOCIMIENTO A LAS ASOCIACIONES CIVICAS Y MILITARES,
POR SU COMPROMISO CON LA HISTORIA Y DEL BICENTENARIO
DE LA INDEPENDENCIA DEL PERU**

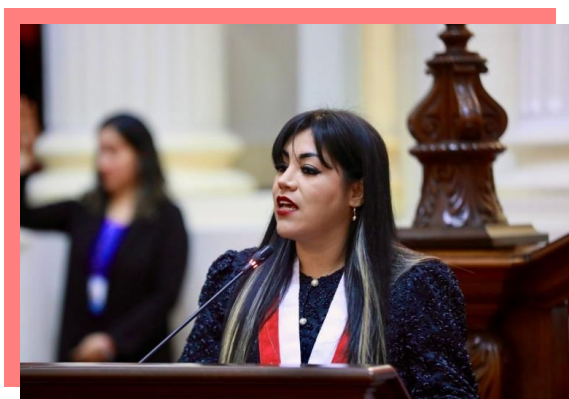

CEREMONIA CONMEMORATIVA PARA EL IZAMIENTO DE PABELLÓN NACIONAL, POR LA CONMEMORACIÓN DE LOS 200 AÑOS DE LA HEROICA BATALLA DE JUNÍN





RECONOCIMIENTO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE LLEVAN EL NOMBRE EN HONOR A LA BATALLA DE JUNÍN

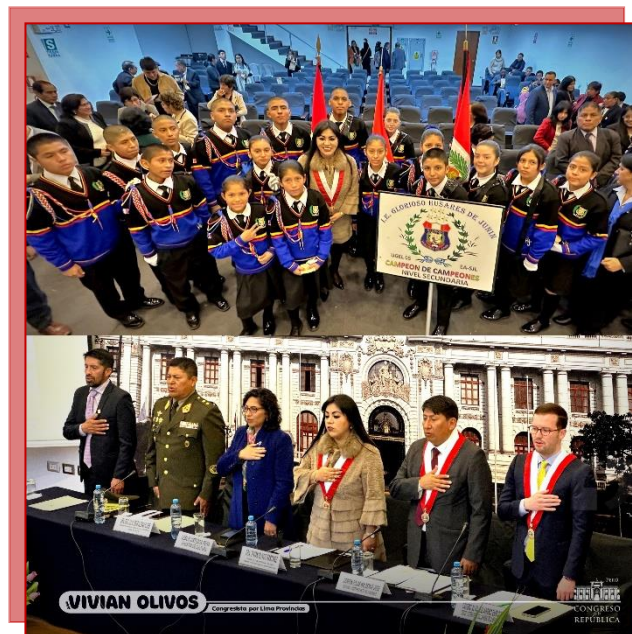

PARTICIPACIÓN EN LA CEREMONIA DEL SANTUARIO DE CHACAMARCA DE LA REGIÓN DE JUNÍN, POR EL BICENTENARIO DE LA HEROICA BATALLA DE JUNÍN



MESA TÉCNICA VIRTUAL SOBRE EL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DEL INMUEBLE DEL MONUMENTO HISTÓRICO BALCÓN DE HUAURA

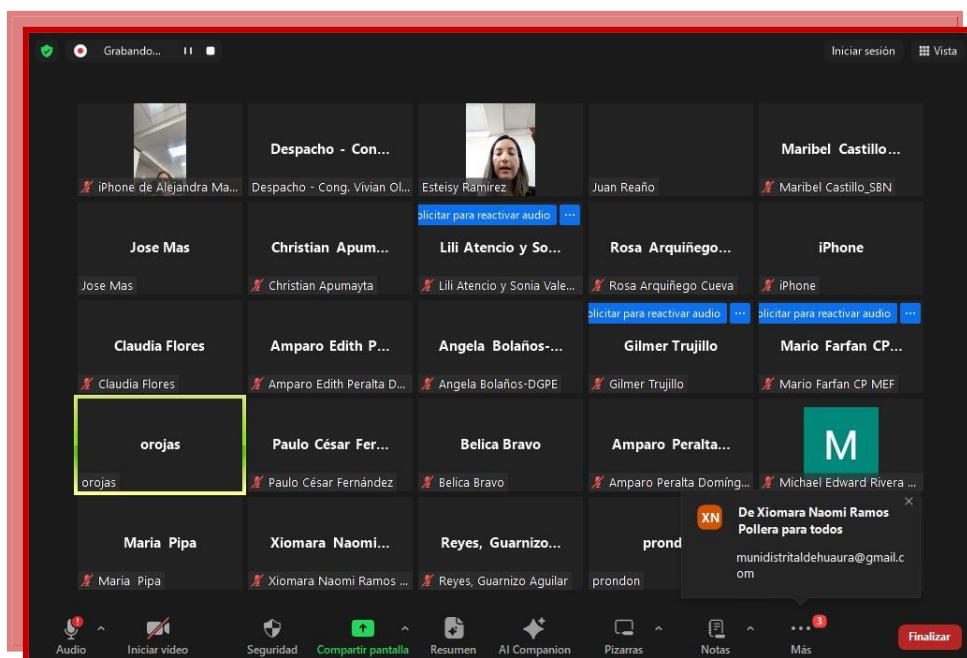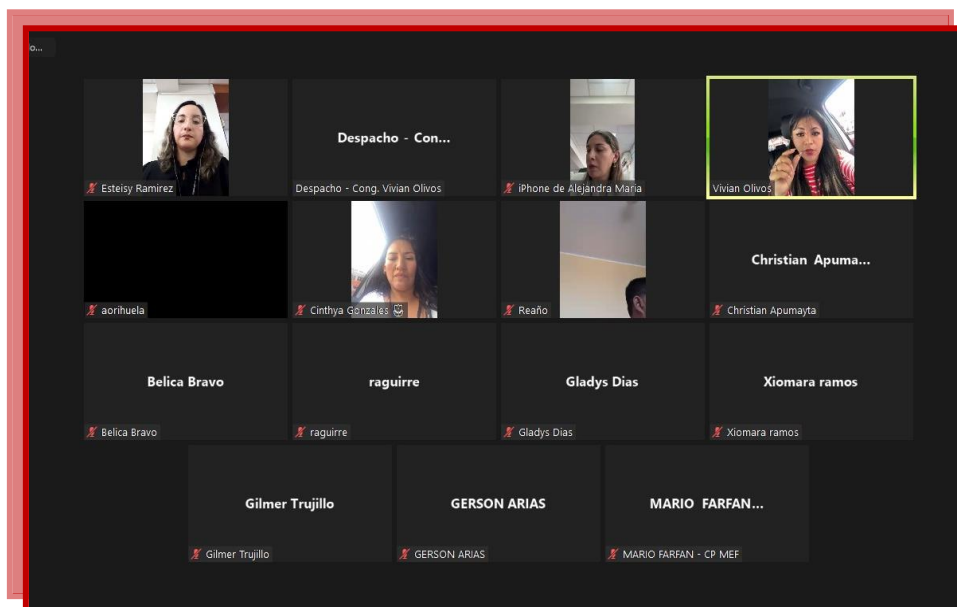

MESA TÉCNICA PRESENCIAL SOBRE EL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DEL INMUEBLE DEL MONUMENTO HISTÓRICO BALCÓN DE HUAURA



**MESA TÉCNICA, SOBRE LA DENOMINACION DEL AÑO 2025 COMO AÑO
DEL BICENTENARIO DEL PASO A LA INMORTALIDAD DE JOSÉ
FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN Y LA DEFENSA DE LA REPUBLICA**



MESA TÉCNICA SOBRE LEY QUE DECLARA DE INTERÉS NACIONAL LA RESTRUCTURACIÓN, CONSERVACIÓN, EXHIBICIÓN Y DIFUSIÓN DEL MONUMENTO HISTÓRICO CASA DONDE NACIÓ EL PRÓCER DE LA INDEPENDENCIA Y TRIBUNO DE LA REPÚBLICA DOCTOR JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN



MESA TÉCNICA SOBRE EL PROYECTO DE LEY: QUE DECLARA DE INTERÉS NACIONAL Y NECESIDAD PÚBLICA EL CIERRE DE BRECHAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN, CON MOTIVO DE CONMEMORARSE LOS 200 AÑOS DE LA BATALLA DE JUNÍN



MESA TÉCNICA SOBRE LOS ALCANCES OFICIALES DE LA RUTA DEL LIBERTADOR PARA SU OFICIALIZACIÓN



PRESENTACIÓN DEL LIBRO DE ORO, EN CONMEMORACIÓN AL BICENTENARIO DE LA BATALLA DE JUNÍN



EXPOSICIÓN DE FOTOS POR LOS 200 AÑOS DE LA HEROICA BATALLA DE AYACUCHO



Página 158 de 267

RECONOCIMIENTO Y CONMEMORACIÓN DEL BICENTENARIO DE LA BATALLA DE AYACUCHO



